

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR


junho - 2020

EIXO NORTE

- **Válvulas EBI 02 e EBI 03** – Projeto até 17/06/20; montagem e teste 18/02/21.
- **As estruturas para o caminho da águas até o reservatório de Jati estão concluídas.**
- **Dique Negreiros**– Percolação dentro do limite aceitável (monitoramento constante). Projeto de aplicação das injeções apresentado em 05/05/20 - previsão de início – agosto/20
- **Enchimento do Reservatório Milagres:**
 - Cota do reservatório (03/06): 487,50 m - Cota mínima Operacional – 487,77 m

EIXO NORTE

Acompanhamento do enchimento do Reservatório Milagres Medidor de Vazão

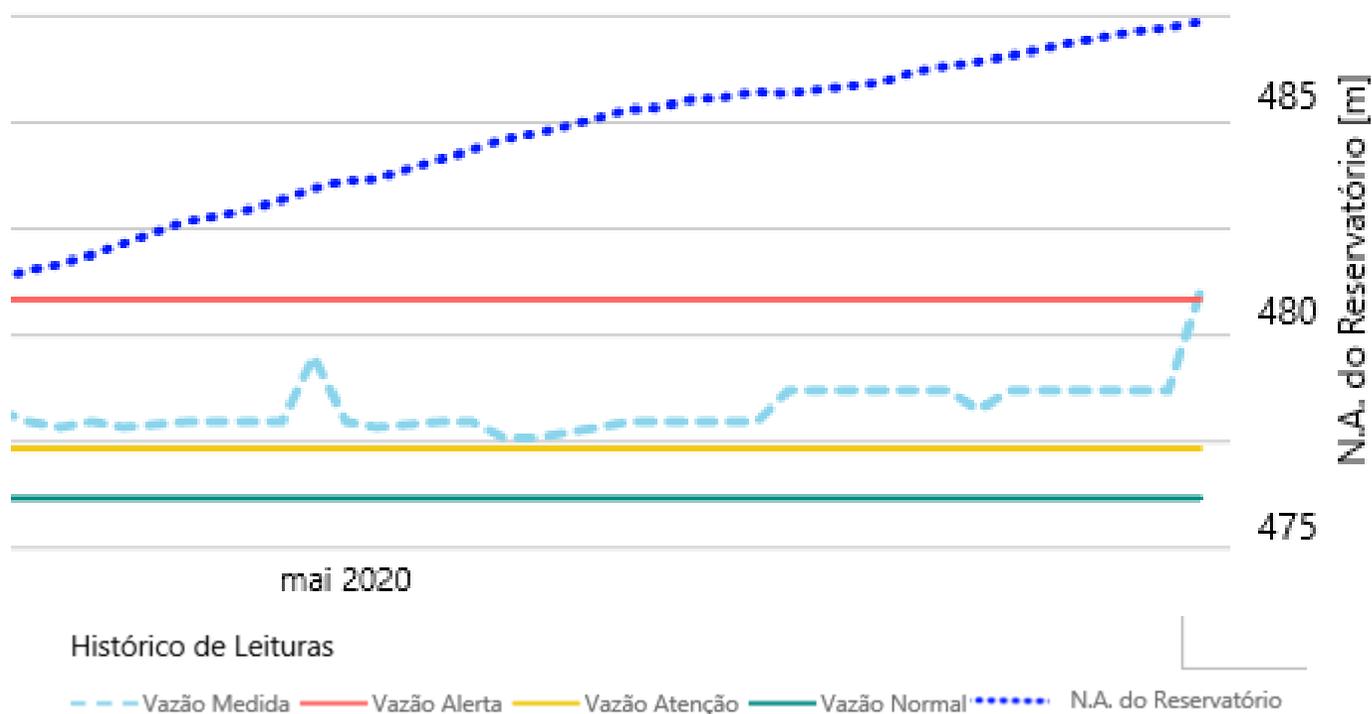

EIXO NORTE

- **EBI 3 :**
 - Retorno do bombeamento em 06/04/2020 (realizados testes e correções)
- **Cronograma de enchimento:**
 - Chegada da água no Ceará – 26/06/2020
 - Chegada no CAC – 01/08/2020
- **Vazamento no CN 10** – recuperados os pontos críticos, percolação ainda elevada. Estudos geofísicos serão realizados pela Pré-Operadora.
- **Iniciada execução do Trecho Caiçara Ávidos – previsão fevereiro/21 (1º etapa)**
 - Contratado: Canal 1238, Ponte 1546 e “Rápido” 1382 – 12,02 % executado
 - A contratar: preparação do leito para os 53 m³/s (2º Etapa)
- **Previsão de Enchimento do Eixo Norte.**
 - Reservatório Caiçaras – Junho/2021
 - Reservatório Morro – Março/2021

Derivação para Res. Eng° Ávidos



EIXO NORTE



EIXO LESTE

- **Contratação de “serviços remanescentes” Eixo Leste** – analisado pelo Jurídico- 1 mês para lançamento da licitação
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas** – Análise de Nota Técnica pelo MDR. Emissão de laudo para definir projeto de recuperação (MDR encaminhou conclusões de análise para que a Projetista se manifeste/ajuste);
- **Cacimba Nova** – Ordem de serviço assinada
- **Atividades de manutenção sendo realizadas pelo Consórcio Pré Operador;**

Obrigado!

