



PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR

Maio - 2020

EIXO NORTE


- **Válvulas EBI 02 e EBI 03** – Projeto até 30/05/20; montagem e teste 18/02/21.
- **Segmento de canal entre o Aq. Terra Nova e o Res. Terra Nova (WBS 1211):**
Recuperação de placas de revestimento concluído (tratamento dos taludes: 27/05);
- **Dique WBS1217** – Percolação dentro do limite aceitável (monitoramento constante).
Projeto de aplicação das injeções apresentado em 05/05/20 - previsão de início – agosto/20
- **Caminho das Águas** – 30/05/20
- **Enchimento do Reservatório Milagres:**
 - Cota do reservatório (27/04): 489,86 m (65% do volume útil)

EIXO NORTE

- **EBI 3 :**
 - Retorno do bombeamento em 06/04/2020 (realizados testes e correções)
- Cronograma de enchimento:
 - Chegada da água no Ceará – 25/06/20
 - Chegada no CAC – 01/08/20
- **Canal 1221 (Desemboque Túnel Milagres)** - Galeria concluído (finalização 16/05/20).
- **Vazamento no CN 10** – recuperados os pontos críticos, percolação ainda elevada. Estudos geofísicos serão realizados pela Pré-Operadora.
- **Iniciada execução do Trecho Caiçara Ávidos – previsão março/21**
 - Contratado: Canal 1238, Ponte 1546 e “Rápido” 1382
 - A contratar: preparação do leito para os 53 m³/s

EIXO NORTE

Acompanhamento do enchimento do Reservatório Milagres Medidor de Vazão

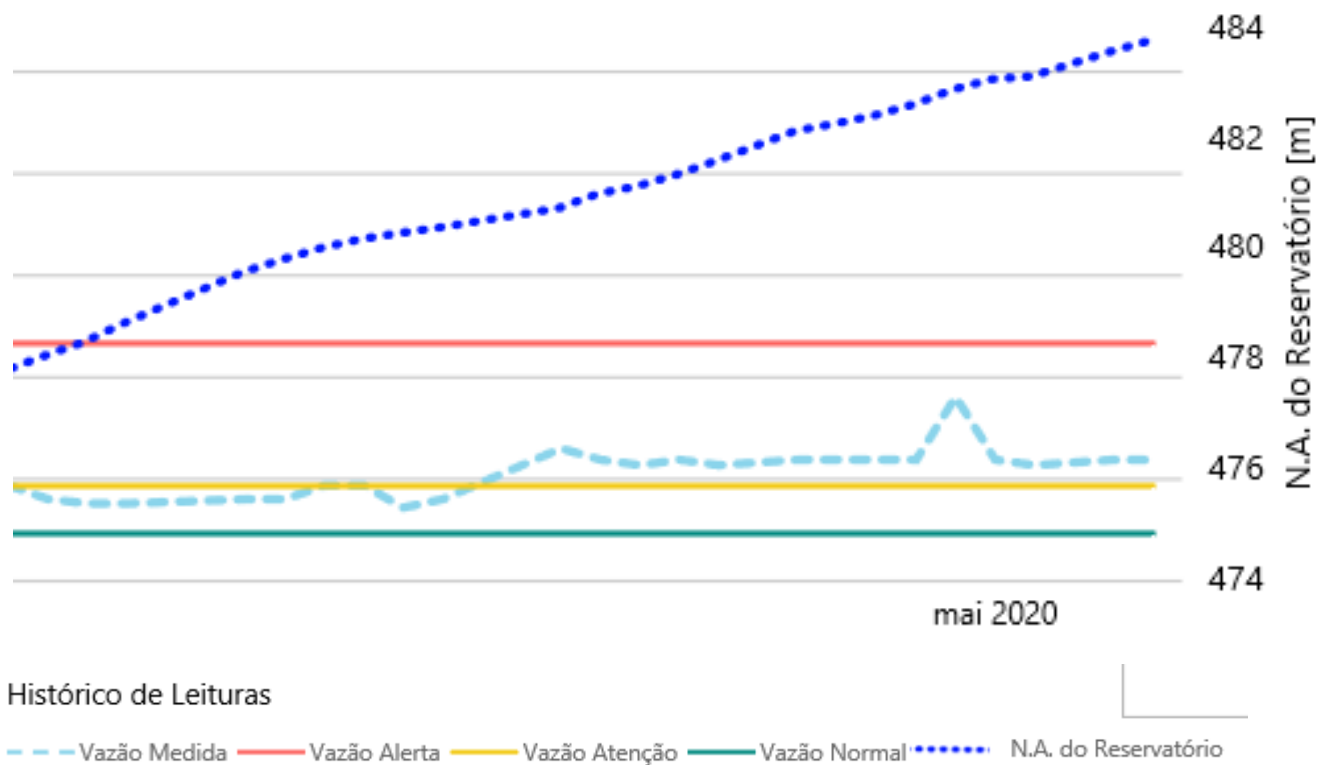


EIXO NORTE



EIXO LESTE

- Bombeamento interrompido por conta da intercorrência em Moxotó;
- Execução dos reparos no canal (Pré-Operadora);
- Estudo para o dique de proteção (Gerenciadora);
- Reparos emergências para a volta do Bombeamento – 07/05/20 (hoje)
- Realizar teste final ligando a bomba, com carga – 11/05
- Painel eletromecânicos da EBV05 – danos não são relevantes até o momento

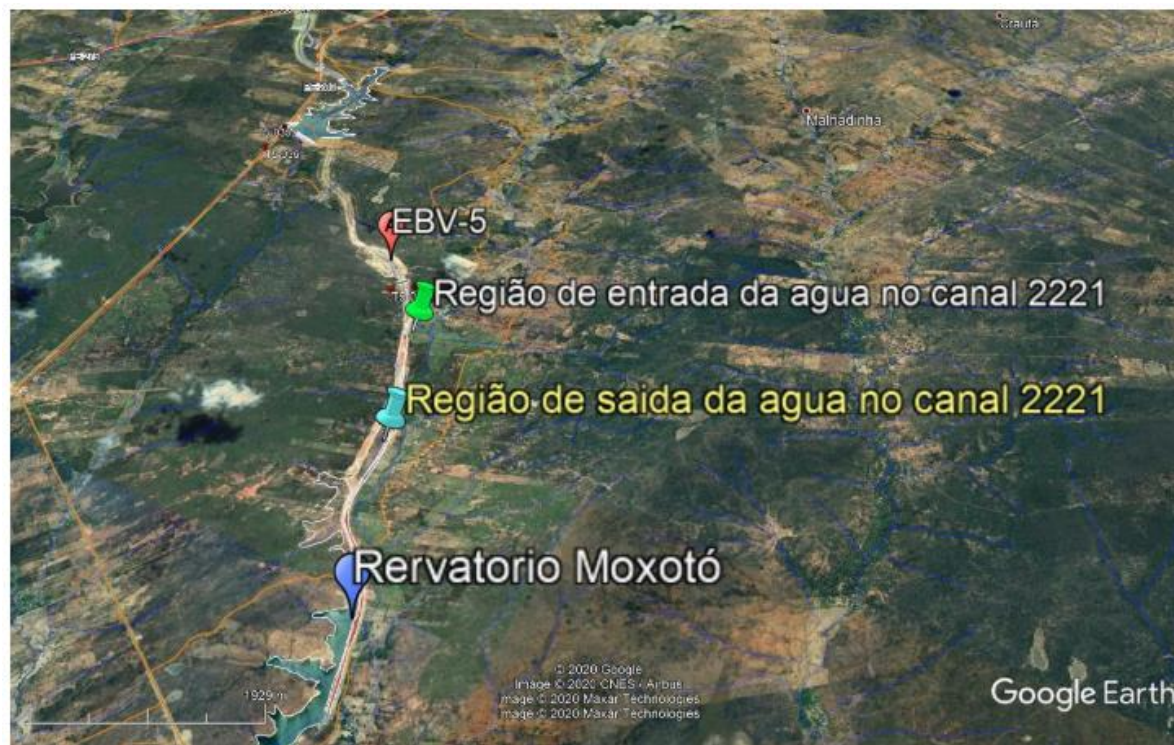

EIXO LESTE

- **Contratação de “serviços remanescentes” Eixo Leste** – Em processo de análise pelo Jurídico;
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas** – Análise de Nota Técnica pelo MDR. Emissão de laudo para definir projeto de recuperação (MDR encaminhou conclusões de análise para que a Projetista se manifeste/ajuste);
- **Cacimba Nova** – Contrato Assinado
- **Atividades de manutenção sendo realizadas pelo Consórcio Pré Operador;**

Obrigado!

