



**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO
FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL**

**Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR**

julho - 2020

INTERCORRÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO PISF

Avanço Físico - Julho/2020 - VALIDAÇÃO


AVANÇO FÍSICO DO PISF						
JULHO DE 2020 - COMPLETO						
Trechos	Valores acumulados					
	Até Caiçara			Até Ávidos		
	jul/20	jun/20	Evolução	jul/20	jun/20	Evolução
PISF	97,36%	97,35%	0,01%	97,10%	97,06%	0,04%
Eixo Leste	97,13%	97,12%	0,01%	97,13%	97,12%	0,01%
Meta 1L	99,09%	99,08%	0,01%	99,09%	99,08%	0,01%
Meta 2L	96,63%	96,62%	0,01%	96,63%	96,62%	0,01%
Meta 3L	98,22%	98,21%	0,01%	98,22%	98,21%	0,01%
Eixo Norte	97,53%	97,51%	0,02%	96,57%	96,50%	0,07%
Trecho I	96,54%	96,53%	0,01%	96,54%	96,53%	0,01%
Trecho II	99,01%	99,00%	0,01%	96,54%	96,48%	0,06%
Meta 2N	99,30%	99,27%	0,03%	99,30%	99,27%	0,03%
Meta 3N	98,87%	98,86%	0,01%	95,11%	95,03%	0,08%

Importante destacar que este avanço será utilizado no Sumário Executivo do Cíbero, no Relatório de Progresso nº 81 (julho/2020) e no Relatório Final.


INTERCORRÊNCIAS EM JATI



INTERCORRÊNCIAS EM JATI

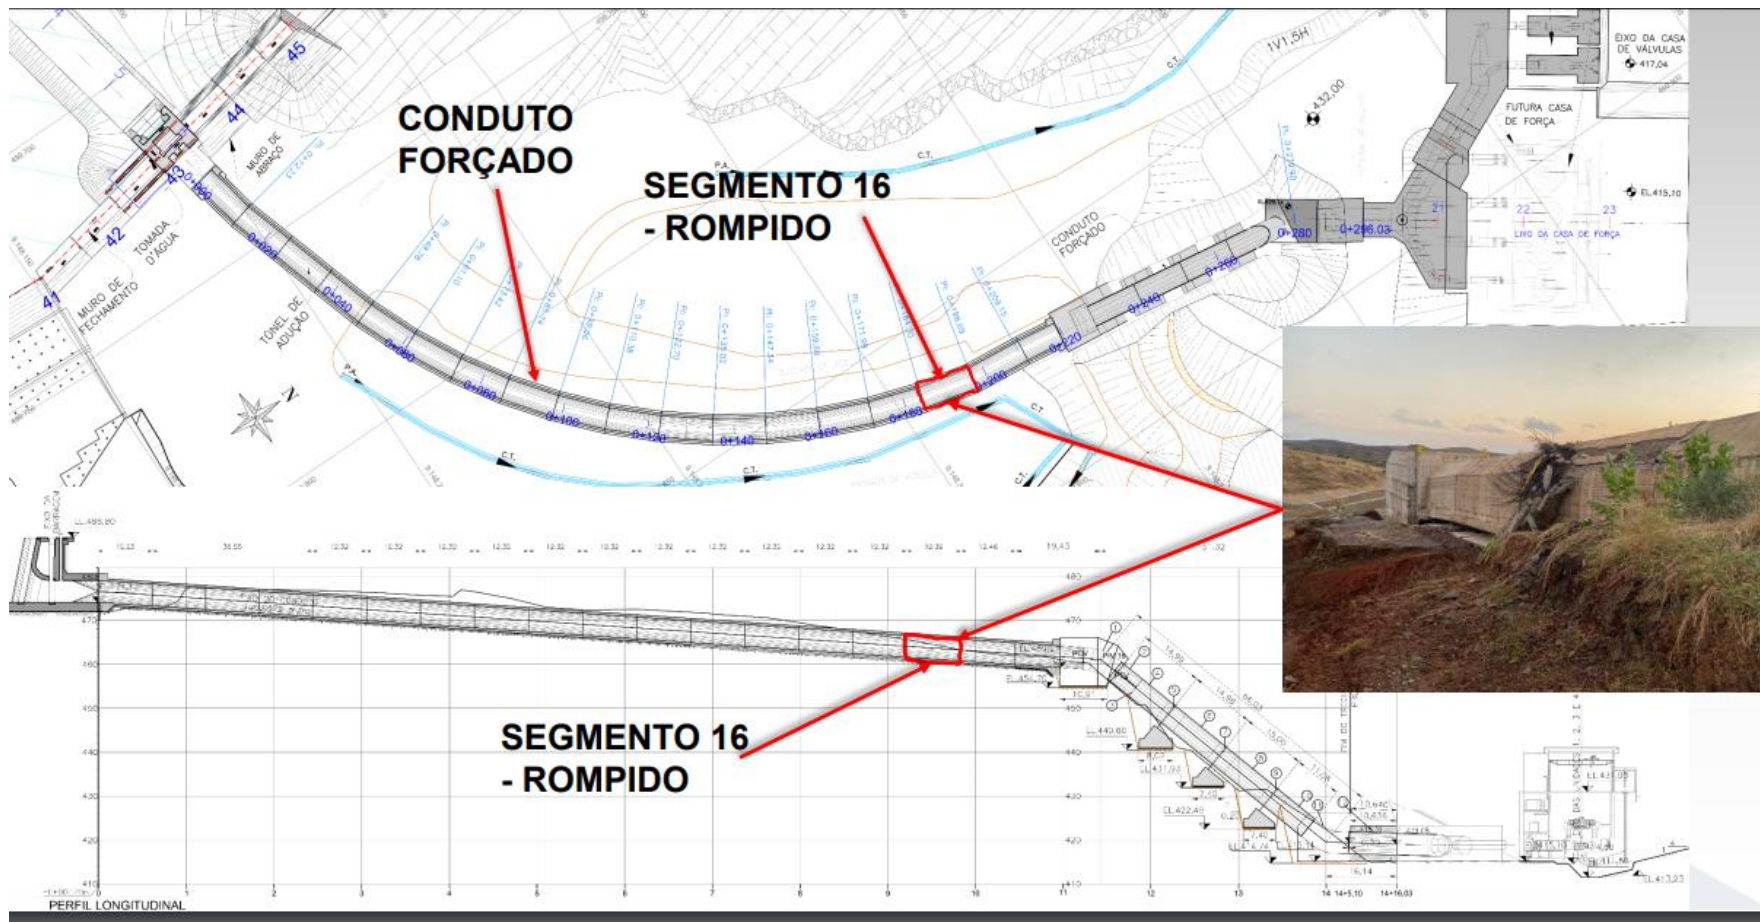

INTERCORRÊNCIAS EM JATI

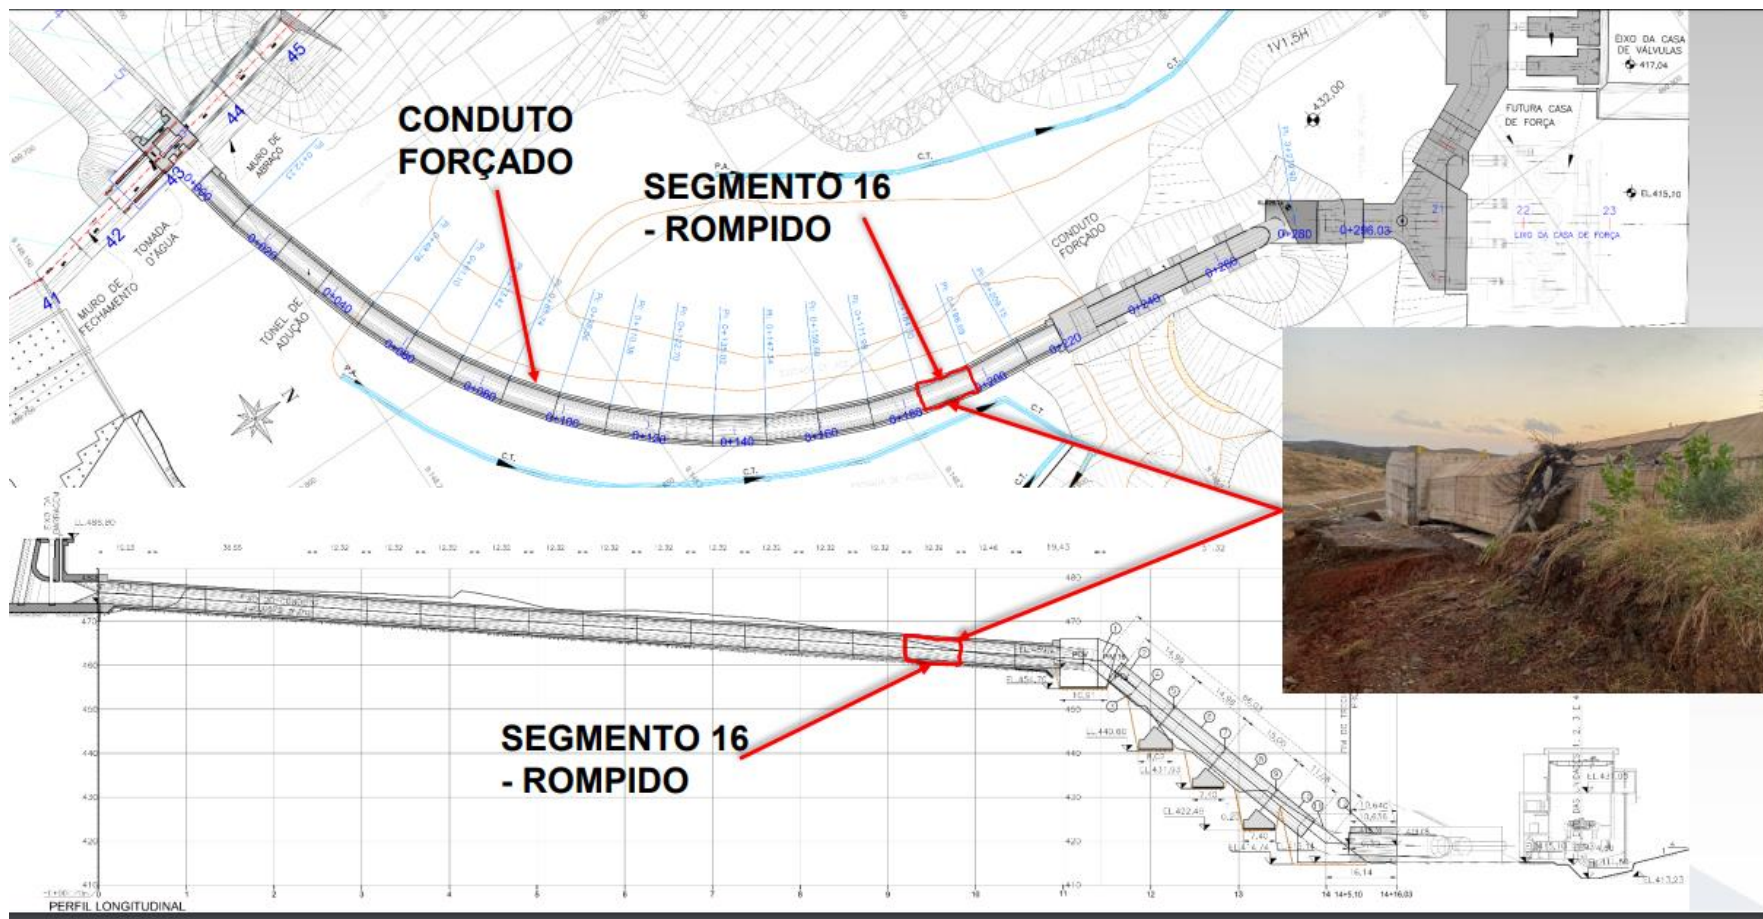

EIXO NORTE

- **Dique Negreiros** – Percolação dentro do limite aceitável (monitoramento constante). Projeto de aplicação das injeções apresentado em 05/05/20 – estão sendo realizadas sondagens complementares previsão de início da recuperação – em análise
- **Vazamento no CN 10** – recuperados os pontos críticos, percolação ainda elevada. Estudos geofísicos foram realizados , início da recuperação em análise
- **Iniciada execução do Trecho Caiçara Ávidos – previsão fevereiro/21 (1º etapa)**
 - Contratado: Canal 1238, Ponte 1546 e “Rápido” 1382
 - A contratar: preparação do leito para os 53,44 m³/s (2º Etapa) – Consultoria Jurídica
- **Previsão de Enchimento do Eixo Norte.**
 - Reservatório Caiçaras – Em análise
 - Reservatório Morro – Em análise

EIXO LESTE

- **Contratação de “serviços remanescentes” Eixo Leste** – encaminhado pra CPI para publicação
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas** – Análise de Nota Técnica pelo MDR. Projeto de recuperação definido
- **Cacimba Nova** – Os serviços de execução das sondagens estão em andamento
- Os serviços de operação e manutenção estão sendo executados pela Codevasf

CACIMBA NOVA



Pendências da última reunião

- A recuperação do Reservatório engenheiro Ávidos está fase de licitação, as propostas estão sendo analisadas pelo área de licitação do DNOCS
- Será agendada uma vista conjunta com o governo da Paraíba para conhecer a situação do rio Piranhas –Açu
- Ramal do Piancó
 - Supervisão - R\$: 8.200.512,65. Abertura das propostas 02/06/2020 - TCU
 - Obra -R\$ 78.858.000,85. Abertura das propostas prevista para 21.09.2020. Início da execução dos serviços previsto para outubro/2020. Conclusão até 30/03/2022.
 - Fornecimento de material (59412.001839/2019-84) - R\$ 94.686.863,93. Licitação concluída. Situação: em andamento. Emitida ordem de suspensão, tendo em vista atraso na licitação da obra.
- Reservatório Camalaú e Poções – 78% e 87% concluídos respectivamente. Previsão out/20

Obrigado!

