


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida

Tipos de Intervenção

■ ADEQUAÇÃO-REST/MELH.	4,33 Km
■ CONTORNO RODoviÁRIO	19,70 Km
Total	24,03 Km

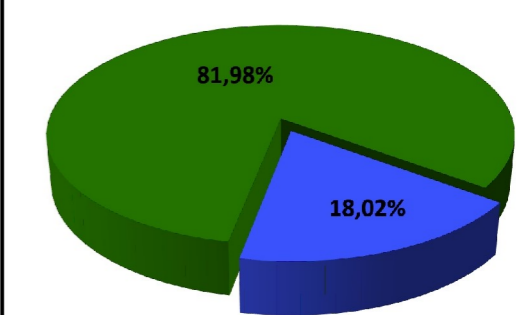

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXTENSÃO	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2010	7U06	Único	00 01081/2014	CONSORCIO CONTRACTOR - IGUA TEMI	BR-447	0,00 - 4,33	4,33	Acesso Capuaba	02/01/2015	31/05/2026	R\$ 232.382.811,91	63,6%	Obra em andamento com 1,17 km já pavimentados. Pendências com desapropriação afetam o andamento do contrato. Previsão de entregar passarela da EST 213 até dezembro/2024.	17 00261/2022	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
2	2011	7S61	Único	00 00461/2017	CONSORCIO CONTRACTOR / SULCATA RINENSE / ENECON	BR-101	249,00 - 268,70	19,7	Contorno Rodoviário do Município de Serra (Mestre Álvaro)	11/08/2017	30/06/2024	R\$ 509.496.345,67	100%	Contrato concluído. Termo de recebimento definitivo assinado em outubro/24.	17 00887/2019	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
