

Legenda:


- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

- IMPLANTAÇÃO 400,72 Km
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 45,00 Km
- OBRAS COMPLEMENTARES**
- OAE*
- OAE
- A LICITAR

Total 445,72 Km

* Contrato para construção de OAEs ao longo do trecho da rodovia.
 ** Intervenção para remoção de rede elétrica

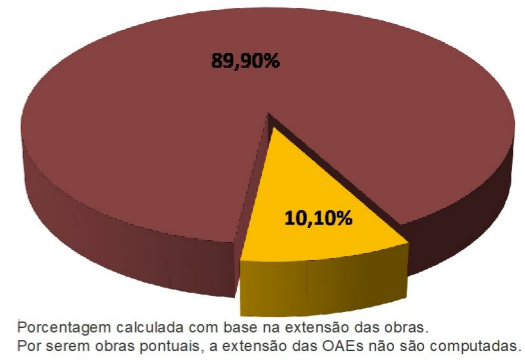

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

Obras Diretas											SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *				
1	1490	Único	02	00263/2023	CONSORCIO AGR/LCM BR-163	BR-163	814,00 844,00	1,68	Acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto.	09/05/2023	27/01/2025	R\$ 19.145.267,27	89,77%	Em execução encabeçamento das OAEs. Em andamento RPFO para alteração do traçado. Previsto concluir obra em dezembro/2024.			
2	2042	1490	Único	00 00035/2013	CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - BENITO ROGGIO - CONSOL	BR-163	676,31 788,98	112,67	Implantação da BR-163/PA.	01/07/2013	26/10/2024	R\$ 329.102.703,65	78,70%	Em tratativas para rescisão contratual. Haverá licitação de remanescente.		02 00627/2009 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	
3	2043	110I	4	00 00851/2016	CONSORCIO VEREDA - ENECON	BR-230	727,80 894,22	0	Execução de OAE na BR-230 (12 Pontes).	22/01/2017	09/04/2024	R\$ 50.110.128,69	99,32%	Concluída em abril/2024. Aguardando Termo de Recebimento Provisório.		02 00519/2023 CONSORCIO STE - ENECON	
4	2043	110I	02	00281/2024	PLANEJE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	BR-230	709,40 1006,80	297,5	Projeto e execução de 15 pontes	13/08/2024	10/09/2027	R\$ 49.055.443,96	0,00%	Em fase de projetos. Entraves com componente indígena entre os km 750 e 851.			
5	2044	161U-10KR	Único	00 00011/2021	CONSORCIO CONSTRUBASE / CIDADE	BR-230	571,00 571,70	0,7	Construção de ponte sobre o rio Xingu.	25/05/2021	07/04/2026	R\$ 375.363.651,43	14,60%	Previsto atingir 30% até dez/24. Previsão de RPFO para alteração de fundação e área de balsas exclusiva para a obra.		02 00936/2018 ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA	
6	2044	10KR	Único	02 00398/2024	CONSTRUTORA JUMBO LTDA	BR-230	390,87 398,95	8,08	Remanescente do Complexo Ladeira da Velha Rodovia	04/07/2024	01/10/2025	R\$ 53.584.238,17	0,00%	Em fase de projetos. Solicitada delegação de competência para análise pela SR.		02 00490/2022 CONSORCIO STE / PROGIA	
7	2045	10KR	2	02 00582/2010	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	BR-230	283,60 388,60	105	Implantação da BR-230.	05/07/2010	14/07/2024	R\$ 290.919.955,45	97,82%	Contrato concluído em 14/07/2024.			
8	2046	7S61	Único	02 00731/2021	CONSORCIO BR-422 (LCM - APIA)	BR-422	0,00 59,34	59,34	Construção e pavimentação da BR-422/PA.	10/12/2021	22/09/2026	R\$ 222.314.085,62	51,13%	Executando terraplenagem e pavimentação. Entrega prevista de 42 kms de pavimentação em dez/24.			
9	2040	7W07	Único	02 00471/2021	TAMASA ENGENHARIA S/A	BR-316	67,60 112,60	45	Duplicação da BR-316.	06/09/2021	04/09/2025	R\$ 192.897.680,35	33,13%	Executando OAE, frentes segmentadas. Interferências com rede elétrica sendo tratadas. Previsão RPFO de solo mole, ponte e drenagem.			
10	2047	7S62	1	02 00341/2024	GONÇALVES DIAS ENGENHARIA LTDA	BR-308	203,27 239,27	36	Remanescente de Implantação e Pavimentação do Lote 1	01/07/2024	28/09/2026	R\$ 60.297.971,54	4,47%	Executando OACs e terraplenagem. Previsão de contratação de supervisão e acessório de desapropriação para o 1º trimestre de 2025.			
11	2047	7S62	2	02 00342/2024	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	BR-308	239,27 318,90	79,63	Remanescente de Implantação e Pavimentação do Lote 2	04/07/2024	01/10/2026	R\$ 188.025.586,55	2,28%	Executando OACs e terraplenagem. Previsão de contratação de supervisão e acessório de desapropriação para o 1º trimestre de 2025.			

Obra Delegada														SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **		
D1	2040	7W07	ACT-433/2023	Estado do Pará	BR-316	67,60 112,60	45	Delegar Supervisão e Execução de remoção de rede elétrica	27/07/2023	12/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 23.168.341,45	R\$ 23.168.341,45	0%	Levantamento dos postes dentro da faixa de domínio e cadastros sendo feitos pela supervisora.	

Obras a licitar														SITUAÇÃO		EDITAL SUPERVISÃO	
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL									
L1		7S62	BR-308	204,30 276,40	Construção de 11 OAEs				Em fase de anteprojeto. Previsão de licitação no 2º semestre de 2025. Prevista contratação futura de acessório de desapropriação e supervisão.								
L2		161U	BR-230	569,61 572,28	Prev 1 - Adequação				Acesso à Ponte do Rio Xingu - a licitar em 2025. Há projetos já desenvolvidos.								
L3		2041	BR-230	728,00 811,10	Prev 4 - Lote 1				Projetos serão elaborados pela Supervisora. Previsão de licitação para o 4º trimestre/2025. Entraves com questões indígenas em um trecho de 80 km.								
L4		2041	BR-230	811,10 894,22	Prev 5 - Lote 2				Projetos serão elaborados pela Supervisora. Previsão para o 4º trimestre/2025.								
L5		2041	BR-230	894,22 976,99	Prev 6 - Lote 3				Remanescente do CT 00 01038/2012. Supervisora irá elaborar os projetos.								
L6		2042	BR-163	676,31 788,98	Remanescente do contrato 00 00035/2013				Previsão de licitação com projeto executivo em 2026/2027.								

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
