

MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Jan - Fev - Mar
- Mai - Jun - Jul
- Mar - Abr - Mai
- Fev - Mar - Abr




Legenda:

- Sede municipal (dot)
- Distrito (triangle)
- Capital Estadual (circle with dot)
- Limite de contrato (thick line)
- Rodovia Estadual (green line)
- Rodovia Federal (red line)
- Pavimentada (solid red line)
- Não pavimentada (dashed red line)
- Planejada (dotted red line)

Tipos de Intervenção

Duplicação/Restauração	51,40 Km
Implantação	67,92 Km
Adequação-REST./MELH.	11,30 Km
A LICITAR	
Total	130,62 Km

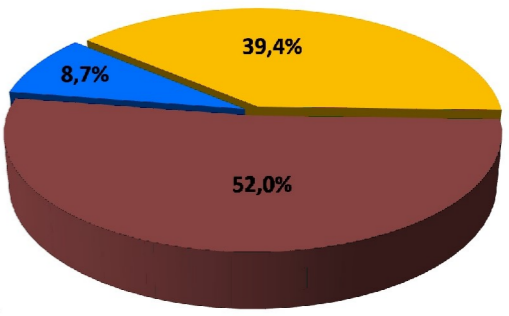

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2053	14X0	1	04.00260/2021	CONSORCIO LCM/BTEC/CONTECNICA	BR-423	18,20	86,12	67,92	Projetos e Execução do Lote 1	26/10/2021	29/09/2026	R\$ 330.394.587,82	0,75%	Drenagem e Terraplenagem do segmento 1 em andamento. Pendente ASV do segmento 2. Interferências com postes sendo tratadas.	04.00421/2024	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA
2	2050	7X42	Unico	04.00520/2022	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREEN	BR-407	115,50	124,60	11,30	Adequação da travessia urbana de Petrolina	13/10/2022	28/06/2025	R\$ 131.065.801,73	48,59%	Concluído o viaduto BR-407/428 e ponte riacho Vitória. Em execução rotatória, alças, terraplenagem, drenagem e pavimentação.	04.00276/2023	JBR/ASTEP

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	
D1	2054	7M88	TC-266/2007	Estado de Pernambuco	BR-104	19,80	71,20	51,4	Rest. e adeq. de capacidade e dupl.	08/07/2008	31/12/2024	R\$ 321.653.976,11	R\$ 26.080.052,12	R\$ 347.734.028,23	82,44%	Obras em andamento, com entraves relacionados à desapropriação. Previsão de resolução até nov/24.

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	3872	14X3	BR-101	0,00	30,00	Arco Metropolitano de Recife			Projeto Básico aprovado pelo estado, e executivo falta a aprovação de 1 OAE e o orçamento. Sem previsão de licitação.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
