
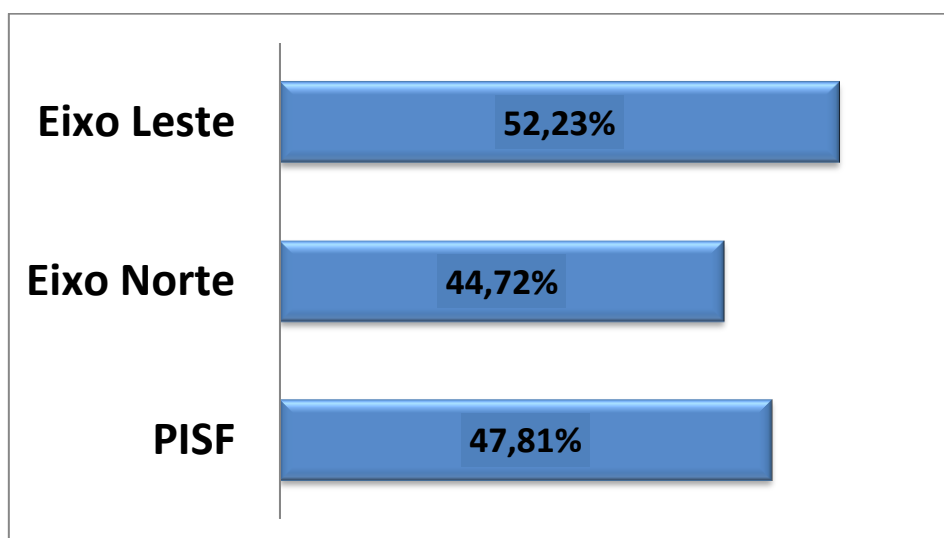


Situação Geral

Projeto de Integração do São Francisco, obra que envolverá investimentos de R\$ 8,2 bilhões, está avançando. No Eixo leste, 52% das ações já foram executadas e, no Eixo Norte, esse índice é 45%. O Empreendimento conta com cerca de 48% das obras executadas.


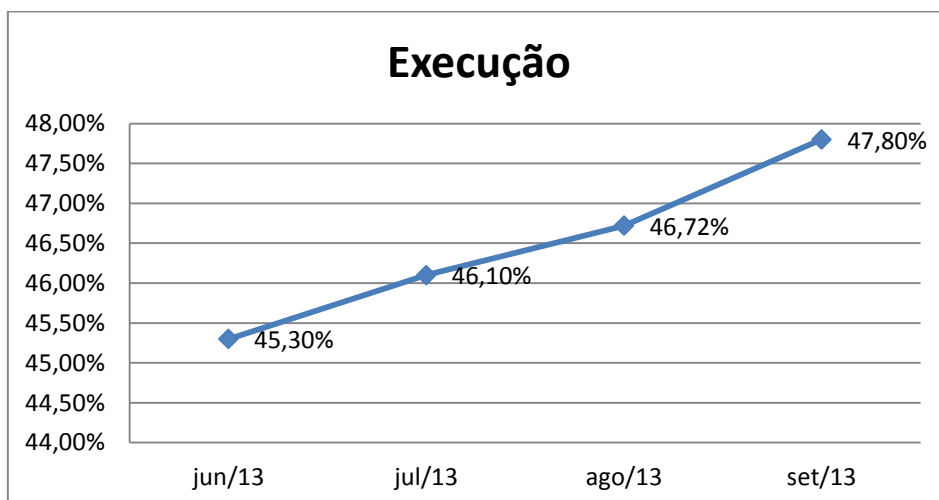


Nesse período, foram contratados e emitidas as ordem de serviços das últimas licitações de obras civis remanescentes do empreendimento, bem como liberados novos trechos para execução, conforme tabela abaixo:

Contratos e O.S

Contrato (Remanescentes)	Assinatura do contrato	O.S
Meta 1L e 2L	23.05.2013	07.06.2013 (Mobilização)
		02.08.2013 (Serviços da Meta 1L)
		02.08.2013 (Serviços da Meta 2L)
Meta 2L e 3L	17.09.2013	20.09.2013 (mobilização) 24.09.2013 (serviços da meta 2L e 3L)
Meta 3N	27.09.2013	27.09.2013 (mobilização) 14.10.2013 (Serviços dos lotes 6 e 7)

Foram liberados no período, junho/13 a outubro/13, por meio dessas O.S mais de 1 bilhão de reais e foram aplicados na execução do empreendimento mais de 350 milhões.

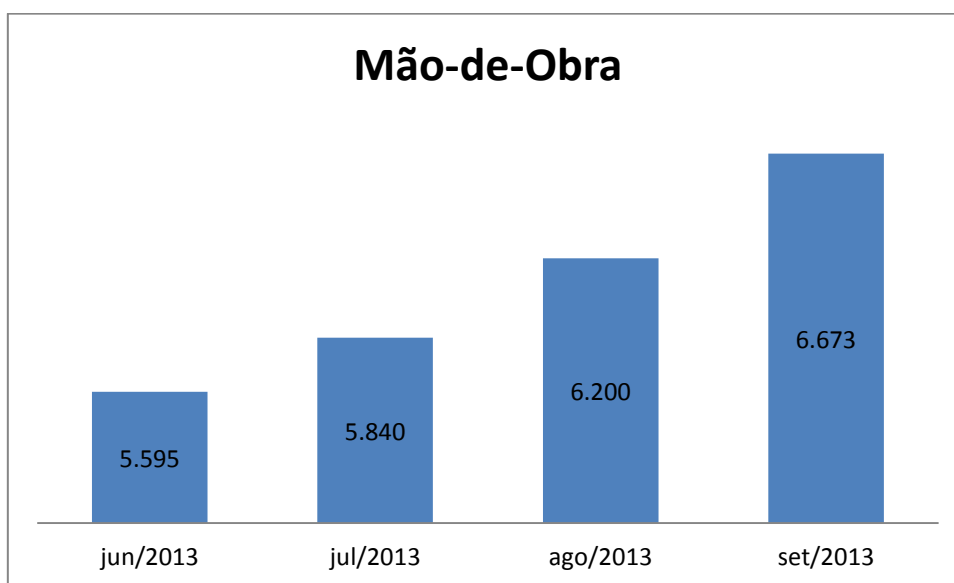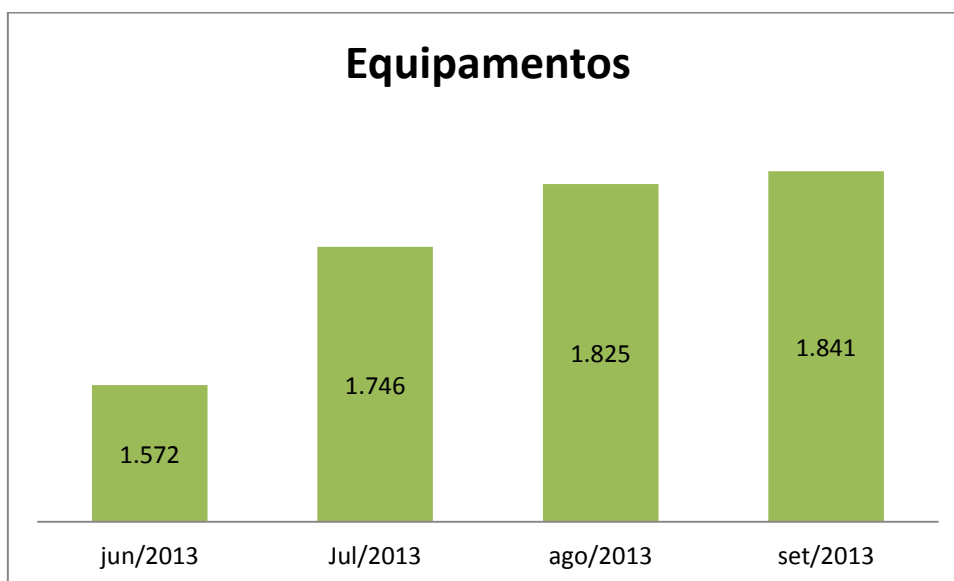

A mão-de-obra de setembro/13 é cerca de 72% superior a de setembro/12 (3.881).

EIXO NORTE

Carioca/Serveng/S.A Paulista (Lote 1 e 2)

Pontos relevantes:

Os canais de ambos os lotes foram finalizados (cerca de 58 km de canais);

Mobilização lote 1: 583;

Mobilização lote 2: 617;

Equipamentos lote 1: 160;

Equipamentos Lote 2: 194

Frentes Lote 1

- Aqueduto Logradouro (em finalização);
- Aqueduto Terra Nova (em finalização);
- Ponte BR-248 (em finalização);

Frentes lote 2

- Barragem Serra do Livramento (previsão de finalização dezembro/13);
- Mangueira (previsão de finalização dezembro/13)

Mendes Júnior (Lote 8)

Pontos relevantes:

Mobilização: 972;

Equipamentos: 102

Frentes

- - EBI-1 : Concretagem do poço de sucção e da estrutura de deságue.
- - EBI-2: Bate-choco com equipamento suspenso (plataforma com gaiola) c/remoção do material solto e mapeamento geológico de paredes com apoio permanente de equipe de topografia;
- - EBI-3: Liberação da fundação do poço de sucção.

Mendes Júnior (Remanescentes 1, 2 ,3 e 4)

Pontos relevantes:

Mobilização: 1214;

Equipamentos: 410

Frentes

- Segmentos de Canais:
 - WBS-1206,
 - WBS-1208,
 - WBS-1209,
 - WBS-1211,
 - WBS 1219.
- Barragem de Terra Nova,
- Dique Negreiros,
- Barragem Negreiros,
- Barragem Milagres,
- Túnel Milagres.

Serveng Civilsan S.A Empresas Associadas (lote 5)

Pontos relevantes:

Mobilização: 986;
Equipamentos: 346

Frentes

Barragem de Jati;
Canal Jati Atalho;
Barragem de Porcos;
Barragem Cana Brava.

Construcap (lote 14)

Pontos relevantes:

Mobilização: 583;
Equipamentos: 209

Frentes

4 frentes no Túnel cuncas I

Queiroz Galvão (Remanescentes 6 e 7)

Pontos relevantes:

Mobilização: 8;
Equipamentos: 4;
Assinado contrato e emitida OS de mobilização em 27/09/2013. A ordem de serviço de execução no valor de 484 milhões foi emitida em 14/10/2013.

Frentes

Em mobilização

EIXO LESTE

S.A Paulista/Somangue (Remanescentes 9 e13)

Pontos relevantes:

Mobilização: 253;
Equipamentos: 114;
Emitida a OS1 em 05/06/2013 (mobilização), OS2 em 02/08/2013 (24 milhões) e OS3 (323 milhões) em 02/08/2013

Frentes

Canteiro- Montagem da central de concreto no Canteiro Floresta lote 13;
Canteiro EBV- 1- Recuperação da área de vivencia junto a EBV-1;
Segmento de canal 2206 - Regularização de bermas e taludes do canal Est-790 a 855;

Início das montagens

EMSA/MENDES JUNIOR (LOTE 10)

Pontos relevantes:

Mobilização: 217;
Equipamentos: 102;

Frentes

Segmentos de canais
WBS 2212,
WBS 2213,
WBS 2215 e
WBS 2216;
Barragem Muquém;
Barragem Cacimba Nova.

S.A Paulista/FBS (Remanescentes 10, 11, 12 e 13)

Pontos relevantes:

Mobilização: 2;
Equipamentos: 3;
Contrato assinado no dia 26/08/2013, OS1 em 20/09/2013 (mobilização) (157 milhões) e OS2 em 24/09/2013 (277 milhões).

Frentes

Em mobilização
