

SUMÁRIO

EXECUTIVO



Outubro/13


*PROJETO INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO –
PISF*


Sumário Executivo

OUTUBRO / 13

Situação Geral

Projeto de Integração do São Francisco, obra que envolverá investimentos de R\$ 8,2 bilhões possui no Eixo leste 52% das ações executadas e, no Eixo Norte, esse índice é 46%. O Empreendimento conta com cerca de 49% das obras executadas. Abaixo, segue gráfico de evolução física do empreendimento e os valores de avanços por eixo:

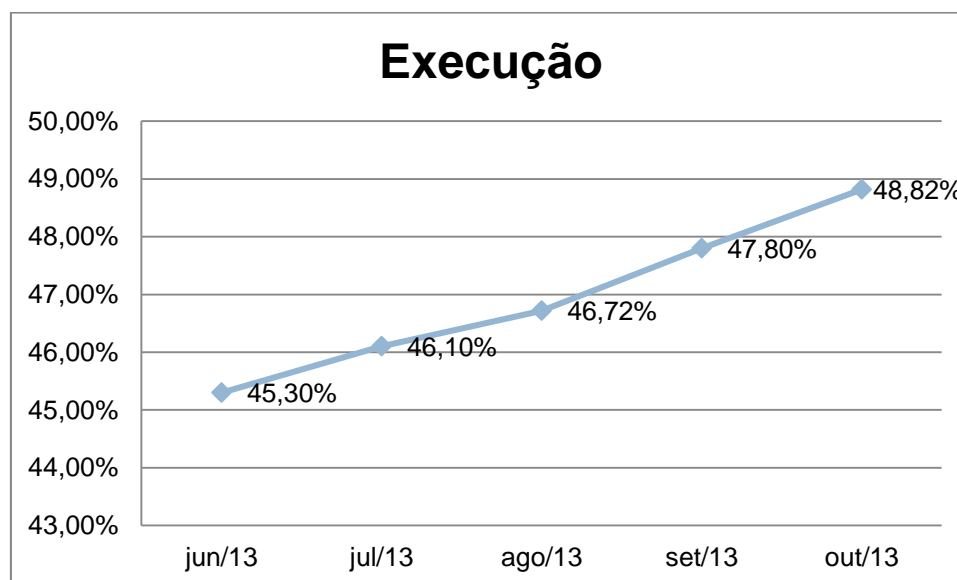

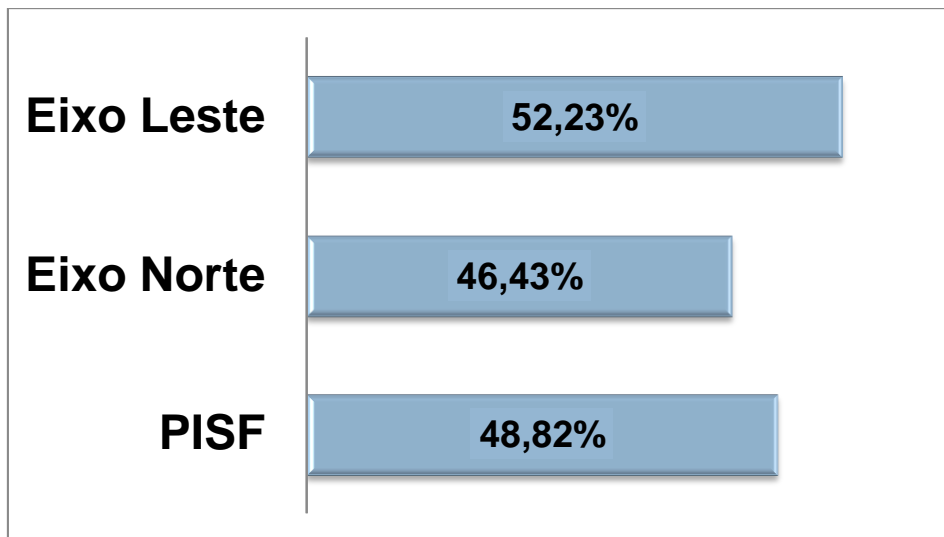


Do período de junho/13 a outubro/13, foram contratados e emitidas as ordem de serviços das últimas licitações de obras civis remanescentes do empreendimento, bem como liberados novos trechos para execução, conforme tabela abaixo:

Últimos Contratos assinados e O.S emitidas (obras)


Contrato (Remanescentes)	Assinatura do contrato	O.S
Meta 1L e 2L	23.05.2013	07.06.2013 (Mobilização)
		02.08.2013 (Serviços da Meta 1L)
		02.08.2013 (Serviços da Meta 2L)
Meta 2L e 3L	17.09.2013	20.09.2013 (mobilização) 24.09.2013 (serviços da meta 2L e 3L) 30.10.2013 (Serviços da meta 2L e 3L)
Meta 3N	27.09.2013	27.09.2013 (mobilização)

		14.10.2013 (Serviços dos lotes 6 e 7)
--	--	---------------------------------------


Foram liberados no período por meio dessas O.S mais de 1 bilhão de reais e foram aplicados na execução do empreendimento quase 450 milhões de reais.

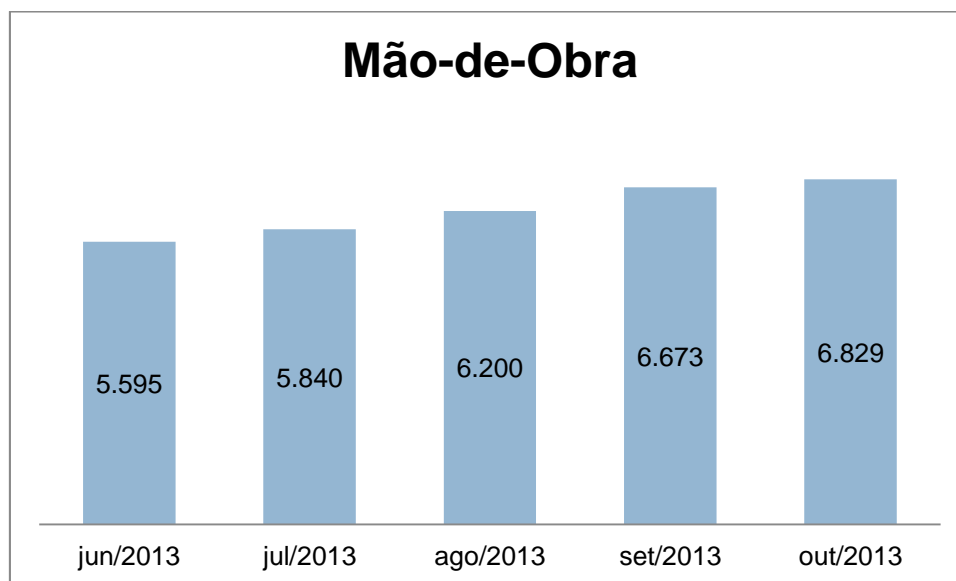

A mão-de-obra de outubro/13 é cerca de 76% superior a de outubro/12 (3.881)

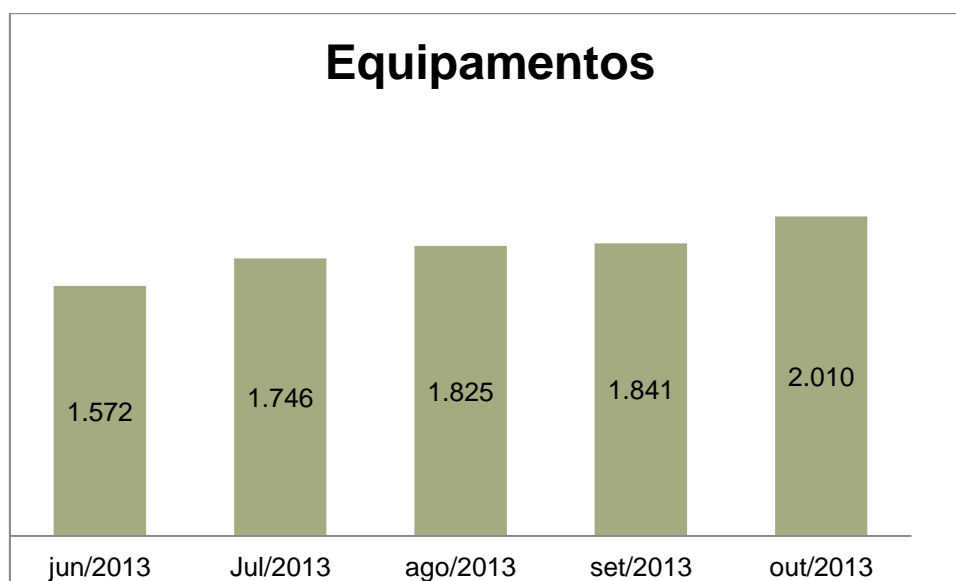

Evolução Pagamentos PISF

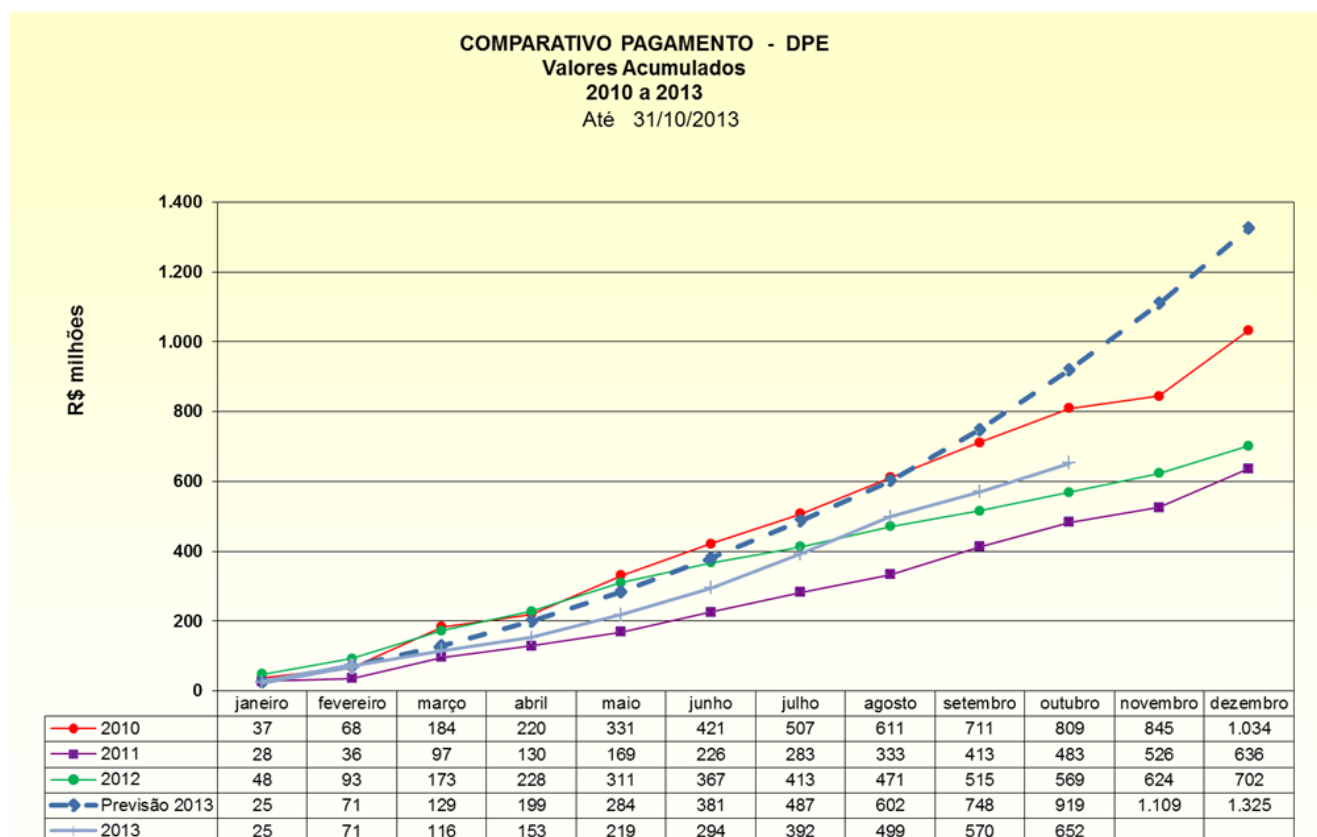

Frentes de Serviços

EIXO LESTE

S.A Paulista/Somangue (Remanescentes 9 e13)

Pontos relevantes:

Mobilização: 297;

Equipamentos: 123;

Concluídos os serviços de recuperação das áreas de vivência junto as EBV's 1 e 2;

Concluído a Instalação do britador E-1117;

Concluído Instalação da Central de concreto no Canteiro do lote 13 em Floresta/PE;

Emitida a OS1 em 05/06/2013 (mobilização), OS2 em 02/08/2013 (24 milhões) e OS3 (323 milhões) em 02/08/2013

Frentes

Segmento de canal WBS 220: Continuam os serviços de enrocamento com material conglomerático na execução do aterro próximo ao Aqueduto da BR-316;

Montagem da EBV-1;

Estrutura de controle de Areias (WBS 2255): Aplicação do concreto de regularização da estrutura de controle de Areias E785 + 10,24 a 788 + 15,31;

Estrutura de controle de Braúnas;

EBV-2: lançamento de Concreto Ciclóptico;

Aqueduto BR 316: Continuam os serviços de cimbramento do aqueduto da BR 316 para montagem das treliças;

Segmento de canal WBS 2206 : Regularização de bermas e canal em material de 1 e 2ª categoria com transporte a bota fora a 1,0 km Est-790 a 855;

Segmento de canal WBS 2208: Regularização de bermas e canal em material de 1 e 2ª categoria com transporte a bota fora a 1,0 km E1062 + 5,89 a 1114. 8.2 - Regularização de bermas e canal em material de 1 e 2ª categoria - Est-1174. 8.3 - Escavação/remoção de material de 3ª categoria a bota fora a 1,0 km - Est-1207.

EMSA/MENDES JUNIOR (LOTE 10)

Pontos relevantes:

Mobilização: 217;

Equipamentos: 102;

Frentes

Segmento de canal 2212: Em execução concreto poroso, drenagem interna e placas de concreto; Execução de mureta dos dois lados ;

Segmento de canal 2213: Execução de muretas nos dois lados, execução de concreto nas alas dos bueiros.

Barragem Cacimba Nova: Continuam os serviços de aterro no maciço e enrocamento de proteção dos taludes. Em fase de conclusão concreto de regularização da fundação do vertedouro.

Segmento de canal 2217: Continua a limpeza do canal.

Segmento de canal 2216: Concluída a limpeza do canal.

S.A Paulista/FBS (Remanescentes 10, 11, 12 e 13)

Pontos relevantes:

Mobilização: 15;

Equipamentos: 3;

Sumário Executivo

Contrato assinado no dia 26/08/2013, OS1 em 20/09/2013 (mobilização) (157 milhões), OS2 em 24/09/2013 (277 milhões) e OS3 em 30/10/2013 (264 milhões).

Frentes

Em mobilização

LICITAÇÕES

Eletromecânica

Obra	Licitação	Situação	Data de Conclusão
Subestação E0	nov/13 (Inexigibilidade)	EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2013, publicado no dia 04/11/2013	mai/14
Subestação E1			mai/14
Subestação E2			jun/14
Subestação E3			out/14
Subestação E4			out/14
Subestação E6			dez/14
Subestação E5	dez/13		dez/14
Linha de transmissão 230 kV entre as SEs E4-E6			nov/14
Linha de transmissão 69 kV entre as SEs E6-E5			dez/14
Seccionamento LT 230 kV 04F2 (Chesf)	nov/13	As linhas de transmissão a área técnica analisou. Falta encaminhar para comissão de licitação	mar/14
Lançamento cabo OPGW na LT 05V1, 500 kV (Chesf)			mar/14
Linha de Transmissão 230 kV entre as SEs E0-E1			mai/14
Linha de Transmissão entre as SEs E0-E2 230 kV			mai/14
Linha de Transmissão 230 kV entre as SEs E2-E3			set/14
Linha de Transmissão 230 kV entre as SEs E3-E4			set/14
Linha de Distribuição 13,8 kV entre as SEs E0 - E1			mai/14
Linha de Distribuição 13,8 kV entre as SEs E0 - E2			mai/14
Linha de Distribuição 13,8 kV entre as SEs E2 - E3	nov/13	Área técnica analisou. Falta encaminhar para comissão de licitação	set/14
Linha de Distribuição 13,8 kV entre as SEs E3 - E4			set/14
Linha de Distribuição 13,8 kV entre as SEs E5 - E6	dez/13		set/14
Sistema de Telecomunicações	nov/13	Previsão de finalização da análise pela área técnica em 15/11/2013	mar/14

Mobilização

QUADRO-SINTESE DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - EIXO LESTE				
Contrato	Frentes de Trabalho	Mobilização de Pessoal*		
		Out	Nov	Dez
META 1L/2L	MONTAGEM EBV-1	254	476	693
	AQUEDUTO BR-316			
	ESTRUTURA DE CONTROLE AREIAS			

	ESTRUTURA DE CONTROLE DE BRAÚNAS			
	CANAIS 2206 E 2208			
	EBV-2			
LOTE 10	CANAIS	217	331	341
	BARRAGEM CACIMBA NOVA			
	BARRAGEM BAGRES			
META 2L/3L	Não Informado		150	200

*final do mês

Meta 11/21 : Mão-de-obra 2081, equipamentos 321 e faturamento 43 milhões (Pico maio/14)

Meta 2L/3L: Mao-de-obra 1881, equipamentos 441 e faturamento 42 milhões (Pico outubro/14)

QUADRO-SINTESE DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - EIXO NORTE							
Contrato	Frentes de Trabalho	Mobilização de Pessoal			Mobilização de Equipamentos		
		out	nov	dez	out	nov	dez
Lote 1 CCASF	Ponte na BR-428	583	650	650	160	150	150
	Canal WBS - 1205						
	Aqueduto Logradouro						
	Aqueduto Saco da Serra						
	Aqueduto Mari						
	Aqueduto Terra Nova						
Lote 2 CCASF	Canal WBS - 1212	617	610	590	194	174	140
	Barragem Serra do Livramento						
	Aqueduto Salgueiro						
	Barragem Mangueira						
	Canal WBS-1216						
Meta 1N Mendes Junior	Estrutura de Controle Tucutú	1214	1464	1616	286	364	430
	Canal WBS- 1217						
	Canal WBS-1219						
	Bueiros						
	Pontes e Passarelas						

Sumário Executivo

	Barragem Terra Nova						
	Dique Negreiros						
	Barragem Negreiros						
	Barragem Milagres						
	Galeria Penaforte						
	Túnel Milagres						
Lote 8 Mendes Junior	EBI-1	969	1005	1046	155	160	172
	EBI-2						
	EBI-3						
Lote 5 Serveng	Barragem Jati	958	1200	1200	346	390	390
	Canal Jati-Atalho						
	Barragem Porcos						
	Barragem Canabrava						
	Canal Canabrava-Cipó						
Meta 3N Queiroz Galvão	Construção e reforma de canteiros	200	354	450	148	234	404
	Barragem Boa Vista						
	Barragem Morros						
	Barragem Caiçara						
Lote 14 Construcap	Túnel Cuncas I	633	530	530	233	210	210
	Túnel Cuncas II						
	Quantidades totais	5174	5813	6082	1522	1682	1896

Avanço Físico (WBS)

EIXO LESTE

