

# Sumário Executivo



Tomada d'água de Jati

Caixa de Válvulas e Bacia de dissipação, em execução estrutura de concreto.



Reservatório Porcos, vista geral da barragem, margem direita.

Projeto de  
Integração do  
Rio São Francisco

SETEMBRO/2016

# SUMÁRIO EXECUTIVO

SETEMBRO/2016

## PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

O Projeto de Integração do Rio São Francisco vai garantir a segurança hídrica a 12 milhões de habitantes, em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além gerar emprego e promover a inclusão social.

O empreendimento tem extensão de 477 km organizados em dois Eixos de transferência de água - Norte e Leste. A obra engloba a construção de 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 4 túneis, 13 aquedutos, 9 subestações de 230 kV, e 270 km de linhas transmissão em alta tensão.

Ao mesmo tempo em que busca garantir o abastecimento por longo prazo de grandes centros urbanos da região, como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, João Pessoa e de centenas de pequenas e médias cidades do Semiárido, o projeto beneficia áreas do interior do Nordeste com potencial econômico, importantes no âmbito de uma política de desconcentração do desenvolvimento nacional.



Construção da Tomada de água do Reservatório Jatí

## AVANÇO DAS OBRAS

O empreendimento, atualmente, apresenta **90,5% de execução física**, sendo que o Eixo Norte conta com 91,0% e o Eixo Leste com 89,6% de execução. Os percentuais de avanço correspondem à evolução dos projetos executivos, das obras civis, das instalações eletromecânicas e ações ambientais.

A evolução física do empreendimento também pode ser verificada no gráfico a seguir.



## METAS DE EXECUÇÃO

O Ministério da Integração Nacional estabeleceu, em 2011, um novo modelo de licitação, contratação e acompanhamento dos trechos de obras definindo 3 Metas em cada Eixo, a saber:

### EIXO NORTE:

**META 1N** (140 km): Vai da captação do rio São Francisco, no município de Cabrobó (PE), até o reservatório de Jati, em Jati (CE).

**META 2N** (39 km): Começa no reservatório Jati, no município de Jati (CE), e termina no reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE).

**META 3N** (81 km): Estende-se do reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávidos, em Cajazeiras (PB).


### EIXO LESTE:

**META 1L** - Meta Piloto (16 km): Compreende a captação no reservatório de Itaparica até o reservatório Areias, ambos em Floresta (PE).

**META 2L** (167 km): Inicia na saída do reservatório Areias, em Floresta (PE), e segue até o reservatório Barro Branco, em Sertânia (PE).



**META 3L** (34 km): Este trecho está situado entre o reservatório Barro Branco, em Sertânia (PE), e o reservatório Poções, em Monteiro (PB).

Mapa de Localização do PISF e Eixos Assossiados

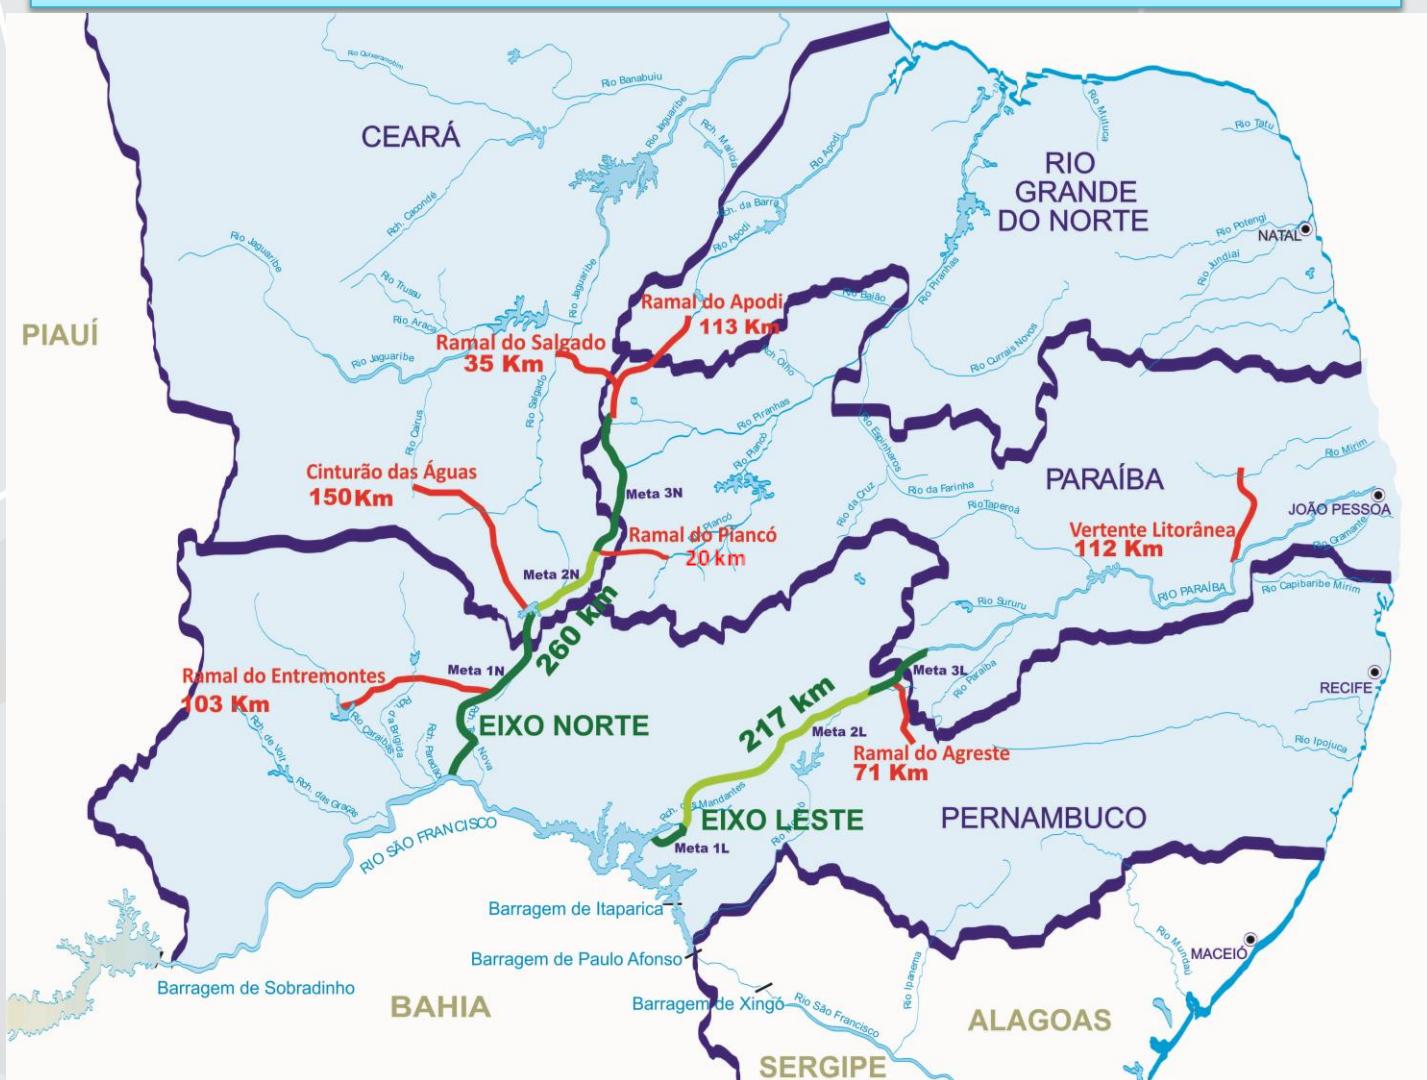

## EXECUÇÃO FINANCEIRA




O Projeto de Integração do Rio São Francisco está orçado em R\$ 10,7 bilhões. São apresentados a seguir os valores pagos, considerando investimentos em obras civis, equipamentos eletromecânicos, supervisão, gerenciamento, projeto e ações ambientais.

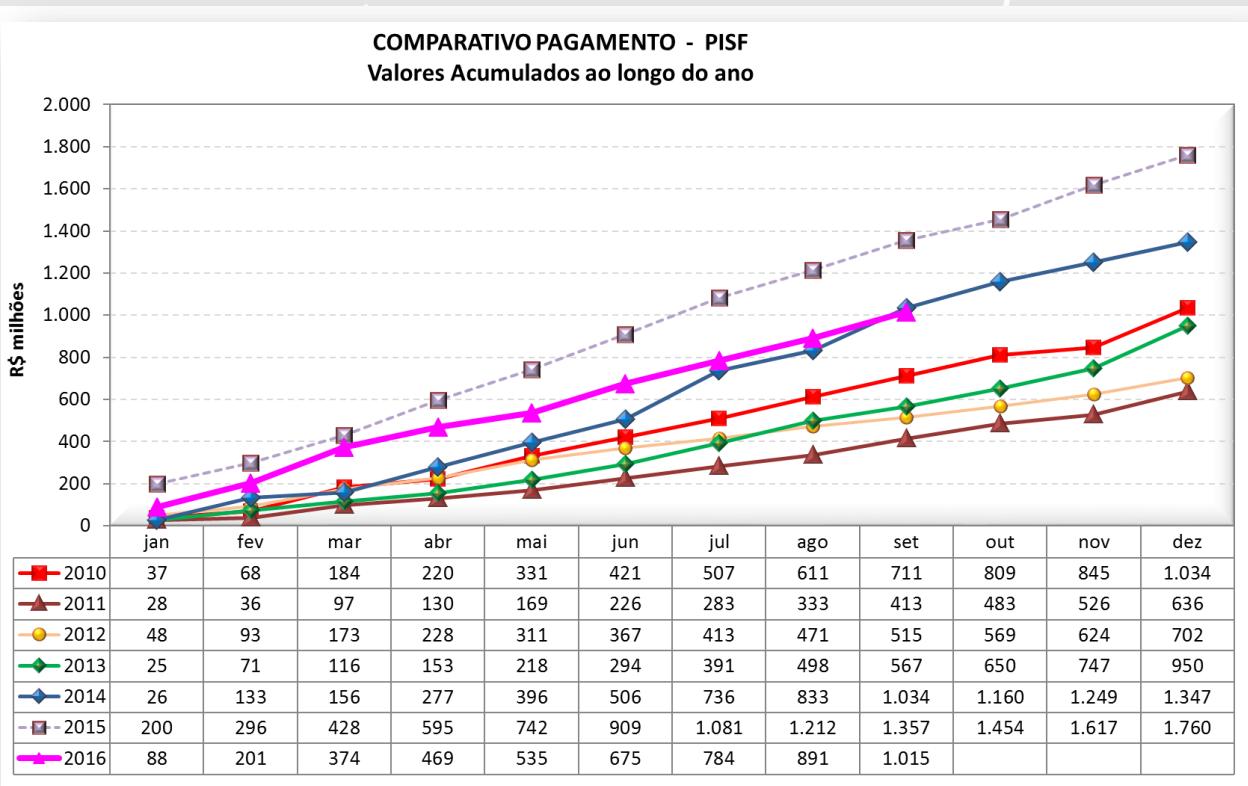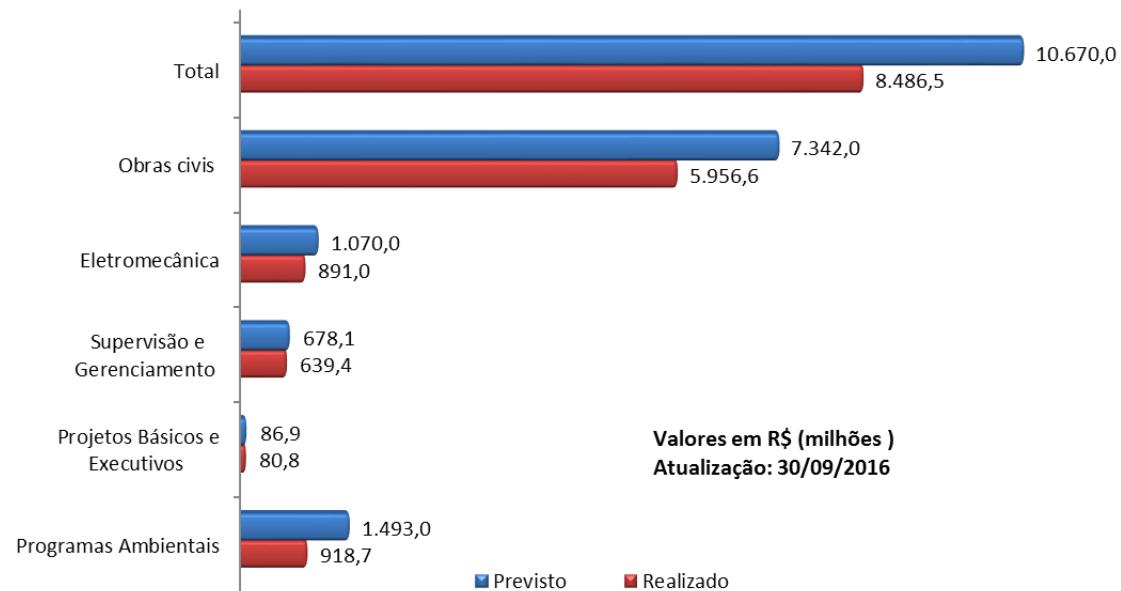

## MOBILIZAÇÃO

O Projeto de Integração do Rio São Francisco registra **5.869 trabalhadores** contratados para atuarem nas obras. Esse número retrata o progresso do empreendimento, que está com a totalidade das obras contratadas e em andamento.

Vale ressaltar, ainda, que alguns trechos de obras estão em funcionamento 24 horas por dia para garantir a celeridade do Projeto. Em relação à mobilização de equipamentos, o Ministério registrou **2.719 equipamentos** em operação nas frentes de serviço.

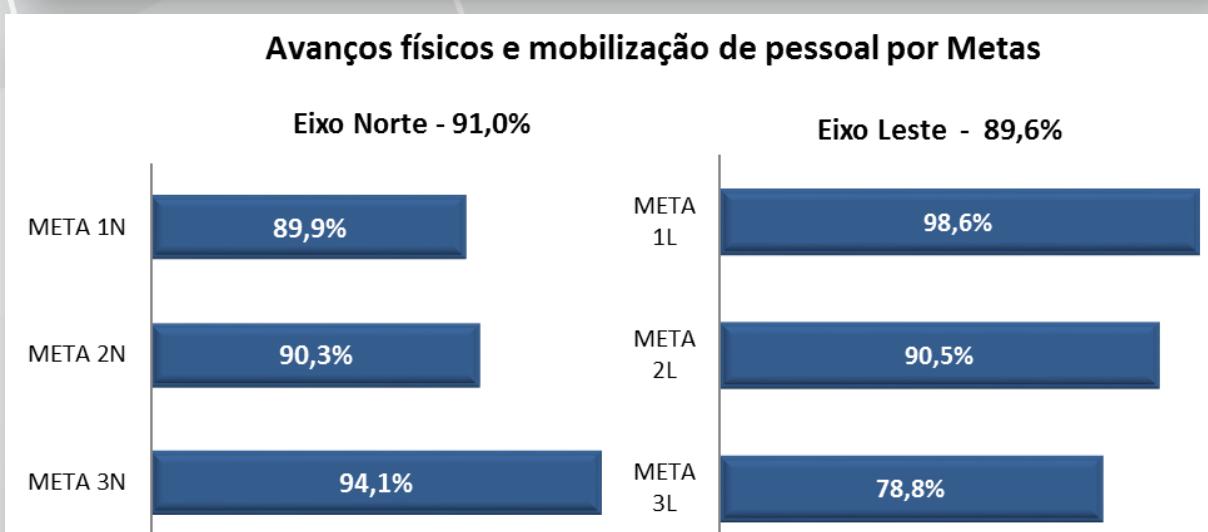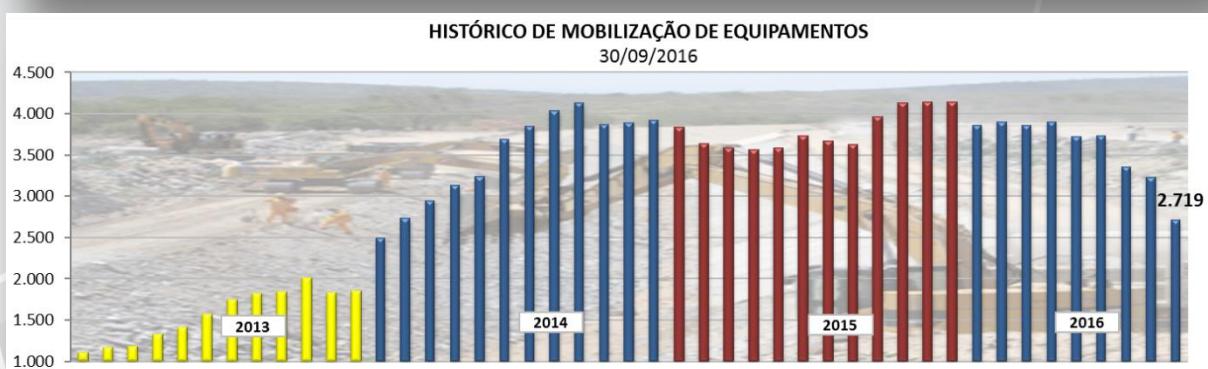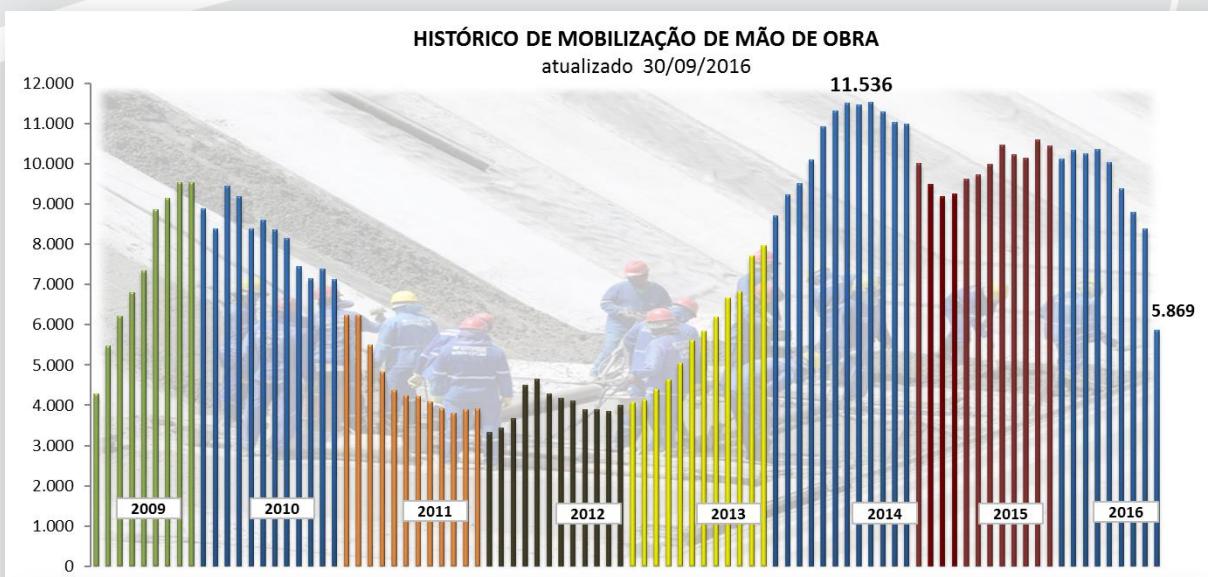

# EIXO NORTE: META 1N

## Execução das Obras Civis:

CONTRATOS	Mobilização	Valor do Contrato e Valor Medido*	Execução Física de Obras Civis
<b>Contrato nº 45/2007 (Lote 1)</b> Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng	50 trabalhadores 48 equipamentos	R\$ 296,6 R\$ 288,2 (97,2%)	96,5%
<b>Contrato nº 25/2008 (Lote 2)</b> Consórcio CCASF – Carioca/SA Paulista/Serveng	8 trabalhadores 13 equipamentos	R\$ 275,9 R\$ 253,5 (99,7%)	96,5%
<b>Contrato nº 25/2011 (Lote 8)</b> Mendes Júnior Trading e Eng. S.A.	0 trabalhadores 0 equipamentos	R\$ 329,7 R\$ 282,1(85,6%)	98,8%
<b>Contrato nº 14/2013 - Obras remanescentes da Meta 1N -</b> Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.	0 trabalhadores 0 equipamentos	R\$ 938,4 R\$ 608,3 (63,0%)	79,9%

\*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira.

## Destaques:

**Iniciado em 06.08.2015 o bombeamento na EBI-1, fornecendo água para o Reservatório Tucutú.**

**Emboque:** Concluído abertura do septo.

**Estação de bombeamento EBI-1:** Concluído, em andamento pré-operação.

**Reservatório Tucutú:** obra concluída e reservatório cheio.

**Canais com concretagem concluída entre:**

- EBI-1 e Res. Tucutu - 6,6km
- Res.Tucutu e Aqueduto Logradouro- 5,2km
- Aquedutos Saco da Serra e Mari - 17,4 km
- Aquedutos Mari e Terra Nova - 2,1 km
- Terra Nova e EBI-2 – 3,3 km

**Aquedutos Logradouro, Saco da Serra, Mari, Terra Nova:** Concluídos.

**Reservatório Terra Nova:** Concluído.

**Estação de bombeamento EBI-2:** As obras estruturais do edifício da EBI-2, bem como a montagem dos painéis elétricos, tubulações, bomba, motores e demais equipamentos foram concluídos em 14.04.2016, dando início a etapa de testes.

**Segmento de canal entre Res. Mangueira e EBI-3:** em fase de conclusão limpeza e tratamento de taludes

**Canais com concretagem concluída entre:**

- EBI-2 e Res. Mangueira- 18,0km
- EBI-3 e Galeria Transnordestina- 16,9km

**Reservatório Mangueira:** Concluído.

**Reservatório Serra do Livramento:** Concluído.

**Aqueduto Salgueiro:** concluído.



Estação de bombeamento EBI-1 em funcionamento.



Aqueduto Mari



Estação de bombeamento EBI-2

# EIXO NORTE: META 1N

## Destaques:

**Estação de bombeamento EBI-3:** Estavam em execução os serviços das obras prediais (alvenaria, cobertura, tubulações hidrossanitárias, esquadrias, etc.) e no forebay de jusante (muros de contenção). Obra paralisada.

**Reservatório Negreiros:** Concluída concretagem do perfil Creager da barragem e em fase final concreto na ombreira direita. No Dique, o aterro estava em execução. Obra paralisada.

**Segmento de Canal entre a BR-116 e o reservatório Milagres:** Concluída concretagem de placas em 18,1 km dos 20,4km. Estavam em execução escavação e revestimento de canal. Obra paralisada.


**Reservatório Milagres:** Concluído o aterro da barragem. Paralisada a concretagem do vertedouro e concluída concretagem da bacia de dissipação. Estava em execução, aterro no dique. Obra paralisada.

**Segmento de Canal entre o res. Milagres e o Túnel Milagres:** Escavações paralisadas.

**Túnel Milagres:** no desemboque e emboque serviços de escavação subterrânea estão paralisados.



Execução da Estação de Bombeamento EBI-3

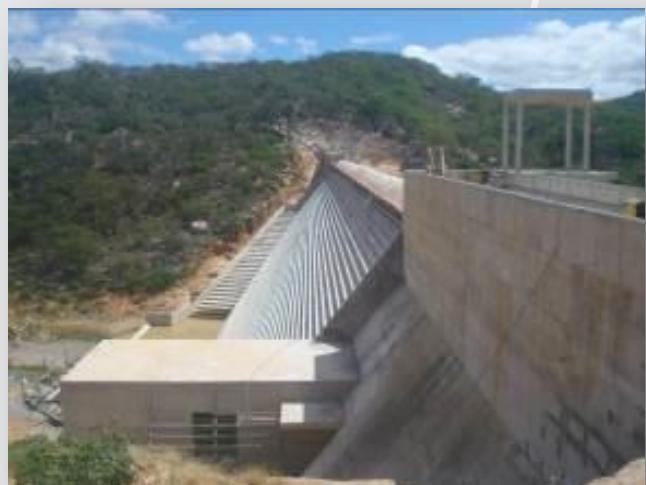

Barragem Negreiros



Vertedouro do Reservatório Milagres



Execução de canal entre Res. Negreiros e Milagres.



Emboque do túnel Milagres.



Execução de canal entre Galeria Penaforte e Res. Jati.

# EIXO NORTE: META 2N

## Execução das Obras Civis:

CONTRATOS	Mobilização	Valor do contrato e Valor medido*	Execução física de obras civis
<b>CONTRATO Nº 45/2012</b> CONSTRUTORA SERVENG CIVILSAN S.A.	1.910 trabalhadores 786 equipamentos	R\$ 923,7 R\$ 634,3 (68,7%)	90,6%

\*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira.

### Destaques:

**Reservatório Jati:** Prossegue a execução do aterro do núcleo e espaldares no dique. Em andamento enrocamento no canal de fuga e concretagem na bacia de dissipaçāo.



Reservatório Jati – vista do dique e maciço

**Ponte CE-153:** Concluída a concretagem dos guarda rodas do vão esquerdo e muros alas.



Ponte CE-153.

**Canal entre Jati e Atalho:** Em execução revestimento com enrocamento da área dos córregos Sabonete e Jardim.

**Reservatório Atalho:** Em andamento o alteamento da barragem e escavações do túnel da tomada de água.

**Reservatório Porcos:** Vertedouro concluído. Em andamento o aterro, transição e enrocamento.



Escavação do túnel da tomada de água do Res. Atalho

**Reservatório Cana Brava:** Continua em execução aterro.

**Reservatório Cipó:** Em execução o aterro.



Estrutura de controle Res. Porcos.



Reservatório Cipó



Reservatório Porcos



Reservatório Cana Brava

# EIXO NORTE: META 3N

## Execução das Obras Civis:

CONTRATOS	Mobilização	Valor do contrato e Valor medido*	Execução física de obras civis
<b>Contrato nº 35/2008 (Lote 14)</b> Construcap / Ferreira Guedes / Toniolo Busnello	0 trabalhadores 0 equipamentos	R\$ 390,7 R\$ 386,5 (97,5 %)	99,9%
<b>Contrato nº75/2013 – Obras remanescentes</b> Construtora Queiroz Galvão S.A.	588 trabalhadores 233 equipamentos	R\$ 612,3 R\$ 525,3 (85,8%)	92,4%

\*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira.

### Destaques:

#### Atividades do contrato do Lote 14 concluídas.

**Aquedutos:** Boi – Concluída concretagem das paredes do vão central. Pinga – Em andamento tratamento das juntas de dilatação. Catingueira – concluído proteção das bermas.

**Bueiro Palha:** Concluído.

**Galeria Sobradinho:** Concluída.

**Túnel Cuncas I:** Concluído, restando executar o contrapiso. Em execução transição entre canal e túnel.

**Segmentos de Canal entre Aq. Pinga e Túnel Cuncas I:** mais de 94% dos trechos concluídos.

**Segmento de Canal entre Res.Morros e Res. Boa Vista:** Em execução concretagem da canal e escavações no trecho final.

**Reservatório Boa Vista:** Concluído.

**Segmento de canal entre Res. Boa Vista e Túnel Cuncas II:** Concluído. Em execução estrutura de controle na transição entre canal e túnel.

**Túnel Cuncas II:** Concluído.

**Reservatório Caiçara:** Concluído.



Aqueduto Boi



Aqueduto Pinga



30.08.2016 08:03

Reservatório Morros



30.08.2016 18:45

Reservatório Boa Vista



Túnel Cuncas II



30.08.2016 07:57

Segmento de canal entre Res. Morros e Boa Vista



31/08/2016 14:31

Estrutura de Controle Reservatório Caiçara

# EIXO LESTE: META 1L

## Execução das Obras Civis:

CONTRATOS	Mobilização	Valor do contrato e Valor medido*	Execução física de obras civis
Contrato nº 47/2013 (execução das obras da META 1L e parte da META 2L) - S.A. Paulista e Somague	611 trabalhadores 301 equipamentos	R\$ 546,8 R\$ 387,3 (70,1%)	1L 99,4% 2L 90,4%

\*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira.

### Destaques:

**Em andamento o comissionamento, com enchimento das estruturas da Meta 1L.**

**Estação de Bombeamento EBV-1:** Prossegue paisagismo no entorno da EBV-1 e testes de eficiência dos conjuntos motobomba.

**Canal entre Aqueduto da BR-316 e Res. Areias:** instalação de canaletas de drenagem.

**Reservatório Areias:** Concluído o enchimento, propiciando passagem da água até EBV-2 por meio das comportas da estrutura de controle.

**Subestações E0 e E1:** concluídas e em operação.



Vista interna da EBV-1.



Estrutura de Controle do Reservatório Areias.



Canal entre EBV-1 e Res. Areias



Estação de bombeamento EBV-2.



Reservatório Braúnas.

# EIXO LESTE: META 2L

## Execução das Obras Civis:

CONTRATOS	Mobilização	Valor do contrato e Valor medido*	Execução física de obras civis
<b>Contrato nº 47/2013</b> (execução das obras da META 1L e parte da META 2L) - S.A. Paulista e Somague	611 trabalhadores 301 equipamentos	R\$ 546,8 R\$ 387,3 (70,8%)	1L 99,4% 2L 90,4%
<b>Contrato nº 58/2013</b> (execução das obras de parte da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS	1.482 trabalhadores 896 equipamentos	R\$ 826,1 R\$ 463,4 (56,1%)	2L 91,5% 3L 76,8%

\*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira.

### Destaques:

#### Canal entre Res. Braúna e Res. Mandantes:

Concluído concretagem do canal. Em andamento execução de muretas e limpeza do canal.

**Reservatório Mandantes:** Concluído. Em andamento cobertura da casa de comando.

**Estação de bombeamento EBV-3:** Concretagem dos pilares e lajes do edifício e no forebay de jusante e caixa de deságue .

**Reservatório Salgueiro:** Vertedouro concluído. Em andamento finalização do aterro do maciço.

**Canal entre Res. Salgueiro e Muquém:** Em execução bueiros ao longo do segmento e terraplanagem para conformação de canal.

**Reservatório Muquém:** Concluído.

**Aqueduto Jacaré:** Conclusão de vigas e lajes em 60% da estrutura e concretado 50% das paredes.

**Reservatório Cacimba Nova:** concluído.



Estação de Bombeamento EBV-3



Reservatório Salgueiro



Segmento de Canal entre Reservatório Braúna e Mandantes



Reservatório Mandantes.



Segmento de canal entre reservatório Mandantes e EBV-3



Aqueduto Jacaré.

# EIXO LESTE: META 2L

## Destaques:

**Estação de bombeamento EBV-4:** Concluída a laje do 1º piso na cota 456,30 e início da execução dos pilares.

**Aqueduto Caetitu:** pilares concluídos. Concluído o encabeçamento dos aterros.

**Aquedutos Branco e Barreiros:** concluídos.

**Reservatório Moxotó:** Vertedouro concluído. Em fase acabamento enrocamento do maciço.

**Estação de bombeamento EBV-5:** Em fase de montagem as formas deslizantes e concretagem parcial das paredes.

**Reservatório Barreiros:** Continua em andamento as atividades de concretagem no vertedouro e aterro do barramento.

**Estação de bombeamento EBV-6:** em andamento as atividades de limpeza das ferragens. Em andamento as atividades de terraplenagem no forebay de jusante.

**Reservatório Campos:** Vertedouro concluído. Andamento compactação do aterro.



Estação de Bombeamento EBV-4.



Reservatório Moxotó.



Estação de bombeamento EBV-5



Reservatório Barreiros



Forebay de Jusante - EBV-6



Reservatório Campos.

# EIXO LESTE: META 3L

## Execução das Obras Civis:

CONTRATOS	Mobilização	Valor do contrato e Valor medido*	Execução física de obras civis
Contrato nº 58/2013 (execução das obras de parte da META 2L e da Meta 3L) - S.A Paulista/FBS	1.482 trabalhadores 896 equipamentos	R\$ 826,1 R\$ 463,4(56,1%)	2L 91,5% 3L 76,8%

\*Valores em milhões. Valor Medido sem reajuste e percentual de execução financeira.

### Destaques:

**Reservatório Barro Branco:** Concluído. Execução casa de comando e aterro de transição entre a via e a ponte sobre vertedouro.



Reservatório Barro Branco

**Segmento de canal entre Res. Barro Branco e Túnel:** Em andamento o enrocamento dos taludes e as escavações.



Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti

**Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti:** Continuam as escavações e revestimento do túnel, tendo sido concluído 981,5 m no emboque e 1.071,90 m no desemboque, totalizando 2,05km do total de 3km.

**Segmento de canal após Túnel Giancarlo:** Em andamento as escavações em pontos variados do canal, enrocamento e execução do concreto poroso.

**Adutora Monteiro:** escavações em pontos variados. Na estrutura de deságue foram iniciados os serviços de concretagem.




Segmento de Canal entre Túnel Giancarlo e Galeria Monteiro



Túnel Eng. Giancarlo Lins Cavalcanti



Galeria Monteiro

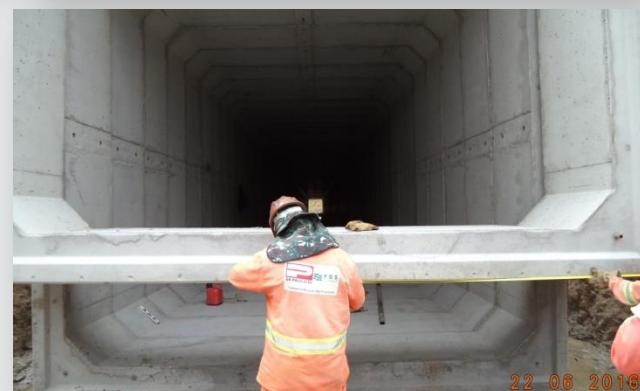

Adutora Monteiro.

## PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

O Projeto Básico Ambiental (PBA), elaborado à partir das recomendações propostas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), tem como objetivo propor medidas mitigadoras, compensatórias, de monitoramento e controle ambiental, frente aos impactos inerentes à execução do PISF. O PBA contempla 38 Planos e/ou Programas Ambientais, executados com base nas diretrizes aprovadas pelo IBAMA e nas condicionantes da Licença de Instalação (LI) nº 925/2013.

As ações executadas no âmbito de cada um dos 38 Programas Ambientais são semestralmente avaliadas pelo órgão licenciador, de forma a promover melhorias nos resultados e nas condições ambientais das áreas de influência do empreendimento.

O PISF destina mais de R\$ 1,4 bilhão do seu orçamento aos programas ambientais. Este valor representa cerca de 14% dos investimentos do projeto.

Os Programas Ambientais, atualmente, apresentam um avanço de **84,60%** de execução física, nos Eixos Norte e Leste. Os percentuais de avanço correspondem à evolução dos 38 programas.



## PROJETO BÁSICO AMBIENTAL



Oficina de Mobilização e Organização Social na VPR  
Baixo dos Grandes, Cabrobó – PE.

### Programa de Educação Ambiental



Vista interna do Posto de Saúde concluído,  
aldeia Caraíbas, etnia Pipipá.



Posto de Saúde concluído, aldeia Caraíbas,  
etnia Pipipá, município de Floresta – PE.

### Apoio aos Povos Indígenas



Colaborador executando atividade em oficina de solda do canteiro central de obras, utilizado EPI's adequados para a atividade.




Coletores seletivos de resíduos sólidos disponíveis na área do canteiro de obras.

### Programa Ambiental de Construção


# EIXO NORTE

Execução Física PISF: 90,5%

Eixo norte: 91,0%

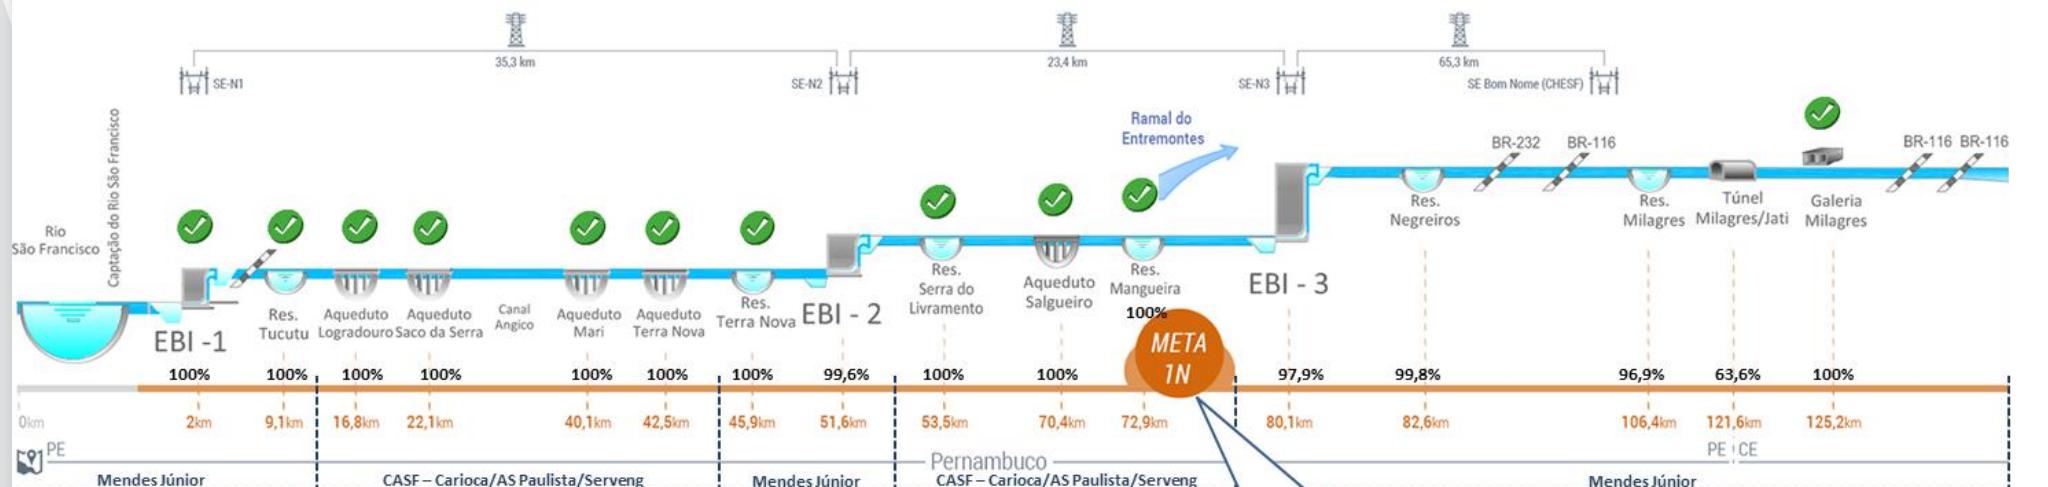

Execução Física: 89,9%

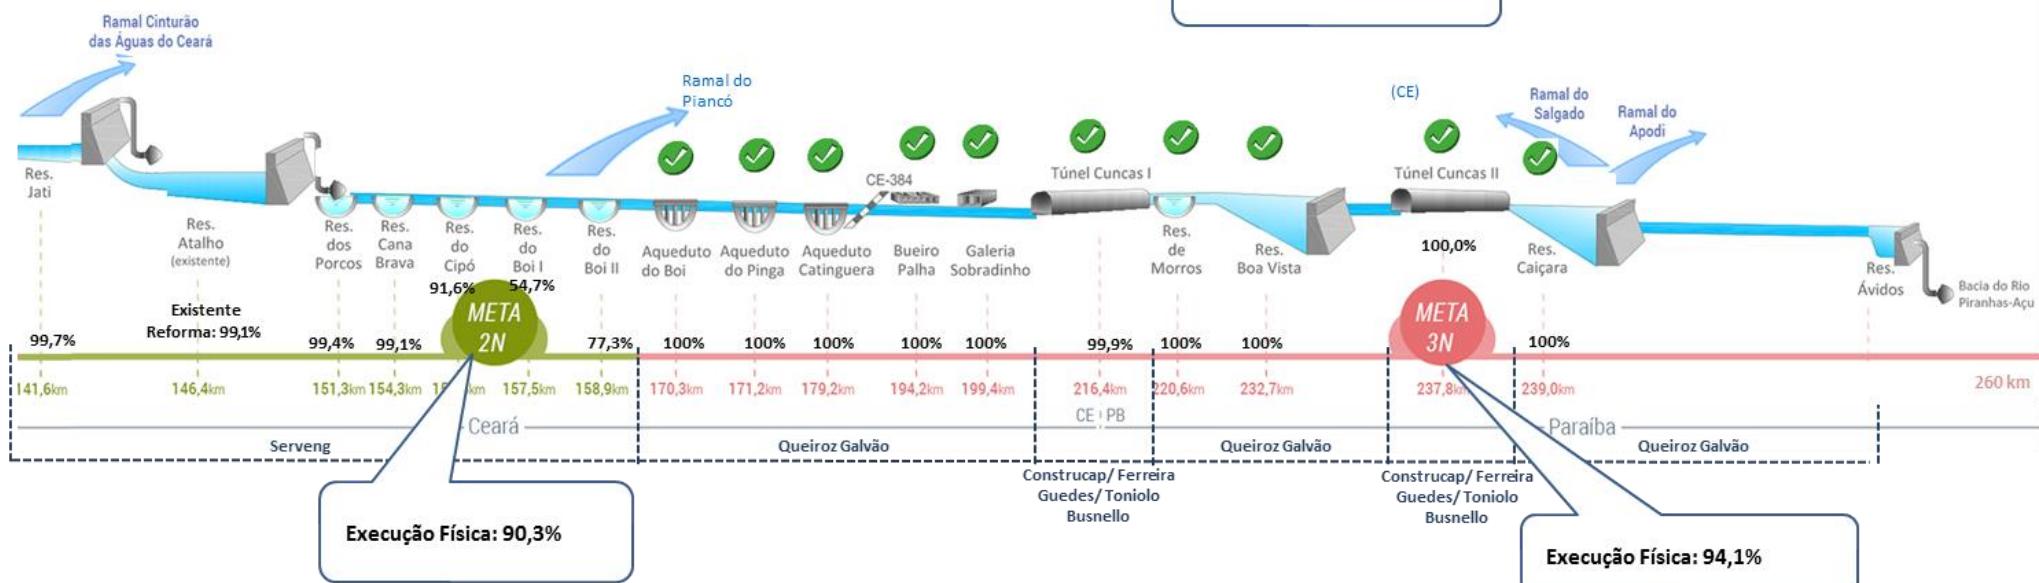


Obra Física Concluída

SUMÁRIO EXECUTIVO – PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO – SETEMBRO/2016

# EIXO LESTE

Execução Física PISF: 90,5%

Eixo Leste: 89,6%

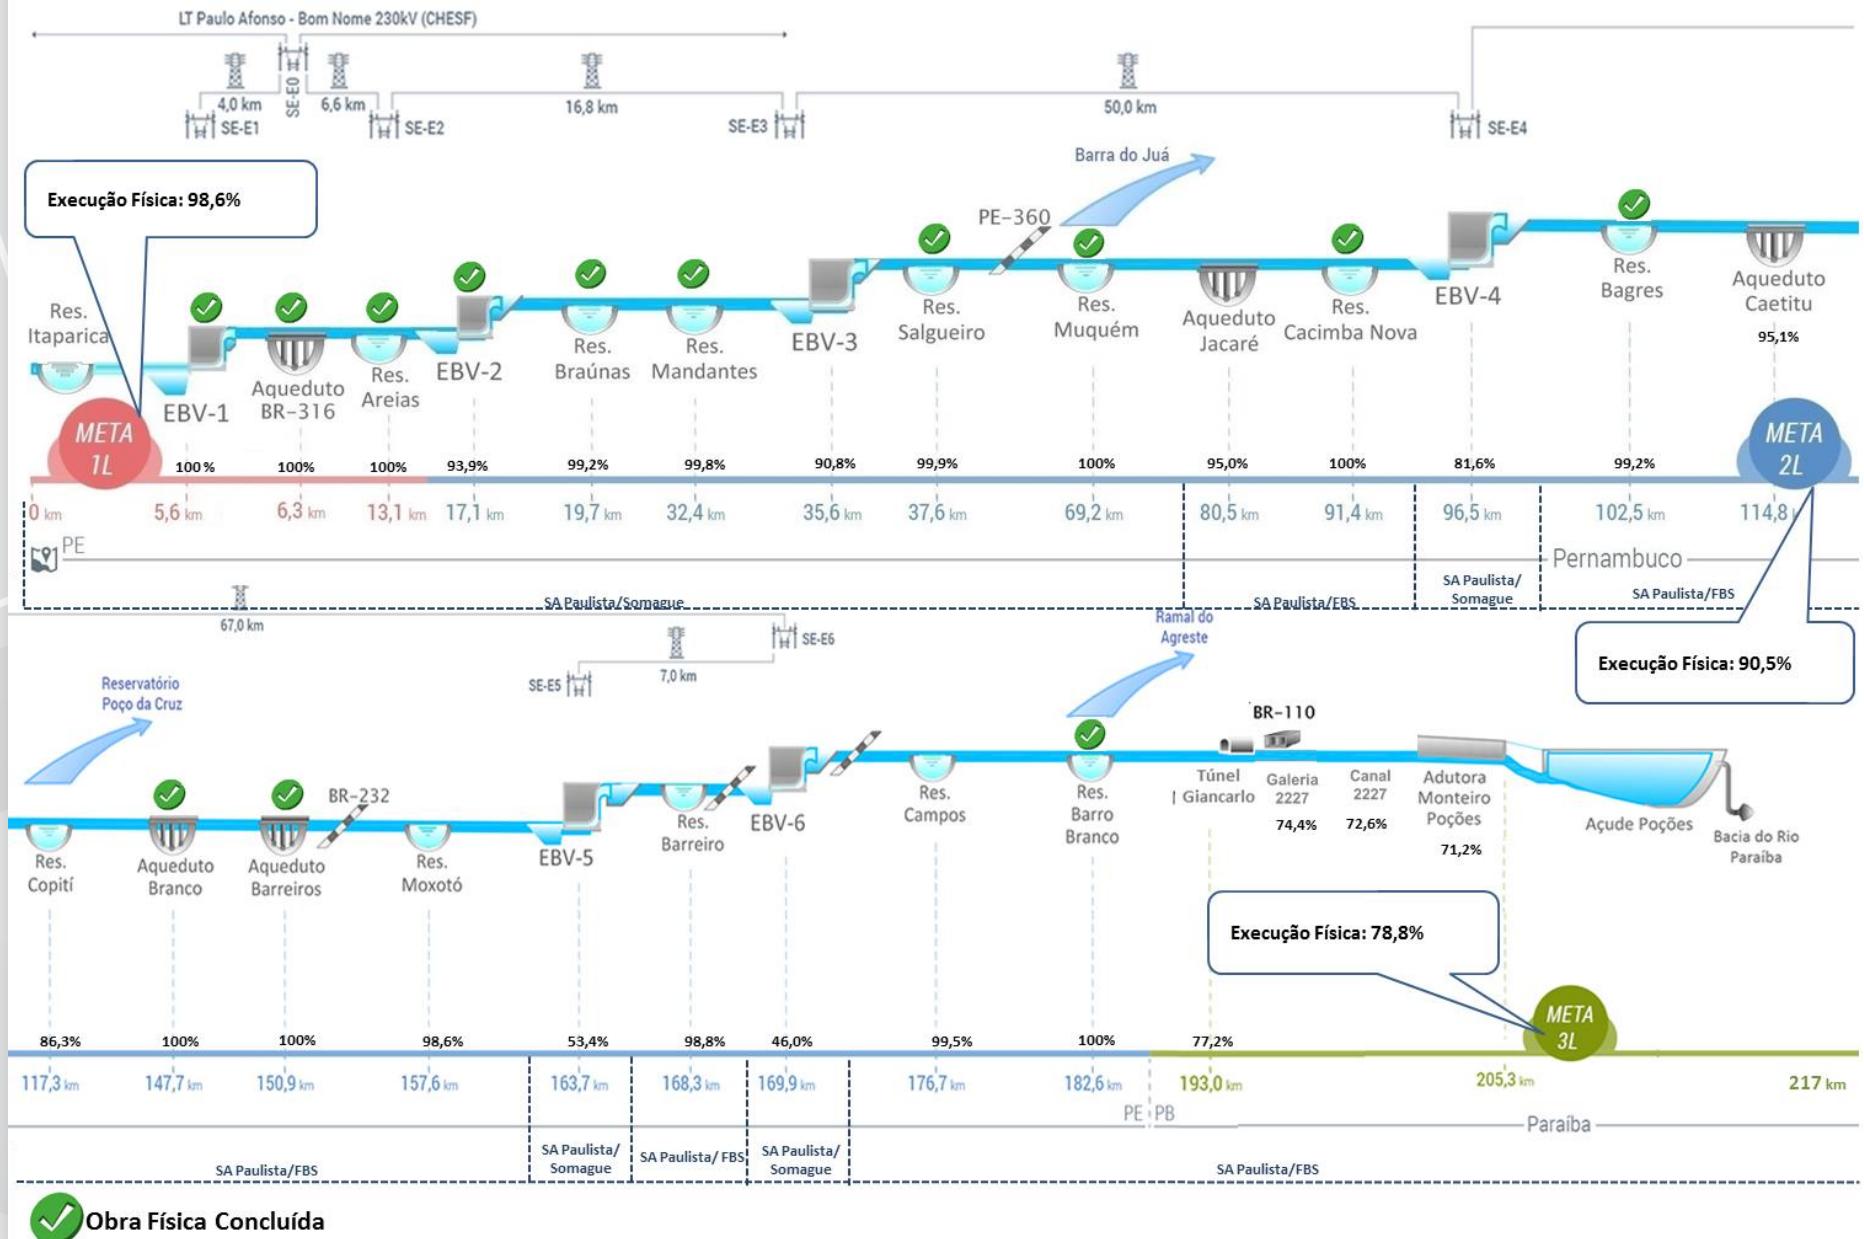

SUMÁRIO EXECUTIVO – PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO – SETEMBRO/2016
