

# SUMÁRIO EXECUTIVO



AGOSTO  
2021

Projeto  
**SãoFrancisco**  
Integração que transforma vidas

RAMAL DO  
AGRESTE  
PERNAMBUCANO

# PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

**Presidente da República**

*Jair Messias Bolsonaro*

## MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Ministro de Estado**

*Rogério Simonetti Marinho*

**Secretário Executivo**

*Daniel de Oliveira Duarte Ferreira*

### Secretaria de Nacional de Segurança Hídrica

**Secretário**

*Sergio Luiz Soares de Souza Costa*

**Chefe de Gabinete**

*Francisco Igor Aires Nunes*

**Coordenador Geral de Gestão Integrada**

*Cristiane Collet Battiston*

**Gerente de Projeto**

*Erik Parente Currlin Perpétuo*

**Diretor do Departamento de Projetos Estratégicos**

*Oscáalmi Porto Freitas*

**Coordenação Geral de Estudos e Projetos**

*Jimmu Azevedo Ikeda*

**Coordenação Geral de Programas Ambientais**

*Elianeiva de Queiroz Viana Odílio*

**Coordenação Geral de Contratos e Orçamentos**

*Claudir Afonso Costa*

**Coordenação Geral de Obras e Fiscalização em Recife**

*Tiago José de Barros Portela*

**Gerente de Projeto**

*Nartacha Gertrud Cunha de Melo*

**Elaboração Técnica**

*Cicero Emanuel Vieira de Meneses*

# RAMAL DO AGreste PERNAMBUCANO

O Ramal do Agreste Pernambucano é parte integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF, iniciando-se no Eixo Leste aduzindo água para a Adutora do Agreste Pernambucano. É localizado no norte do Estado de Pernambuco, próximo à fronteira com o Estado da Paraíba, abrangendo terrenos dos municípios de Sertânia e Arcoverde, nas sub-bacias hidrográficas dos rios Moxotó e Ipojuca. Possui cerca de 70,8 km de extensão, é composto, principalmente, por 43,4 km de canais, 16 km de túneis, 1,8 km de aquedutos, uma estação de bombeamento para elevar a água a uma altura de aproximadamente 220 metros de desnível, uma adutora de aproximadamente 7,2 km de extensão e duas barragens.

O sistema adutor possui capacidade para vazão de 8.000 litros por segundo e garantirá a oferta de água à mais de 2,2 milhões de pernambucanos em 68 municípios beneficiados do agreste, no qual destacamos Caruarú, Santa Cruz do Capibaribe, Belo Jardim e Arcoverde.

## AVANÇO DAS OBRAS

O empreendimento, atualmente, apresenta 92,89% de execução física. O percentual de avanço corresponde à evolução dos projetos executivos, das obras civis, das instalações eletromecânicas e ações ambientais.

A evolução física do empreendimento também pode ser verificada a seguir (Referência: 30/07/2021).

Execução Física **92,89%**  
do RAMAL DO AGRESTE



Segmento de Canal

# MARCOS DE ENTREGA

**A**s obras foram iniciadas em março de 2018, com previsão para conclusão em 41 meses, portanto em julho de 2021.

## RAMAL DO AGRESTE


**MARCO 1** - Conclusão da execução das obras e serviços compreendidos entre o Canal C1 (que tem seu início no Reservatório de Barro Branco do Eixo Leste do PISF) e o Reservatório de Negros (com entrega de água neste reservatório).

**MARCO 2** - Conclusão da execução das obras e serviços compreendidos entre o Reservatório de Góis e a Estação de Bombeamento EBVII-1 (inclusive).

**MARCO 3** - Conclusão da execução das obras e serviços compreendidos entre a Estação de Bombeamento EBVII-1 e o Reservatório de Ipojuca (com entrega de água neste reservatório).




# MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RAMAL DO AGreste

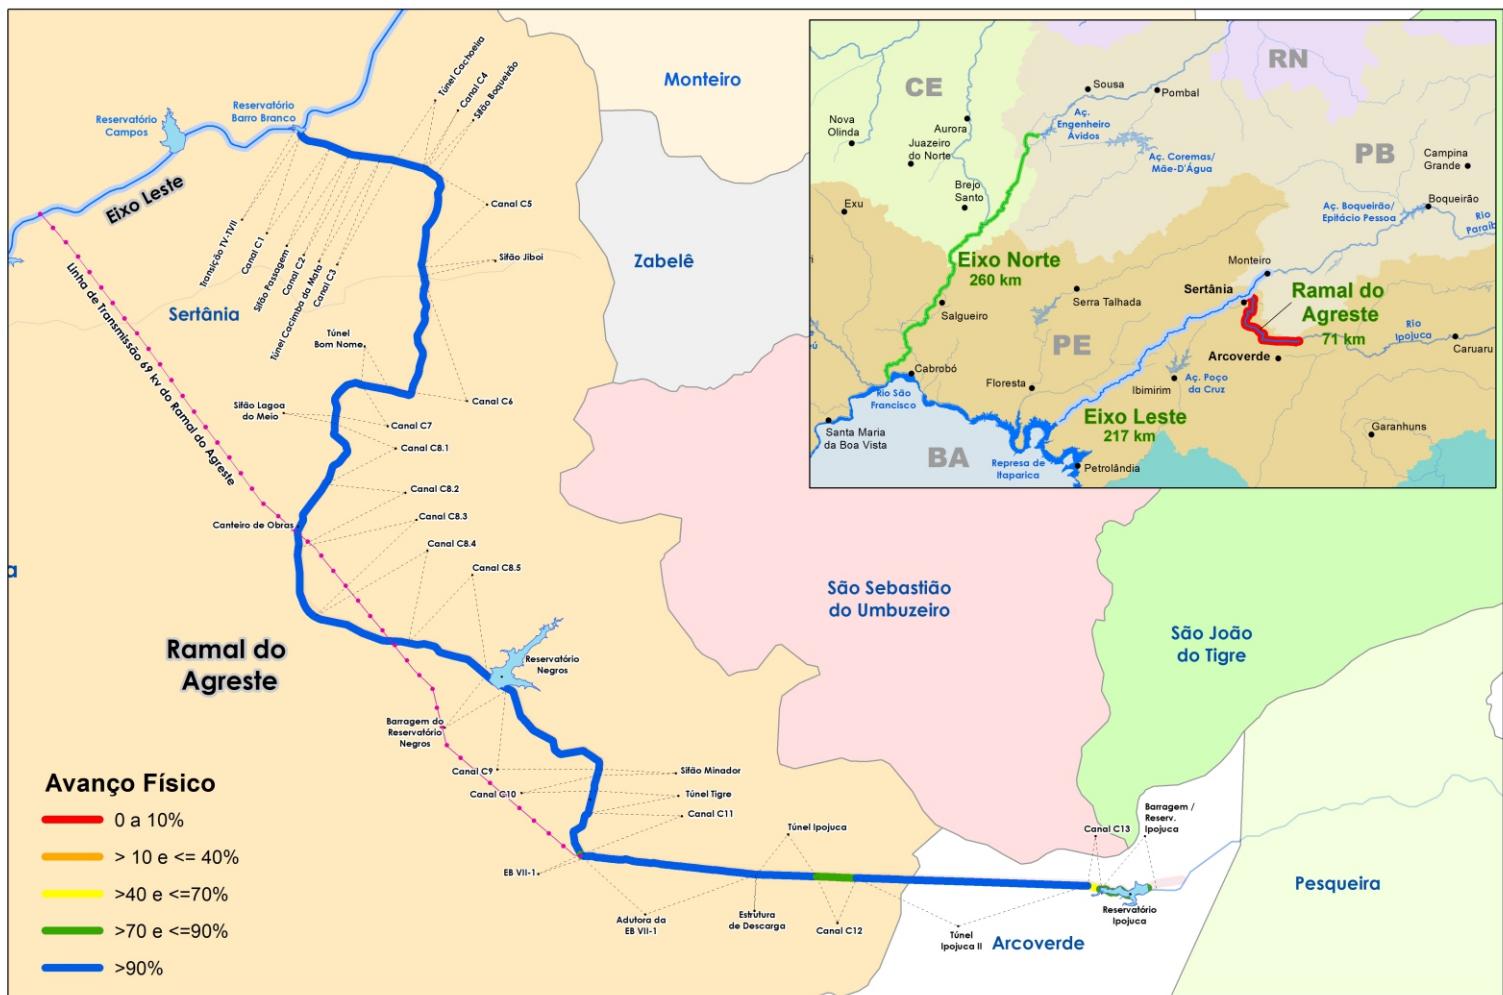

# EXECUÇÃO FINANCEIRA

O Ramal do Agreste está orçado no ano de 2015 em R\$ 1,13 bilhão com projeção financeira até 2021 alcançando R\$ 1,67 bilhão, devido a reajustes contratuais. São apresentados a seguir os valores pagos, considerando investimentos em obras civis, equipamentos eletromecânicos, supervisão, gerenciamento, projeto e ações ambientais.

Cronograma Financeiro - Ramal do Agreste

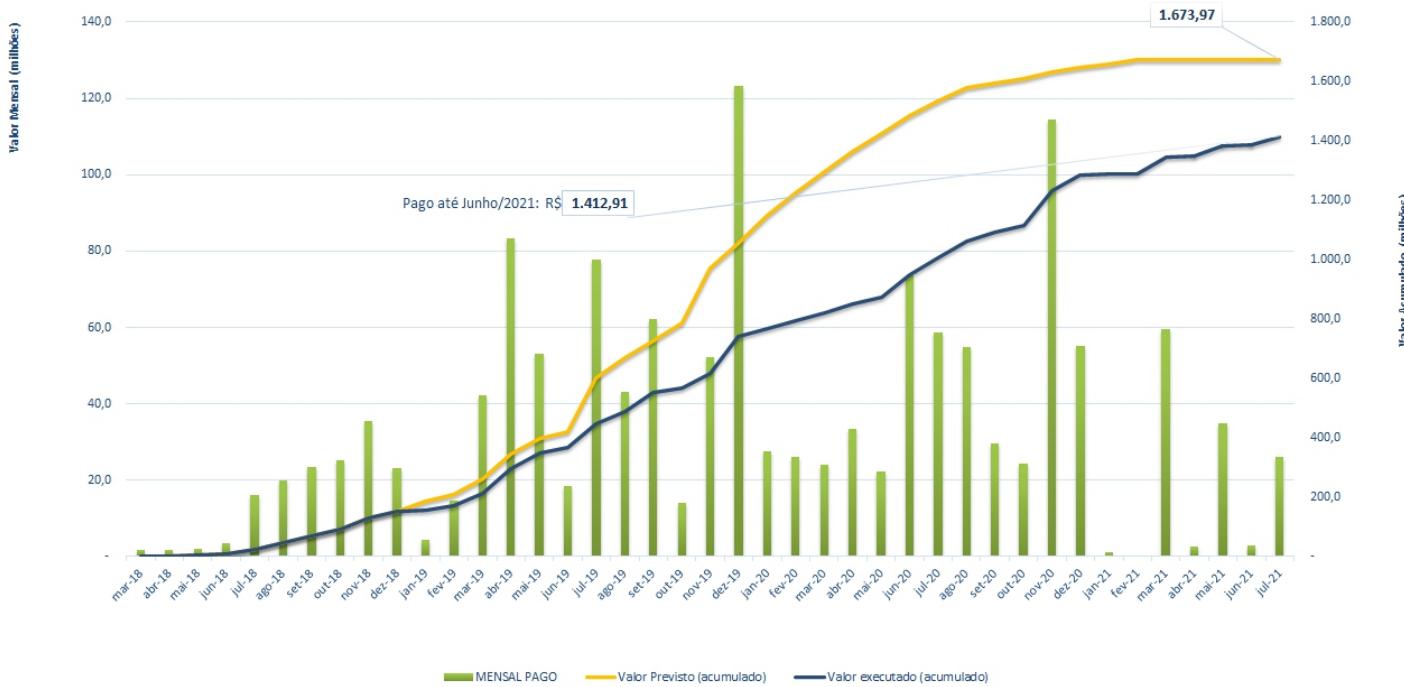


O valor previsto está sendo revisado em aditivo contratual em negociação.


# MOBILIZAÇÃO

O Ramal do Agreste registra 2.156 trabalhadores contratados para atuarem nas obras. Esse número retrata o progresso do empreendimento. Em relação à mobilização de equipamentos, o Ministério registrou 687 equipamentos em operação nas frentes de serviço.

## HISTÓRICO DE MÃO DE OBRA

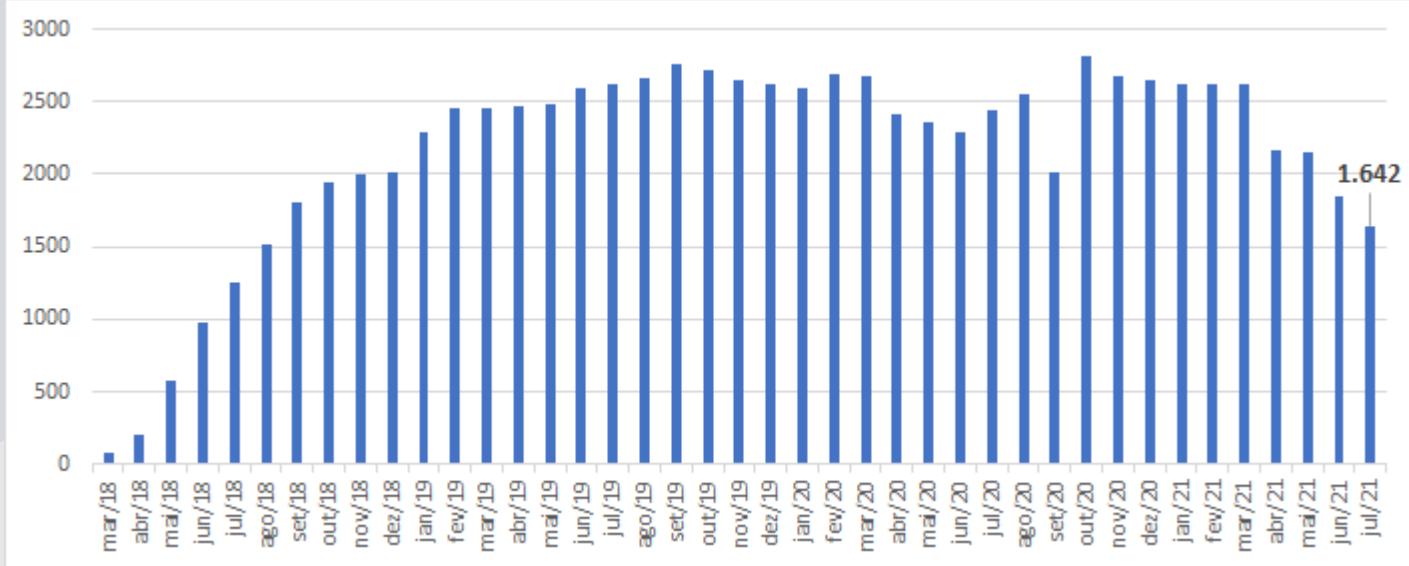

## HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS

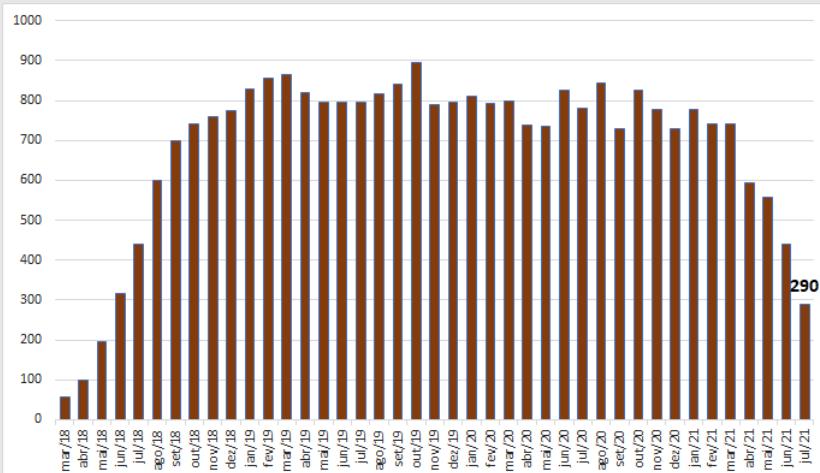

# ANDAMENTO DAS OBRAS

## DESTAQUES

Obras iniciadas em março de 2018 pelo Consórcio FG Ramal do Agreste.

**Segmento de canal C1:** concluído com 1.385 metros executados


**Segmento de canal C2:** concluído com 440 metros executados

**Túnel Cacimba da Mata:** com 776 metros, foi concluído em março de 2019.

**Túnel Cachoeira:** foram concluídas as escavações dos 1.204 metros totais

Executado teste com água até o Sifão Lagoa do Meio cerca de 18km desde a Estrutura de Controle de Barro Branco.

Túnel Ipojuca II

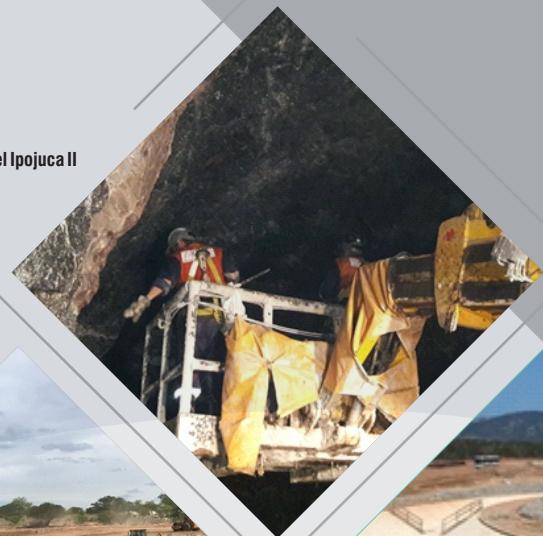

Execução de Bueiro

Execução de Drenagem em Seguimento de Canal

Janela do Túnel Ipojuca II



# ANDAMENTO DAS OBRAS

## DESTAQUES

Túnel Cachoeira -  
Perfuração com Jumbo



Túnel Cacimba da Mata -  
Concluído



Segmento de Canal Concluído



Escavação em Rocha

**Segmento de canal C5:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,7% de avanço físico.

**Segmento de canal C6:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,7% de avanço físico.

**Túnel Bom nome:** Concluído com 1.187 metros totais.

**Segmento de canal C7:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,9% de avanço físico.

**Segmento de canal C8.1:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,8% de avanço físico.

**Segmento de canal C8.2:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,3% de avanço físico.

**Segmento de canal C8.3:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,4% de avanço físico.

**Segmento de canal C8.4:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,6% de avanço físico.

**Segmento de canal C8.5:** Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 95,6% de avanço físico.



# ANDAMENTO DAS OBRAS

Captação no Reservatório  
Barro Branco do Eixo Leste



Emboque do Túnel  
Ipojuca



Fornecimento de Tubulação para  
Adutora



Segmento de Canal



## DESTAQUES

**Barragem Góis**: Execução das obras civis com avanço físico de 100% e fornecimento de equipamentos eletromecânicos com 94,1% de avanço.

**Segmento de canal C9**: Em execução serviços de terraplanagem, tendo alcançado 99,4% de avanço físico.

**Estação de Bombeamento EBVII**: Obras civis com avanço físico de 85,2% e aquisição de equipamentos eletromecânicos com 55,2% de avanço.


**Adutora**: Concluída.

**Túnel Ipojuca II**: Foram concluídas as escavações de 9.326 metros dos 9.488 metros totais, com avanço físico de 98,3%.

# RAMAL DO AGreste PERNAMBUCANO

## Acompanhamento Físico das Estruturas

**92,89%**

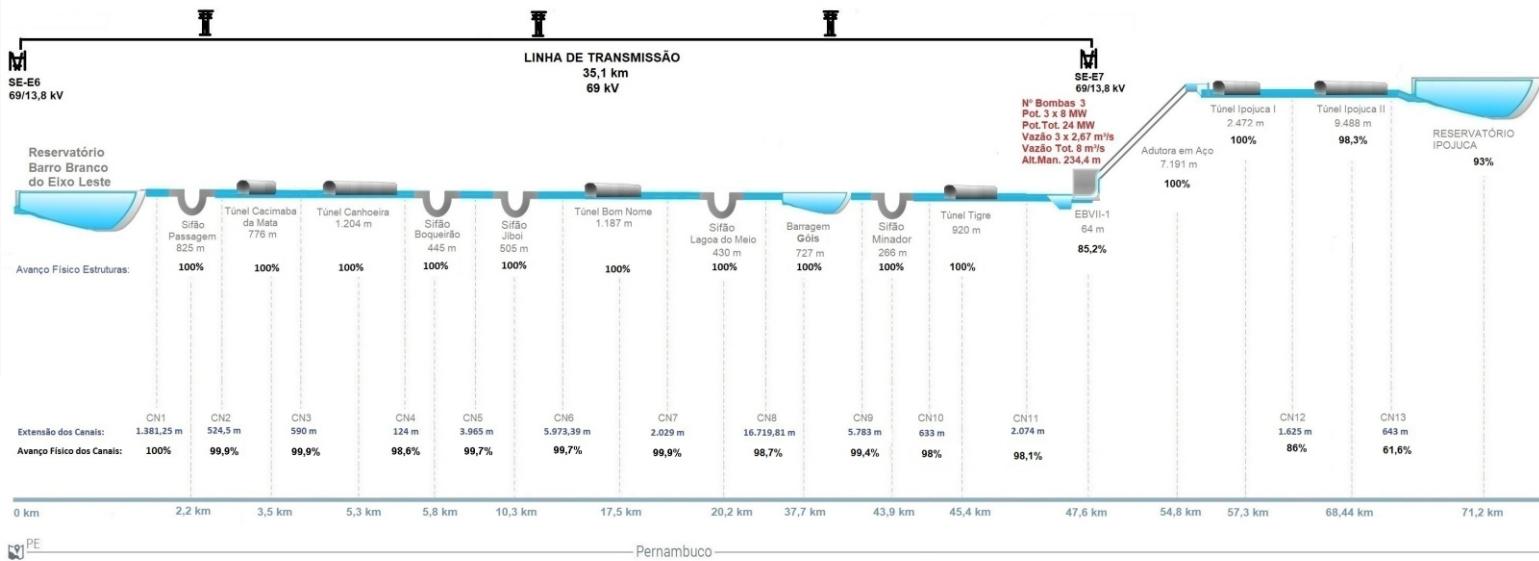

Execução de terraplanagem no Canal C6



# PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

O Projeto Básico Ambiental (PBA), elaborado a partir das recomendações propostas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), tem como objetivo propor medidas mitigadoras, compensatórias, de monitoramento e controle ambiental, frente aos impactos inerentes à execução do PISF. O PBA contempla 17 Planos e/ou Programas Ambientais, executados com base nas diretrizes aprovadas pelo IBAMA.

As ações executadas no âmbito de cada um dos 17 Programas Ambientais são constantemente avaliadas pelo MDR e pelo órgão licenciador (Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH/PE), de forma a promover melhorias nos resultados e nas condições ambientais das áreas sob influência do empreendimento.

## PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

### PROGRAMAS DE GESTÃO E APOIO AS OBRAS

**Objetivos:**  
Visam promover mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos planos e programas ambientais do empreendimento, bem como a adequada execução das obras do Ramal do Agreste, no que se refere aos procedimentos ambientais e demais normas aplicáveis, mantendo-se um elevado padrão de qualidade durante a sua implantação.  
**Quantidade de Programas:** 06  
**Execução Física:** 73,98%

### PROGRAMAS DE SOCIOECONÔMICO

**Objetivos:**  
Visam promover ações e medidas de mitigação das alterações e/ou impactos negativos ocasionados direta ou indiretamente à população e ao patrimônio público pelas obras de implantação do Projeto Ramal do Agreste, ocasionando o menor grau de perturbação possível e potencializando os impactos positivos do empreendimento.  
**Quantidade de Programas:** 06  
**Execução Física:** 70,88%

### PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO


**Objetivos:**  
Visam identificar e avaliar quantitativa e qualitativamente as condições dos recursos naturais, durante as fases de implantação e operação do empreendimento, realizando-se o acompanhamento contínuo e sistemático de variáveis ambientais estabelecidas, por meio de coletas periódicas de dados e avaliações de tendências ao longo do tempo.  
**Quantidade de Programas:** 05  
**Execução Física:** 61,18%

**Quantidade de Programas Ambientais: 17**

**Execução Física: 69,21%. julho/2021**

# PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

Comunicação Social  
Comunicando o Ramal do  
Agreste para Instituições  
Sertânia-PE

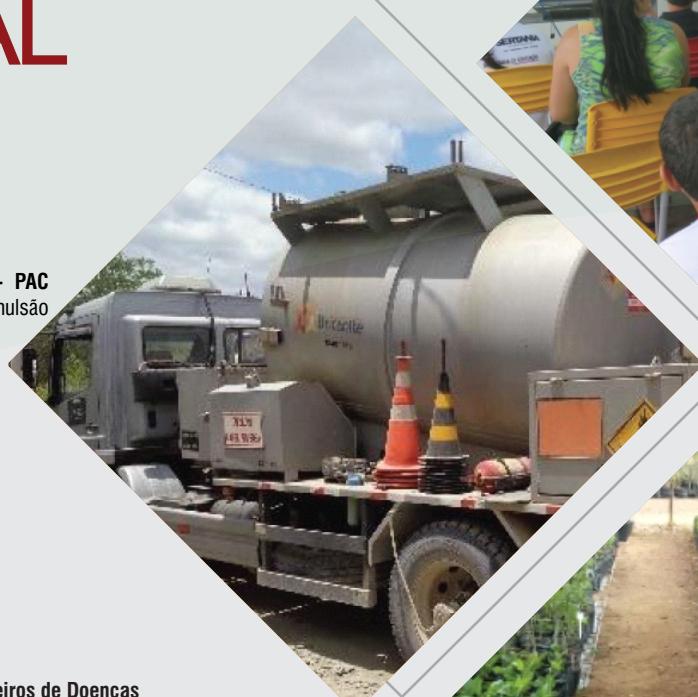

**Programa Ambiental para a Construção - PAC**  
Veículo adequado para o transporte de emulsão  
explosiva, na janela do túnel Ipojucá II.

**Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças**  
Coleta de exemplares com auxílio do aspirador  
entomológico elétrico. Ponto de monitoramento  
Po7 - Canal C9 - A jusante do reservatório Negros.

**Reassentamento de Famílias  
Viveiro em Vila Produtiva.**





MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
