


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH. 66,10 Km
- IMPLANTAÇÃO 71,03 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 57,41 Km
- A LICITAR
- Total 194,54 Km**

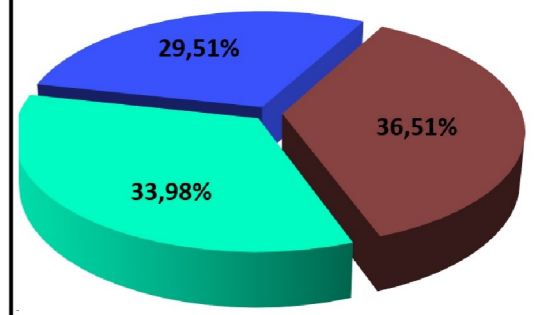

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Outubro de 2024

MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Nov - Dez - Jan
- Dez - Jan - Fev

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXTENSÃO	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2024	10IX	3.1	00 00412/2016	CONSORCIO BRASIL - MOTA - ENGESUR	BR-381	288,40	317,00	28,6	Duplicação da BR-381	20/11/2013	28/03/2024	R\$ 502.897.959,48	92,5%	Obra paralisada. PAAR em andamento, o remanescente será incluído no PER da concessão.	06 00343/2023	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
2	2025	10IX	7	00 00817/2013	CONSORCIO BRASIL - MOTA - ENGESUR	BR-381	389,50	427,00	37,5	Duplicação da BR-381	20/11/2013	27/07/2023	R\$ 701.903.507,36	100%	Pavimento concluído, patologias foram identificadas. PAAR em andamento.	06 00343/2023	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
3	2028	10IW	Unico	00 00277/2022	CONSORCIO LCM / ÁPIA / HOLLUS	BR-135	82,00	139,41	57,41	Adequação/Restauração e melhoramentos	27/09/2022	19/01/2026	R\$ 260.244.803,46	1,59%	Projeto geométrico atrasado. Licenças e desapropriações dependem do projeto. Previsão de início dos serviços físicos até dez/2024.	06 00331/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
4	2029	7XJU	Unico	06 00298/2023	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	BR-265	546,80	582,00	9,43	Remanescentes de implantação e pavimentação	13/06/2023	26/09/2025	R\$ 71.285.008,87	50%	Obra em andamento, com 4,21 km já entregues. RPFO de solo mole e cortina prevista. Previsão de entrega de mais 1 km em 2024.	06 00416/2022	TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	
D1	2026	13XG	TED-403/2022	DEC - Exército Brasileiro	BR-367	0,00	61,6	61,6	Remanescente de implantação do contrato 06 01040/2018	25/08/2022	04/08/2026	R\$ 328.741.747,74	R\$ 0,00	R\$ 328.741.747,74	7,83%	Terraplanagem em andamento. Redução de escopo prevista. Ainda sem entregas de km de pavimento.

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2498	7XX1	BR-365	276,94	337,40	Adequação de capacidade - Lote 1			Rubricas da BR-365/MG serão unificadas. Aguardando mudança para licitação.	
L2	2498	7XX1	BR-365	337,40	407,80	Adequação de capacidade - Lote 2			Rubricas da BR-365/MG serão unificadas. Aguardando mudança para licitação.	
L3	2498	7XX1	BR-365	407,80	476,20	Adequação de capacidade - Lote 3			Rubricas da BR-365/MG serão unificadas. Previsto RDCI.	
L4	10IX	10IX	BR-381	427,00	445,00	Lote 8A	50600.006897/2024-70		RDCI em fase de adjudicação. Caso haja ordem de início em 2024 será para iniciar projetos.	0144/24-00
L5	10IX	10IX	BR-381	445,00	458,40	Lote 8B			Edital publicado. Data de abertura prevista para 04/12/2024	0324/24-00
L6	2026	13XG	BR-367	0,00	46,28	Remanescente do TED 403/2022			Aguardando contratação de supervisão (previsto para nov/24), para levantamento dos remanescentes	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
