


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - ⋯ Planejada
 - ▭ Concedida
- Tipos de Intervenção**
- IMPLANTAÇÃO 478,67 Km
 - CONTORNO RODOVIÁRIO 52,7 Km
 - ALICITAR
- Total 531,37 Km**

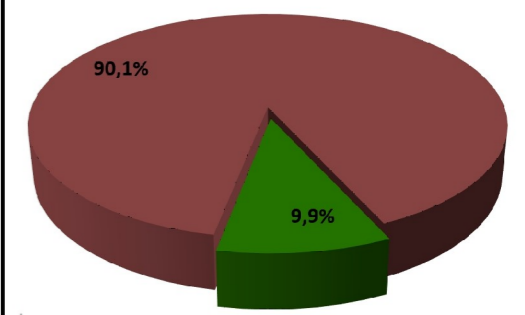

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2037	11VA	A	11 00485/2020	CONSORCIO CONSTRUCAP-EGIS	BR-158	0,00 - 93,9	93,99	Implantação do Lote A	02/09/2020	03/08/2026	R\$ 307.279.130,28	4,07%	Obra em andamento com previsão de entrega de 12 km até dez/24. Há tratativas para licenciamento de um trecho de mais 30 km nos próximos meses.	11 00551/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	2038	11VA	B	11 00159/2022	CONSORCIO BANDEIRANTES - DESTESA - RTA	BR-158	93,99 - 195,42	101,43	Implantação do Lote B	23/05/2022	28/07/2025	R\$ 375.525.233,73	0,36%	Contratação integrada em fase de projetos, estão em andamento tratativas com o IBAMA para liberação das obras no trecho.	11 00567/2023	CONSORCIO SUPERVISÃO VALE DO ARAGUAIA MT
3	2039	10KK	Único	11 00259/2016	CONSORCIO BANDEIRANTES/DESTESA/ASTEC	BR-242	291,98 - 395,36	103,38	Implantação e pavimentação	03/06/2016	22/12/2027	R\$ 294.169.064,86	0,33%	Nunca iniciada devido a entraves indígenas. Os estudos do licenciamento ambiental estão em análise na DPP.	11 00658/2017	PROSUL - PROJETOS SUPER, PLANEJ. LTDA
4	2039	10KK	2	11 00927/2015	CONSORCIO JM/ALTA/ETEC	BR-242	395,36 - 486,32	90,96	Implantação BR-242/MT	26/01/2016	23/03/2024	R\$ 247.507.401,93	0,31%	Nunca iniciada devido a entraves indígenas. SR trabalhando em aditivo para a Supervisora elaborar os anteprojetos para uma nova licitação.	11 00031/2024	STRATA ENGENHARIA LTDA
5	2039	10KK	1	11 00960/2015	CONSORCIO ENPA/CAVALCA/SAB/CONTÉCNICA	BR-242	486,32 - 575,23	88,91	Implantação BR-242/MT	11/01/2016	24/06/2027	R\$ 399.162.544,08	0,10%	Nunca iniciada devido a entraves indígenas.	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DAS OBRAS (OUTUBRO 2024)
D1	2036	12KY	TC-764/2011	Governo de MT	BR-163	0,00 - 52,70	52,7	Contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande	15/11/2012	02/06/2027	R\$ 323.582.183,87	R\$ 215.721.455,93	R\$ 539.303.639,80	22,56%	Obra em andamento com execução de terraplenagem, galerias e OAE. Previsão de entrega da Ponte do Rio Cuiabá em dezembro/24.

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2035	7S80	BR-070	0,00 - 9,90	Contenção de taludes			0312/24-11	Orçamento em atualização para licitação prevista para dez/24. Licença de instalação já emitida.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
