


Legenda:

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

■ ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	38,90 Km
■ IMPLANTAÇÃO	42 Km
■ CONTORNO RODOVIÁRIO	13,18 Km
■ DUPLICAÇÃO	8,70 Km
▲ OAE	
Total	102,78 Km

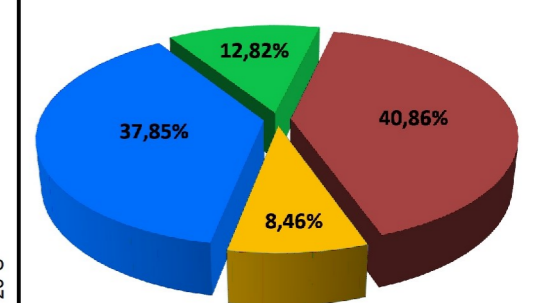

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2062	7V25-7M91	Unico	09 00070/2022	CONSORCIO BANDEIRANTES - TUCUMANN - ENGINEM	BR-376	0,00	13,18	13,18	Implantação do Contorno Sul de Maringá	01/06/2022	26/01/2025	R\$ 328.634.472,57	0,29%	Análise de projetos em andamento pela DPP. Sem previsão de início das obras.	09 00705/2022	CONSORCIO ASTEP / JBR
2	2935	7K23	Unico	09 00397/2021	CONSORCIO NEOVIA - CASTILHO - STE	BR-487	56,41	93,80	37,39	Implantação e Pavimentação	17/04/2023	31/12/2025	R\$ 321.189.531,75	0,06%	Previsto concluir análise de projetos em nov/2024 e iniciar as obras em dez/2024. Pendente licença de instalação.	09 00047/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
3	2059	12JL	Unico	09 00837/2014	CONSORCIO CASTILHO / TÉCNICA VIÁRIA	BR-163	235,50	274,40	38,90	Duplicação de Toledo a Mar. Candido Rondon	07/10/2014	07/02/2025	R\$ 461.460.700,01	98,23%	Obra concluída. Entraves na indicação de área para plantio compensatório. Emitido Termo de Recebimento Provisório.	09 00049/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA

Obras Delegadas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	
D1	2061		TT-00211/2019	Governo do Paraná	BR-277	15,00	15,76	0,76	2ª Ponte de Foz do Iguaçu	10/05/2019	25/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 448.663.562,60	R\$ 448.663.562,64	0%	Ponte concluída. Executando acesso com previsão de conclusão em novembro/2025.
D2	2063		TT-599/2020	Governo do Paraná	BR-469	10,70	19,40	8,7	Duplicação e Manutenção	13/11/2020	03/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 139.477.766,41	R\$ 139.477.766,41	0%	Execução em ritmo lento com avanço físico em 34%.
D3			ACT-366/2023	Município de Coronel Vivida	BR-158	507,00	508,06	1	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	02/07/2023	01/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obra sendo executada com ritmo bom e com avanço físico em 30%
D3			ACT-366/2023	Município de Coronel Vivida	BR-373	477,89	481,50	3,61	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	02/07/2023	01/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obra sendo executada com ritmo bom e com avanço físico em 30%
D4			ACT-35/2022	Município de Colombo	BR-476	112,00	112,50	0,5	Implantação de interseção em nível	<Null>	<Null>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	Aguardando assinatura por parte da prefeitura de Colombo para dar início ao objeto do ACT.

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2557	163I	BR-163	338,6	343,2	Contorno de Guaira			Em andamento a preparação dos documentos, mas sem previsão de licitação definida.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
