


- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - - - Não pavimentada
  - Planejada
  - Concedida

**Tipos de Intervenção**

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	316,47 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	68,50 Km
IMPLANTAÇÃO	24,10 Km
A LICITAR	
<b>Total</b>	<b>409,07 Km</b>

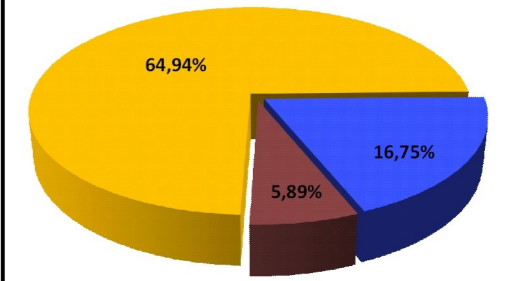

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2090	7X78	Único	10 00094/2021	CONSORCIO PLANATERRA/TRAÇADO/IGUATEMI	BR-285	30,00 54,10	24,10	Remanescentes de obras na BR-285	15/03/2021	17/08/2026	R\$ 114.510.033,03	21,94%	Obra em andamento com a retomada da execução da terraplenagem. Há previsão de entrega da Ponte sobre o Rio das Antas somente em novembro de 2026.	10 00391/2022	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	2077	7X16	Único	10 00717/2019	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-285	431,50 464,30	32,80	Travessia urbana de Ijuí	27/12/2023	07/06/2027	R\$ 254.328.507,50	0,74%	Em execução terraplenagem e drenagem, km 460+00 ao 460+700 RLE. E RLD. Sem previsão de entregas para 2024.	10 00062/2024	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	2083	7X16	1	10 00821/2019	CONSORCIO (MAC / ETERC / SOGEL / IGUATEMI)	BR-116	234,70 270,40	35,70	Melhoramento físicos e segurança de tráfego	02/12/2019	21/12/2026	R\$ 791.980.140,19	45,15%	Em execução OAEs Celina Kroeff, Retorno e ponte do arroio sapucaia. Entrega de 5,5 km pavimentados em 2024. Prevista RPFO para elevação de greide	10 00650/2016	MAGNA ENGENHARIA LTDA
4	2086	7L04	5	10 00058/2022	PLANATERRA TERRAPL. PAVIMENTAÇÃO LTDA	BR-116	397,18 422,30	25,12	Remanescentes do contrato 461/2012	21/03/2022	05/09/2025	R\$ 222.847.495,17	51,51%	Obra em andamento com ritmo lento devido as condições climáticas na região, previsão de entrega de 4 km de pista duplicada em novembro de 2024.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
5	100003	7L04	Único	10 00802/2020	CONSORCIO A GASPARG/V. GARAMBONE	BR-116	400,34 401,20	0,13	Implantação do viaduto Pompéia	01/12/2020	29/08/2025	R\$ 85.940.903,92	53,65%	Obra em andamento com a execução da Ponte sobre o Rio Camaquã e o Viaduto da Pompéia. Devido as chuvas o contrato deverá ser prorrogado para 2025.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
6	2087	7L04	Rem. lote 6	10 00605/2023	CONSORCIO PELOTENSE / PLANATERRA	BR-116	422,30 447,98	25,68	Duplicação da Ponte sobre o rio Camaquã	01/12/2020	29/08/2025	R\$ 85.940.903,92	53,65%	Obra em andamento com a execução da Ponte sobre o Rio Camaquã e o Viaduto da Pompéia. Devido as chuvas o contrato deverá ser prorrogado para 2025.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
7	2088	7L04	Rem. lote 7	10 00041/2023	CONSORCIO SULTEPA / BOURSCHIED ENG.	BR-116	448,50 470,10	21,60	Remanescente da duplicação do lote 6	21/11/2023	03/05/2027	R\$ 135.030.428,48	4,13%	Obra com ritmo lento devido as condições climáticas da região, previsão de entrega de 3 km de pista duplicada no início de 2025	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
8	2088	7L04	7	00 00463/2012	SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	BR-116	448,50 470,10	21,60	Remanescentes do lote 7	22/03/2023	16/09/2025	R\$ 77.150.942,06	23,93%	Obra em andamento com a execução dos aterros do viaduto da RS-265.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
9	100002	7L04	8/9	10 00427/2023	CONSORCIO SBS-BOURSCHIED	BR-116	470,10 511,76	41,66	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	27/01/2024	R\$ 171.201.530,81	81,44%	Emitido o Termo de Recebimento Definitivo da obra e o Contrato Encerrado	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
10	2526	112N	Único	00 00375/2024	CONSORCIO CIDADE / PLANATERRA / ÚNICA	BR-116	0,00 9,2	9,20	Remanescente da duplicação dos lotes 8 e 9	28/08/2023	07/02/2027	R\$ 101.780.002,36	23,86%	Obra em andamento com ritmo lento devido as condições climáticas na região. Executando pavimentação, aterro e drenagem.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
11	2079	123U	1	00 00139/2014	CONSORCIO B C M	BR-290	112,30 142,00	29,70	Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão	28/07/2024	28/07/2028	R\$ 210.008.065,29	0,00%	Em fase de estudos e elaboração de projetos		
12	2080	123U	2	00 01070/2013	CONSORCIO TB ECB - ETEL	BR-290	142,00 172,08	30,08	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	01/08/2022	R\$ 168.971.402,71	16,57%	Contrato em tratativas para a retomada. (elaboração do termo de acordo e adequação da composição societária)	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
13	2081	123U	3	00 00217/2014	CONSORCIO TRIER CTESA - PRODEC	BR-290	172,00 199,03	27,03	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	05/11/2021	R\$ 212.694.280,34	9,87%	Em tratativas para retomada do contrato. (elaboração do termo de acordo)	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
14	2082	123U	4	00 01128/2013	CONSORCIO TRIER CTESA - ESTEIO	BR-290	199,30 228,00	28,70	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	14/02/2027	R\$ 259.062.207,21	23,15%	DUP pendente. 5 km pavimentados com previsão de entrega de aprox. 6 km a partir de mar/2025.	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
15	12KG	2	00 00494/2013	CONSORCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-287	247,70 254,30	6,60	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	20/10/2025	R\$ 274.921.406,76	60,52%	DUP pendente. 10 km pavimentados/2024. Previsão de entrega de aprox. 8 km a partir de mar/2025. Prevista RPFO incluindo ação emergencial em taludes.	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA	
16	12KG	2	00 00494/2013	CONSORCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-158	329,10 331,90	2,80	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	24/06/2025	R\$ 248.437.568,45	98,59%	Obra próxima à data de conclusão. Previsão de finalizar em dez/24.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTD	
17	12KG	1	00 00493/2013	CONSORCIO CONTINENTAL SOGEL ECOPLAN	BR-158	324,00 329,10	5,10	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	24/06/2025	R\$ 207.690.439,33	96,66%	Obra próxima à data de conclusão. Previsão de finalizar em dez/24.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTD	

OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)
D1	2084	7L04	TED-919/2018	1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	BR-116	300,54 351,34	50,8	Remanescente de duplicação dos lotes 1 e 2	19/12/2018	18/12/2024	R\$ 255.528.384,19	R\$ 0,00	R\$ 255.528.384,19	64,52%	Obra paralisada, aguardando prestação de contas. Haverá contratação de remanescente.

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2085	7L04	BR-116	351,34 397,20	Remanescente dos lotes 3 e 4				Levantamento de Remanescentes. Em análise na CGCONT. Previsão de contratar somente em 2025.	
L2	2076	7X16	BR-472	510,53 517,10	Ponte sobre o Rio Ibicuí				Licitação do Edital 000386/2016-10 não teve êxito. Será providenciado novo processo licitatório.	10 00588/2023
L3	2092	7X96	BR-392	700,00 700,00	Construção da Ponte Internacional em Porto Xavier				Em processo de análise do edital. Será licitada pela SEDE. Previsão de publicação ainda em 2024.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

\*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
