












SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	A	Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP/PB	SOLUÇÃO ENTREGUE	
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO ENTREGUE	
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO ENTREGUE	
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	OBRA EM EXECUÇÃO	
5	A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	OBRA EM EXECUÇÃO	
6	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	OBRA EM EXECUÇÃO	
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	OBRA EM EXECUÇÃO	
8	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
9	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
10	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	OBRA EM EXECUÇÃO	
11	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	OBRA PARALISADA	

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	LICITAÇÃO HOMOLOGADA
2	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	LICITAÇÃO HOMOLOGADA
3	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	LICITAÇÃO HOMOLOGADA

PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	LICITAÇÃO EM ANÁLISE DOCUMENTAL
2	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	LICITAÇÃO EM ANÁLISE DOCUMENTAL
3	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas - Pelotas/RS	LICITAÇÃO EM ANÁLISE DOCUMENTAL

PROJETO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Ana Nery/RS	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE












	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
2	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
3	A	Hospital Regional do Oeste -Chapecó/SC	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
4	A	Hospital Santa Marcelina- São Paulo/SP	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
5	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
6	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
7	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS
8	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS

PROJETOS EXECUTIVOS EM ELABORAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	PROJETO EXECUTIVO EM ELABORAÇÃO NA VARIAN
2	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	PROJETO EXECUTIVO EM ELABORAÇÃO NA VARIAN
3	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	PROJETO EXECUTIVO EM ELABORAÇÃO NA VARIAN












SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	REANÁLISE 
2	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	REANÁLISE 
3	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT	REANÁLISE 
4	C	Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ	REANÁLISE 
5	C	Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS	REANÁLISE 
6	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	REANÁLISE 
7	C	Hospital Marieta Konder/SC	REANÁLISE 
8	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	REANÁLISE 
9	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	REANÁLISE 
10	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	REANÁLISE 
11	C	Hospital Geral de Roraima/RR	REANÁLISE 






SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
12	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	REANÁLISE 
13	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	REANÁLISE 
14	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	REANÁLISE 
15	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	REANÁLISE 
16	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	REANÁLISE 
17	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	REANÁLISE 
18	C	Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE	REANÁLISE 
19	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	REANÁLISE 
20	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	REANÁLISE 
21	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	REANÁLISE 
22	C	Hospital N. Sra da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC	REANÁLISE 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
23	C	Hospital Geral de Palmas/TO	REANÁLISE 
24	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	REANÁLISE 
25	C	Hospital Universitário Severino Sombra/RJ	REANÁLISE 
26	A	Instituto do Câncer do Ceará /ICC - Fortaleza/CE	REANÁLISE 
27	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	EM ANÁLISE 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP	ANÁLISE DE TITULARIDADE NA CONJUR
2	C	Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL
3	C	Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho/RO	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
4	A	Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
5	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
6	C	Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL
7	C	Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL
8	C	Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL
9	A	Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE RETORNO AO PLANO - EXC. EM 15/01/2015
10	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE TERRENO
11	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO PARA RETORNO AO PLANO

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
12	C	Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
13	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DE NOVO TERRENO
14	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DE TERRENO
15	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO
16	A	Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB - São Luís/MA	AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
17	A	Hospital do Câncer III/HC III/INCA - Rio de Janeiro/RJ	AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE INCLUSÃO PELO COMITE GESTOR
18	A	Associação Beneficente Douradense - Dourados	EM ANÁLISE NA SAS
19	A	Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS	EM ANÁLISE NA SAS
20	C	Hospital Regional de Assis - Assis/SP	EM ANÁLISE NA SAS
21	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	VOLTAR PARA REANÁLISE

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EXCLUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR











	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital de Referência de Araguaína/TO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
2	A	Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
3	A	Fundação Hospital Centenário-São Leopoldo /RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
4	C	Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015




LEGENDA

A Ampliação

C Construção

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		25/02/2015
ORDEM DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016
INAUGURAÇÃO		28/11/2016











-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Obs. Solução entregue e em operação



Valor da Obra: R\$ 2.471.731,37
Valor Equipamento: R\$ 1.923.709,47
Valor Projeto: R\$ 17.461,61
Valor Fiscalização: R\$ 114.230,25
Valor da Solução: R\$ 4.527.132,70

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		16/04/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017
INAUGURAÇÃO		13/05/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação
















Valor da Obra: R\$ 2.711.598,95
Valor Equipamento: R\$ 1.923.709,47
Valor Projeto: R\$ 17.312,15
Valor Fiscalização: R\$ 93.461,11
Valor da Solução: R\$ 4.746.081,68

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		28/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017
INAUGURAÇÃO		17/06/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue. Aguarda inauguração.



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51

Valor Projeto: R\$ 15.958,20











Valor Fiscalização: R\$ 76.499,65




Valor da Solução: R\$ 4.453.242,34

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		19/06/2015
ORDEM DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		20/06/2017
INAUGURAÇÃO		10/07/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs.
















Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15
Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51
Valor Projeto: R\$ 16.418,01
Valor Fiscalização: R\$ 94.845,72
Valor da Solução: R\$ 4.494.496,39

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		14/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		95%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/06/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		06/08/2017
INAUGURAÇÃO		07/09/2017











-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03
Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51
Valor Projeto: R\$ 18.100,78
Valor Fiscalização: R\$ 101.076,46
Valor da Solução: R\$ 4.132.406,78

[VOLTAR](#)

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		26/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		98%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		03/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		15/08/2017
INAUGURAÇÃO		29/08/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 1.975.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51

Valor Projeto: R\$ 15.341,00











Valor Fiscalização: R\$ 80.653,48




Valor da Solução: R\$ 3.954.226,99

VOLTAR 



EVOLUÇÃO











ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		95%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/06/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		25/08/2017
INAUGURAÇÃO		26/08/2017




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.490.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51
Valor Projeto: R\$ 15.836,87
Valor Fiscalização: R\$ 67.153,54
Valor da Solução: R\$ 4.456.222,92

EVOLUÇÃO











ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		60%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/09/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		24/10/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		19/12/2017
INAUGURAÇÃO		04/01/2018




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51
Valor Projeto: R\$ 19.908,40
Valor Fiscalização: R\$ 77.191,95
Valor da Solução: R\$ 4.480.332,86

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/08/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		20/09/2017
INAUGURAÇÃO		10/10/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51

Valor Projeto: R\$ 17.765,81











Valor Fiscalização: R\$ 80.653,48




Valor da Solução: R\$ 5.001.651,80


VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		11/11/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		24/10/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		19/12/2017
INAUGURAÇÃO		04/01/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

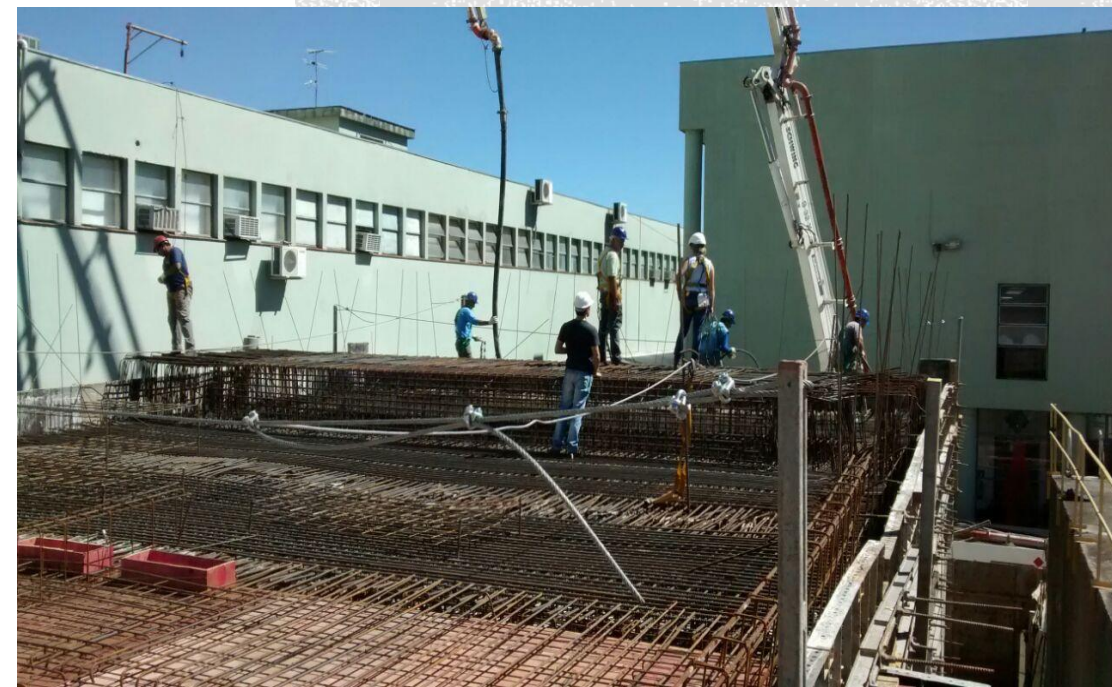














Valor da Obra: R\$ 2.512.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51
Valor Projeto: R\$ 17.566,24
Valor Fiscalização: R\$ 69.922,76
Valor da Solução: R\$ 4.482.721,50

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		80%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/01/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		26/03/2018
INAUGURAÇÃO		11/04/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Aguardando processo de licitação. O pedido de importação foi cancelado.



Valor da Obra: R\$ 2.780.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.883.232,51
Valor Projeto: R\$ 20.499,22
Valor Fiscalização: R\$ 69.230,45
Valor da Solução: R\$ 4.752.962,18



Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Reprovado



Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital Marieta Konder/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Hospital Geral de Roraima/RR

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Reprovado



Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Hospital Regional de Presidente Prudente/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Em Análise	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital Geral de Palmas/TO

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital Universitário Severino Sombra/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aguardando Parecer	Aguardando Parecer



Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Instituto do Câncer do Ceará /ICC - Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado

