

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR

julho - 2020

EIXO NORTE

- **As águas do Rio São Francisco chegaram no Reservatório Jati em 26/06/2020**



RESERVATÓRIO JATI

Cota atual: 456,85 m




RESERVATÓRIO DE JATI - CURVA DE ENCHIMENTO

—●— NA Reservatório (m) PREVISTO —●— NA Reservatório (m) REALIZADO

484,40 Cota Mínimo Operacional CAC

480,60 Cota da Soleira da EC do CAC

474,12 Cota da Soleira da TUD de JATI

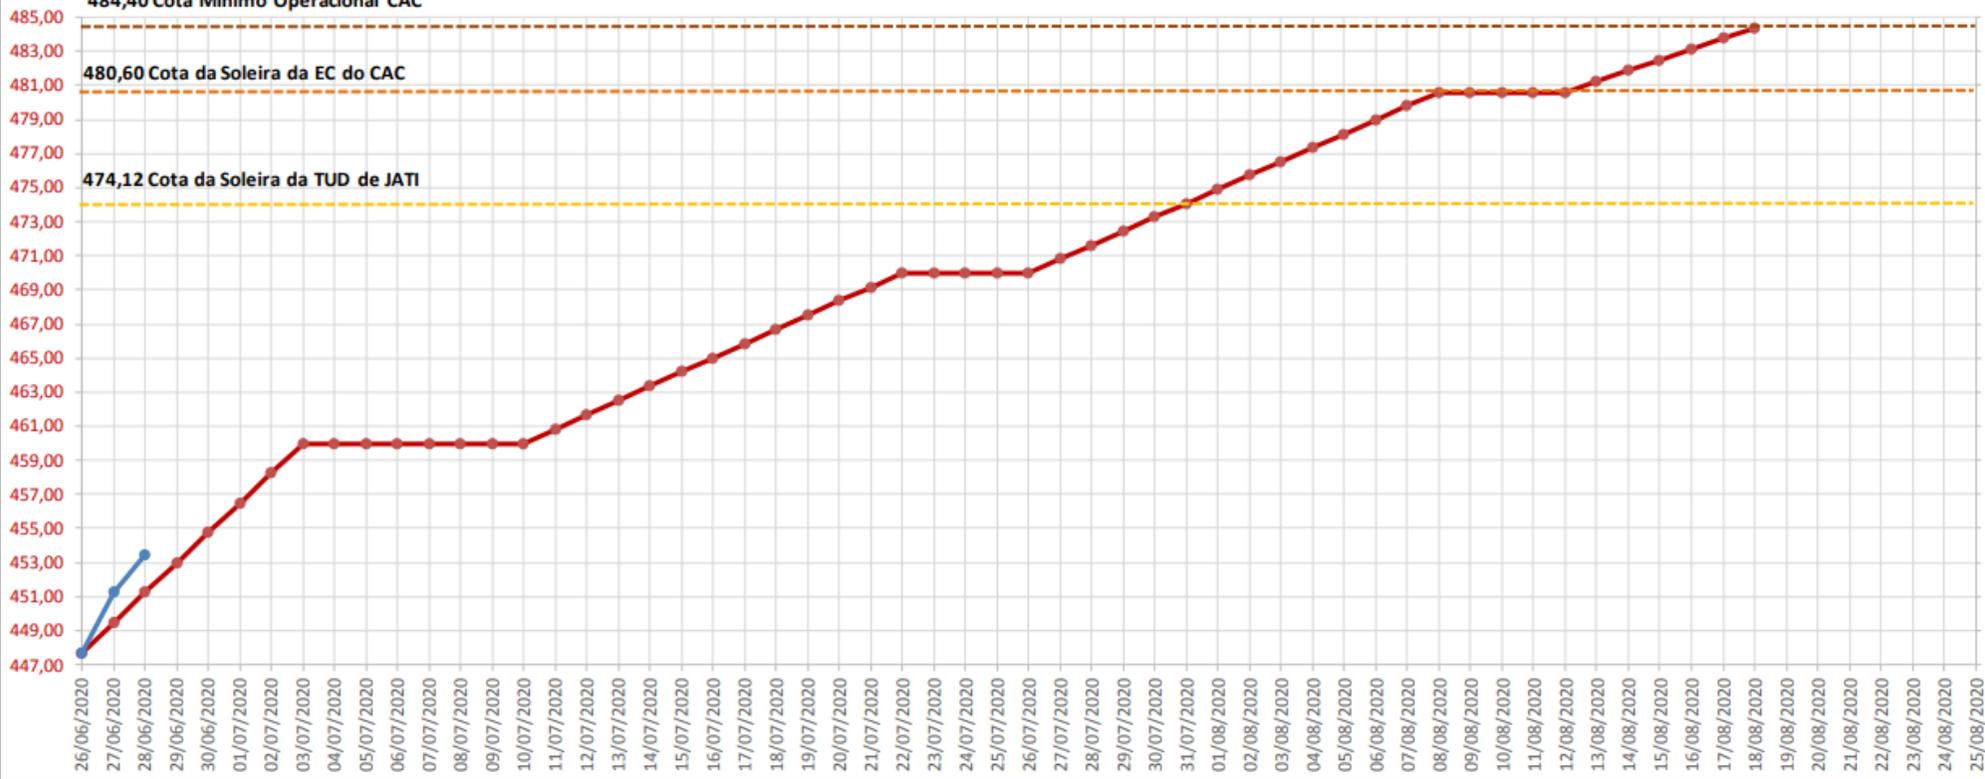

EIXO NORTE

- **Dique Negreiros** – Percolação dentro do limite aceitável (monitoramento constante). Projeto de aplicação das injeções apresentado em 05/05/20 - previsão de início – agosto/20
- **Vazamento no CN 10** – recuperados os pontos críticos, percolação ainda elevada. Estudos geofísicos serão realizados pela Pré-Operadora.
- **Iniciada execução do Trecho Caiçara Ávidos – previsão fevereiro/21 (1º etapa)**
 - Contratado: Canal 1238, Ponte 1546 e “Rápido” 1382 – 25,00% executado
 - A contratar: preparação do leito para os 53 m³/s (2º Etapa)
- **Previsão de Enchimento do Eixo Norte.**
 - Reservatório Caiçaras – Junho/2021
 - Reservatório Morro – Março/2021

Derivação para Res. Eng° Ávidos



Derivação para Res. Eng° Ávidos



Serviços de Escavação – E.333 a E.338



Perfuração em rocha – E.317 a E.324



Serviços de Escavação
Vista de Montante

EIXO LESTE

- **Contratação de “serviços remanescentes” Eixo Leste** – analisado pelo Jurídico-lançamento da licitação prevista para esse mês.
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas** – Análise de Nota Técnica pelo MDR. Emissão de laudo para definir projeto de recuperação (MDR encaminhou conclusões de análise para que a Projetista se manifeste/ajuste);
- **Cacimba Nova** – Ordem de serviço assinada
- **Atividades de manutenção sendo realizadas pelo Consórcio Pré Operador;**

Obrigado!

