

# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Projetos Estratégicos  
( DPE/SNSH – MIDR )

Março / 2023

*Trecho de Canal / Cruzamento com CE-384 (WBS 1232)*

## SNSH - MIDR

---

- **Secretário SNSH**

- Giuseppe Serra Seca Vieira (nomeação publicada em 01/03/2023)

- **Diretor DPE**

- Oscálmi Porto Freitas (nomeação publicada em 28/02/2023)

# AVANÇO FÍSICO

Trechos	Dezembro / 2020	Fevereiro / 2023	Evolução
<b>PISF</b>	<b><u>97,42 %</u></b>	<b><u>98,98 %</u></b>	<b><u>1,56 %</u></b>
<b>Eixo Norte</b>	<b>97,61 %</b>	<b>99,80 %</b>	<b>2,19 %</b>
Meta 1N	97,45 %	99,61 %	2,16 %
Meta 2N	99,30 %	99,99 %	0,69 %
Meta 3N	99,09 %	99,99 %	0,90 %
<b>Eixo Leste</b>	<b>97,13 %</b>	<b>97,13 %</b>	<b>0,00 %</b>
Meta 1L	99,09 %	99,09 %	0,00 %
Meta 2L	96,63 %	96,63 %	0,00 %
Meta 3L	98,22 %	98,22 %	0,00 %
<b>Ramal do Agreste</b>	<b><u>81,46 %</u></b>	<b><u>99,95 %</u></b>	<b><u>18,49 %</u></b>
<b>Ramal do Apodi</b>	<b><u>00,00 %</u></b>	<b><u>11,79 %</u></b>	<b><u>11,79 %</u></b>

Fonte: Sumário Executivo de Março/2023

# RAMAL DO SALGADO

## Execução das Obras de Implantação

Fase externa de licitação

- Edital RDC-E N.º 2/2022
- Homologado e adjudicado em **29/11/2022**

## Cadastro Fundiário – Contrato n.º 02/2022

Contrato assinado e publicado no DOU em **20/10/2022**

- Em execução
- OS emitida em **06/12/2022**

## Gestão Ambiental

- Edital RDC-E N.º 3/2022
- 03 Propostas apresentadas estão sob análise

## Engenharia Consultiva

Fase interna de licitação

- Previsão de publicação: até **15/03/2023**

Parcela do investimento	Valor estimado	Valor contratado / homologado
Obras	R\$ 420.000.000,00	R\$ 357.850.000,00
Engenharia Consultiva	R\$ 40.000.000,00	
Gestão Ambiental	R\$ 48.000.000,00	
Fundiário / Desapropriação	R\$ 16.000.000,00	R\$ 925.896,00
Reajustamento	R\$ 76.365.582,22	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 600.365.582,22</b>	<b>R\$ 358.775.896,00</b>

## TED UFV – Consultoria e Projetos

- **Dique Negreiros** - Elaboração de projetos (anteprojeto, básico e executivo)
  - Relatório de estudo das alternativas: concluído em **dezembro/2022**
  - Previsão de conclusão: **novembro/2023**
- **Galeria Monteiro** – Consultoria (Causas, responsabilização e avaliação da solução proposta pela projetista)
  - Previsão de conclusão: **novembro/2023**
- **Conduto Forçado Reservatório Jati** – Projeto de recuperação
  - Previsão de conclusão: **setembro/2023**

Em fevereiro/2023 foi realizada reunião de alinhamento das atividades dos consultores da UFV.

# LICENCIAMENTO AMBIENTAL



## **Eixo Norte: Licença de Operação (LO) n.º 1660/2022**

- 28 Planos e Programas Ambientais
- 44 Condicionantes

## **Eixo Leste: Licença de Operação (LO) n.º 1464/2018**

- 29 Planos e Programas Ambientais
- 11 Condicionantes



## **Ramal do Agreste: LI n.º 08.22.11.006069-5 - CPRH-PE**

- 17 Planos e Programas Ambientais
- 37 Condicionantes

## **Ramal do Apodi: LI n.º 1392/2021**

- 25 Planos e Programas Ambientais
- 35 Condicionantes



## **Ramal do Salgado: LI n.º 1420/2022**

- 24 Planos e Programas Ambientais
- 34 Condicionantes

# PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS – PISF


## Controle e Monitoramento Ambiental – 94,97%




## Liberação, Supervisão e Controle de Obras – 97,89%



## Compensatórios – 78,24%



## Estratégicos de Desenvolvimento – 91,98%




## Gestão, Conservação e Monitoramento – 96,10%



# PROGRAMAS AMBIENTAIS – RAMAL DO AGRESTE


## PROGRAMAS DE GESTÃO E APOIO ÀS OBRAS

93,74% - Fevereiro/2023



## PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

98,52% - Fevereiro/2023




## PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

88,93% - Fevereiro/2023



A - ACOMPANHAMENTO  
E - EXECUÇÃO

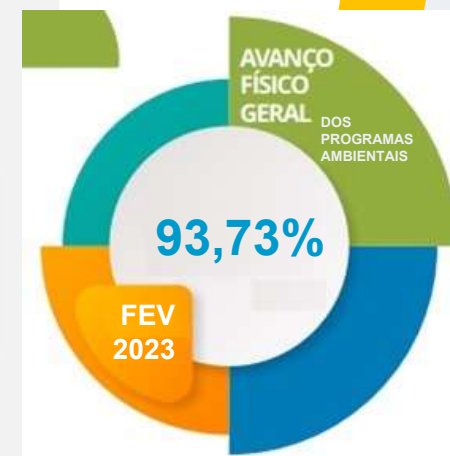



# PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS – RAMAL DO APODI

## PROGRAMA AMBIENTAIS DE GESTÃO E ESTRATÉGICOS (G0) – 35,00%

1

Plano de  
Gestão e  
Supervisão  
Ambiental

13

Programa de  
Compensação  
Ambiental

25

Programa de  
Monitoramento  
do Sistema  
Adutor

## PROGRAMA AMBIENTAIS RELACIONADOS AO MEIO FÍSICO (G1) – 4,83%

2

Plano  
Ambiental para  
a Construção –  
PAC

5

Programa de  
Treinamento e  
Capacitação de  
Técnicos da  
Obra em  
Questões  
Ambientais

6

Programa de  
Identificação e  
Salvamento de  
Bens  
Arqueológicos

12

Programa de  
Acompanhame  
nto da Situação  
dos Processos  
Minerários

17

Programa de  
Monitoramento  
de Processos  
Erosivos

22

Progr. de Reloc.  
Infraestruturas a  
Serem Afetadas  
pela implant. do  
Empreend. de  
Prev. a Desertif.



## PROGRAMA AMBIENTAIS RELACIONADOS AO MEIO BIÓTICO (G2) – 2,29%

9

Programa de  
Recuperação  
de Áreas  
Degradadas -  
PRAD

10

Programa de  
Supressão de  
Vegetação das  
áreas de Obra  
e Limpeza dos  
Reservatórios

18

Programa de  
Monitoramento  
de Fontes  
Hídricas  
Subterrâneas

20

Programa  
Monitoramento  
de  
Hospedeiros e  
Doenças

21

Programa de  
Saúde Pública

23

Programa de  
Conservação  
da Fauna e da  
Flora

24

Programa de  
Prevenção a  
Desertificação

## PROGRAMA AMBIENTAIS RELACIONADOS AO MEIO SOCIOECONÔNOMICO (G3) – 1,39%

3

Programa de  
Comunicação  
Social

4

Programa de  
Educação  
Ambiental

7

Programa de  
Indenização de  
Terras e  
Benfeitorias

16

Programa de  
Fornecimento de  
Água e Apoio  
Técnico para  
Pequenas  
Atividades de  
Irrigação

8

Programa de  
Reassentament  
o de Famílias

14

Programa de  
Conservação e  
Uso do  
Entorno e das  
Águas dos  
Reservatórios

15

Programa de  
Implantação de  
Infraestrutura  
de  
Abastecimento  
de Água

19

Programa de  
Regularização  
Fundiária nas  
Áreas do  
Entorno dos  
Canais

11

Programa de  
Apoio Técnico  
as Prefeituras



MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL



**Agradecimentos  
do Time do DPE.**
