


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida
- Tipos de Intervenção**
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 12,00 Km
 - CONTORNO RODOVIÁRIO 15,20 Km
 - IMPLANTAÇÃO 97,90 Km
 - ▲ OAE*
 - A LICITAR
- Total 125,10 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

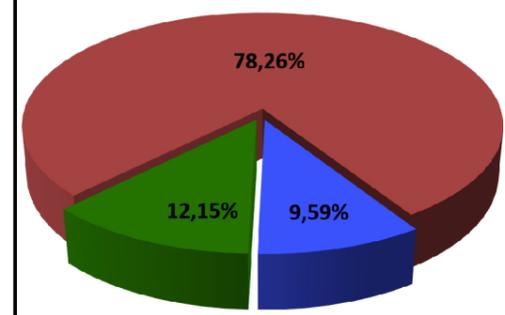

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	12 00961/2015	CONSÓRCIO COMSA/LOCTEC/ENESCIL	BR-080	406,20 410,30	4,1	Ponte sobre rio Araguaia e acessos	30/12/2015	28/02/2024	R\$ 195.304.218,47	84,58%	12 00857/2015	ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA	Terraplenagem no lado GO em andamento. Instalação dos guarda-corpos da OAE concluída. Há entraves com ASV e liberação de jazida do lado MT.
2	Único	12 00686/2020	CONSÓRCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	293,00 363,00	70	Remanescentes de Implantação e Pavimentação, incluindo OAEs	19/10/2020	27/10/2024	R\$ 97.662.512,50	69,33%	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA	Terraplenagem, drenagem, pavimentação e OAE sobre Rio Gregório em andamento. OAE sobre Rio Pintado e Viaduto BR-080 liberados ao tráfego.
3	Único	12 00368/2023	CONSÓRCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	273,30 301,20	27,9	Implantação e Pavimentação	05/07/2023	21/09/2025	R\$ 58.869.474,85	0,25%	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA	Ainda não mobilizado. Aguarda-se Assinatura da Ordem de Serviço.
4	Único	12 00955/2018	CONSÓRCIO LOCTEC / PAVIENG / CAVA / ALTA / SETORSUL	BR-020	0,00 12,00	12	Adequação-Rest./Melh. no perímetro urbano de Formosa	05/12/2018	31/03/2023	R\$ 103.807.823,20	14,49%	12 00799/2018	STRATA ENGENHARIA LTDA	Aguarda-se decisão final quanto à rescisão unilateral. Será realizada nova contratação para execução dos remanescentes.
5	Único	12 00218/2022	CONSÓRCIO CAIAPÓ / EGETRA	BR-070	8,30 14,60	6,3	Remanescente do Contorno de Aragarças	28/06/2022	29/02/2024	R\$ 32.500.946,23	96,77%	12 00214/2019	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.	Construtora desmobilizada. Serviços do objeto contratual concluídos. Tráfego liberado.
6	Único	12 00293/2021	CONSÓRCIO TRENA / CRIAR	BR-060	12,00 23,60	8,9	Remanescente do Contorno de Jataí	21/06/2021	04/06/2024	R\$ 70.200.891,31	92,11%	12 00480/2021	PROSUL - PROJETO SUPER. PLANEJ.	Serviços de pavimentação e sinalização concluídos. Em execução: OACs e ações do PRAD. Tráfego liberado.

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-080	0,00 24,60	Adequação de capacidade, duplicação e restauração	50600.044687/2022-18		0484/22-00	Processo licitatório adjudicado e homologado ao Consórcio CONSERVA / COESA. Em trâmite alteração da composição do Consórcio	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
