


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
- Tipos de Intervenção**
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 79,33 Km
 - IMPLANTAÇÃO 27,40 Km
 - OAE
 - A LICITAR
- Total 106,73 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

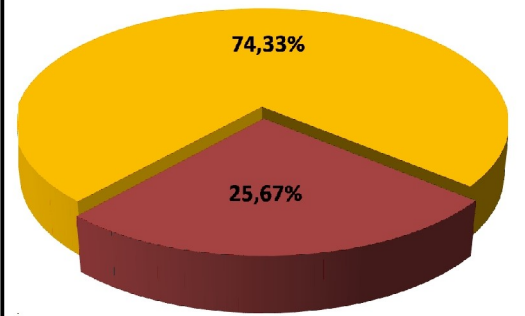

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	1986	7624	4/5	00 00083/2017	CONSORCIO BR-101/AL	BR-101	92,21 170,32	78,11	Duplicação e restauração com melhoramentos	10/03/2017	31/01/2026	R\$ 612.401.010,10	84,7%	Obra em andamento com pouca mobilização. Há afundamentos sendo tratados. Prevista pavimentação de 5 km na Travessia de São Miguel até dez/24.	20 00101/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.
2	3005	7624	7	20 00563/2023	CONSORCIO FP-LP-ENGEMAT	BR-101	244,14 245,36	1,22	Remanescente de duplicação do lote 7	03/10/2023	31/10/2025	R\$ 23.981.206,84	29,9%	Obra em andamento em fase de finalização das vias marginais e OAE, previsão de conclusão até o fim de novembro/24.	20 00170/2023	CONSORCIO JDS - TRAFECOM
3	1987	7U07	Único	20 00866/2019	CONSORCIO SVC / PAVISERVICE	BR-416	7,60 57,00	27,40	Conclusão de remanescentes de pavimentação	01/01/2020	20/07/2025	R\$ 127.875.176,39	38,5%	Obra em andamento no trecho da Serra da Catita, ritmo lento devido às chuvas, previsão de concluir este segmento até dez/24.	20 00308/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA/ZAGO-AL
4		7X25	Único	00 00057/2024	CONSORCIO PENEDO / NEÓPOLIS	BR-349	135,10 136,30	1,20	Ponte sobre o rio São Francisco (Penedo-Neópolis)	16/02/2024	29/07/2027	R\$ 205.867.963,66	12,78%	Contratação integrada em fase de projetos. Licenciamento ambiental em análise.		

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	3003	7624	BR-101	20,60 30,50	Remanescente do Lote 2	50600.002571/2024-73		0041/24-00	Edital adjudicado e homologado em setembro, aguardando assinatura do contrato.	
L2	2586	7624	BR-101	170,32 212,32	Remanescente do Lote 6	50600.001261/2024-31		0029/24-00	Edital adjudicado e homologado em setembro, aguardando assinatura do contrato.	
L3	2590	163V-161N	BR-316/424	92,00 108,20	Arco Metropolitano de Maceió			0216/24-00	Edital adjudicado e homologado em outubro, aguardando assinatura do contrato.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
