


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	93,52 Km
IMPLANTAÇÃO	429,30 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	217,13 Km
A LICITAR	
Total	739,95 Km

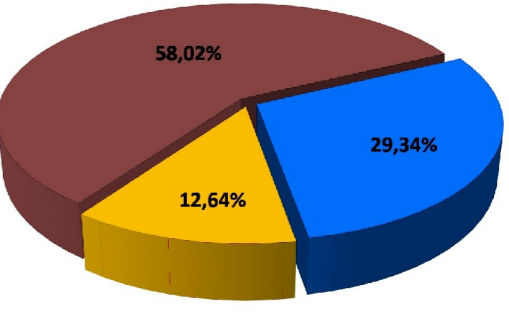

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

Mai - Jun - Jul
Abr - Mai - Jun
Nov - Dez - Jan
Jan - Fev - Mar
Dez - Jan - Fev

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	13X7	1	05	00875/2014	CONSORCIO CCL / LCM / PRODEC	BR-116	0,00	113,36	Adequação BR-116/BA	21/11/2014	31/01/2025	R\$ 310.420.073,76	47,29%	Obra em andamento com serviços de terraplenagem e pavimentação apresentando boa performance. Previsão de pavimentar 48,5 km até dez/24.	05 00028/2015	Consórcio HOLLUS/ASTEP
2	13X7	2	05	00858/2014	CONSORCIO LCM-CCL-JDS	BR-116	113,36	211,83	Adequação BR-116/BA	23/10/2014	28/01/2026	R\$ 288.537.295,63	12,83%	Obra em andamento com boa performance na execução de terraplenagem e pavimentação. Previsão de concluir 25 km até o fim de dez/24.	05 00028/2015	Consórcio HOLLUS/ASTEP
3	1992	13X7	5	00 00379/2024	CONSORCIO SVC / TOP / PAVISERVICE / SD	BR-116	334,23	387,41	Duplicação BR-116/BA - Remanescente do contrato 05 00878/2014	11/08/2024	20/07/2028	R\$ 273.593.301,91	0%	Aguardando ordem de início. Serão necessárias alterações no projeto antes de iniciar as obras.	05 00911/2016	ENECON S.A.
4	1993	13X7	6	05 00879/2014	CONSORCIO AMORIM BARRETO/EMPA/BASITEC	BR-116	387,41	427,75	Duplicação BR-116/BA	14/10/2014	27/10/2024	R\$ 467.166.005,95	97,04%	Obra concluída com supressão algumas passarelas e 1 segmento de restauração retirados do escopo.	05 00911/2016	ENECON S.A.
5	1991	14LV	Unico	05 00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-407	0,00	5,30	Adequação de capacidade na Travessia de Juazeiro	15/05/2023	08/07/2025	R\$ 187.719.166,67	35,48%	Executando pavimentação e OAE's. Previsão de pavimentar 3,8 km e concluir as OAE's 3, 4 e 5 até dez/24. Remanejamento de postes está em análise junto à COELBA.	05 00523/2023	CONSORCIO JBR / ASTEP
6	2003	7F51	10	05 00114/2017	CONSORCIO BR-235 (S.A. PAULISTA / ASTEC)	BR-235	601,30	663,60	Implantação e pavimentação	20/04/2017	30/12/2024	R\$ 178.255.592,56	65,41%	Ordem de paralisação emitida em 28/06/2024 devido às interferências ligadas com a análise do RGV. A construtora recusou prorrogar o contrato.	05 00189/2017	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO
7	3893	7V18	Unico	05 00105/2024	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	BR-020	775,50	787,30	Implantação entre Campo Alegre de Lurdes e Div/PI	20/02/2024	14/04/2025	R\$ 30.830.684,15	15,59%	Obra em andamento da estaca 150 à 590 com terraplenagem e OAC's, ainda sem pavimentação. Haverá mudança de traçado da estaca 0 até a estaca 150.	05 00540/2024	CONSORCIO GEOSISTEMAS-SETEC
8	2006	7XJ4	3	00 00390/2024	CONSERVA DE ESTRADAS LTDA	BR-030	845,50	898,40	Implantação do lote 3 - Maraú	30/07/2024	15/05/2027	R\$ 231.409.291,03	0%	Ordem de início em 14/10/24. Obras ainda não iniciadas, aguardando ajustes no critério de pagamento.	05 00179/2023	TRAFEGON ENGENHARIA LTDA
9	2004	7V19	2	05 00312/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	237,50	280,10	Implantação entre Cocos e Carinhanha (Lote 2)	20/06/2023	04/04/2025	R\$ 111.136.687,87	82,98%	Obras em andamento com 39,18 km já pavimentados. RFFO prevista referente ao acesso a Juvenília.	05 00604/2022	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
10	2004	7V19	1	05 00059/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	191,50	237,50	Implantação entre Cocos e Carinhanha (Lote 1)	12/12/2022	30/04/2025	R\$ 129.215.163,88	79,74%	Obra em andamento com 42,2 km já pavimentados. RFFO referente ao acesso a Juvenília em análise. Previsão de conclusão em dez/24.	05 00604/2022	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
11	4120	163J	2	00 00392/2024	CONSORCIO GAE/SVC/PAVISERVICE/BASITEC	BR-030	90,60	190,90	Implantação Div/GO até Cocos - Lote 2	10/07/2024	31/12/2027	R\$ 479.548.076,34	0%	Contratação integrada em fase de projetos, estudos preliminares em análise na DPP.	A licitar	A licitar
12	4120	163J	1	00 00391/2024	CONSORCIO CAIAPO / MULTI MODAL	BR-030	0,00	90,60	Implantação Div/GO até Cocos - Lote 1	11/07/2024	01/01/2028	R\$ 338.192.108,20	0%	Contratação integrada em fase de projetos, estudos preliminares em análise na DPP.	A licitar	A licitar
13	2007	1C09	5	05 00629/2014	CONSORCIO TOPI/GEOSISTEMAS	BR-135	443,90	466,80	Implantação BR-135/BA	21/08/2014	30/01/2025	R\$ 122.309.811,52	94,45%	Obra em andamento, previsão de conclusão dez/24. Foi realizado acréscimo de 1,14 km em aditivo, totalizando uma nova extensão de 24,04 km.	05 00030/2015	DEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	1994	105S	BR-101	0,00	41,60	ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA - Lote 1	50600.021701/2024-77	201/24-05	Remanescente dos Lotes 1 e 2 serão unificados em uma contratação só. Abertura de propostas prevista para 18/12/2024.	50600.025598/2024-07
L2	1995	105S	BR-101	41,60	83,58	ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA - Lote 2	50600.021701/2024-77	201/24-05	Remanescente dos Lotes 1 e 2 serão unificados em uma contratação só. Abertura de propostas prevista para 18/12/2024.	50600.025598/2024-07
L3	1996	105S	BR-101	83,58	124,60	ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA - Lote 3			Remanescente dos Lotes 3 e 4 - Previsão de licitação adiada para o primeiro semestre de 2025.	50600.025598/2024-07
L4	1997	105S	BR-101	124,60	165,40	ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA - Lote 4			Remanescente dos Lotes 3 e 4 - Previsão de licitação adiada para o primeiro semestre de 2025.	50600.025598/2024-07
L5	2002	7XM0	BR-324	512,50	520,00	Contorno Norte de Feira de Santana		27/12/24-05	Edital publicado com sessão pública prevista para 30/10/24.	50600.025598/2024-34
L6	1991	14LV	BR-235/407	318,40	322,40	Contratação de remanescente para execução das agulhas, OAEs e drenagens			Publicação de edital será adiada para 2025. Licitação futura será com projeto executivo.	A licitar
L7		1C09	BR-135	267,00	344,70	Ação 1C09 - Lote 2			Previsão de publicar o edital em novembro/24.	A licitar
L8	2928	1C09	BR-135	340,00	378,00	Ação 1C09 - Lote 3			Orçamento em elaboração, previsão de publicar o edital em novembro/24	A licitar

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
