


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	46,40 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	1,90 Km
A LICITAR	
Total	48,30 Km

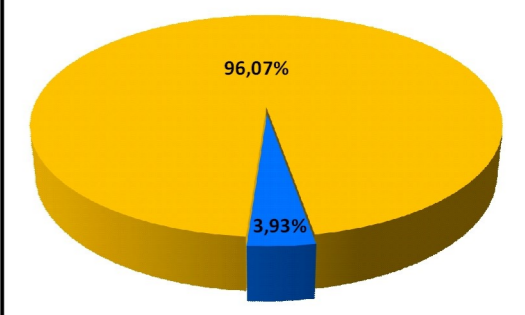

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Outubro de 2024

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXTENSÃO	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2008	10L3	Unico	03 00537/2015	CONSORCIO TORC - MAIA MELO	BR-222	11,40 35,70	24,3	Duplicação do Acesso ao Porto de Pecém	02/12/2015	31/03/2025	R\$ 268.879.985,65	86,2%	Obra com a pista nova concluída. O contrato será prorrogado para execução das passarelas.	03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
2	2009	13X6	1	03 00077/2024	CONSORCIO CLC-CONSERVA-ESTRATEGICA	BR-116	53,40 75,50	22,1	Duplicação Pacajus - Boqueirão do Cesário	25/03/2024	03/01/2028	R\$ 281.633.337,19	0%	Contratação integrada em fase de projetos. Previsão de início das obras a partir de maio de 2025.		

Obra Delegada

ID OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)
D1			ACT-266/2023	DNOCS	BR-404	73,00 74,90	1,9	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	09/02/2026	R\$ 0,00	R\$ 84.006.006,04	R\$ 84.006.006,04	0%	Em fase de análise de projetos.

*Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. **Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
