


MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Nov - Dez - Jan
- Dez - Jan - Fev



- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida
- Tipos de Intervenção**
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 12,00 Km
 - CONTORNO RODoviÁRIO 15,20 Km
 - IMPLANTAÇÃO 106,46 Km
 - DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 24,60 Km
 - A LICITAR
 - OAE*
- Total 158,26 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

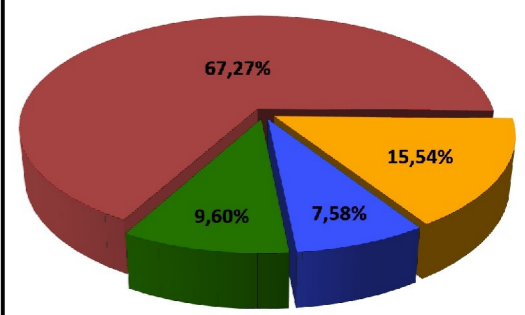

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXTENSÃO	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2018	7E79	Unico	12 00961/2015	CONSORCIO COMSA - BK - ENESCIL	BR-080	406,20 410,30	4,1	Ponte sobre rio Araguaia e acessos	30/12/2015	27/02/2025	R\$ 203.625.768,91	87,4%	Em execução terraplenagem no encabeçamento da ponte Lado Goiás. ASV emitida para execução dos acessos.	12 00439/2024	CONSORCIO DIREÇÃO-ESTRATEGICA
2	2017	7E79	Unico	12 00686/2020	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	293,00 363,00	70	Remanescentes de implantação, incluindo OAEs	19/10/2020	29/04/2025	R\$ 98.299.529,60	92,2%	Terraplenagem e drenagem profunda em andamento com expectativa de conclusão da obra no início de 2025.	12 00089/2023	TRAFECON ENGENHARIA LTDA
3	2017	7E79	Unico	12 00368/2023	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	273,30 301,20	27,9	Implantação e Pavimentação na BR-080/GO	05/07/2023	21/09/2025	R\$ 61.856.552,96	2,08%	Contratação integrada em fase de projetos. Pendências com desapropriação.	12 00089/2023	TRAFECON ENGENHARIA LTDA
4		15K0	Unico	12 00218/2022	CONSORCIO CAIAPÓ / EGETRA	BR-070	8,30 14,60	6,3	Remanescente do Contorno de Aragarças	28/06/2022	26/02/2025	R\$ 32.500.946,23	97,8%	Pavimentados os 6,3 Km. Em análise RPFO referente à necessidade de ajustes de Projeto e acréscimos de quantitativos.	12 00214/2019	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
5	2014	7XM3	2	12 00350/2024	CONSORCIO CAIAPÓ/MME	BR-070	129,00 167,70	8,56	Remanescente de implantação do Lote 2	14/06/2024	30/11/2026	R\$ 50.610.153,65	0%	Contratação integrada em fase de projetos até março/2025. Supervisão em pendência, sem previsão de licitação ainda.		
6		7171	Unico	12 00293/2021	CONSORCIO TRENA / CRIAR	BR-060	12,00 23,60	8,9	Remanescente do Contorno de Jataí	21/06/2021	17/04/2025	R\$ 71.736.971,72	94,8%	Obra finalizada. Aguardando encerramento do contrato.	12 00480/2021	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.
7	3030	7R82	Unico	00 00544/2024	TRIER ENGENHARIA S/A	BR-020	0,00 12,00	12	Remanescente da adequação de Formosa	30/08/2024	20/02/2026	R\$ 192.903.462,41	0%	Em fase de mobilização do canteiro. Há entraves ambientais, com desapropriação e interferências. Prevista RPFO para tratar de erosão no km 2,25.	12 00588/2024	CONSORCIO DYNATEST / NORDEN
8	2531	7XT1	1	00 00680/2023	CONSERVA DE ESTRADAS LTDA	BR-080	0,00 24,60	24,6	Duplicação da 080/DF	23/12/2023	05/03/2026	R\$ 339.752.587,54	0,947%	Terraplenagem em andamento. Prevista entrega da passarela em 2024. Projeto geométrico em alteração. Há entraves com interferências e desapropriação.	12 00384/2024	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1	2532	163X	BR-153	703,32 703,60	Ponte sobre o rio Paranaíba em Itumbiara				TR pronto com edital em elaboração. Aguardando licença prévia para realizar contratação semi-integrada.	
L2	2531		BR-080		BR-080/DF - Adequação de Taguatinga - Div DF-GO				Licitação pela SR prevista para até o final de 2024 e contratação para 2025.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
