


**Legenda:**

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

**Tipo de Intervenção**

IMPLANTAÇÃO	150,70 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	20,26 Km
OBRA DE EMERGÊNCIA	1,02 Km
OAE*	
A LICITAR	
<b>Total</b>	<b>171,98 Km</b>

\* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

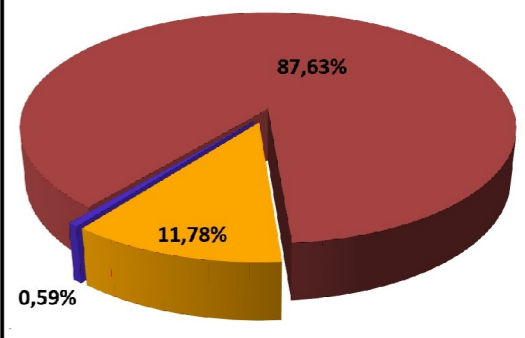

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

**MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO**

Nov - Dez - Jan
Jan - Fev - Mar
Fev - Mar - Abr

Obras Diretas													SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA	
OBRA	ID PAC	AÇÃO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)		
1	2056	7W95	Único	18 00131/2022	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-343	340,98 341,20	1,02	Construção de trincheira em interseção com Av. João XXIII em Teresina	13/06/2022	08/03/2025	R\$ 46.086.737,68	90,32%	Conclusão prevista para dez/24. RPFO para acréscimo de quantidades com impacto financeiro em andamento na SR.		
2	2055	7X75	Único	18 00899/2019	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-316	13,38 33,54	20,26	Duplicação do trecho entre Entr. com BR-226/PI e Demerval Lobão	27/12/2019	14/03/2025	R\$ 90.388.642,57	94,48%	Duplicação liberada ao tráfego. Pendentes as OAE's (3 passarelas e 1 ponte) devido a entraves de projeto e interferências com rede de energia.		
3	2057	7XM5	Único	18 00517/2022	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-330	0,00 1,42	4,02	Construção de ponte sobre rio Pamaiba e seus acessos (Ribeiro Gonçalves)	26/09/2022	27/06/2025	R\$ 34.787.309,02	44,79%	OAE pronta e acessos em execução, com previsão de conclusão da obra em abril/2025.		
4	7N22	Único	18 00191/2019	CONSORCIO ARTELESTE/MAVILLIS	BR-235	435,30 435,48	4,60	Construção de OAE	23/05/2019	31/08/2024	R\$ 35.645.637,38	99,97%	Obra concluída.			

Obra Delegada													SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)		
D1	2058	7N22	UT-003/2007	Estado do Piauí	BR-235	0,00 150,70	150,7	Implantação da BR-235/PI - Gestão feita pela SR do Piauí	17/04/2009	29/10/2024	R\$ 436.940.747,77	R\$ 0,00	R\$ 436.940.747,77	46,04%	Paralisada. Atualização de projeto para licitação de remanescente pelo Estado sendo analisada pela SR.		

Obras a licitar													SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA	
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO				EDITAL SUPERVISÃO			
L1	2947	7W95	BR-343	303,10 332,20	Adequação entre Teresina e Altos				Pendente apenas análise do projeto executivo. Licitação prevista para nov/2024.							
L2	2566	7W95	BR-343	341,5 346,72	Rem. Contrato 721/2018 - Adequação BR-316/343/PI (Saidas Sul e Leste de Teresina)				Remanescente do Contrato 18 00721/2018, já licitado (Edital 255/24-18).							
L3		7W95	BR-343	346,72 347,08	Construção OAE				Previsão de licitação para dez/2024.							
L4	2566	7W95	BR-343	347,08 349,10	Contorno de Teresina - Lote 3				Previsão de licitação para dez/2024.							
L5	2521	163E	BR-316	33,54 55,60	Demerval Lobão a Monsenhor Gil (Lote 2)				Projeto executivo em elaboração. Licitação prevista pela SR até o final de 2024.							
L6	4631	163E	BR-316	55,60 79,60	Duplicação de Monsenhor Gil até Estaca Zero				Prevista licitação de projetos até o final de 2024.							
L7	4115	163K	BR-330	1,34 115,78	Lote 1				Já em andamento trâmites para assinatura do Convênio.							
L8	4632	163K	BR-330	115,78 233,86	Lote 2				Já em andamento trâmites para assinatura do Convênio.							

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
