


**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO
FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL**

**Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR**

PAINEL DO EIXO NORTE

PENDÊNCIAS - EIXO NORTE - TRECHO I

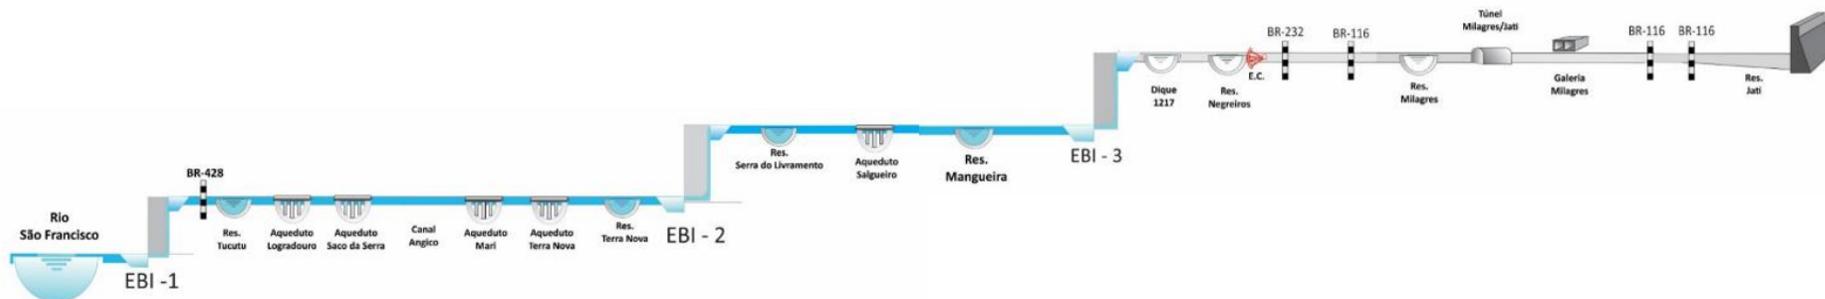

ESTRUTURA	SE-NI	EBI-1	Canal 1205	TUCUTU	EC. TUCUTU	Canal 1206	AQ. LOGRADOURO	Canal 1207	AQ. SACO DA SERRA	Canal 1208	CANAL ANGICO	Canal 1209	AQ. MARI	Canal 1210	AQ. TERRA NOVA	Canal 1211	TERRA NOVA	Canal 1212	EBI2	Canal 1213	SERRA DO LIVRAMENTO	EC. S. DO LIVRAMENTO	Canal 1214	
PENDÊNCIAS																				Válvulas				Vazões altas nos MVs
NÍVEL DE ATENÇÃO																								

ESTRUTURA	AQUEDUTO SALGUEIRO	Canal 1215	MANGUEIRA	Canal 1216	EBI3	Canal 1217 / DIQUE	NEGREIROS Dique	EC. NEGREIROS	Canal 1218	Canal 1219	MILAGRES	EC. MILAGRES	Canal 1220	TÚNEL MILAGRES - JATI	Canal 1221	GALERIA MILAGRES	Canal 1222	Ponte 1522	Canal 1223	Ponte 1523	Canal 1224	Ponte 1542	Ponte 1524	
PENDÊNCIAS					Válvulas		Vazões excessivas no MV 01			Percolação no canal	Instrumentação na barragem, Novo dique e Estrada Contorno					Execução da Galeria								
NÍVEL DE ATENÇÃO																								

Legenda: Estruturas

- no momento, NÃO apresenta pendência que possa interferir na retomada do bombeamento
- no momento, apresenta pendência que PODE interferir na retomada do bombeamento

Nível de atenção

- Ações seguindo o planejado
- Ações com desvio
- Ações com atraso que podem comprometer o prazo


EIXO NORTE

- Reservatório Negreiros – Atingiu cota mínima de operação (491,60m) em 03/01/2020;
- Dique WBS1217 – Recomposição do dique finalizado em Dez/2019 – Percolação abaixo do nível esperado (monitoramento constante);
- Percolação excedente no Dique Negreiros;
- Bombeamento Paralisado.

EIXO NORTE

- **Bombeamento paralisado;**
- **Válvulas EBI 02 e EBI 03 – Ordem de Compra para a aquisição de novas válvulas sobressalentes;**
- **Obras complementares em Serra de Livramento - Finalizadas;**
- **Vazamento no CN 10 – recuperados os pontos críticos, percolação elevada;**
- **Dique Negreiros – Percolação Excessiva, projeto de recuperação em aprovação**
- **Reservatório Milagres – novo Dique (concluído) e estrada de contorno (a concluir em 10/01/2020);**
- **Canal 1221 – Desemboque Túnel Milagres – Lençol freático alto. Previsão 22/02/2020.**

DIQUE NEGREIROS

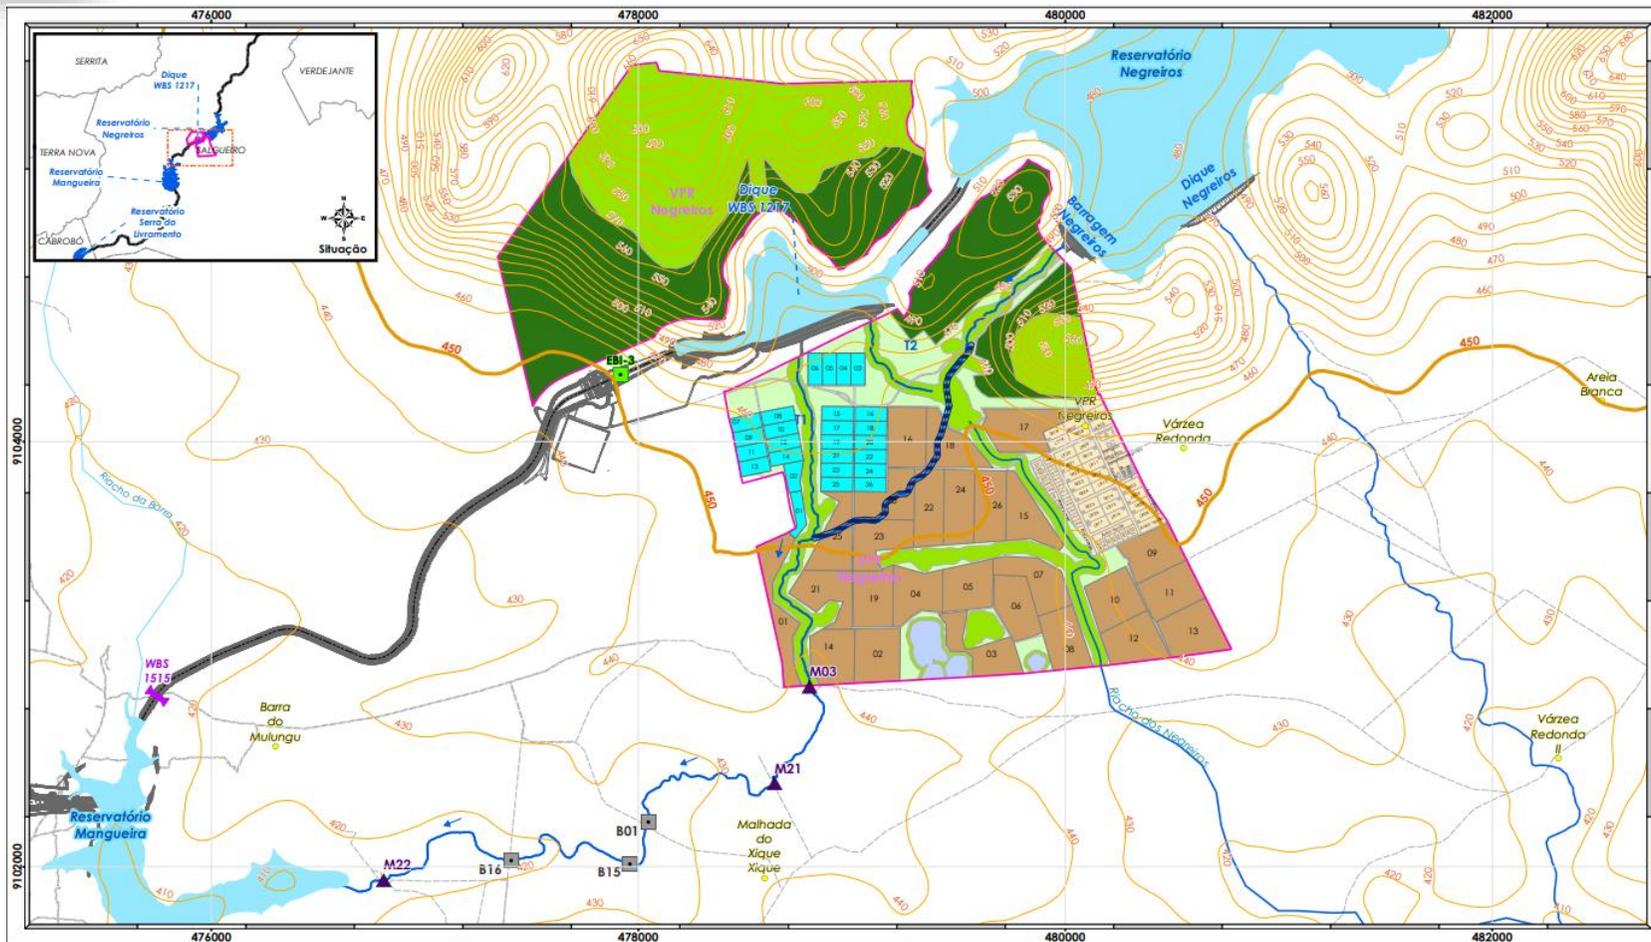

EIXO LESTE

- **Retomado o bombeamento em 09/11**
- **Iniciados testes na captação da adutora do Pajeú a jusante da EBV-06;**
- **Elaboração “serviços remanescentes” Eixo Leste – Edital em fase de encerramento**
- **Atividades de manutenção sendo realizadas normalmente pelo Consórcio Pré Operador;**

EIXO LESTE

- **Acesso à EBV-06 – Em fase de finalização pelo Consórcio Pré-Operador;**
- **Consórcio Pré-Operador irá realizar o ajuste da parede da tomada d'água do Reservatório Barro Branco (autuação ANA);**
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas – Consórcio Projetista detalhou solução. MDR e Gerenciadora fizeram comentários para serem incorporados ao Projeto;**
- **Necessário que Compesa disponibilize acesso a relatório de volumes captados para Adutora Moxotó – Arcoverde.**

RESERVATÓRIO DE CACIMBA NOVA

- Operando em cota de segurança (final de setembro);
- Licitação da investigação geológica por pregão eletrônico – 2 ° tentativa, concorrentes desabilitados
- Após investigação, caso necessário, será feita uma contratação à parte para execução do projeto apenas para o serviços de Cacimba Nova.



Network: 12 de jul de 2019 14:05:32 BRT
Local: 12 de jul de 2019 14:05:32 BRT
8°22'28,081"S -37°52'29,268"W



8°22'19,8349"S -37°52'15,8065"W
Cacimba Nova Ensaio de Resistividade (Geoffisica) E-140
16/09/2019 13:52

Obrigado!

