


**Legenda:**

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

**Tipos de Intervenção**

- A LICITAR
  - IMPLANTAÇÃO
  - CONTRATO ESPECÍFICO DE OAE
- 20,00 Km  
**TOTAL 20,00 Km**

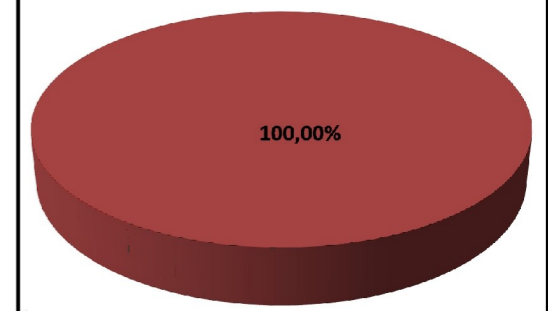

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Outubro de 2024

**Obras Diretas**

OBRA	ID PAC	ACAO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INICIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1		1248	Único	00 00389/2024	TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	BR-319	575,73	601,20	0	Elaboração dos projetos e execução das obras das pontes sobre os garapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio	11/07/2024	30/08/2026	R\$ 18.434.627,60	0%	Contratação integrada em fase de projetos. Aguardando definição quanto a delegação para contratação da supervisão.		
2		1248		00 00563/2024	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A	BR-319	198,20	218,20	20	Execução de remanescente do Lote C - Segmento 1	16/09/2024	04/03/2027	R\$ 157.474.150,00	0%	Entraves com o transporte dos insumos está impedindo o início das obras.		

**Obra a licitar**

A LICITAR	ID PAC	ACAO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	EDITAL SUPERVISÃO
L1		1248	BR-319	103,50	665,70	Prev 05 CONTR - BR319 AM			Termo de Referência em elaboração. Previsão de publicação do edital para final de out/24 ou início de nov/24.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
