

57°W 54°W 51°W

**MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO**

- Out - Nov - Dez
- Nov - Dez - Jan
- Dez - Jan - Fev




**Legenda:**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

**Tipos de Intervenção**



- IMPLANTAÇÃO 120,30 Km
- CONTORNO RODoviÁRIO 26,50 Km
- Total 146,80 Km**

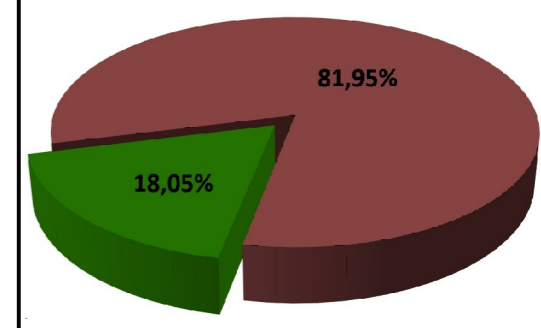

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Outubro de 2024

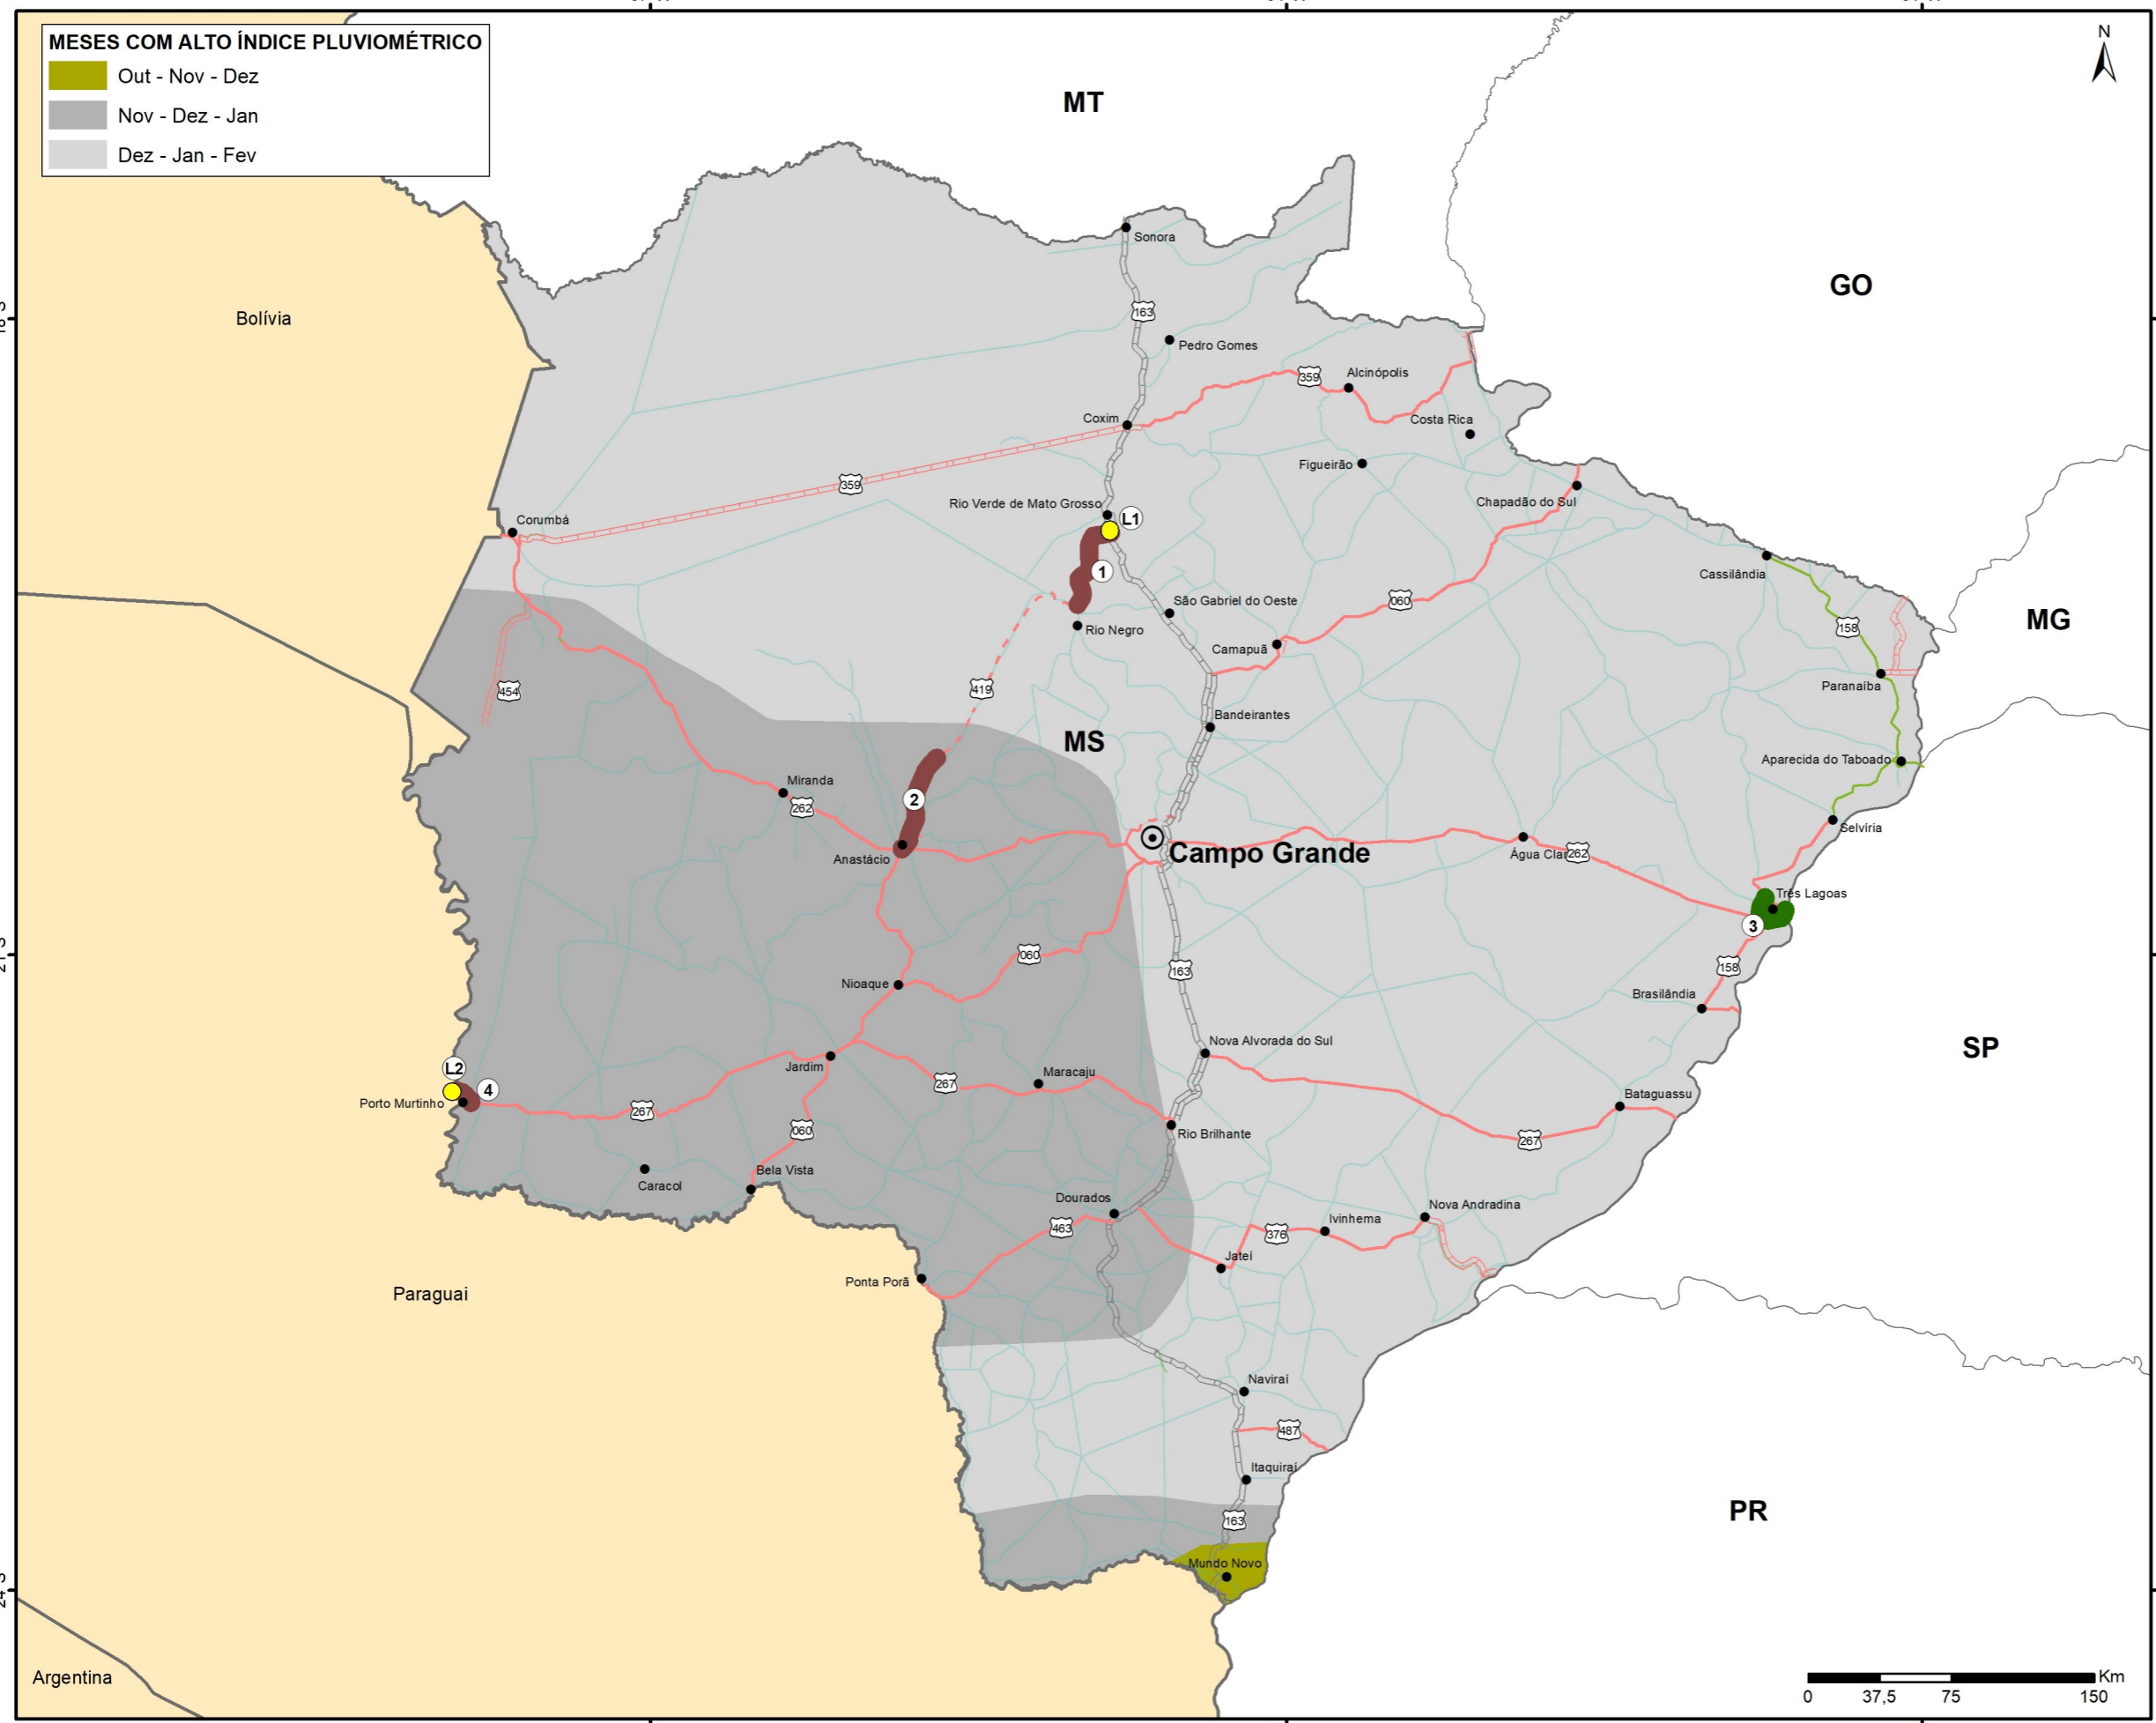

OBRA	ID PAC	ACAO	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INICIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC*	SITUAÇÃO DA OBRA (OUTUBRO 2024)	SUPERVISAO	EMPRESA SUPERVISORA
1	7S57	1	19 00587/2017	CONSORCIO CAIAPO / PAVISERVICE / GEOSISTEMAS	BR-419	11.30 63.80	52,5	Implantação da BR-419/MS	11/09/2017	24/08/2025	R\$ 154.402.938,31	96,35%	Obras paralisadas desde 06/2023. Há 52,5 km de pista pavimentada. Aguardando solução de RPFO para finalizar o contrato.	19 00716/2017	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISAO EIRELI	
2	2033	7X34	4	19 00194/2021	CONSORCIO CAIAPO/IME-BR-419/MS	BR-419	189.30 244.00	54,7	Implantação do Lote 4	29/06/2021	06/01/2026	R\$ 208.837.433,32	43,7%	Obra em andamento com previsão de entregar 10,7 km em TSD até dez/24. Há entraves com desapropriação e interferências no trecho entre as interseções 01 e 02.	19 00345/2022	CONSORCIO HOUER - ENECON/DNIT/MS
3	2031	7X34	Unico	19 00934/2020	CONSORCIO CONTORNO DE TRÉS LAGOAS	BR-262	0.00 16.20	16,2	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	10/09/2025	R\$ 200.861.908,18	36,75%	Obra em andamento com previsão de entregar 15,32 km de pavimento até dez/24. Desapropriação será solucionada até dez/24. Há 3 RPFOs em andamento.	19 00644/2021	CONSORCIO JDS - PROGA IA
3	2031	7X34	Unico	19 00934/2020	CONSORCIO CONTORNO DE TRÉS LAGOAS	BR-158	0.00 10.30	10,3	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	10/09/2025	R\$ 200.861.908,18	36,75%	Obra em andamento com previsão de entregar 15,32 km de pavimento até dez/24. Desapropriação será solucionada até dez/24. Há 3 RPFOs em andamento.	19 00644/2021	CONSORCIO JDS - PROGA IA
4	2030	7XG6	Unico	19 00758/2023	CONSORCIO PDC FRONTEIRA-PORTO MURTINHO	BR-267	678.10 691,20	13,1	Acesso à ponte internacional em Porto Murtinho	26/12/2023	26/05/2026	R\$ 475.294.735,77	0,04%	Contratação integrada em fase de projetos. Projetos de OAEs em análise na DPP. Há interferência com rede elétrica.	19 00142/2024	CONSORCIO JDS/ASTEC

A LICITAR	ID PAC	ACAO	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITACAO	DATA PUBLICACAO DOU	EDITAL	SITUACAO	EDITAL SUPERVISAO
L1	7S57	BR-163	670,9 671,4	Construção de OAE - Interseção BR-163/419					Está sendo elaborado o TR, previsão de licitação em novembro/24.	
L2	100006	7XG6	BR-267	Construção da Nova ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho - BR-267/MS					Ponte sendo executada pelo Governo do Paraguai	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
