

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

**Março/2019**


**Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado**

Alocação de Água -  
15/05/2018 - Espinosa-MG.

ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566  
comar@ana.gov.br

CBH-Verde Grande – Dirceu  
Colares -

Comissão Gestora da Bacia  
Hidrográfica do Rio Verde  
Pequeno – Juliana Santana  
Aranha - (77) 99119-5264

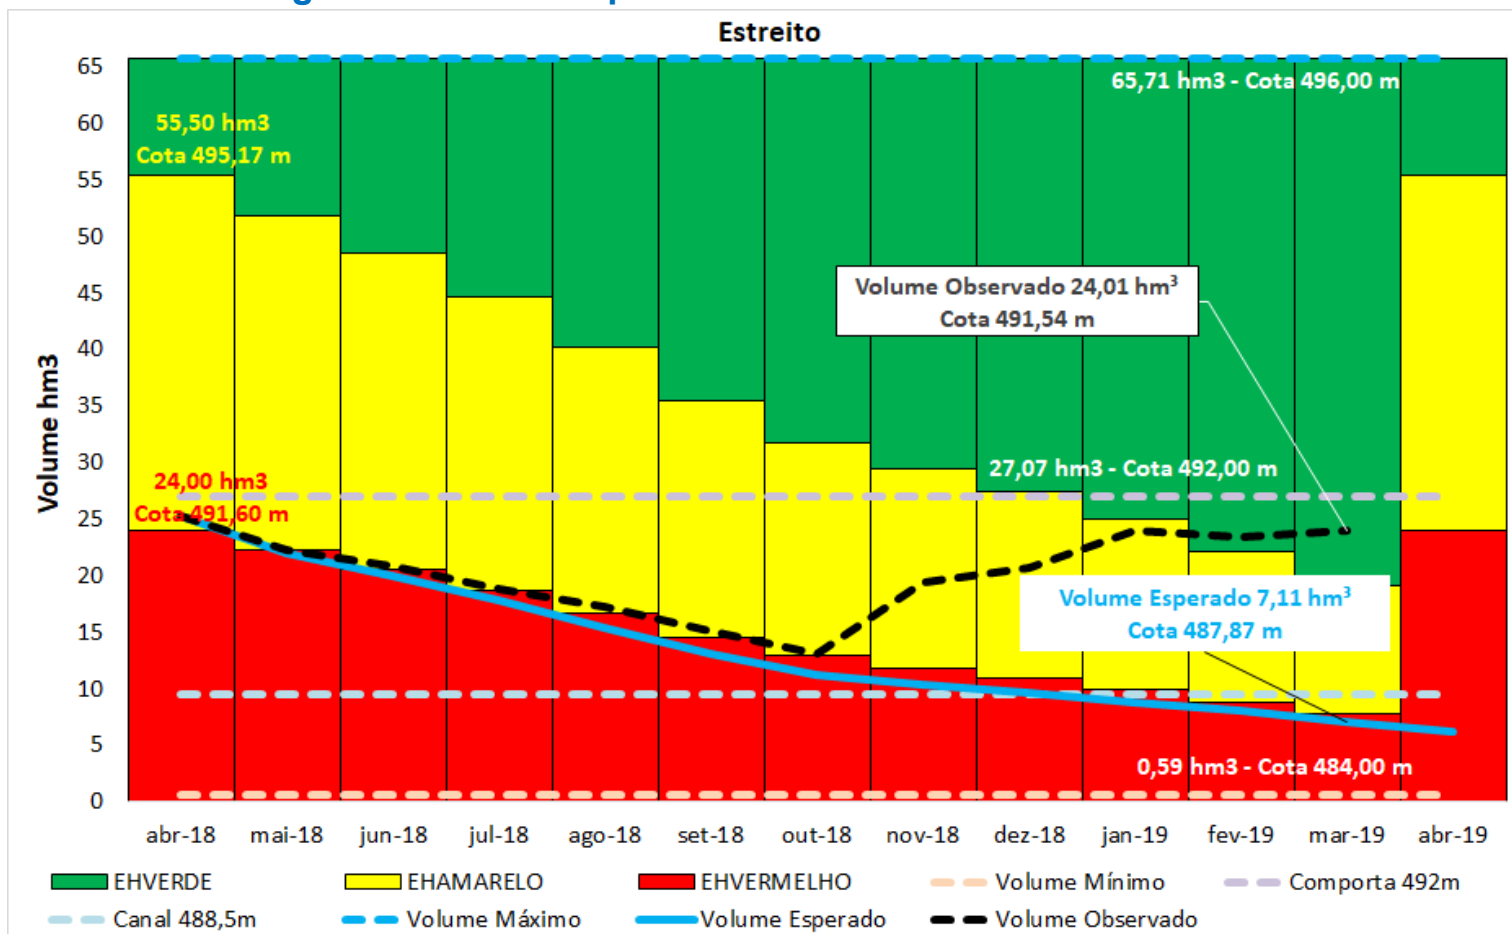

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
mai/18	22,04	22,31	set/18	13,15	15,14	jan/19	8,87	24,07
jun/18	20,01	20,85	out/18	11,28	13,10	fev/19	8,03	23,50
jul/18	17,79	18,83	nov/18	10,40	19,44	mar/19	7,11	24,01
ago/18	15,47	17,30	dez/18	9,67	20,73	abr/19	6,28	

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

**Março/2019**
**Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado**

Comissão para Deliberação  
sobre a Operação da Comporta  
de Controle do Canal Adutor  
entre os reservatórios:

Leonardo Franklin –  
CODEVASF

Fernando Roberto Santana –  
Entorno Estreito

Paulo Henrique Alves – Entorno  
Estreito

Luiz Henrique Garcia – Entorno  
Cova da Mandioca


Udson Angelo Tolentino –  
Entorno Cova da Mandioca

Cícero Davi (DIPE I)

João Carlos Soares (DIPE II)

Reinaldo Alve (DIPE III)

Robson Gualberto (DIPE IV)

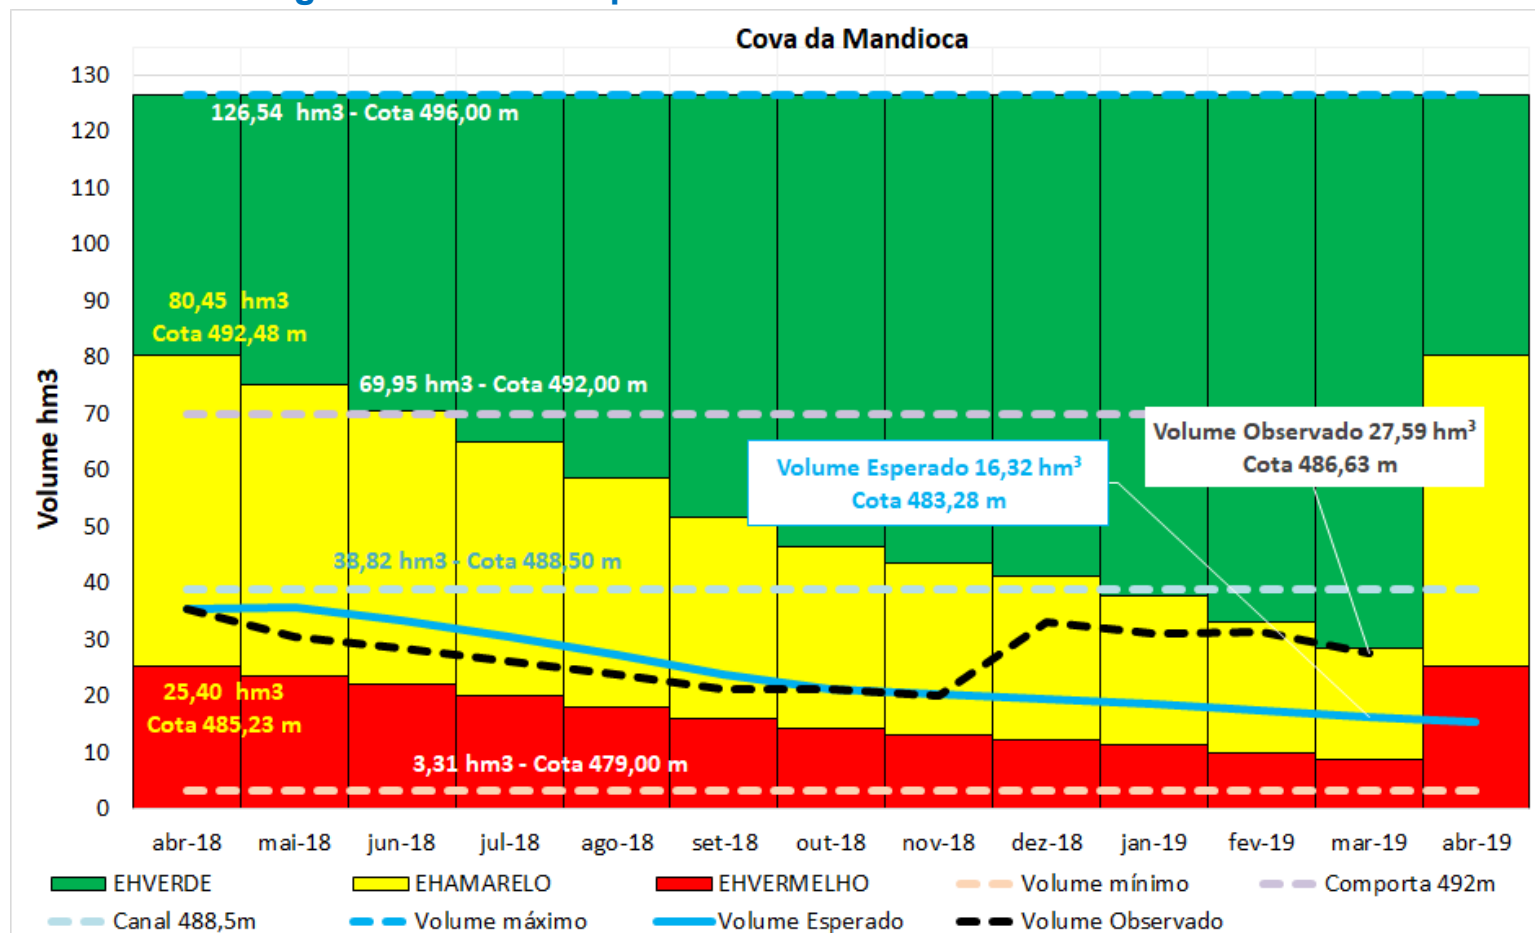

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
mai/18	35,64	30,57	set/18	23,98	21,34	jan/19	18,50	30,98
jun/18	33,36	28,44	out/18	21,27	21,09	fev/19	17,47	31,45
jul/18	30,63	26,04	nov/18	20,26	20,15	mar/19	16,32	27,59
ago/18	27,46	23,89	dez/18	19,46	33,18	abr/19	15,34	

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

**Março/2019**

## Usos Esperados - Açude Estreito

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano Espinosa	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Abastecimento humano núcleos I e II	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Irrigação DIPE I e II	206	166	212	259	297	219	16	12,7	33,3	51,7	59	45,8	131
Irrigação entorno Estreito	89,1	91,7	89,1	89,1	91,7	89,1	10	10	10	10	10	10	50
<b>Total</b>	<b>358</b>	<b>320</b>	<b>364</b>	<b>412</b>	<b>451</b>	<b>371</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>106</b>	<b>125</b>	<b>132</b>	<b>119</b>	<b>244</b>

## Usos Observados - Açude Estreito

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano Espinosa	61	59	57	62	64	60	59	58	59	66	SI		60
Abastecimento humano núcleos I e II	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0		3
Irrigação DIPE I e II	80	186	87	107	207	375	43,8	37,6	40,7	36,3	86		117
Irrigação entorno Estreito	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
<b>Total</b>	<b>&gt;= 144</b>	<b>&gt;= 247</b>	<b>&gt;= 147</b>	<b>&gt;= 172</b>	<b>&gt;= 274</b>	<b>&gt;= 437</b>	<b>&gt;= 106</b>	<b>&gt;= 98</b>	<b>&gt;= 103</b>	<b>&gt;= 105</b>	<b>&gt;= 89</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 180</b>

**SI - Sem Informação**

**Ocorrência de chuvas na região**

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

**Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.**

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

**Março/2019**

## Usos Esperados - Açude Cova da Mandioca

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano núcleos III e IV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Irrigação DIPE III e IV	430	346	443	542	620	458	33	26	69	108	123	96	275
Irrigação entorno Cova da Mandioca	96	99	96	96	99	96	11	10	10	11	10	11	54
<b>Total</b>	<b>529</b>	<b>449</b>	<b>542</b>	<b>641</b>	<b>722</b>	<b>557</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>122</b>	<b>137</b>	<b>109</b>	<b>332</b>

## Usos Observados - Açude Cova da Mandioca

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano núcleos III e IV	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0	3,0			3
Irrigação DIPE III e IV	357	299	216	175	312	688	63,2	295	162	158			273
Irrigação entorno Cova da Mandioca	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
<b>Total</b>	<b>&gt;= 360</b>	<b>&gt;= 302</b>	<b>&gt;= 219</b>	<b>&gt;= 178</b>	<b>&gt;= 315</b>	<b>&gt;= 691</b>	<b>&gt;= 66</b>	<b>&gt;= 298</b>	<b>&gt;= 165</b>	<b>&gt;= 161</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>0</b>

**SI - Sem Informação**

**Ocorrência de chuvas na região**

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

**Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.**

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cota dos reservatórios	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição de volumes captados pelo DIPE	DIPE	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados para Espinosa	COPASA	Mensal			
1.4	Publicação para consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação e funcionamento contínuo dos medidores de vazão dos canais do Perímetro Irrigado Estreito	CODEVASF	2018			<b>OBS. 4</b>
2.2	Instalação de régua de nível na comporta do canal adutor entre os reservatórios da cota 491 à 494	CODEVASF/ANA	jun/18	<b>OBS. 1</b>		
2.3	Batimetria (divulgação)	ANA	2018			
2.4	Instalação de hidrômetros nas captações do entorno dos reservatórios	Outorgados	jul/18		<b>OBS 2</b>	
<b>3</b>	<b>Regulação dos usos</b>					
3.1	Regularização dos usos conforme Marco Regulatório vigente	Outorgados	mai/18			
3.2	Fiscalização	ANA	contínua			
3.3	Atualização do CNARH com inclusão do número da unidade consumidora de energia elétrica	Outorgados	jun/18		<b>OBS 3</b>	
3.4	Estudo sobre ajuste novo Marco Regulatório tendo em vista as novas batimetrias	ANA	2019			

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Março/2019

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>				
4.1	Instalação da Estação de Tratamento de Água na rede de distribuição a partir do reservatório Cova da Mandioca para os núcleos habitacionais do DIPE	PM Urandi (BA)	2018		<b>OBS. 4</b>
4.2	Estudo sobre mananciais alternativos para atendimento a Espinosa	COPASA	2018		
4.3	Estudo sobre projeto para redução de perdas nos reservatórios do DIPE (Gabriela, etc.)	CODEVASF	2018		<b>OBS. 4</b>

### Observações:

- 1) As réguas foram instaladas em fevereiro de 2019.
- 2) Entre 17 e 21/09/2018 a ANA (Fiscalização) realizou vistoria *in loco* em 23 propriedades. Foi constatado que 6 usuários instalaram os medidores e 17 usuários não instalaram. Desses 17, 14 receberam advertência e notificados a instalar em até 45 dias. 4 desses já comunicaram que instalaram. O descumprimento do prazo de 45 dias implica em aplicação de multa. Outros 3 usuários não instalaram, mas não estão fazendo captações.
- 3) Os usuários outorgados para a finalidade de irrigação e/ou aquicultura e que possuam o benefício de desconto na tarifa de energia elétrica, deverão atualizar seu cadastro no sistema REGLA o número da unidade consumidora de energia elétrica (número da instalação constante na conta de energia elétrica). Os usuários que descumprirem essa determinação estão sujeitos às penalidades previstas em Lei.
- 4) Não há informações sobre o cumprimento destas atividades.
