



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Novembro/2018


Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Alocação de Água -
15/05/2018 - Espinosa-MG.

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566
comar@ana.gov.br

CBH-Verde Grande – Dirceu
Colares -

Comissão Gestora da Bacia
Hidrográfica do Rio Verde
Pequeno – Juliana Santana
Aranha - (77) 99119-5264

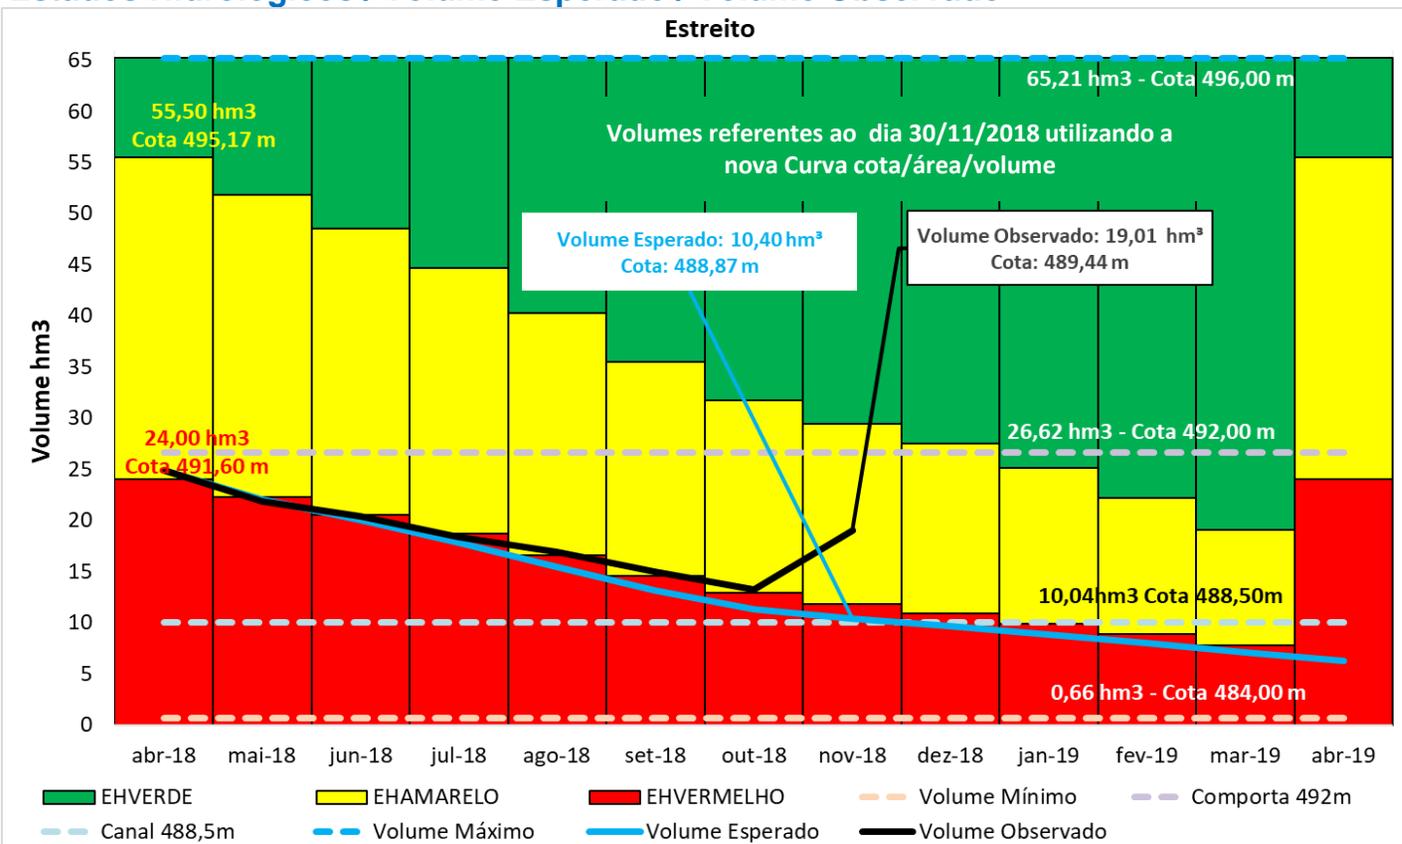

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/18	22,04	21,87	set/18	13,15	15,03	jan/19	8,87	
jun/18	20,01	20,41	out/18	11,28	13,27	fev/19	8,03	
jul/18	17,79	18,40	nov/18	10,40	19,01	mar/19	7,11	
ago/18	15,47	16,90	dez/18	9,67		abr/19	6,28	

Comissão para Deliberação sobre a Operação da Comporta de Controle do Canal Adutor entre os reservatórios:

Leonardo Franklin – CODEVASF

Fernando Roberto Santana – Entorno Estreito

Paulo Henrique Alves – Entorno Estreito

Luiz Henrique Garcia – Entorno Cova da Mandioca

Udson Angelo Tolentino – Entorno Cova da Mandioca

Cícero Davi (DIPE I)

João Carlos Soares (DIPE II)


Reinaldo Alve (DIPE III)

Robson Gualberto (DIPE IV)

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Novembro/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

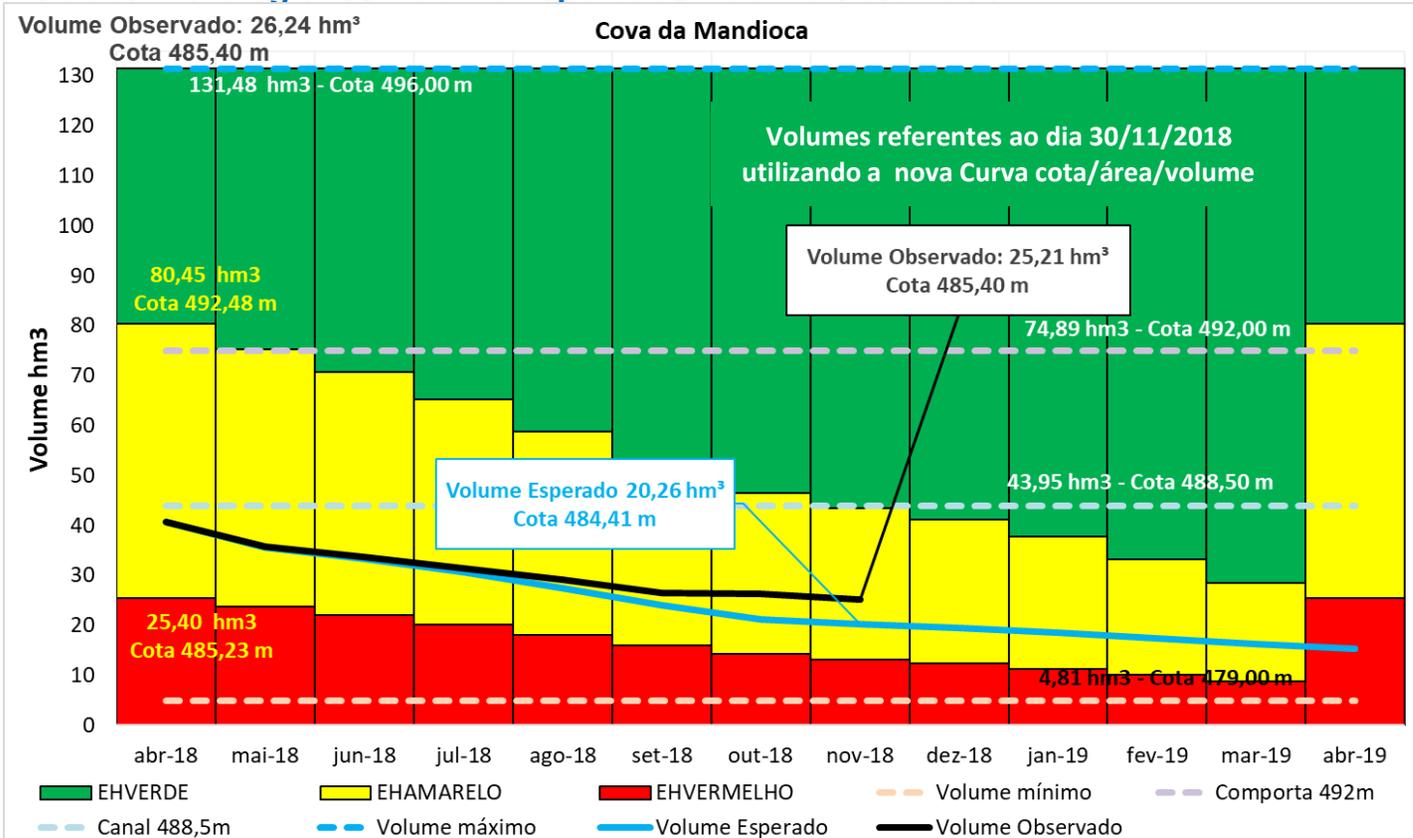

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
mai/18	35,64	35,85	set/18	23,98	26,50	jan/19	18,50	
jun/18	33,36	33,74	out/18	21,27	26,24	fev/19	17,47	
jul/18	30,63	31,34	nov/18	20,26	25,21	mar/19	16,32	
ago/18	27,46	29,16	dez/18	19,46		abr/19	15,34	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Novembro/2018

Usos Esperados - Açude Estreito

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano Espinosa	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Abastecimento humano núcleos I e II	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Irrigação DIPE I e II	206	166	212	259	297	219	16	12,7	33,3	51,7	59	45,8	131
Irrigação entorno Estreito	89,1	91,7	89,1	89,1	91,7	89,1	10	10	10	10	10	10	50
Total	358	320	364	412	451	371	89	86	106	125	132	119	244

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Observados - Açude Estreito

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano Espinosa	61	59	57	62	64	60	59						0
Abastecimento humano núcleos I e II	3	3	3	3	3	3	3						0
Irrigação DIPE I e II	80	186	87	107	207	375	43,8						0
Irrigação entorno Estreito	SI						0						
Total	>= 144	>= 247	>= 147	>= 172	>= 274	>= 437	>= 106	>= 0	0				

SI - Sem Informação

Ocorrência de chuvas na região

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Novembro/2018

Usos Esperados - Açude Cova da Mandioca

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano núcleos III e IV	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Irrigação DIPE III e IV	430	346	443	542	620	458	33	26	69	108	123	96	275
Irrigação entorno Cova da Mandioca	96	99	96	96	99	96	11	10	10	11	10	11	54
Total	529	449	542	641	722	557	47	40	83	122	137	109	332

Usos Observados - Açude Cova da Mandioca

Demanda/Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	Média
Abastecimento humano núcleos III e IV	3	3	3	3	3	3	3						3
Irrigação DIPE III e IV	357	299	216	175	312	688	63,2						302
Irrigação entorno Cova da Mandioca	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						SI
Total	>= 360	>= 302	>= 219	>= 178	>= 315	>= 691	>= 66	>= 0	0				

SI - Sem Informação

Ocorrência de chuvas na região

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Novembro/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cota dos reservatórios	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição de volumes captados pelo DIPE	DIPE	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados para Espinosa	COPASA	Mensal			
1.4	Publicação para consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação e funcionamento contínuo dos medidores de vazão dos canais do Perímetro Irrigado Estreito	CODEVASF	2018			
2.2	Instalação de régua de nível na comporta do canal adutor entre os reservatórios da cota 491 à 494	CODEVASF/ANA	jun/18			OBS 1
2.3	Batimetria (divulgação)	ANA	2018			
2.4	Instalação de hidrômetros nas captações do entorno dos reservatórios	Outorgados	jul/18		OBS 2	
3	Regulação dos usos					
3.1	Regulação dos usos conforme Marco Regulatório vigente	Outorgados	mai/18			
3.2	Fiscalização	ANA	contínua			
3.3	Atualização do CNARH com inclusão do número da unidade consumidora de energia elétrica	Outorgados	jun/18		OBS 3	
3.4	Estudo sobre ajuste novo Marco Regulatório tendo em vista as novas batimetrias	ANA	2019			

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES ESTREITO E COVA DA MANDIOCA

Novembro/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4	Outras ações				
4.1	Instalação da Estação de Tratamento de Água na rede de distribuição a partir do reservatório Cova da Mandioca para os núcleos habitacionais do DIPE	PM Urandi (BA)	2018		
4.2	Estudo sobre mananciais alternativos para atendimento a Espinosa	COPASA	2018		
4.3	Estudo sobre projeto para redução de perdas nos reservatórios do DIPE (Gabriela, etc.)	CODEVASF	2018		

Observações:

- 1) A ANA encaminhou as réguas. Em novembro houve tentativa de instalação, mas não foi possível concluir devido ao mal tempo.
- 2) Entre 17 e 21/09/2018 a ANA (Fiscalização) realizou vistoria *in loco* em 23 propriedades. Foi constatado que 6 usuários instalaram os medidores e 17 usuários não instalaram. Desses 17, 14 receberam advertência e notificados a instalar em até 45 dias. 2 desses já comunicaram que instalaram. O descumprimento do prazo de 45 dias implica em aplicação de multa. Outros 3 usuários não instalaram, mas não estão fazendo captações.
- 3) Usuários para irrigação e aquicultura que possuam medidor com tarifa com desconto noturno que não informaram o Número da Unidade Consumidora para o e-mail comar@ana.gov.br estão sujeitos às penalidades previstas em Lei.
