

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO
FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL**

**Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
SNSH/MDR**

julho - 2020

RESERVATÓRIO JATI

Cota: 456,85m 03de julho de 2020



Cota Atual: 481,16m



NÍVEIS DE CONTROLE

NÍVEL DE OPERAÇÃO	*NÍVEL D'ÁGUA	VOLUME (m³)
MÍN. MINIMORUM	474,12	14.367.198
MÍN. OPERACIONAL	483,45	23.829.066
MÁX. OPERACIONAL	486,72	27.707.405
MÁX. MAXIMORUM	487,79	29.288.339

*Fonte: 1377-NTC-3500-70-09-019-R00

SOLEIRA DO VERT.	487,15
SOLEIRA DO CAC	480,60
COTA DO COROAMENTO	488,80

LEITURA ATUAL

05/08/2020

N.A (m)	VOLUME (m³)	*CAP. %
481,16	21.347.820	77%


*Capacidade em relação ao N.A Máx. Operacional

N.A MÁXIMO ATINGIDO	DATA	05/08/2020
	N.A	481,16

STATUS DO NÍVEL DE ÁGUA ATUAL

Abaixo do Nível Mínimo Operacional

Histórico do Nível de Água do Reservatório

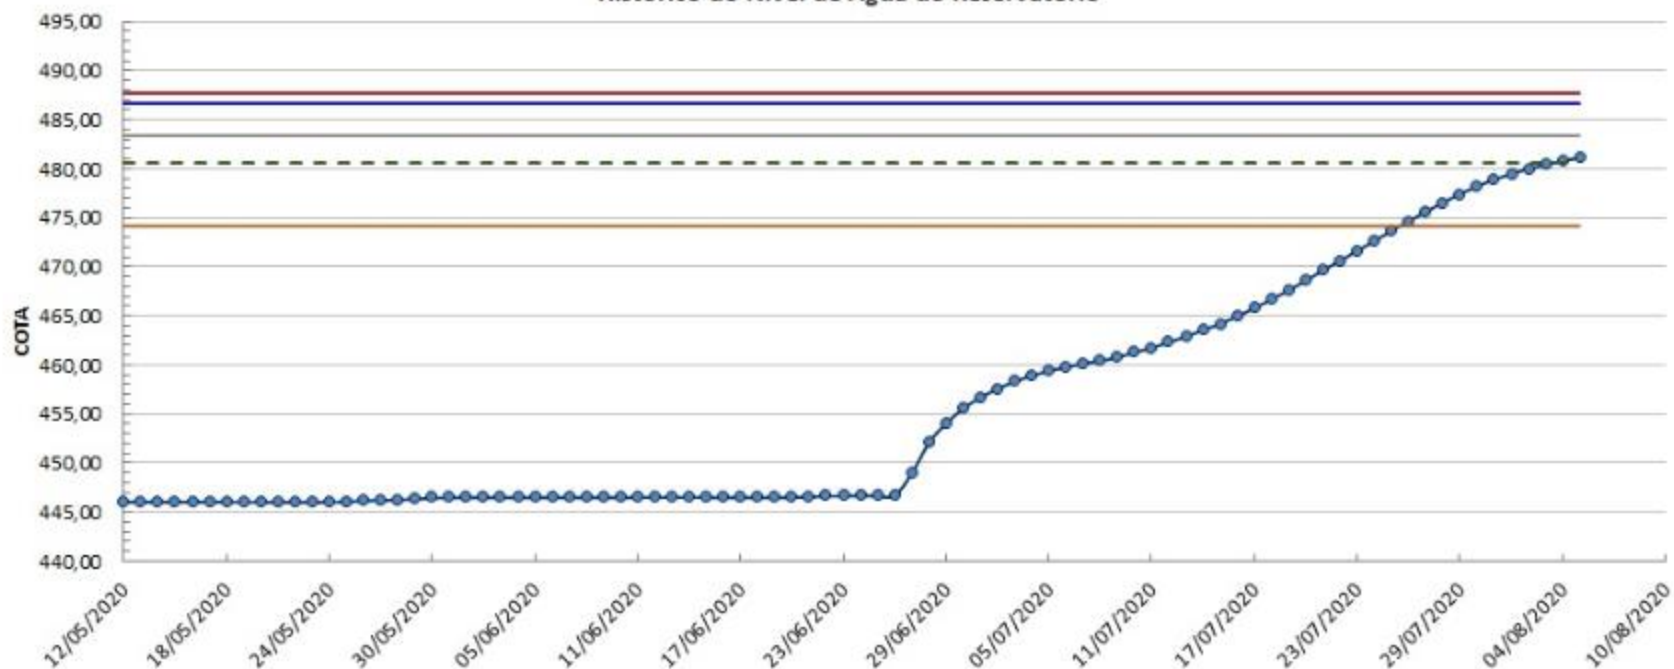

EIXO NORTE

- **Dique Negreiros** – Percolação dentro do limite aceitável (monitoramento constante). Projeto de aplicação das injeções apresentado em 05/05/20 – estão sendo realizadas sondagens complementares previsão de início da recuperação – 25/08/20
- **Vazamento no CN 10** – recuperados os pontos críticos, percolação ainda elevada. Estudos geofísicos foram realizados e será apresentado um plano de ação para correção até dia 20/08/20
- **Iniciada execução do Trecho Caiçara Ávidos – previsão fevereiro/21 (1º etapa)**
 - Contratado: Canal 1238, Ponte 1546 e “Rápido” 1382 – 29,32 % executado
 - A contratar: preparação do leito para os 53,44 m³/s (2º Etapa) – Consultoria Jurídica
- **Previsão de Enchimento do Eixo Norte.**
 - Reservatório Caiçaras – Junho/2021
 - Reservatório Morro – Março/2021

Derivação para Res. Eng° Ávidos



Derivação para Res. Eng° Ávidos



EIXO LESTE

- **Contratação de “serviços remanescentes” Eixo Leste** – analisado pelo Jurídico-lançamento da licitação prevista para esse mês.
- **Galeria WBS 2227 – recalque nos poços de visitas** – Análise de Nota Técnica pelo MDR. Projeto de recuperação definido
- **Cacimba Nova** – Os serviços de execução das sondagens estão em andamento
- **Atividades de manutenção sendo realizadas pelo Consórcio Pré Operador;**
- O Contrato da Pré Operação se encerra em agosto de 2020 e está em negociação com a Codevasf a continuidade dos serviços.

CACIMBA NOVA



Obrigado!

