


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

Agosto/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Alocação de Água -
26/07/2018 - Picos-PI

O MONITORAMENTO DAS
CONDIÇÕES DA
ALOCAÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO GESTORA DA
BARRAGEM DE BOCAINA

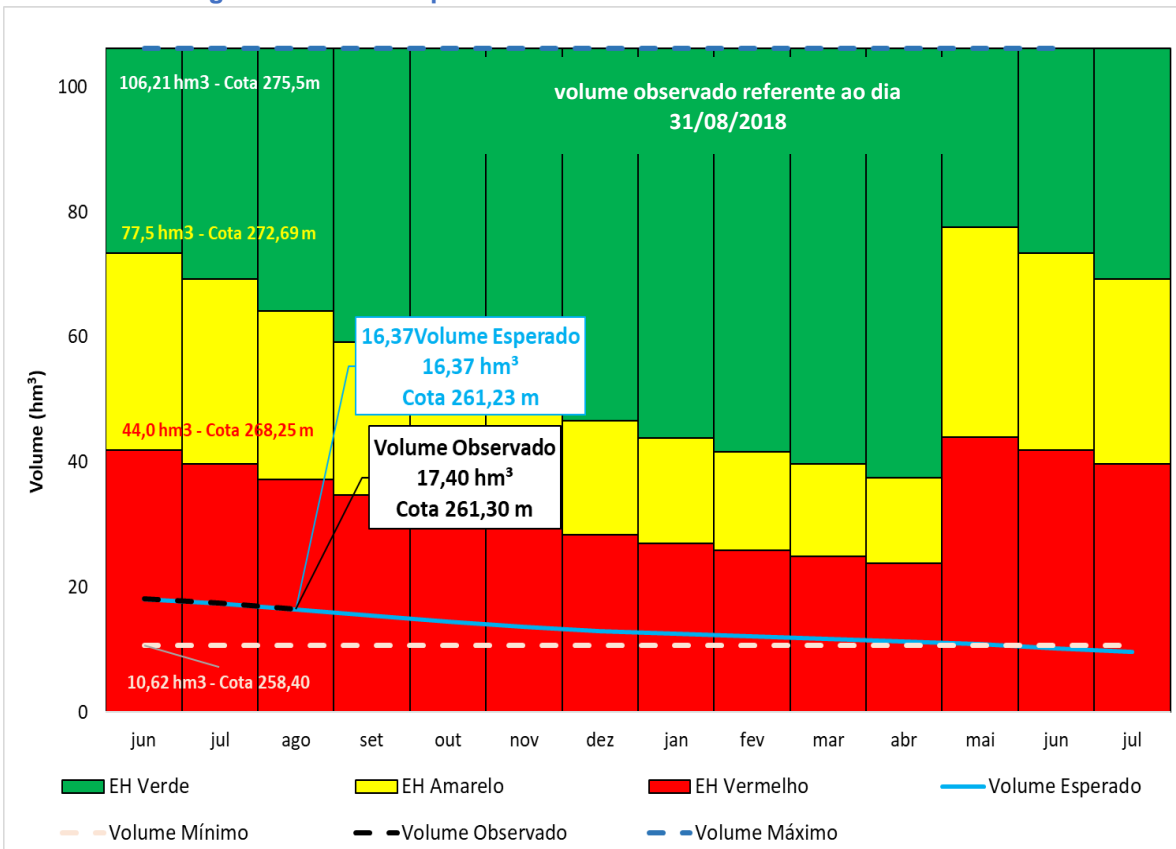

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
jul/18	17,38	17,40	dez/18	12,99		mai/19	10,83	
ago/18	16,37	16,52	jan/19	12,50		jun/19	10,25	
set/18	15,39		fev/19	12,10		jul/19	9,60	
out/18	14,43		mar/19	11,71				
nov/18	13,63		abr/19	11,31				

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

Agosto/2018

Alocação de Água -
26/07/2018 - Picos-PI

O MONITORAMENTO DAS
CONDIÇÕES DA
ALOCAÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO GESTORA DA
BARRAGEM DE BOCAÍNA

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais -
Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigação entorno Bocaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos jusante até riacho dos Cabaços	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Perenização até riacho dos Cabaços														
Usos riacho dos Cabaços até rio Itaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização riacho dos Cabaços até rio Itaim														
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

Usos Observados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	0	0												0
Irrigação entorno Bocaina	0	0												0
Usos jusante até riacho dos Cabaços	SI	75												75
Perenização até riacho dos Cabaços														
Usos riacho dos Cabaços até rio Itaim	SI	SI												SI
Perenização riacho dos Cabaços até rio Itaim														
Total	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75

SI - Sem Informação



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

Agosto/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição de cotas do açude	ANA	Diária		
1.2	Medição da vazão defluente (cota da estação fluviométrica a jusante do açude)	DNOCS	Semanal	OBS 3	
2	Instrumentação				
2.1	Recuperação emergencial da válvula dispersora a jusante do açude	DNOCS	Imediato	OBS 1	
2.2	Recuperação completa dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS	2018	OBS 1	
3	Regulação dos Usos				
3.1	Publicação do Marco Regulatório MR	ANA / SEMAR-PI	2018		
3.2	Regularização dos usuários	ANA / SEMAR-PI	180 dias após a publicação do MR		
4	Outras Ações				
4.1	Recuperação da via sobre a barragem visando evitar a continuidade da erosão oriunda de águas pluviais na ombreira direita	DNOCS / Pm de Bocaina	Imediato		OBS 4
4.2	Ações para proibição do tráfego de motocicletas no talude da barragem, causa de erosão inicial no maciço	DNOCS/SEMAR-PI/Comissão Gestora	Imediato		OBS 4
4.3	Relato sobre a situação da adutora do SIAA Bocaina	SEMAR-PI	Agosto de 2018	OBS 2	

Observações:

- 1) A válvula foi recuperada emergencialmente no início de agosto. O recursos para recuperação completa estão sendo disponibilizados pela ANA ao DNOCS. Previsão de apreciação pela Diretoria da ANA em setembro de 2018.
- 2) O DRH/SEMAR/PI informou que o projeto do Sistema Adutor Bocaina/Piauí está 70% executado e parado desde junho de 2015. A Caixa Econômica Federal está finalizando os ajustes das planilhas para que possa ser retomado.
- 3) Em 17/08/2018 foi realizada a abertura da válvula dispersora com a vazão de 75 L/s, segundo o DNOCS
- 4) Não há informações a respeito da realização destas atividades.
