



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CERAÍMA

Fevereiro/2018

Alocação de Água -
15/05/2017 - Guanambi BA

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Monitoramento da
Alocação de Água:

Lauleste Públio - CODEVASF –
(77) 99962-1193

Rogério Silva - EMBASA – (77)
3451-2061

João Batista Junior – INEMA –
(77) 3451-1241

Vanderlei Florêncio - Câmara de
Vereadores – (77) 99994-7448 /
3493-2053


Sebastião Batista - Ass.
Produtores do Bau – (77) 98815-
2680

Marco Antônio Fraga - Perímetro
Ceraíma - (77) 99994-7448 /
(77)3493-2053

Luzinaldo Correia Costa - Pref.
de Guanambi - (77) 3451-8705
99962 2851

Jairo Costa Fernandes - IF
Baiano - (77) 99115 8225 3493-
2100

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

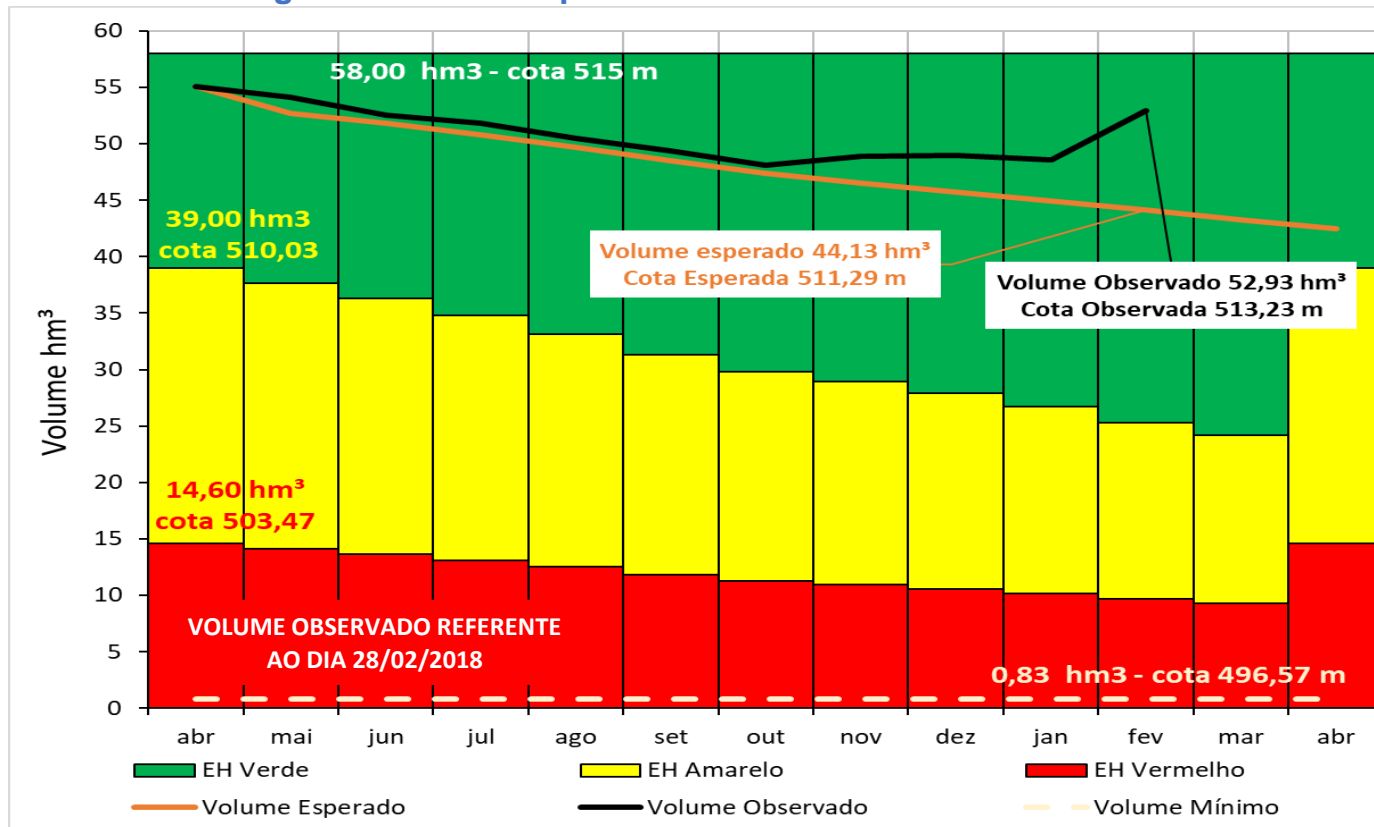

| Mês | Volume Esperado (hm ³) | Volume Observado (hm ³) | Mês | Volume Esperado (hm ³) | Volume Observado (hm ³) | Mês | Volume Esperado (hm ³) | Volume Observado (hm ³) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| mai/17 | 52,70 | 54,09 | set/17 | 48,48 | 49,38 | jan/18 | 44,93 | 48,60 |
| jun/17 | 51,80 | 52,55 | out/17 | 47,36 | 48,12 | fev/18 | 44,13 | 52,93 |
| jul/17 | 50,80 | 51,79 | nov/17 | 46,50 | 48,93 | mar/18 | 43,26 | |
| ago/17 | 49,67 | 50,49 | dez/17 | 45,72 | 48,94 | abr/18 | 42,44 | |

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CERAÍMA

Fevereiro/2018

Usos Esperados

| Usos (l/s) | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | média |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| SIAA Guanambi | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Irrigação Perímetro Ceraíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usos Entorno | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Demanda total | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |

Usos Observados

| Usos (l/s) | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | média |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| SIAA Guanambi | 44 | 34 | 38 | 39 | 38 | 59 | 50 | 47 | 58 | 41 | | | 45 |
| Irrigação Perímetro Ceraíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Usos Entorno | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | | SI |
| Demanda total | 44 | 34 | 38 | 39 | 38 | 59 | 50 | 47 | 58 | 41 | | | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|
| EMBASA - Adutora do Algodão | 240 | 245 | 227 | 230 | 236 | 229 | 208 | 206 | 190 | 205 | | | 222 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

VOLUME OBSERVADO REFERENTE AO DIA 23/02/2018.

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

[Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.](#)

Encaminhamentos da Alocação de Água

| Atividade | Responsável | Prazo / Periodicidade | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA |
|-----------|---|------------------------|--|---------|--------------|
| 1 | Monitoramento | | | | |
| 1.1 | Medição de cotas do reservatório | CODEVASF | Semanal | | |
| 1.2 | Medição dos volumes captados pela EMBASA (junto com a Comissão de Acompanhamento da Alocação) | EMBASA | Mensal | | |
| 1.3 | Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura | ANA | Anual | | |
| 2 | Instrumentação | | | | |
| 2.1 | Recuperação hidromecânica do açude Ceraíma | CODEVASF | 2017 | | Obs. 1) |
| 2.2 | Adequação do medidor e totalizador dos volumes captados pela EMBASA no açude Ceraíma | EMBASA | 2017 | Obs. 2) | |
| 2.3 | Instalação de réguas no reservatório | ANA | 2017 | Obs. 3) | |
| 2.4 | Batimetria | ANA | 2017 | | |
| 3 | Regulação de Usos | | | | |
| 3.1 | Regularização dos usos (inclusive do centro de aquicultura da CODEVASF) | ANA | 180 dias a partir da publicação do Marco Regulatório | | |
| 3.2 | Campanhas de fiscalização e treinamento sobre o DAURH | ANA | Imediata e sob demanda | | |
| 4 | Outras ações | | | | |
| 4.1 | Modernização do Pérímero Irrigado Ceraíma | CODEVASF / PM GUANAMBI | 2018 | | |
| 4.2 | Verificação da segurança da barragem e emissão de relatório | CODEVASF / INEMA | Imediato | | |

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1) A ANA transferiu os recursos à CODEVASF para concluir a recuperação hidromecânica da barragem.
- 2) Segundo a EMBASA (Nota Técnica nº 018/2018 encaminhada à ANA em 23/01/2018), o medidor de volumes captados foi instalado.
- 3) Levantamento topobatimétrico realizado. Os dados estão sendo trabalhados e serão divulgados em breve.
