



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - RESERVATÓRIO ZABUMBÃO

Julho/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Alocação de Água -
10/05/2018 - Paramirim -
BA.

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água

CODEVASF / 2ª SR - Sérgio
Roberto Alves Farias /
Leonardo Franklin

Carla Pedreira - EMBASA


Irrigante jusante (Paramirim) -
Manoel Cardoso Bomfim

Irrigante jusante (Caturama) -
Edivaldo da Cruz Silva

Prefeitura Municipal de
Paramirim - Antônio Carlos
Vieira Azevedo

Prefeitura Municipal de
Caturama - Gildásio Batista da
Silva

CBH PASO - Anselmo Barbosa
Caires

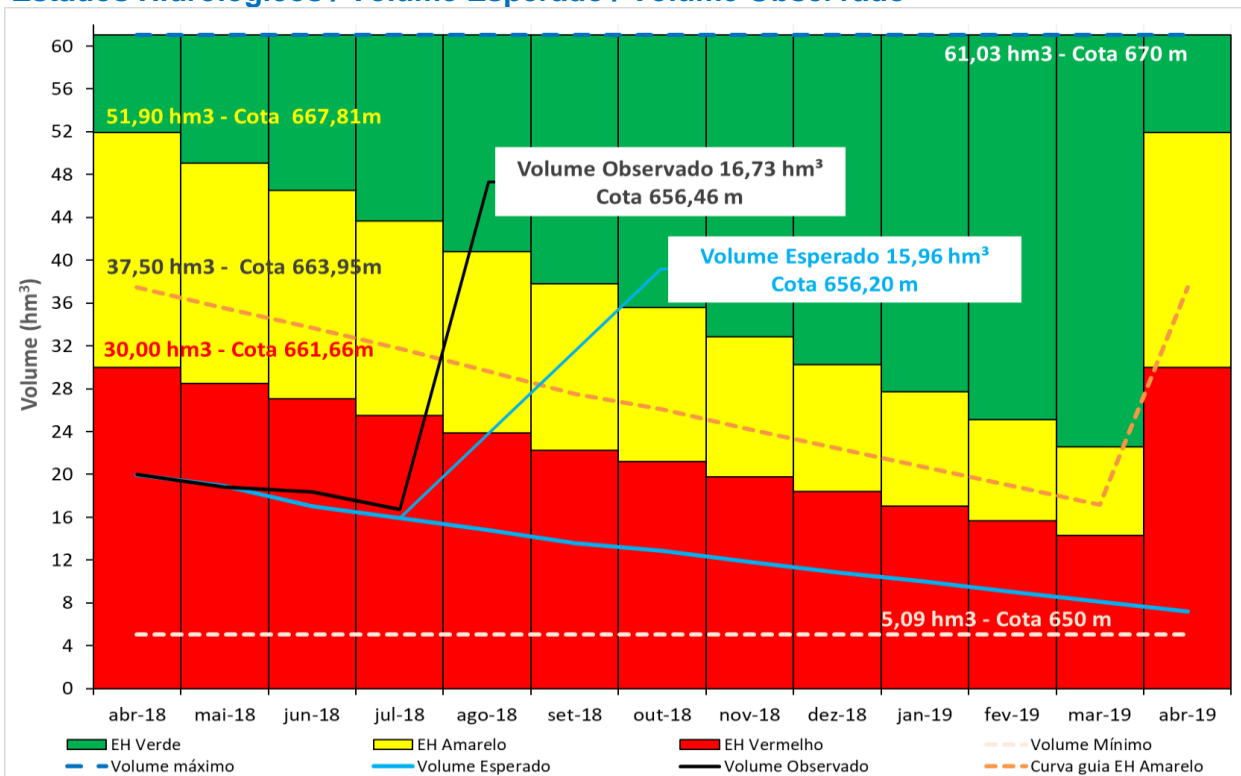

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/18	18,91	18,83	set/18	13,60		jan/19	10,00	
jun/18	17,07	18,38	out/18	12,85		fev/19	9,02	
jul/18	15,96	16,73	nov/18	11,83		mar/19	8,13	
ago/18	14,80		dez/18	10,84		abr/19	7,22	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - RESERVATÓRIO ZABUMBÃO

Julho/2018

Usos Esperados

Usos/Vazões (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público - Paramirim/Caturama	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Usos entorno açude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos Jusante	40	390	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	69
Perenização Jusante	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Total	291	641	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	320

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Observados

Usos/Vazões (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público Paramirim/Caturama	66	67	66										66
Usos entorno açude	SI	SI	SI										SI
Demais usos Jusante	SI	SI	187										187
Perenização Jusante													
Total	SI	67	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SI

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - RESERVATÓRIO ZABUMBÃO

Julho/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cota do reservatório	EMBASA / ANA	Semanal			
1.2	Medição das descargas a jusante da barragem	CODEVASF	Semanal		OBS 1	
1.3	Medição de volumes captados para abastecimento público	EMBASA	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de réguas limimétricas no canal de descarga da barragem Zabumbão	ANA / CODEVASF	Imediato		OBS 2	
2.2	Complementação da seção de réguas da barragem Zabumbão	ANA / INEMA	Imediato			
2.3	Calibração de curvas-chave para medição de descargas da barragem Zabumbão	CODEVASF	Em alterações de vazão ou a partir de nov/18		OBS 3	
2.4	Levantamento planimétrico dos regos existentes	PM Paramirim	Imediato			
2.5	Levantamento para melhoramento nas comportas dos regos do balneário até a última barragem da CODEVASF e encaminhamento de orçamento à ANA	CODEVASF / PM Paramirim e Caturama	Junho		OBS 3	
3	Regulação dos Usos					
3.1	Elaboração de proposta de Marco Regulatório - MR	ANA / INEMA	2018			
3.2	Regularização dos usos	ANA / INEMA	180 dias após publicação do MR			
3.3	Fiscalização dos usos	ANA / INEMA	Contínuo			



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - RESERVATÓRIO ZABUMBÃO

Julho/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4	Outras ações					
4.1	Levantamento e desobstrução do rio Paramirim até o Distrito de Feira Nova (Caturama)	Pm Paramirim e Caturama	Junho		OBS 3	
4.2	Reunião da Comissão de Acompanhamento sobre descargas a jusante	Comissão de Acompanhamento	Junho e Novembro			
4.3	Eletrificação rural do vale do Paramirim	ANA / SHIS	2018			
4.4	Tratamento de esgotamento sanitário Érico Cardoso	PM Érico Cardoso	2019			
4.5	Tratamento de esgotamento sanitário Paramirim	PM Paramirim	2019			

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Feito o ajuste pontual para a vazão de 187 l/s, a ser ajustada após a elaboração da curva chave da defluência.
- 2 Foi instalada régua encaminhada pela ANA logo a jusante da barragem, aguardando finalização da infraestrutura de medição a ser realizada com recursos da ANA.
- 3 Programada por ocasião da liberação do volume de 1 hm³, prevista a partir de 21 de agosto de 2018.
