


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SERRINHA II

Setembro/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 14/06/2018, Floresta-PE

O MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALOCAÇÃO SERÁ REALIZADO PELA COMISSÃO GESTORA DA BARRAGEM SERRINHA II

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

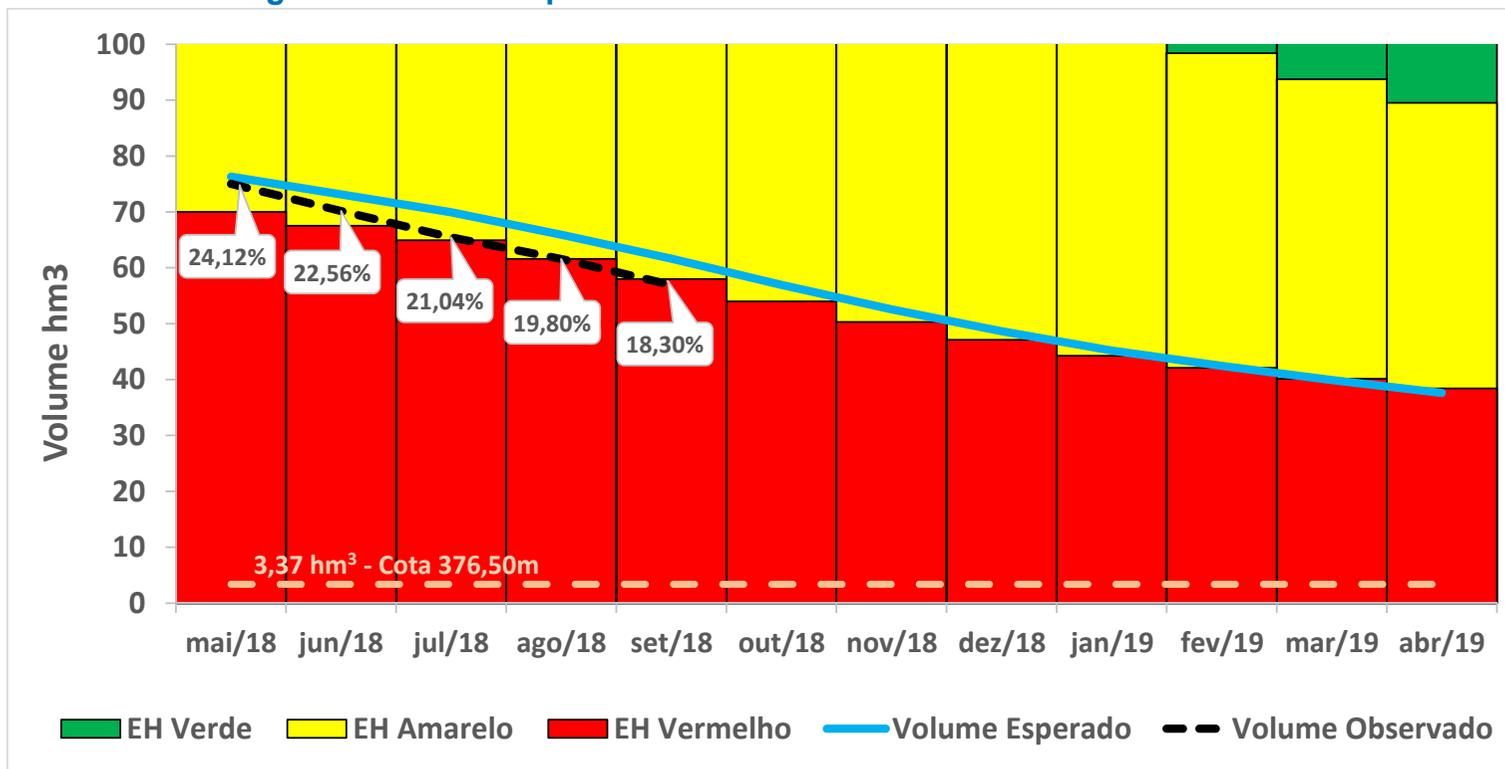

Mês	Volume esperado (hm ³)	OBSERVADO		Mês	Volume esperado (hm ³)	OBSERVADO		Mês	Volume esperado (hm ³)	OBSERVADO	
		Volume (hm ³)	Cota (m)			Volume (hm ³)	Cota (m)			Volume (hm ³)	Cota (m)
mai/18	76,31	75,03	386,15	out/18	56,95			mar/19	39,90		
jun/18	73,15	70,19	385,83	nov/18	52,58			abr/19	37,63		
jul/18	69,95	65,46	385,50	dez/18	48,68			mai/19	35,25		
ago/18	65,93	61,60	385,23	jan/19	45,21			jun/19	32,88		
set/18	61,66	56,93	384,89	fev/19	42,44						

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SERRINHA II

Setembro/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 09/08/2017, na Comunidade Serrinha II-PE.

O MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALOCAÇÃO SERÁ REALIZADO PELA COMISSÃO GESTORA DA BARRAGEM SERRINHA II

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	média
Entorno do reservatório	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Rio Pajeú a jusante														
Total	440													

Usos Observados

Usos (l/s)	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	média
Entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI										
Rio Pajeú a jusante														
Total	SI	SI	SI	SI										

SI - Sem Informação

Observações importantes:

1) A demanda média mensal em setembro/2018 foi estimada em **739 L/s** em função do balanço hídrico do reservatório, considerando a diferença entre os volumes em 31/08 e 30/09, a área média do espelho d'água no período e a evaporação de referência fornecida pela APAC para o mês de setembro (202 mm). Informações precisas quanto à descarga a jusante serão obtidas após a instalação de dispositivo de medição. **Todavia, essa é uma possível razão para o deplecionamento do açude à taxa maior que a esperada.**

2) Por meio do Ofício nº 446/DG, de 22 de agosto de 2018, a Diretoria Geral do DNOCS informa que está sendo atualizado o orçamento das obras de recuperação dos dispositivos hidromecânicos da Barragem Serrinha II (Processo SEI 59400.003448/2017-71), seguindo o projeto executivo elaborado no âmbito do contrato nº 08/2016-DNOCS/CEST-PE, pela empresa Acquatool Consultoria S/S LTDA.

3) De acordo com seu coordenador, Henrique G. Ferraz, o CONSU aguarda o apoio das prefeituras da região para a realização das atividades necessárias para a elaboração do Relatório.

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas do açude	ANA / APAC	Semanal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de régua e curva chave a jusante	ANA	2018			
2.2	Batimetria do açude	ANA	2019			
3	Regulação de usos					
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA / APAC	2018			
3.2	Regularização dos usuários	ANA / APAC	180 dias após a publicação do MR			
3.3	Apoio aos usuários para cadastramento e outorga de direito de uso junto à ANA (no açude) e à APAC (no rio Pajeú)	PM Serra Talhada e Floresta	180 dias após a publicação do MR			
4	Outras ações					
4.1	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	ANA / DNOCS	2018		OBS. 2	
4.2	Relatório sobre as 5 barragens a jusante no rio Pajeú com coordenadas, fotos e observações sobre o funcionamento e problemas de cada uma	CONSU	Julho 2018			OBS. 3
