


# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

**Janeiro/2019**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

 Alocação de Água -  
26/07/2018 - Picos-PI

O MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALOCAÇÃO SERÁ REALIZADO PELA COMISSÃO GESTORA DA BARRAGEM DE BOCAINA

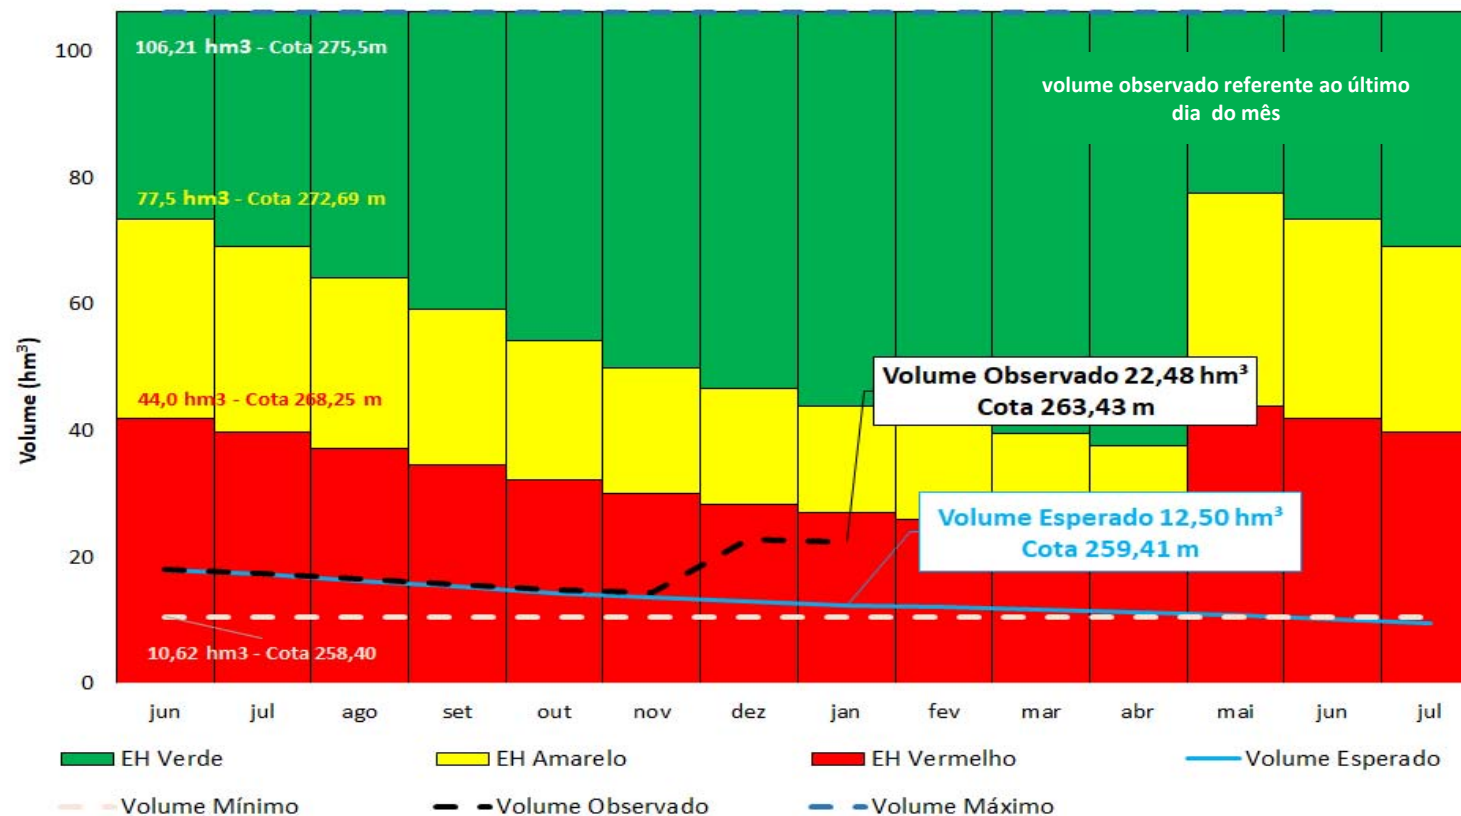

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
jul/18	17,38	17,40	dez/18	12,99	22,84	mai/19	10,83	
ago/18	16,37	16,52	jan/19	12,50	22,48	jun/19	10,25	
set/18	15,39	15,71	fev/19	12,10		jul/19	9,60	
out/18	14,43	14,98	mar/19	11,71				
nov/18	13,63	14,37	abr/19	11,31				

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

**Janeiro/2019**

Alocação de Água -  
26/07/2018 - Picos-PI

O MONITORAMENTO  
DAS CONDIÇÕES DA  
ALOCAÇÃO SERÁ  
REALIZADO PELA  
COMISSÃO  
GESTORA DA  
BARRAGEM DE  
BOCAINA

Regulação >>> Resoluções e  
Normativos >>> Regras  
especiais - Alocação de Água.

### Usos Esperados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigação entorno Bocaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos jusante até riacho dos Cabaços														
Perenização até riacho dos Cabaços	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Usos riacho dos Cabaços até rio Itaim														
Perenização riacho dos Cabaços até rio Itaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento público	0	0	0	0	0	0								0
Irrigação entorno Bocaina	0	0	0	0	0	0								0
Usos jusante até riacho dos Cabaços														
Perenização até riacho dos Cabaços	SI	75	209	150	0	0								87
Usos riacho dos Cabaços até rio Itaim														
Perenização riacho dos Cabaços até rio Itaim	SI	SI	SI	SI	SI	SI								SI
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>209</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>

**SI - Sem Informação**



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BOCAINA

Janeiro/2019

### Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas do açude	ANA	Diária			
1.2	Medição da vazão defluente (cota da estação fluviométrica a jusante do açude)	DNOCS	Semanal			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Recuperação emergencial da válvula dispersora a jusante do açude	DNOCS	Imediato	OBS 1		
2.2	Recuperação completa dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS	2018		OBS 1	
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Publicação do Marco Regulatório MR	ANA / SEMAR-PI	2018			
3.2	Regularização dos usuários	ANA / SEMAR-PI	180 dias após a publicação do MR			
<b>4</b>	<b>Outras Ações</b>					
4.1	Recuperação da via sobre a barragem visando evitar a continuidade da erosão oriunda de águas pluviais na ombreira direita	DNOCS / Pm de Bocaina	Imediato		OBS 1	
4.2	Ações para proibição do tráfego de motocicletas no talude da barragem, causa de erosão inicial no maciço	DNOCS/SEMAR-PI/Comissão Gestora	Imediato			OBS 2
4.3	Relato sobre a situação da adutora do SIAA Bocaina	SEMAR-PI	Agosto de 2018	OB3		

#### Observações:

- 1) A válvula foi recuperada emergencialmente no início de agosto. Em 10/12/2018 foram iniciados os Serviços de Recuperação da Barragem Bocaina. A válvula encontra-se fechada desde 07/12/2018.
- 2) Não há informações a respeito da realização desta atividade
- 3) Segundo informações do DRH/SEMAR/PI, o projeto do Sistema Adutor Bocaina/Piaus está 70% executado e parado desde junho de 2015. A Caixa Econômica Federal está finalizando os ajustes das planilhas para que possa ser recommçado.
