



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE TRUVISCO

**Novembro/2018**

Alocação de Água -  
11/05/2018 - Rio do  
Antônio - BA.

ANA – Coordenação de  
Marcos Regulatórios e  
Alocação de Água – (61) 2109-  
5566

Comissão de  
Acompanhamento da  
Alocação de Água

DNOCS / Livramento de Nossa  
Senhoa

Carla Pedreira - EMBASA -  
(77) 3454-8400

Jean Vitor Pereira- INEMA -  
(77) 3454-3738

Gabriel Romano Carvalho  
Onofre - SINTRAF Caculé -  
(77) 98105-7392


Antônio de Souza Lima -  
Sociedade Civil Rio do  
Antônio - (77) 98852 - 1924

Representante da Sociedade  
Civil de Guajeru

Prefeitura Municipal de Caculé

Prefeitura Municipal de Rio do  
Antônio  
Prefeitura Municipal de

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

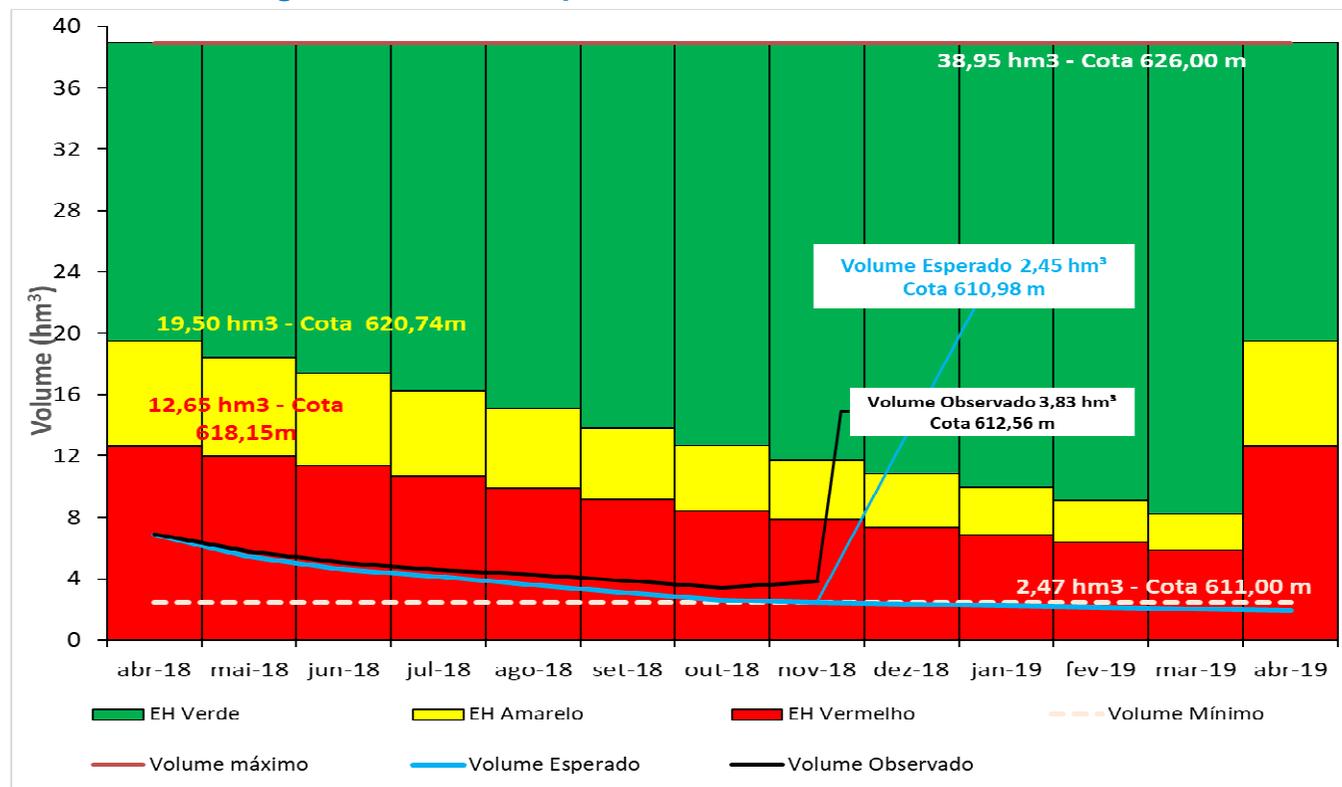

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/18	5,42	5,75	set/18	3,06	3,86	jan/19	2,24	
jun/18	4,62	5,03	out/18	2,58	3,41	fev/19	2,14	
jul/18	4,12	4,56	nov/18	2,45	3,83	mar/19	2,03	
ago/18	3,60	4,26	dez/18	2,35		abr/19	1,93	



## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição do nível da água no reservatório Truvisco (cotas)	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição do nível de água no reservatório Lagoa da Horta (cotas) e dos volumes captados	EMBASA	Semanal			
1.3	Medição de vazões defluentes do reservatório Truvisco	ANA	Diária			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados	EMBASA	2018			
2.2	Instalação de réguas complementares no açude Truvisco (cota 616 e abaixo da cota 614)	ANA	Imediato			
2.3	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos na barragem Truvisco	DNOCS com apoio e articulação da ANA	Imediato		<b>OBS 1</b>	
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Fiscalização do rio e do reservatório Lagoa da Horta	INEMA com apoio das PM de Caculé, Rio do Antônio e Guajeru	Imediato e contínuo			
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>					
4.1	Levantamento e desobstrução do leito do rio do Antônio para facilitar enchimento do Lagoa da Horta	Prefeituras Municipais de Caculé, Rio do Antônio e Guajeru	Imediato			<b>OBS 2</b>
4.2	Mapeamento das comunidades rurais abastecidas com água bruta no trecho do rio entre os dois açudes (nome, localização e população estimada)	Comissão de Acompanhamento da Alocação	Imediato			<b>OBS 3</b>
4.3	Construção e operação da adutora para abastecimento público a partir do Truvisco ao Lagoa da Horta	EMBASA	1º semestre de 2019			

**Novembro/2018**

## **OBSERVAÇÕES RELEVANTES**

- 1 Serviços em andamento. Previsão de finalização em dezembro de 2018.**
- 2 Não foram enviadas informações a reste respeito.**
- 3 Não foram enviadas informações a reste respeito.**
- 4 Devido ao baixo nível d'água do reservatório Lagoa da Horta, o SIAA Rio do Antônio - Ibitira e o SAA Guajerú estão sendo atendidos pelo reservatório Comocoxico (Caculé-BA).**
