

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

ANAGÉ

ANAGÉ

BA


2019-2020

09/05/2019



AÇUDE ANAGÉ

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

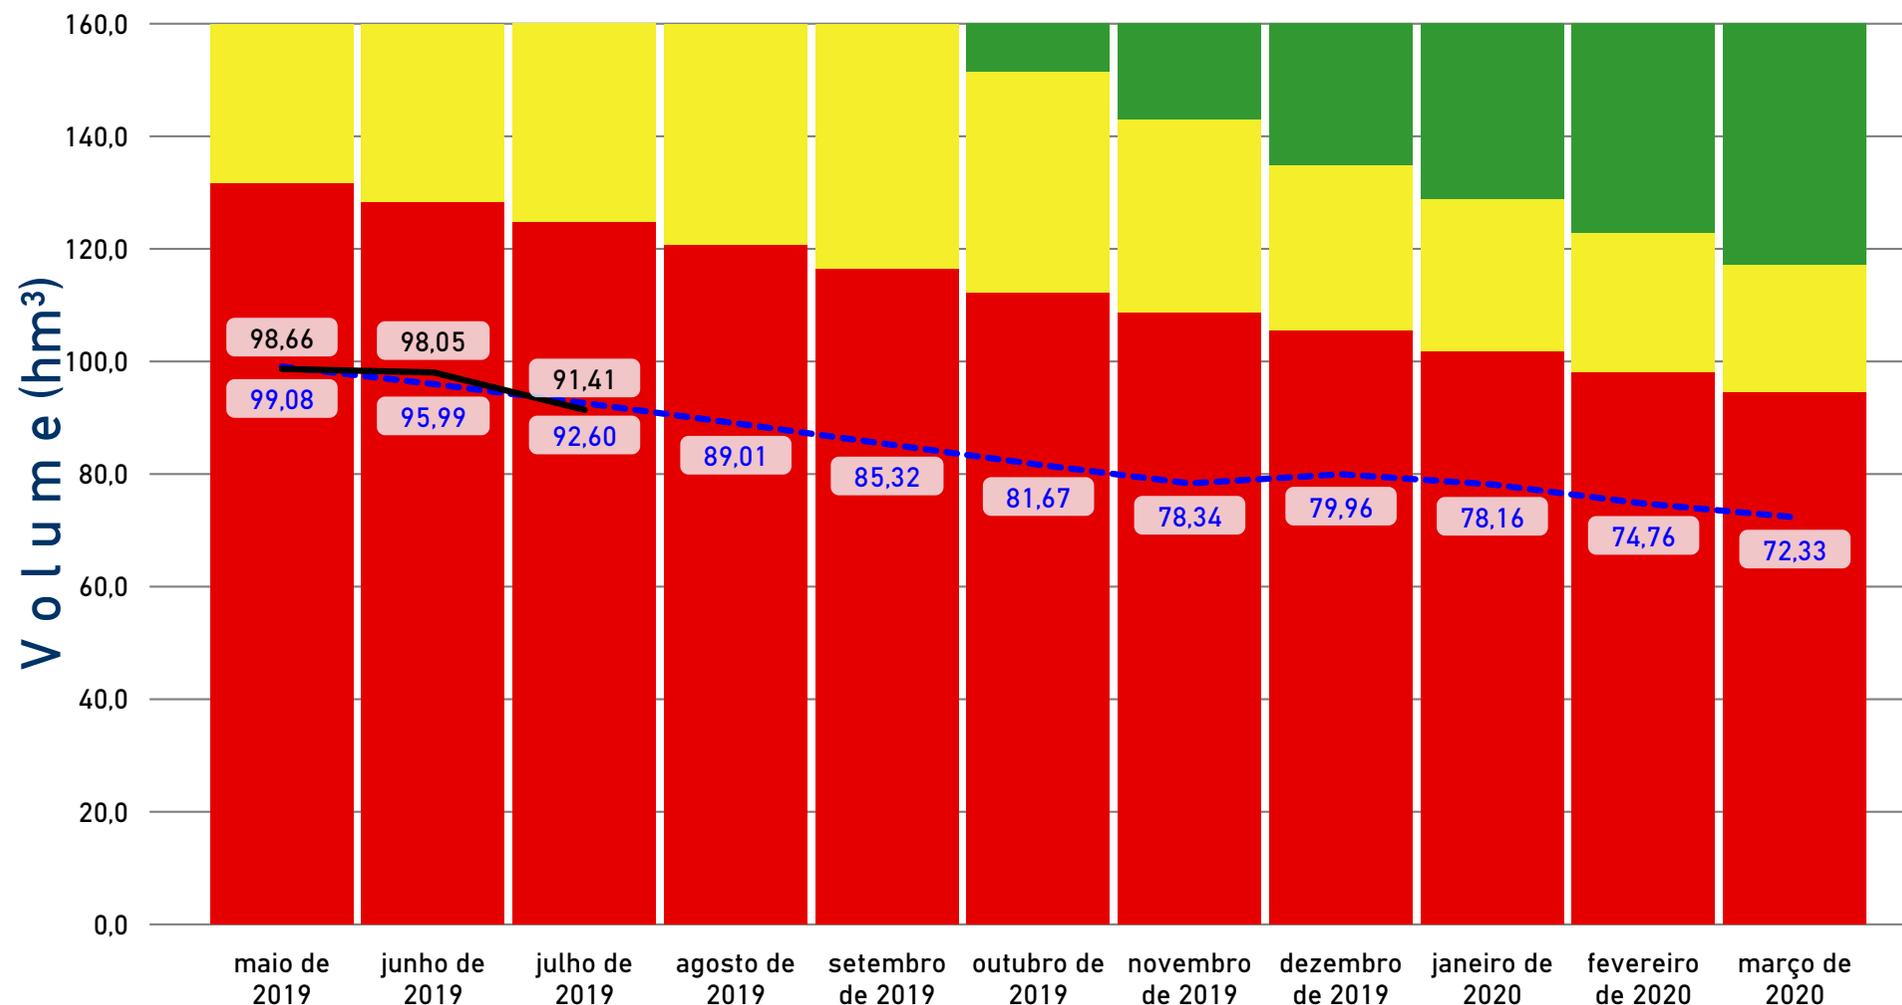

Datas	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
maio de 2019	403,10	99,08	403,06	98,66
junho de 2019	402,79	95,99	201,85	98,05
julho de 2019	402,45	92,60	402,33	91,41

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO	LOCAL:	UF:	ALOCAÇÃO:	DATA DA REUNIÃO:
ANAGÉ	ANAGÉ	BA	2019-2020	09/05/2019



CONSUMOS ESPERADOS (L/s)

Item	Finalidade	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
1	Abastecimento público no Reservatório	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
2	Abastecimento público no rio Gavião (SAA Caetanos)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Demais usos no reservatório	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
4	Descarga a jusante (usos e vazão de perenização, exceto SAA Caetanos)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5	Uso excepcional a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		853,00											

CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

Item	Finalidade	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
1	Abastecimento público no Reservatório	15,84	15,13	15,00									
2	Abastecimento público no rio Gavião (SAA Caetanos)	4,93	4,86	4,75									
3	Demais usos no reservatório												
4	Descarga a jusante (usos e vazão de perenização, exceto SAA Caetanos)	473,08	432,77	426,52									
5	Uso excepcional a jusante	0,00	0,00	0,00									
Total		493,86	452,77	446,28									

LEGENDA	
	SEM INFORMAÇÃO

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

ANAGÉ

ANAGÉ

BA

2019-2020

09/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ITEM	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO/FREQUENCIA	DESEMPENHO	OBSERVAÇÕES
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório	DNOCS/ANA	Diária	REALIZADA	
1.2	Medição de volumes captados para abastecimento público	EMBASA	Mensal	REALIZADA	
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno - 2018	ANA	30 dias	NÃO REALIZADA	
1.4	Medição do nível da régua na saída da barragem (estação fluviométrica Anagé Jusante)	ANA	Diária	REALIZADA	
1.5	Medição do nível da régua a jusante da captação de caetanos	EMBASA	Diária (envio semanal)	REALIZADA	
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Instalação de hidrômetros para todas as captações outorgadas	Usuários outorgados	Urgente	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
2.2	Encaminhamento da relação de outorgados no rio Gavião para a Comissão Gestora, com dados cadastrais e de uso (área irrigada e vazão)	INEMA	Urgente	NÃO REALIZADA	
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Adequação da captação de água para Caetanos	EMBASA	Urgente	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
3.2	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos do açude Anagé (envio à ANA)	DNOCS	Urgente	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	A ser contratado no âmbito do PROSB (R\$ 3,5 milhões)
3.3	Solicitação de informações ao Exército Brasileiro sobre os volumes mensais retirados do reservatório Anagé por carros-pipa	ANA	30 dias	NÃO REALIZADA	

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

ANAGÉ

LOCAL:

ANAGÉ

UF:

BA

ALOCAÇÃO:

2019-2020

DATA DA REUNIÃO:

09/05/2019



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
André Ribeiro de Castro	EMBASA	(77) 3423-9733
Deisy Rocha Farias	EMBASA	(77) 3423-9712
Glauber Oliveira	INEMA	(77) 98111-7902
Nikitas Ferraz Chatzivagiannis (Coordenador)	Irrigante Montante	(77) 98852-8505
Pedro Antônio O. Lima (Coordenador)	DNOCS	(77) 99915-4514
Ygo Bispo (Coordenador)	Usuário	(77) 98802-1011

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)
