


Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

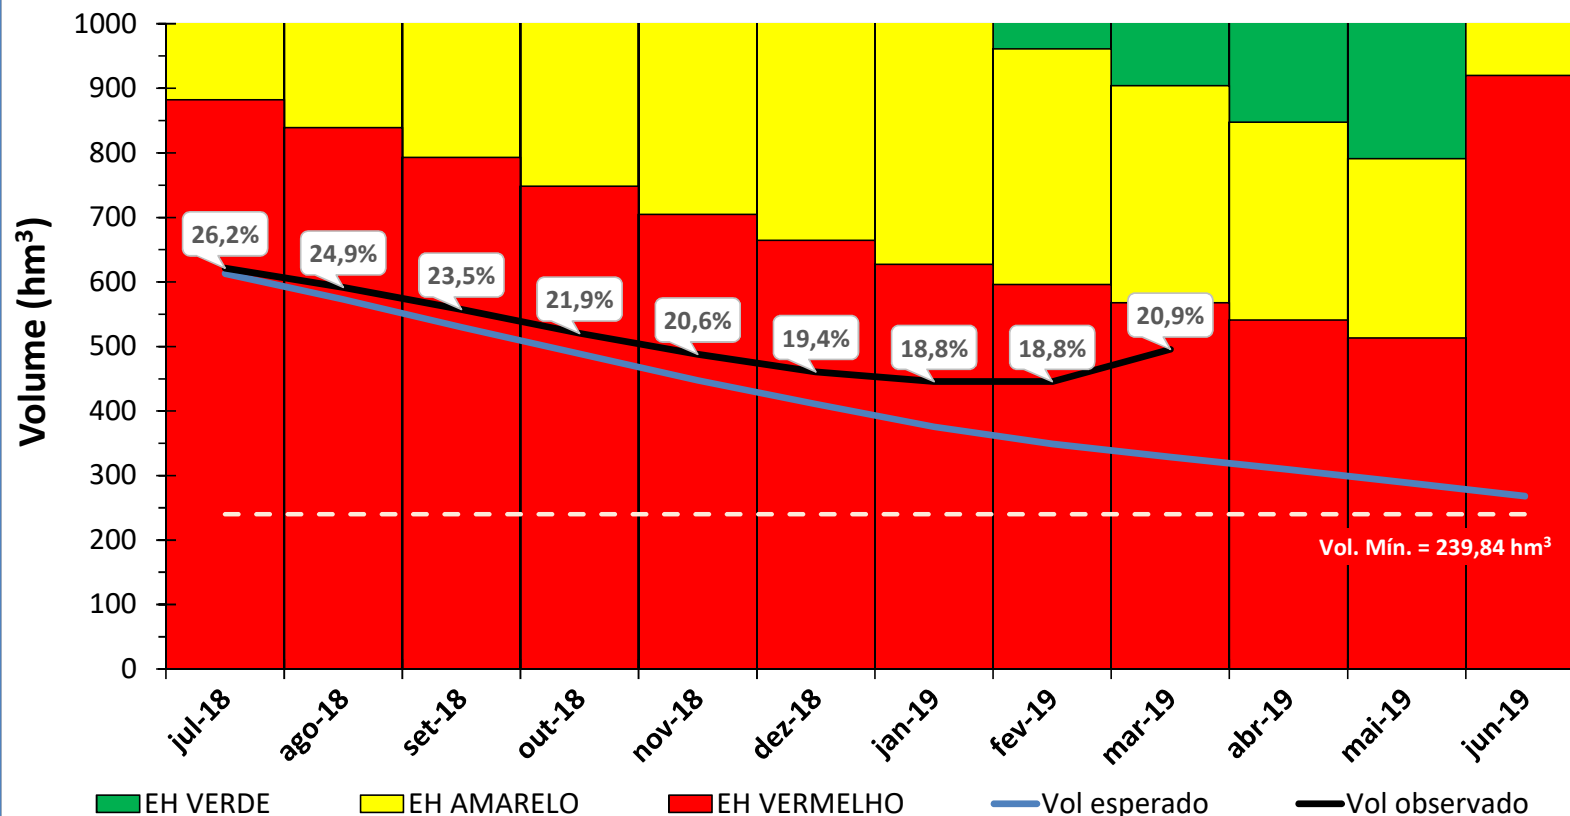

MÊS	Volume Esperado (hm ³)	OBSERVADO		MÊS	Volume Esperado (hm ³)	OBSERVADO		MÊS	Volume Esperado (hm ³)	OBSERVADO	
		Volumes (hm ³)	Cotas (cm)			Volumes (hm ³)	Cotas (cm)			Volumes (hm ³)	Cotas (cm)
jul/18	612,95	621,29	41,24	nov/18	447,47	487,85	39,44	mar/19	328,91	495,49	39,55
ago/18	572,83	591,58	40,86	dez/18	410,45	460,68	39,04	abr/19	309,31		
set/18	529,60	557,48	40,41	jan/19	375,28	445,49	38,81	mai/19	289,26		
out/18	488,32	520,22	39,90	fev/19	349,15	445,49	38,81	jun/19	268,00		

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 18/07/2018, em Assu-RN

COMAR – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

- **José Procópio de Lucena** - CBH-PPA – José Procópio de Lucena – (84) 3417-2959
- **Rafael Mendonça** - DNOCS – (84) 99667-6065
- **Radimilla Avelino** - IGARN – (84) 98837-8340
- **Jairo dos Santos** - CAERN – (84) 99986-6797
- **Salatiel Venâncio** - CAERN - (84) 98108-1520
- **Francisco Pereira** - Conselho de Desenv. Rural Sustentável – (84) 98826-8216
- **Marcílio Macedo** - DIBA – (84) 99906-9981

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES

MARÇO / 2019

- **Daniel Henrique** - Del Monte - (85) 99404-5011
- **Evaldo Bezerra** - Finobrasa - (84) 99138-4237
- **Renato Augusto Faria de Araújo** - Petrobrás - Gerente UTE-JSP (84) 99972-5477
- **Edeweis Rodrigues de Carvalho Jr** - Petrobras - (84) 3235-3590
- **Sérgio Campiolo** - Usuário Aquicultura - (84) 98847-4266
- **Camilo Vinicius** - Pref. de Macau - (84) 99945-3621
- **Alexandre Douglas de Souza** - Pref. Assu - (84) 99710-2770

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abast. Púb. no lago	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Demais usos no lago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abast. Púb. Canal Pataxó	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Demais usos Canal Pataxó	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717
Abast. Púb. Jusante	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586
Demais Usos Jusante	4.414	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	3.614	2.614	2.614	2.614	2.614	3.997
Perenização Jusante													
Total	5.985	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485	6.485	5.185	4.185	4.185	4.185	4.185	5.568

Usos Observados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abast. Púb. no lago	272	190	215	192	183	219	266	240	213				221
Demais usos no lago	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				SI
Abast. Púb. Canal Pataxó	77	85	90	93	96	95	77	79	84				86
Demais usos Canal Pataxó	723	802	763	760	306	180	94	47	173				427
Abast. Púb. Jusante	598	632	655	655	655	655	655	624	552				631
Demais Usos Jusante	5.051	4.915	4.617	4.642	4.828	4.877	4.826	4.487	3.784				4.670
Perenização Jusante													
Total	6.721	6.623	6.340	6.318	6.053	5.996	5.860	5.476	4.805				6.036

Defluências

L/s	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Previsto	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.383
Observado	6.449	6.433	6.126	6.126	5.870	5.777	5.605	5.237	4.592				5.802
Previsto - Observado	-649	-133	174	174	430	523	695	-237	-592				43

Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas dos açudes ARG e Mendobim	ANA / DNOCS	Diária			
1.2	Medição da vazão defluente açudes ARG e Mendobim	ANA / DNOCS	Mensal			
1.3	Medição dos volumes mensais captados para abastecimento público	CAERN	Mensal			
1.4	Medição da vazão afluente ao canal Pataxó	IGARN	Mensal			
1.5	Medição da cota do rio em Pendências	IGARN	Diária	OBS. 1		
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos açudes (se necessário)	ANA / IGARN	2018 / 2019			
2.2	Instalação e manutenção de régua para monitoramento no canal Pataxó.	IGARN	2018			OBS. 2
2.3	Batimetria açudes ARG e Mendobim (divulgação)	ANA	2018	OBS. 3		
2.4	Instalação de medidor fixo das vazões defluentes dos açudes ARG e Mendubim	DNOCS	2018			OBS. 4
3	Regulação dos Usos					
3.1	Proposta de Marco Regulatório - MR	ANA / IGARN	2018		OBS. 5	
3.2	Regularização dos usuários	ANA	180 dias após a publicação do MR			
3.3	Sugestões quanto à revisão da Resolução ANA / IGARN nº 1932/2017	Todos	Até agosto de 2018	OBS. 6		
3.4	Revisão da Resolução ANA / IGARN nº 1932/2017 sem alteração de limites de uso	ANA / IGARN	Até setembro de 2018		OBS. 5	
4	Outras Ações					
4.1	Conclusão da recuperação hidromecânica dos açudes ARG e Mendobim	DNOCS	2018			OBS. 7

