



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Indicadores do Monitoramento e Controle
da Programação
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

**4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação
2014**

**Recife
18 de dezembro de 2014**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do monitoramento	5
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	8
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	20
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	27
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	45
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos	49
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 107/2013, alterado pela Portaria SUDENE nº 134/2014	52
8 – Observações e Deliberações em plenária de 18/12/2014	55
9 – Conclusões	57
Anexo I – Quadros do monitoramento	58
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2014	137
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	139
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015	143

Introdução

Este relatório consolida os resultados do monitoramento dos projetos conduzidos pela SUDENE no período janeiro – novembro, que constituiu o 4º Ciclo de 2014. Foram considerados neste ciclo 54 projetos.

Os trabalhos foram abertos pelo Superintendente substituto, Sérgio Alencar, tendo ao seu lado o Diretor de Administração, Marcos Robalinho, além da presença dos Coordenadores-Gerais, Coordenadores e responsáveis pelos projetos. A Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI), órgão responsável pela realização do processo de monitoramento, em conformidade com a sistemática de tal processo, realizou no dia 18 de dezembro deste ano na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar, às 14h, reunião para exposição dos resultados obtidos no referido ciclo.



Foto 1 – Superintendente substituto Sérgio Alencar abrindo a reunião Geral para discussão dos resultados do 4º Ciclo de Monitoramento da SUDENE

A reunião foi iniciada com uma exposição resumida dos resultados consolidados de todos os projetos da pauta e um retrospecto dos resultados dos ciclos anteriores, tendo como “pano de fundo” os programas do Plano Plurianual (PPA), e as diretrizes e objetivos estratégicos adotados pelos órgãos internos.

Na abordagem a ênfase foi para os projetos na condição de atraso, destacando-se os do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) que, apesar de concluídos em sua maior parte, são “vítimas” da legislação, que não estabelece prazo para a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado pelos agentes operadores federais (BNB, CEF ou BB), resultando que o projeto se encontra concluído, com todas as liberações e fiscalizações realizadas, mas tem que aguardar o cumprimento de um rito por parte do agente operador, que não tem prazo estabelecido para isso. Enfim, termina o projeto numa situação irreal, efetivamente concluído, mas a espera do CEI.

A solução administrativa encontrada, mas que ainda requer posição da Diretoria Colegiada, seria a aprovação de um documento que espelhasse a situação desse projeto na SUDENE de forma que pudesse o seu status passar à condição de “concluído” se cumpridas todas as formalidades da Autarquia.

A expectativa é que isso já esteja resolvido até o primeiro ciclo de 2015.



Foto 2 – Técnicos e Diretoria Colegiada debatendo os resultados do 4º Ciclo de Monitoramento da SUDENE

Situação semelhante também foi discutida para os convênios, tendo em vista que etapas administrativas relacionadas com a finalização, sob responsabilidade da unidade de gestão de convênios (CGC), hoje integram o rol de responsabilidades na planilha da unidade finalística. A proposta advinda do ciclo anterior, mas também dependente de decisão da Superintendência, é que essa etapa (emissão de parecer financeiro final) venha a constituir um único plano operativo sob responsabilidade da CGC, onde constaria esse item desdobrado para cada processo e número de SIAFI. Durante a reunião a CGC, representada pelo seu titular, Heber Leandro Nunes, já se pronunciou favorável à proposta do Superintendente substituto. Ficaria, assim, suprimido do PO da unidade finalística tal etapa, conferindo assim, mais fidedignidade às responsabilidades de cada instância.



Foto 3 – Técnicos e Diretoria Colegiada debatendo os resultados do 4º Ciclo de Monitoramento da SUDENE


Em ambos os casos, essas alterações somente poderão ser implementadas após aprovação da Diretoria Colegiada.

Por fim, cabe o registro de que, afóra pequenos ajustes na adoção do conceito de “Atrasado” e “Em Andamento”, não houve alteração nos demais procedimentos do monitoramento. Apenas para lembrar, projetos com etapa na situação de atraso, desde que tal atraso esteja compreendido no prazo de execução do projeto, não mais levará o projeto como um todo à condição de atraso.

As deliberações e encaminhamentos da alta administração constam de capítulo específico deste relatório.

1- Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Comparativos dos Monitoramentos nos Ciclos de 2014

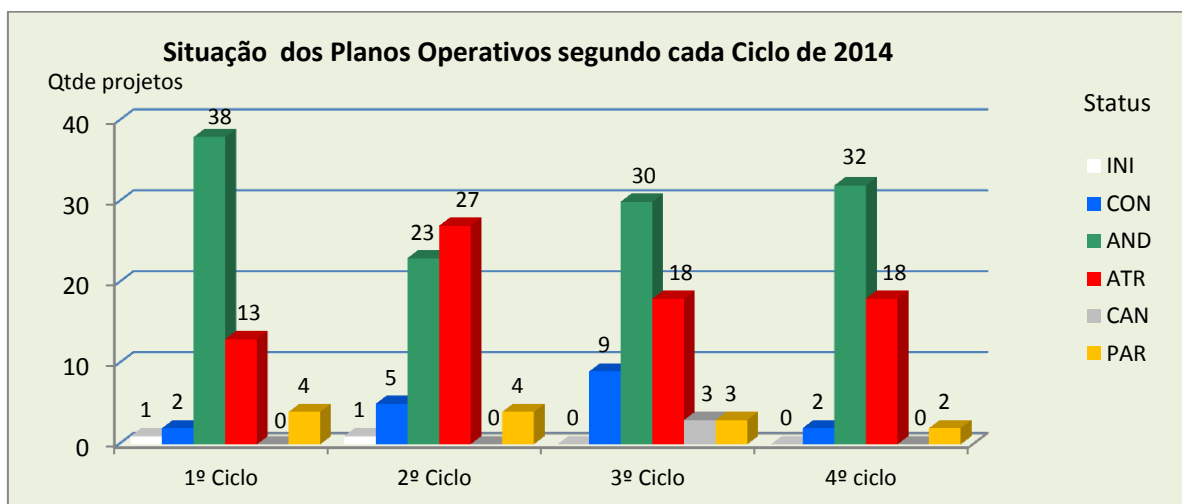

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo os ciclos de 2014

Neste 4º ciclo, somaram 34 (trinta e quatro) a quantidade de projetos em andamento e concluídos contra 20, entre atrasados e paralisados.

1.2 – Resultados Gerenciais – 4º Ciclo 2014

A tabela 1, adiante, nos mostra como os projetos ficaram distribuídos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, além dos recursos envolvidos segundo esses objetivos. Ademais, também explicita a quantidade desses projetos por status na posição de 28 de novembro de 2014. Nesse ciclo houve a redução de onze projetos e o acréscimo de dois em relação ao anterior. Os 54 projetos somaram, aproximadamente, R\$ 9,1 bilhões de recursos previstos, dos quais pouco mais de 4,9 bilhões foram liberados até o momento, puxados pelos projetos do FDNE.

A mesma tabela revela também, um maior volume de recursos na diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, com ênfase no objetivo 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, onde estão enquadrados os projetos do Fundo de

Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Neste objetivo estão concentrados 99,7% dos recursos previstos e 99,8% do montante liberado para 37 projetos.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2014

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados (qtde) ²	Recursos previstos (R\$ 1 mil) ³	Recursos liberados (R\$ 1 mil) ³	INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	36	9.167.118,09	4.978.435,87	-	-	18	17	-	1	36
	1.5	1	234,11	139,87	-	-	1	-	-	-	1
Sub-Total		37	9.167.352,19	4.978.575,74	-	0	19	17	0	1	37
2	2.1	0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0
	2.3	1	530,48	265,24	-	-	1	-	-	-	1
	2.4	2	579,78	354,70	-	-	2	-	-	-	2
Sub-Total		3	1.110,26	619,94	-	0	3	0	0	0	3
3	3.1	4	0,00	0,00	-	-	4	-	-	-	4
	3.2	6	1.336,02	1.008,93	-	2	3	1	-	-	6
	3.3	4	21.303,82	7.875,49	-	-	3	-	-	1	4
Sub-Total		14	22.639,85	8.884,42	0	2	10	1	0	1	14
TOTAL		54	9.191.102,30	4.988.080,10	0	2	32	18	0	2	54

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

(1) - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1.1** Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.1**-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**- Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 28/11/2014 (Data de travamento das informações do 4º Ciclo de monitoramento-2014)

A Tabela 2, mostra, por sua vez, a dotação e a liberação dos recursos segundo Programas e Ações do PPA, com destaque para os investimentos do FDNE, que termina influenciando na execução da Ação 0355 do PPA.

O Gráfico 2, mais adiante, mostra a distribuição dos 54 projetos segundo status (iniciado, concluído, em andamento, atrasado, cancelados ou paralisado), com destaque para os 37 projetos enquadrados no objetivo estratégico 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, mais uma vez, influenciados pelos 27 projetos do FDNE, dos quais 16 na condição de atraso pelo fato de que o agente financeiro ainda não viabilizou a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado, e não há prazo legal para essa definição.

O Gráfico3, por sua vez, trata dos recursos liberados para os 54 projetos, até o 4º ciclo 2014, sendo o Obj. 1.1, já mencionado, aquele de maior repercussão entre os demais, em razão do “peso” das liberações para os projetos do FDNE.

Tabela 2 – Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 4 Ciclo de Monitoramento de 2014

Programa do PPA (Código) ¹	Ação do PPA (Código) ¹	Projetos enquadrados (qtde) ²	Recursos previstos (R\$ 1 mil) ³	Recursos liberados (R\$ 1 mil) ³	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	27	9.151.282,96	4.972.889,79			10	16		1	27
	4640	1	1.183,12	1.183,12			1				1
	8340	1	857,02	274,41			1				1
	8689	1	530,48	265,24			1				1
	8902	6	13.127,10	3.564,29			5	1			6
	8917	1	207,54	107,35			1				1
	8918	1	694,46	556,78			1				1
Sub-Total		38	9.167.882,67	4.978.840,98	0	0	20	17	0	1	38
2040	8172	2	579,78	354,70			2				2
Sub-Total		2	579,78	354,70	0	0	2	0	0	0	2
2111	2000	14	22.639,85	8.884,42		2	10	1		1	14
Sub-Total		12	22.639,85	8.884,42	0	2	10	1	0	1	14
TOTAL		54	9.191.102,30	4.988.080,10	0	2	32	18	0	2	54

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

(1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 20N9 – Apoio ao Associativismo e Cooperativismo; 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20WQ-Plano Orçamentário 05 – Divulgação das políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;). Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade).


(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os de financiamento do FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento financiado pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Nota: Os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


Referência: 28/11/2014 (Data de travamento das informações do 4º Ciclo de monitoramento-2014)

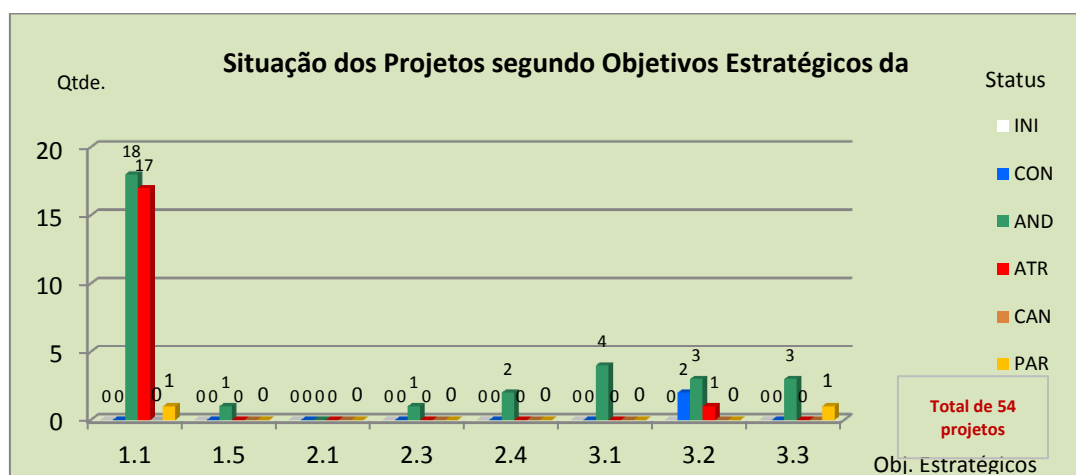

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Convenções dos Obj. Estratégicos: 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; 2.1-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; 2.4-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; 3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; 3.3-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo – 2014)

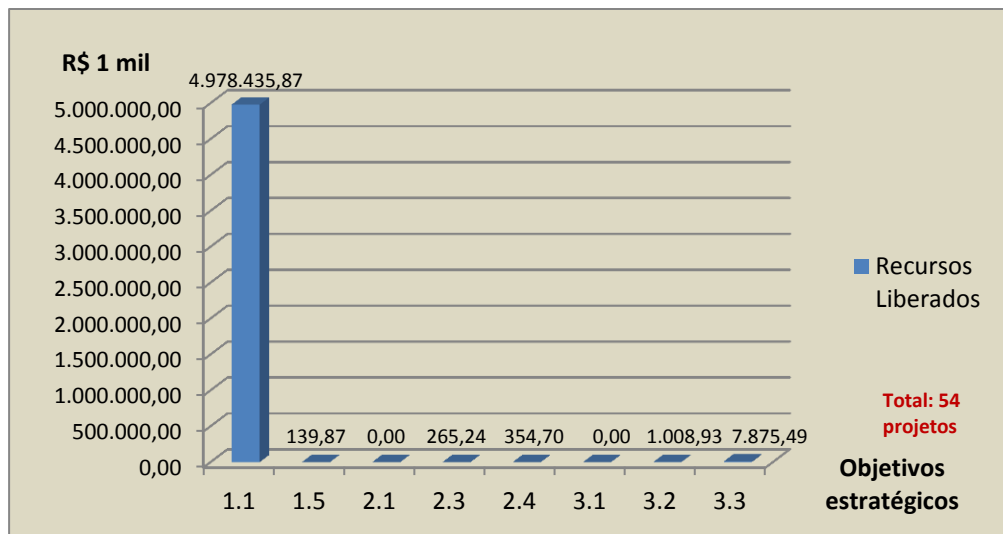

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Convenções dos Obj. Estratégicos: **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.1**-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.3**- Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**- Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Gráfico 3 – Recursos liberados segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo – 2014)

2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{24 \times 100}{24} = 100,00 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: Não foi informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 98,6 %.

Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 57,14% (1º Ciclo 2013).

Jun/2013 = 100% (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 100 % (3º Ciclo 2013).


Nov/2013= 100% (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = 100% (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 100% (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 100% (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

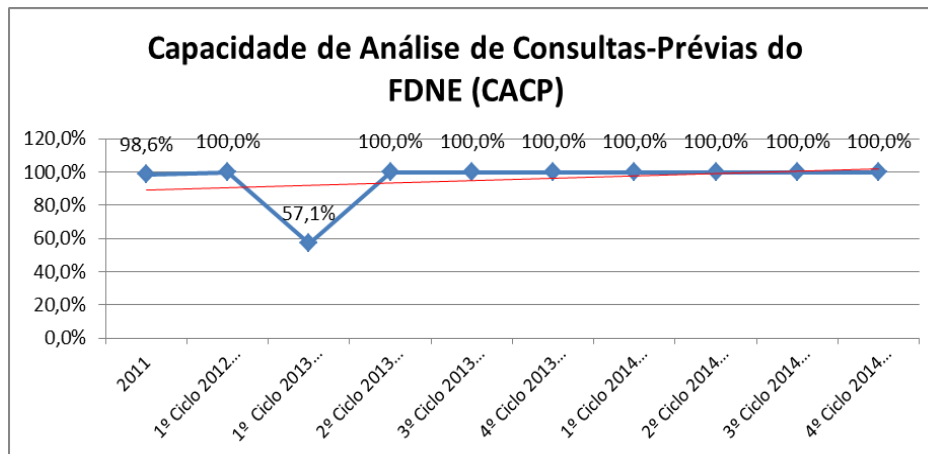

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{24}{7} = 3,4$ análises/técnico

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: A partir de julho de 2014 foram incorporados 5 novos técnicos, o que reduziu a média de consultas prévias analisadas por cada técnico. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 2,05 análises/técnico (2011)

Nov/2012 = 0,67 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 2,67 análises/técnico (1º Ciclo 2013).

Jun/2013 = 6,00 análises/técnico (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 6,50 análises/técnico (3º Ciclo 2013).


Nov/2013 = 11,67 análises/técnico (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = 11,67 análises/técnico (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 3,50 análises/técnico (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 7 análise/técnico (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

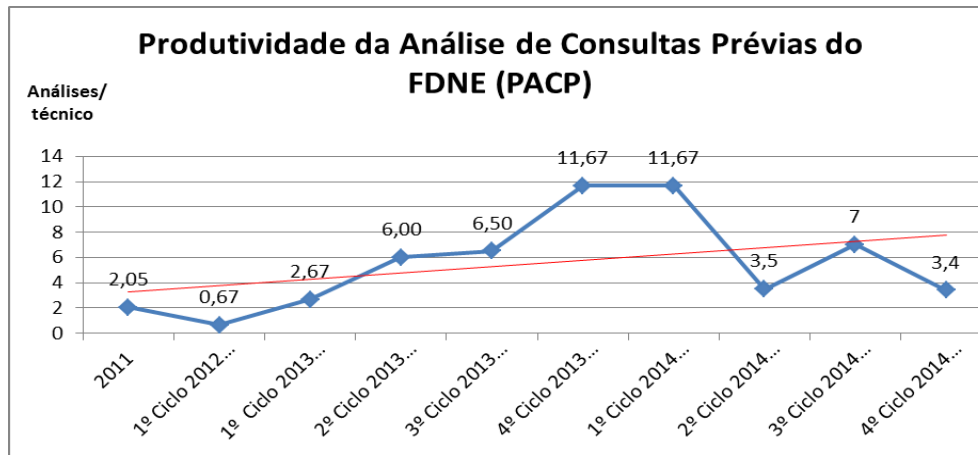


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.3 - Consistência das Consultas Prévia Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévia Protocoladas}} = \frac{15 \times 100}{24} = 62,5\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévia protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2014
- f) Comentários: A devolução de 62,5% Consultas Prévia protocoladas foi decorrente de ausência de documentos necessários à conclusão da análise e/ou preenchimento inadequado do formulário padrão estabelecido. A DFIN/CGDF buscará ampliar as discussões prévia com os interessados em apresentar propostas.
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = 40,80 %.
 - Nov/2012 = 100,00 % (1º e único Ciclo 2012).
 - Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013).
 - Jun/2013 = 50,00 % (2º Ciclo 2013).
 - Ago/2013 = 46,15 % (3º Ciclo 2013).
 - Nov/2013 = 40% (4º Ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 40% (1º Ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 71,43% (2º Ciclo 2014)
 - Ago/2014 = 71,43% (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

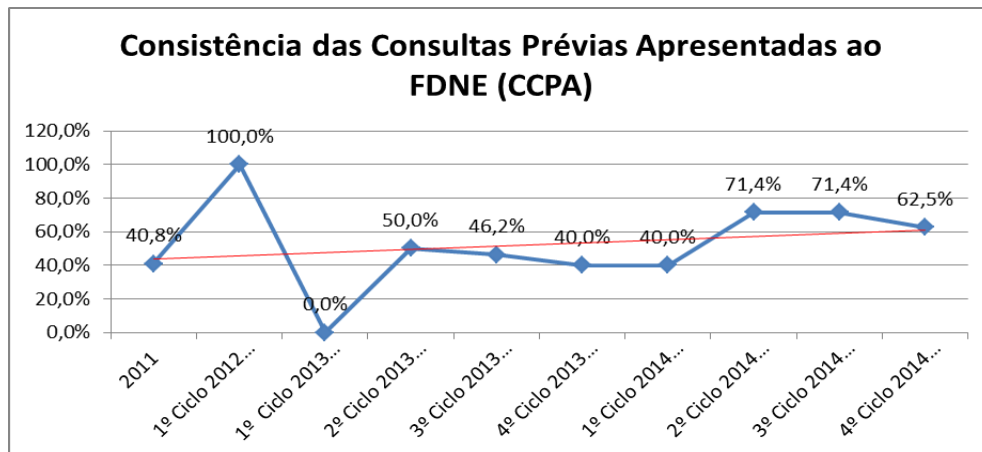

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$ (não há projeto em análise)

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{163,5 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,82$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{320,5 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 3,56$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão. Sugestão de novo nome para o indicador (em estudo): Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = Cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = Cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º Ciclo 2013). Incluía até então, apenas o BNB.

Jun/2013 = BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63 (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63 (3º Ciclo 2013)


Nov/2013 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67 (2º Ciclo 2014)


Ago/2014 = BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67 (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

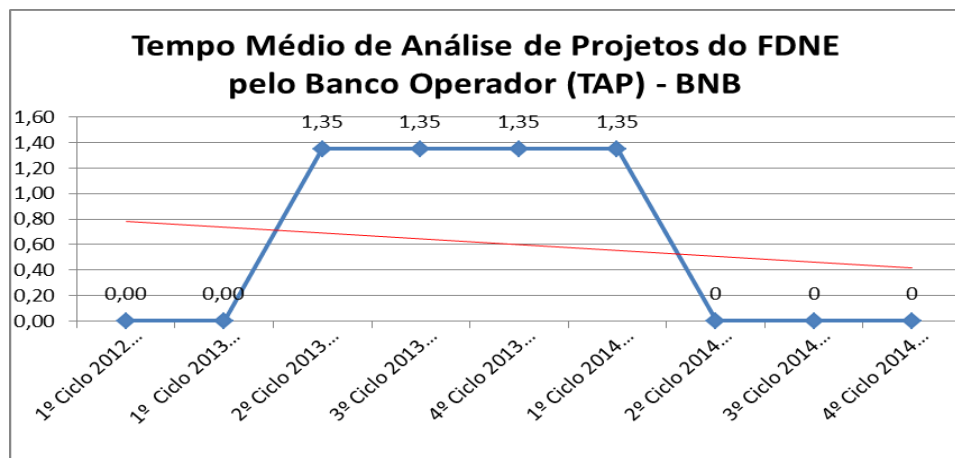


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Obs.: Desde o 2º ciclo 2014 que o BNB não dispõe de projeto do FDNE em análise em sua carteira.

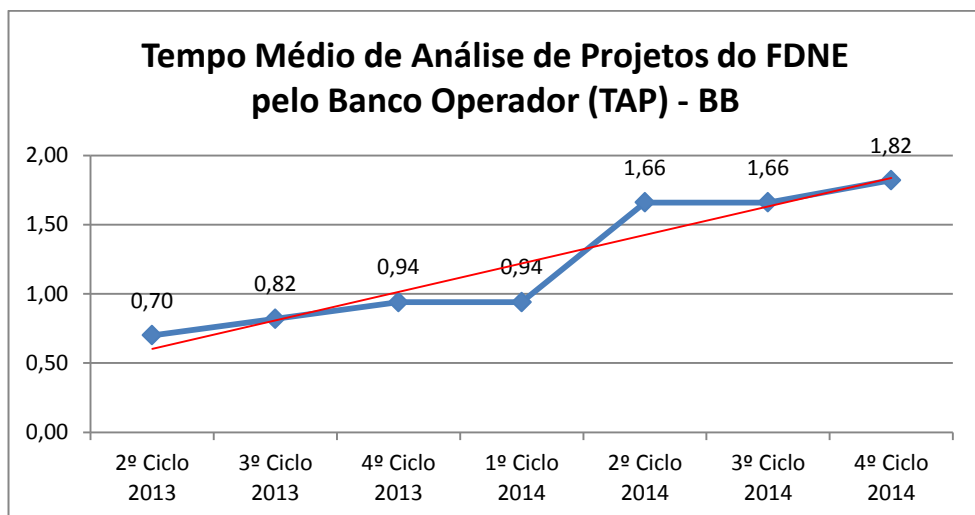

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

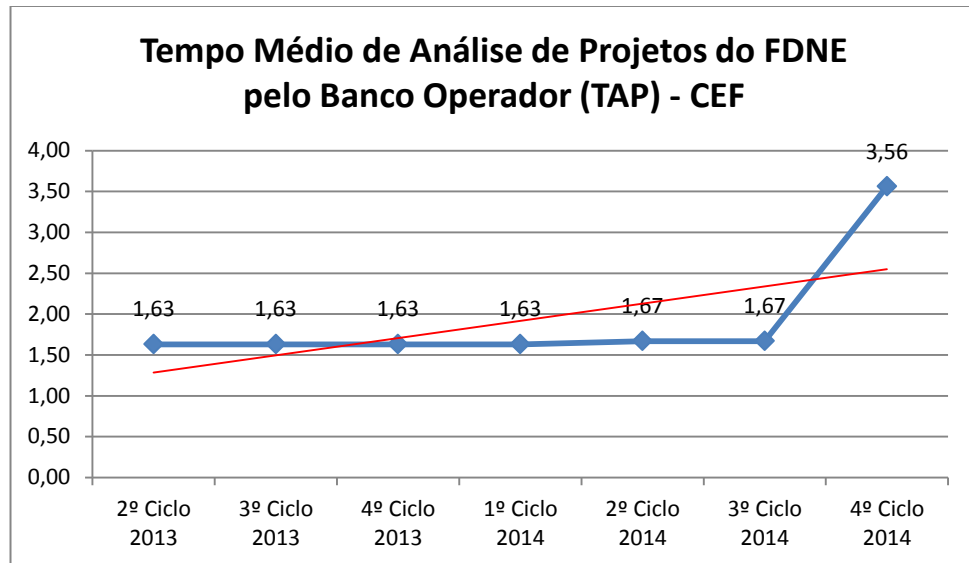

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise (em dias) é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 – Inconsistências dos Projetos do FDNE apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = 0,00\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{2 \times 100}{5} = 40,00\%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{2} = 0,00\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: Não houve demanda de análise projeto para o BNB. No caso dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil, houve desistência momentânea dos proponentes.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013) (incluía até então, apenas o BNB).

Jun/2013 = BNB 0,00 % ; BB 0,00 % ; CEF 0,00 % (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = BNB 0,00 % ; BB 0,00 % ; CEF 0,00 % (3º Ciclo 2013).


Nov/2013 = BNB 0,00% ; BB 0,00% ; CEF 0,00% (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = BNB 0,00% ; BB 0,00% ; CEF 0,00% (1º Ciclo 2014)


Mai/2014 = BNB 0,00% ; BB 100,00% ; CEF 0,00% (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = BNB 0,00% ; BB 100% ; CEF 0,00% (3º Ciclo 2014)


h) Representação Gráfica:



Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

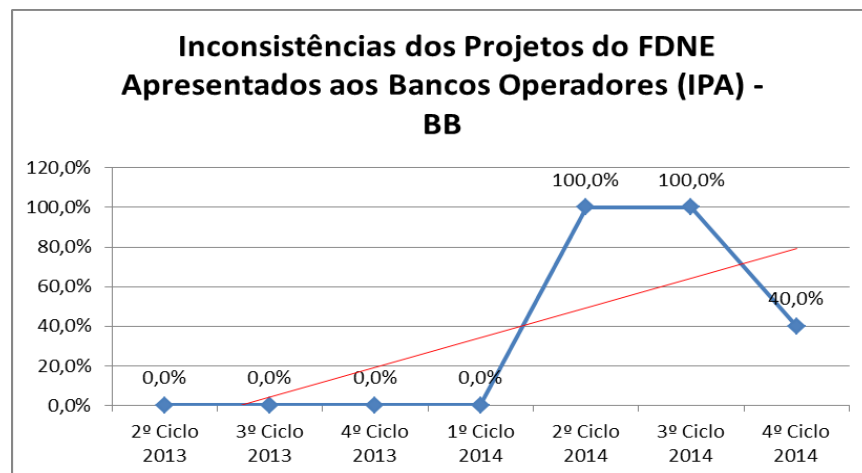

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.




Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor empenhado} \times 100}{\text{Dotação LOA}} = \frac{1.887.513.062,27 \times 100}{1.887.513.062,27} = 100\%$$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2014
- f) Comentários: Da dotação prevista do FDNE na LOA foi retirado o montante de R\$ 134.968.572,73, dos quais R\$ 133.532.107,00 não poderão ser empenhados por terem sido bloqueados visando alteração da fonte de recursos próprios, que não se concretizou. A outra parte, no valor de R\$ 1.436.465,73 (fonte 280) não poderá ser empenhada devido à falta de arrecadação.
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = 100,0 %
 - Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)
 - Abr/2013 = 99,14 % (referência LOA 2012 e RAPs) (1º Ciclo 2013)
 - Jun/2014 = 61,24 % (2º Ciclo 2013)
 - Ago/2013 = 61,24 % (3º Ciclo 2013)
 - Nov/2013 = 56,26% (4º Ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 100% (1º Ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 2,52% (2º Ciclo 2014)
 - Ago/2014 = 93,3% (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

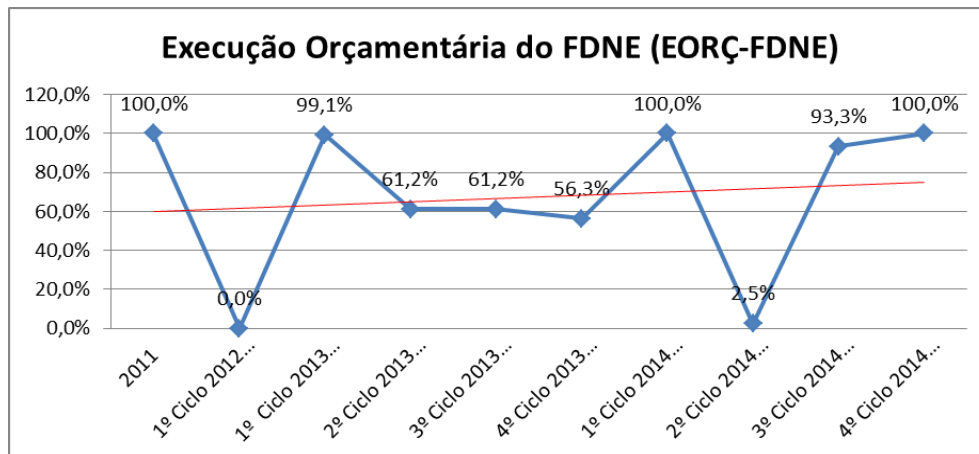

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Recursos Empenhados}} = \frac{2.387.537.856,89 \times 100}{6.514.386.244,56} = 36,5\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: O desempenho é prejudicado em virtude da necessidade de empenhar o valor total do projeto, em contraponto a desembolsos que ocorrem em mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 14,2 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 3,25 % (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 11,70 % (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 11,70 % (3º Ciclo 2013)


Nov/2013 = 18,43% (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = 18,43% (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 8,46% (2º Ciclos 2014)

Ago/2014 = 24,68% (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

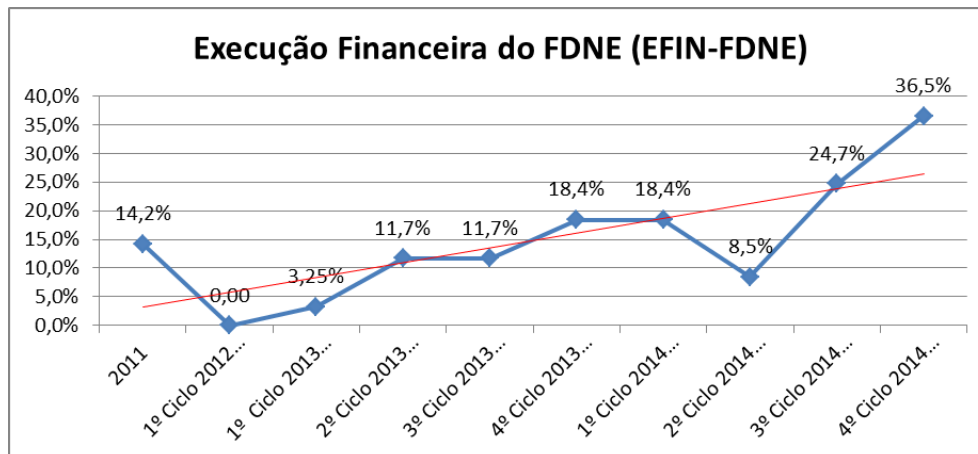

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{19,5}{30} = 0,65$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal)

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: O percentual reflete a eficiência da equipe técnica, que utilizou apenas uma fração do tempo máximo legal para tanto. Sugestão de novo nome para o indicador: Indicador de Performance na Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada pelo Bancos Operadores.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 0,37 (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 0,37 (3º Ciclo 2013)


Nov/2013 = 0,35 (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = 0,35 (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 0,10 (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 0,27 (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

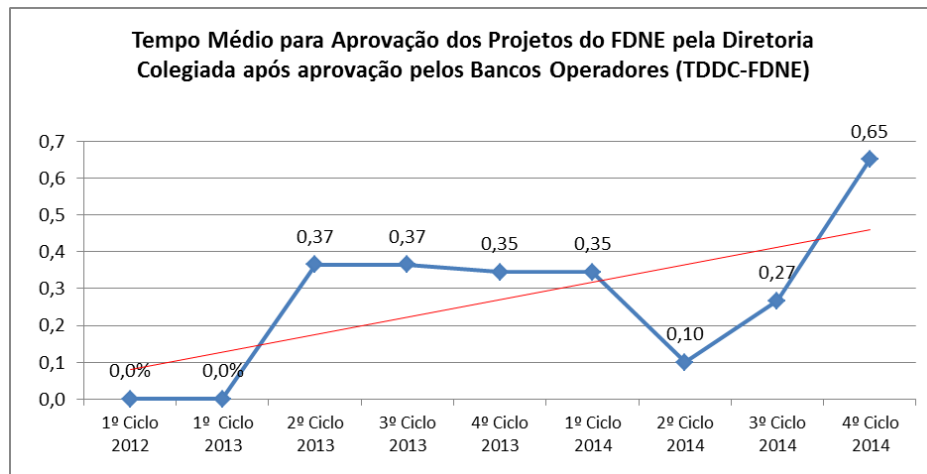

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{1167}{4} = 291,75$ dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 300 dias (igual ou menor que 300 dias e quanto menor, melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 138,4 dias (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 138,4 dias (3º Ciclo 2013)


Nov/2013 = 501 dias (4º Ciclo 2013)

Mar/2014 = 501 dias (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 260,5 dias (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 264,67 dias (3º Ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

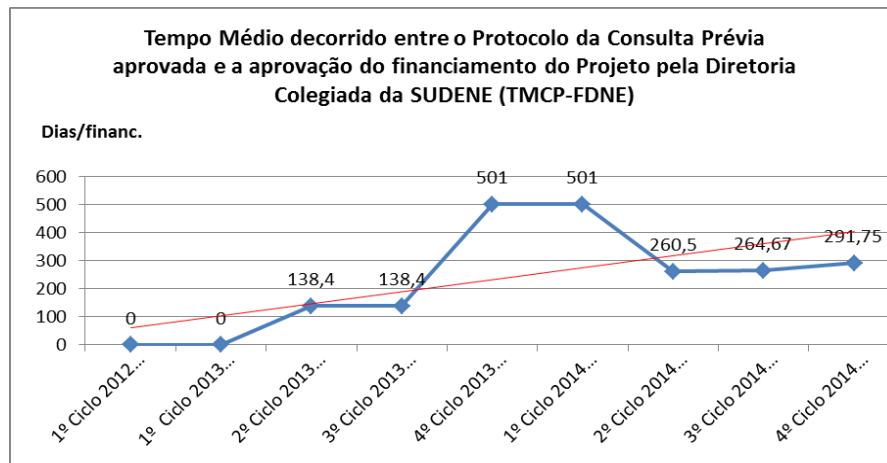

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos (em dias) transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **300 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para definição do banco operador pelo proponente + 60 dias para apresentação do projeto ao banco operador + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{4}{4} = 1,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2014

f) Comentários: todos os projetos aprovados pelos Agentes Operadores (BB, BNB e CEF) tiveram o financiamento aprovado pela SUDENE.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 1,0 (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 1,0 (3º Ciclo 2013)


Nov/2012 = 1,0 (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 1,0 (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 1,0 (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 1,0 (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

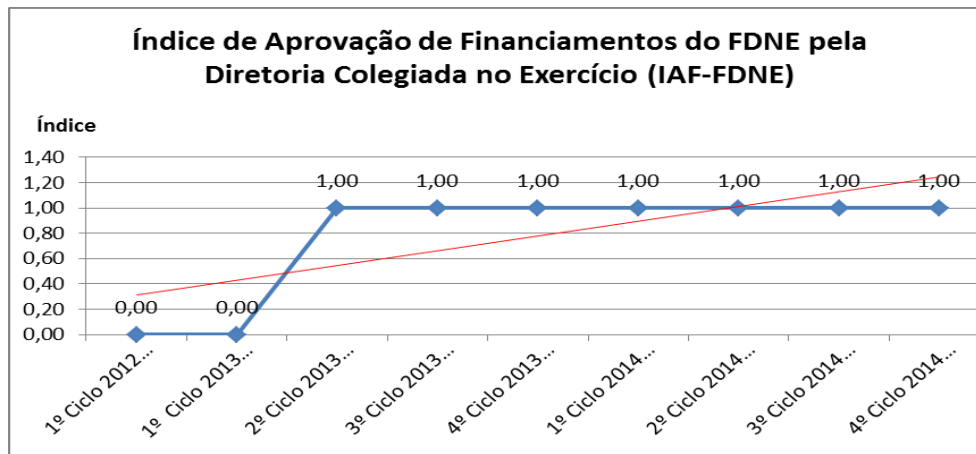

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- Fórmula:
$$T1 = \frac{11.067 \text{ dias}}{123 \text{ pleitos}} = 90 \text{ dias/pleito}$$
- Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal: quanto menor melhor.
- Periodicidade: jan- nov/2014
- Comentários:** no período iniciado em 1º de janeiro de 2014 e encerrado em 30 de novembro de 2014, foram **vistoriados 123 estabelecimentos (ou pleitos) interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 90 dias**. O resultado foi basicamente afetado pelo período de férias uma vez que em janeiro não foram realizadas vistorias e em fevereiro as vistorias somente tiveram início a partir do dia 17, e por 15 processos cujo prazo médio entre a formalização e a vistoria variou de 167 a 279 dias.


O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 279 dias (Icofort Agroindustrial Ltda.). O prazo mínimo, de **8 dias**, foi observado no processo de interesse da empresa Autopel Automação Comercial e Informática Ltda. O maior número de observações (32) situou-se entre 31 e 60 dias de espera. Também foi significativo o número de observações entre 61 e 90 dias (23 vistorias).

Prazo em dias	Número de vitorias
Até 30 dias	19
De 31 a 60 dias	32
De 61 a 90 dias	23
De 91 a 120 dias	15
De 121 a 150 dias	11
De 151 dias a 180 dias	11
De 181 a 210 dias	5
Acima de 210 dias	7

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = 64,60 dias/pleito. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 = 30,10 dias/pleito. (1º Ciclo 2013)
 Jun/2013 = 76,00 dias/pleito. (2º Ciclo 2013)
 Ago/2013 = 64,40 dias/pleito. (3º Ciclo 2013)
 Nov/2012 = 68,50 dias/pleito. (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 69,20 dias/pleito. (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 83,00 dias/pleito. (2º ciclo 2014)
 Ago/2014 = 89,70 dias/pleito (3º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

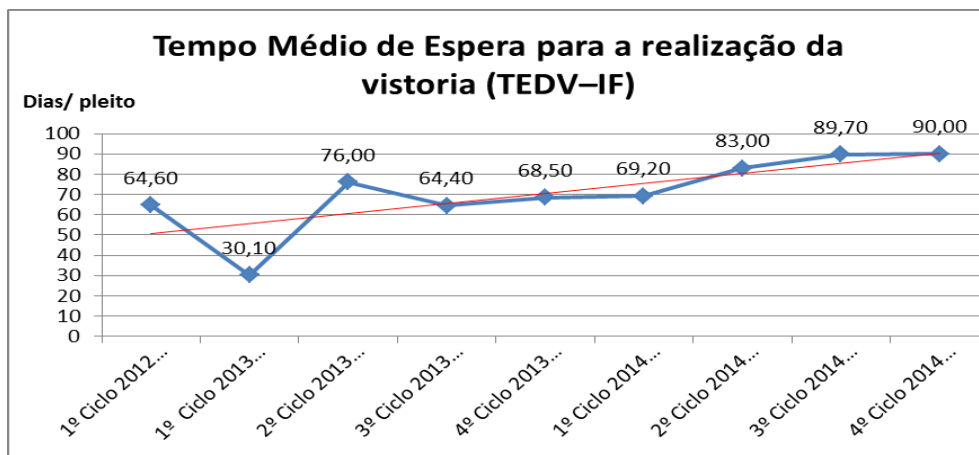

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T1 = Σ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.


N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{275} = 0\%$
- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan – nov/2014.
- f) Comentários: Não preenchido
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 2,36 % (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 0,00 % (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 0,00% (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 0,00% (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 0,00% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 0,00% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 0,00% (2º ciclo 2014)
 Ago/2014 = 0% (3º ciclo 2014)

- h) Representação Gráfica:



Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no semestre e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

Observação:


Processos formalizados no período = 275 (240 aprovados e 35 em análise).

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{n}^\circ \text{ de análises concluídas no período} \times 100}{\text{n}^\circ \text{ de pleitos protocolados no período}} = \frac{240 \times 100}{275} = 87,3\%$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: semestral
- f) Comentários: no período, foram concluídas as análises de 240 pleitos diversos, representando 87,3 % dos pleitos ingressados.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 77,16 %. (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 90,00% (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 100,00% (2º Ciclo 2013)
 Jan-ago/2013 = 75,4% (3º ciclo 2013)
 Jan-nov/2013 = 62,9% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 67,3% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 66,4 % (2º ciclo 2014)
 Ago/2014 = 63,70% (3º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

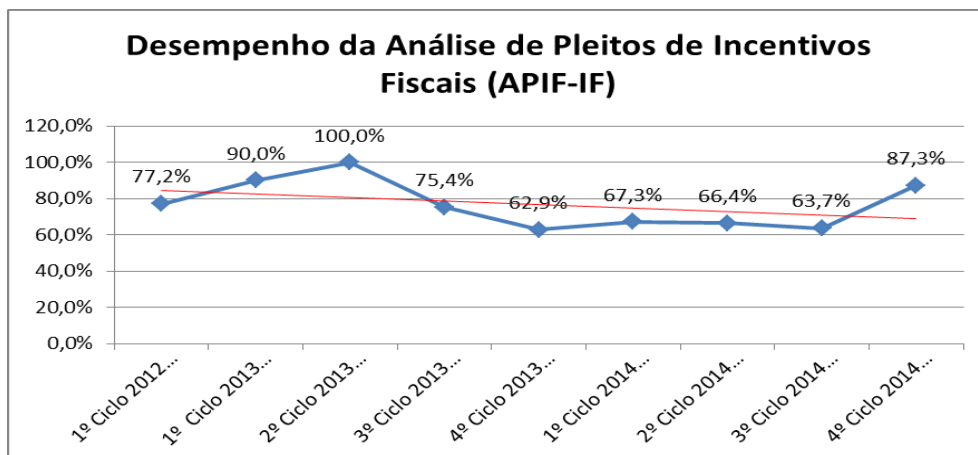

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Observação:


No período foram concluídas as análises de 240 pleitos (processos) diversos, sendo 145 de redução do imposto de renda, 71 pleitos de isenção do AFRMM, 23 de reinvestimento do IRPJ e 1 de depreciação acelerada. No mesmo período foram formalizados 275 pleitos (processos) diversos.

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:
$$\frac{T1}{N} = \frac{20.863 \text{ dias entre o ingresso e a conclusão da análise}}{240 \text{ pleitos protocolados}} = 86,9 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (média): Quanto menor melhor
- e) Periodicidade: jan-nov/2014
- f) Comentários: o prazo médio observado, de 86,9 dias decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nesses 11 meses de 2014 (240). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 150,9 dias, sendo de 32 dias para os processos de isenção do AFRMM e de 84 dias para os processos de reinvestimento.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 53,86 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 52,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 67,7 dias/pleito (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 62,2 dias/pleito (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 70,2 dias/pleito (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 76,7 dias/pleito (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 113,3 dias/pleito (2º ciclo 2014)
 Ago/2014 = 105,6 dias/pleito (3º ciclo 2014)

- h) Representação gráfica:

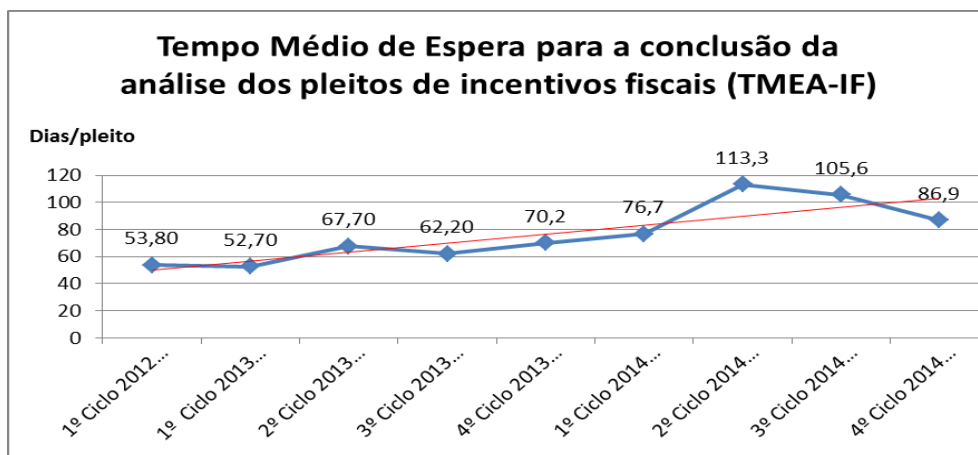

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de pleitos (processos) protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{240}{21} = 11,4$ análises/técnico
- Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)
- Periodicidade: jan-nov/2014
- Comentários: o número observado, de 11,4 análises por técnico, traz consigo uma peculiaridade pelo fato de que considera o período de 11 meses para toda a análise, ao passo que 11 técnicos somente tomaram posse a partir de junho, iniciando as análises a partir de julho de 2014.
- Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 12,7 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 14,4 análises/técnico (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 9,6 análises/técnico (2º Ciclo/2013)

Jan a ago/2013 = 15 análises/técnico (3º ciclo 2013)


Jan a nov/2013 = 21,6 análises/técnico (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 29,8 análise/técnico (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 8,5 análise/técnico (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 15,1 análise/técnico (3º ciclo 2014)

- Representação gráfica:

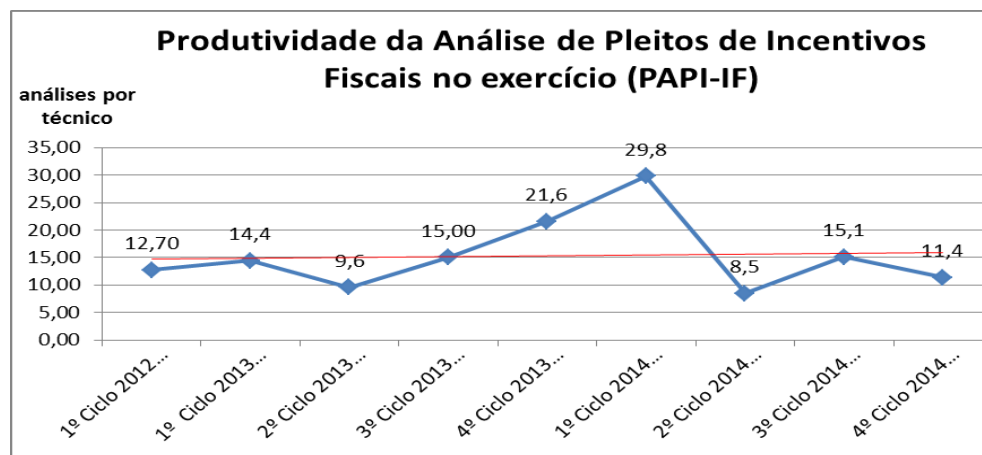

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vitorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{123 \text{ vitorias}}{10 \text{ equipes}} = 12,3 \text{ vitorias/equipe}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: jan-nov/2014
- f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vitoria. Foram realizadas 123 vitorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 12,4 vitorias/equipe. (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 18,2 vitorias/equipe (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 8 vitorias/equipe (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 12,4 vitorias/equipe (3º ciclo 2013)


Jan a nov/2013 = 18,6 vitorias/equipe (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 32,4 vitorias/equipe (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 8 vitorias/equipe (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 14,6 vitorias/equipe (3º ciclo 2014)

- h) Representação gráfica:

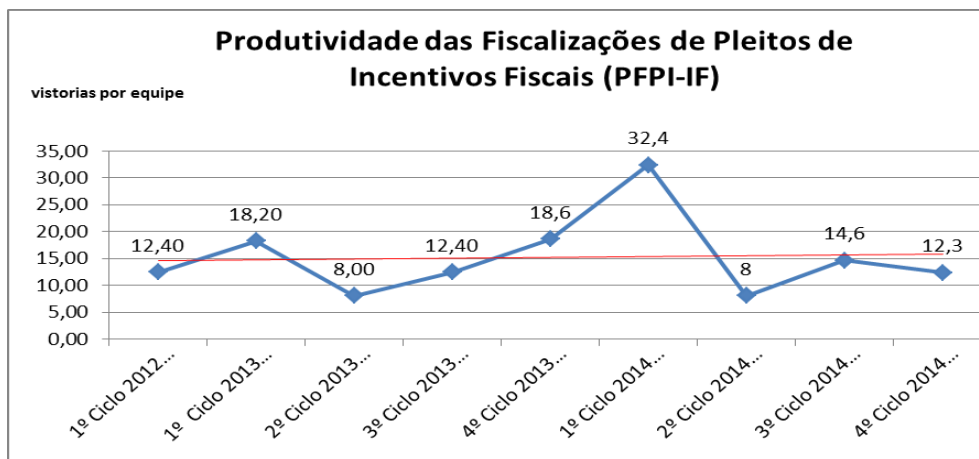


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 – Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{80 \times 100}{112} = 71,43 \%$$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período de aferição: janeiro-novembro/2014.
- f) Comentários: No período do 3º ciclo para o 4º ciclo, foi constatado um acréscimo significativo de propostas protocoladas, ou seja, de 72 passou para 112 propostas, constando no SICONV 80 analisadas.

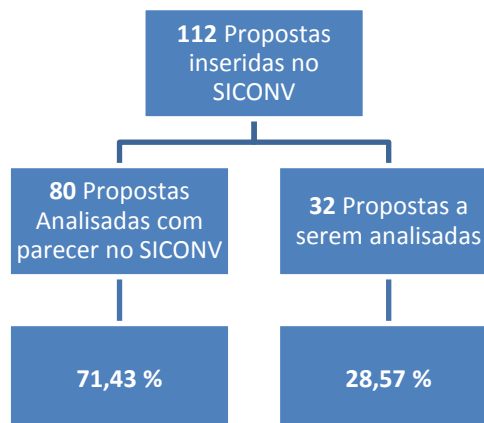

g) Resultados Anteriores (CAPC):

Dez/2011 = 100,0 %

Jan a nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0% (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)


Jan a nov/ 2013 = 86,79 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013= 92,45% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 73,33% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 54,17 % (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

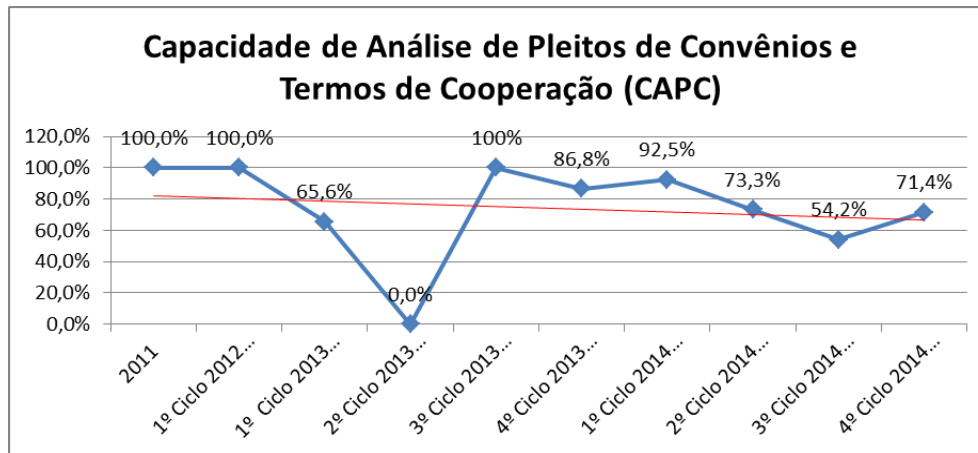

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{3 \times 100}{80} = 3,75 \%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período da aferição: janeiro-novembro/2014

f) Comentários: Até o encerramento deste período, foram aprovadas 3 propostas, das 80 analisadas. Entretanto, cabe ressaltar que outras 2 propostas foram aprovadas porém o plano de trabalho encontra-se em complementação pelo proponente, e 3, após serem complementadas, aguardavam nova análise técnica desta SUDENE.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = 14,6 %

Jan a nov/2012 = 21,74 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 38,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 25,0% (3º Ciclo 2013)


Jan a nov/2013 = 23,91 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 22,45% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 18,18% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 7,69% (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

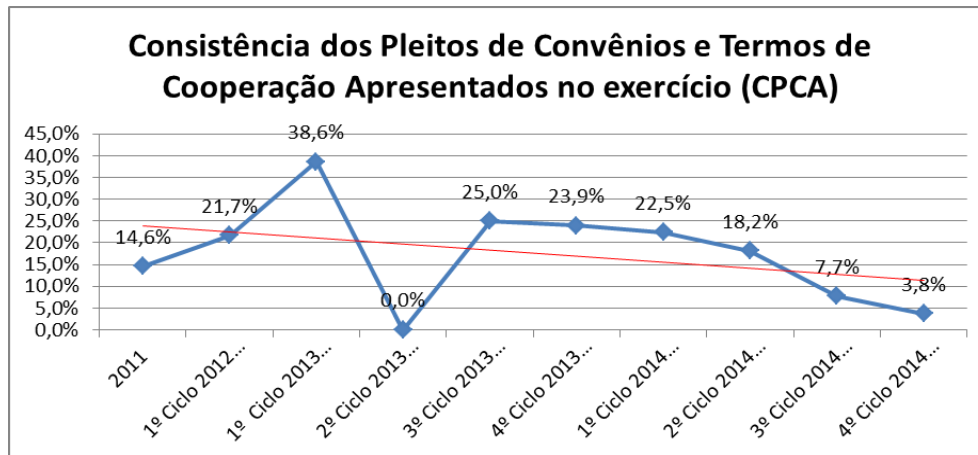

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$$

$$= \frac{13 \times 100}{112} = 11,61 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Período da aferição: janeiro-novembro/2014

f) Comentários: Dentro das 13 propostas rejeitadas, 8 foram por impedimento técnico.

g) Resultados Anteriores (IIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 13,04 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 74,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 75,0 % (3º Ciclo 2013)


Jan a nov/2013 = 56,6 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 62,26% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 60,0% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 16,67% (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

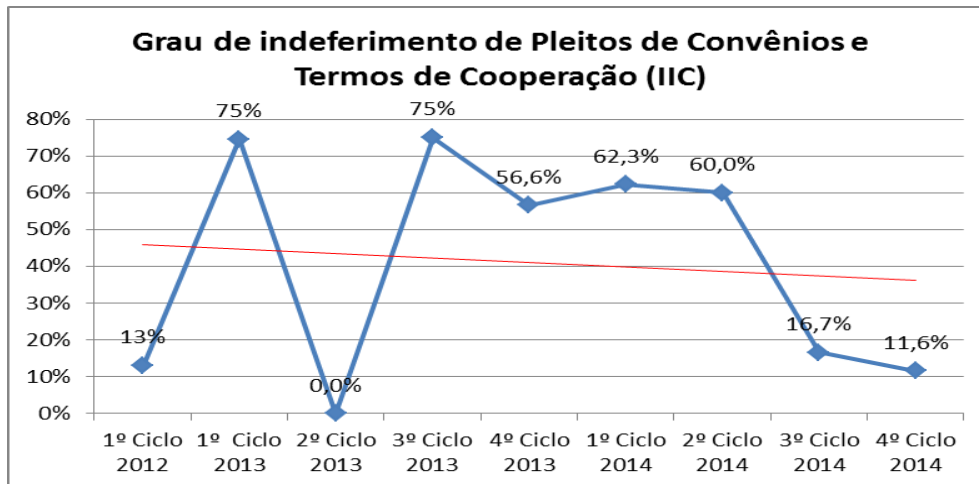

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)


- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{17 \times 100}{17} = 100 \%$$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)
- e) Período da aferição: janeiro-novembro/2014
- f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 17 viagens de acompanhamento da parte física dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral.
- g) Resultados Anteriores (DFCON):
 - Dez/2011 = Não existia o indicador.
 - Jan a nov/2012 = não informado pela unidade. (1º e único Ciclo 2012)
 - Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)
 - Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)
 - Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)
 - Jan a nov/2013 = 100,0 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 100,0% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 100,0% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 100,0% (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

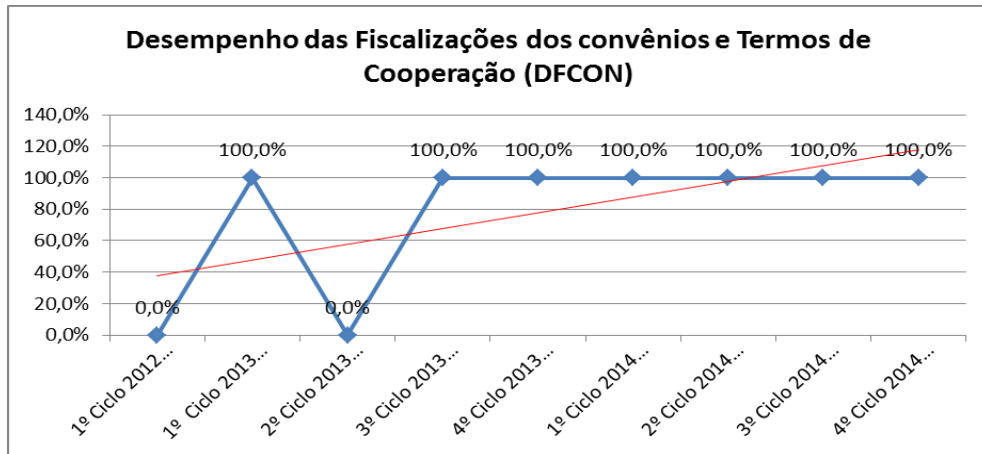

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ANO 2014

1. Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura.
Período: 28 à 31.01.2014
Técnico: Marcelo Viana
Local: Araripina, Serra Talhada, Moreilândia – PE.
2. Realizar visita técnica de acompanhamento do convênio nº 770741/2012 que trata do Projeto de Capacitação dos Integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Estado da Paraíba
Período: 30.01.2014
Técnicos: Juliana Borges e Macira Sotero
Local João Pessoa – PB.
3. Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura no Estado de PE
Período: 04 a 06.02.2014
Técnico: Marcelo Viana
Local: Floresta e São José do Egito – PE.
4. Realizar visita de acompanhamento final do Projeto Aprisco Seridó, convênio SICONV 710365/2009 – Região do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte – RN
Período 1102 a 13.02.2014-03-31 Técnico: Victor Uchoa
Local: Natal e Jardim do Seridó – RN.

5. Visita Técnica para emissão de Laudo Técnico do convênio SICONV 744654/2010 – ao município de Timbau do Sul, no Estado do Rio Grande do Norte.
Período: 20 a 21.02.2014.
Técnica: Maria Helena Castro
Local: Timbau do Sul – RN.

6. Realizar supervisão final do convênio nº 767485/2011, celebrado com o Município de Riacho de Santana, no Estado do Rio Grande do Norte, com vistas a emissão de Laudo Técnico
Período: 19 a 21.03.2014.
Técnico Agrimon Marcos
Local Riacho de Santana – RN.

7. Realização dos trabalhos de vistoria de campo nos convênios da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedra/RN – SICONV nº 737691/2010 (conclusão de obras de urbanização), Prefeitura Municipal de Assu/RN – SICONV 768007/2011 (obras de pavimentação em asfalto CBUQ em ruas) e Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa-RN, SICONV 770860/2012 (construção de uma ponte de concreto armado) para emissão de Laudo técnico.
Período: 09.04 a 11.04.2014
Técnico: Edson Laranjeiras
Local: Lagoa de Pedra, Assu e Ruy Barbosa – RN.

8. Verificar no local onde vai se realizar as reformas dos mercados públicos de Messias Targino/RN e Jardim de Piranhas/RN, a viabilidade de realização de convênios.
Período: 06.05 a 08.05.2014.
Técnico: Edson Laranjeiras
Local: Messias Targino-RN e Jardim de Piranhas – RN.

9. Viagem de acompanhamento ao termo de Cooperação entre SUDENE e IFPB “Qualificação Profissional de Mulheres para a Construção Civil, nº 59.335.000213/2013-25”.
Período 31.07.2014.
Técnicos: Macira Sotero e Edson Laranjeiras.
Local: João Pessoa – PB.

10. Supervisionar as ações do Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura Processo nº 59.335.000124/2012-6 – SICONV 769783/2012
Período 07 a 08.08.2014.
Técnico: Marcelo Viana.
Local: Serra Talhada e Sertânia – PE.

11. Supervisionar as ações do Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das estruturas Produtivas da caprinocultura e Apicultura convênio 59.335.000124/2012-6 - SICONV 769783/2012
Período: 20 a 22.08.2014.
Técnicos: Marcelo Viana e Marcelo Saiki.
Local: Parnamirim e Custódia – PE.

12. Realizar vistoria às obras de Pavimentação de Vias Urbanas na Sede do Município para emissão de Laudo Técnico do Convênio SICONV 750323/2010 – Prefeitura Municipal de Assu/RN.
Período: 01 a 02.09.2014
Técnicos: José Villeneuve e Givanildo Ramos
Local: Assú – RN

13. Reunião no IFPB para socializar as informações pertinentes à continuidade do Projeto “Mulheres na Construção Civil, convênio 59.335000213/2013-25.
Período: 08.09.2014
Técnicos: Edson Laranjeiras e Macira Sotero
Local: João Pessoa-PB

14. fiscalizar a reforma do mercado público e serviços de urbanização das ruas em volta do mercado público da Prefeitura Municipal de Saboeiro/CE – SICONV 78901/2013
Período: 10 a 12.09.14
Técnicos: Edson Laranjeiras e Givanildo Ramos
Local: Saboeiro – CE

15. Realizar supervisão final do convênio nº 786583/2013, celebrado com o município de Brejinho, estado de PE, com vistas à emissão de Laudo Técnico
Período: 24 a 26.09.2014
Técnicos: Agrimon Marcos
Local: Brejinho – PE

16. Acompanhamento técnico para o convênio nº 770355/2012 Capacitação e Reequipamento das Coordenadorias de Defesa Civil.
Período: 20 a 22.10.2014
Técnicos: Macira Sotero e Marcelo Viana
Local: Fortaleza e Tianguá – CE

17. Acompanhamento técnico do Projeto especificamente a capacitação em Cabedelo e reunião no IFPB sobre as outras ações constantes do Termo de Execução Descentralização entre SUDENE e o IFPB-PB - convênio 59.335.000033/2014-24
Período: 24 a 25.11.2014
Técnicos: Macira Sotero e Juliana Borges
Local: João Pessoa – PB

PROPOSTAS INSERIDAS NO SICONV - JANEIRO À NOVEMBRO / 2014

NÚMERO DA PROPOSTA	NOME DO PROPONENTE	UF DO PROPONENTE	PROGRAMA	POSSUI PARECER	SITUAÇÃO
1	055150/2014 VALENTE PREFEITURA	BA	2029-Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia solidária. Ação 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
2	055083/2014 UMBURANAS PREFEITURA	BA	2029-Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia solidária. Ação 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
3	054577/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA	AL	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado em Análise
4	052390/2014 ESTADO DA PARAIBA	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ 8917-FORTELECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação (2)	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação
5	052160/2014 SAO JOSE DE MIPIBU PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
6	051994/2014 SAO PAULO DO POTENGI PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
7	051990/2014 GOIANINHA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
8	051989/2014 BOM JESUS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
9	051987/2014 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise

10	051929/2014	VARZEA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
11	051925/2014	MUNICIPIO DE MONTANHAS	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
12	051797/2014	PEDRO VELHO PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
13	051500/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N9 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO - Plano Brasil sem Miséria - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
14	051299/2014	SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT	PB	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 8689 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO - PROGRAMAÇÃO	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado em Análise
15	051298/2014	RIACHUELO PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
16	051297/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
17	051296/2014	NOVA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
18	051291/2014	VERA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação

19	051229/2014	LAGOA DE VELHOS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
20	051188/2014	SAO PEDRO PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
21	051187/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
22	051186/2014	MUNICIPIO DE ARES	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
23	051171/2014	MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
24	051169/2014	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
25	051151/2014	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
26	051150/2014	MUNICIPIO DE BREJINHO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
27	051112/2014	VILA FLOR PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
28	051111/2014	TIBAU DO SUL PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise

Sustentável Local Integrado						
29	051105/2014	MUNICIPIO DE SERRINHA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
30	051104/2014	MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
31	051102/2014	LAGOA DE PEDRAS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
32	051101/2014	SAO TOME PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
33	051096/2014	PASSA E FICA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
34	051094/2014	MUNICIPIO DE PASSAGEM	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
35	051093/2014	LAGOA SALGADA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
36	051091/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
37	051090/2014	BOA SAUDE PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise

38	051072/2014	BAIA FORMOSA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
39	048821/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ 8917- FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação (2)	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
40	047621/2014	MUNICIPIO DE TANGARA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
41	047615/2014	CAMPO REDONDO PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
42	047161/2014	PORTO DO MANGUE PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
43	047104/2014	MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
44	044157/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	MG	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
45	043883/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	RN	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
46	043574/2014	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
47	043406/2014	PENDENCIAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

48	043352/2014	GROSSOS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
49	043346/2014	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
50	043339/2014	SAO JOSE DE MIPIBU PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
51	043338/2014	MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
52	043325/2014	VARZEA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
53	043317/2014	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
54	043316/2014	EXTREMOZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
55	043302/2014	SAO GONCALO DO AMARANTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
56	043286/2014	MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
57	043270/2014	TIBAU DO SUL PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
58	043235/2014	GOIANINHA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

59	042663/2014	BOM JESUS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
60	042552/2014	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
61	042522/2014	CAICARA DO RIO DO VENTO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
62	042505/2014	RIO DO FOGO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
63	042247/2014	MONTE DAS GAMILEIRAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
64	042067/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
65	041924/2014	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
66	041922/2014	JAPI PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
67	041915/2014	MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
68	041907/2014	MUNICIPIO DE JARDIM DE ANGICOS	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
69	041899/2014	SÃO JOSE DO SERIDO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise






70	041894/2014	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
71	041885/2014	ALMINO AFONSO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
72	041858/2014	RUY BARBOSA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
73	041853/2014	MUNICIPIO DE ACARI	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
74	041821/2014	NOVA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
75	041736/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
76	041668/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
77	041665/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
78	041664/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
79	041663/2014	MUNICIPIO DE FLORANIA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
80	041654/2014	SERRA DO MEL PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise

81	041652/2014	LAGOA DE VELHOS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
82	041648/2014	MUNICIPIO DE BREJINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
83	041647/2014	MUNICIPIO DE JUCURUTU	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
84	041645/2014	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
85	041644/2014	AREIA BRANCA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
86	041545/2014	MUNICIPIO DE CRUZETA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
87	041482/2014	MAJOR SALES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
88	040009/2014	VERA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
89	040008/2014	SANTA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
90	040007/2014	LAJES PINTADAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
91	040005/2014	PARAZINHO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

92	040003/2014	JANDEIRA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
93	040001/2014	JACANA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
94	040000/2014	CURRAIS NOVOS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
95	039978/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
96	039973/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
97	039971/2014	MUNICIPIO DE BREJINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
98	039733/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
99	039665/2014	MUNICIPIO DE CERRO CORA - PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise
100	039638/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
101	039633/2014	MUNICIPIO DE FLORANIA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

102	036529/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 82029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado em Análise
103	036442/2014	ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA	SE	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 82029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
104	036438/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	MG	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
105	036339/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
106	036275/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
107	036138/2014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	PE	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 8689 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO - PROGRAMAÇÃO	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
108	034868/2014	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	PE	PROGRAMA 2029 – DESENVOLVIMENTO, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA.AÇÃO 8340 – DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
109	024010/2014	MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO	RN	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

110	023207/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação
111	023169/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
112	020551/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

LEGENDA	
	PROPOSTAS ANALISADAS E APROVADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS POR IMPEDIMENTO TÉCNICO
	PROPOSTAS EM PROCESSO DE ANÁLISE
	PROPOSTAS A SEREM ANALISADAS

4.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)

Não informado pela unidade.

4.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

Não informado pela unidade.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

Não informado pela unidade.

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009

Não informado pela unidade.

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{170 \times 100}{199} = 85,43\%$$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-nov/2014

f) Comentários: A unidade centrou suas ações na promoção de eventos *in company*. As ações de capacitação oportunizaram o aumento significativo da participação de servidores, com ênfase na capacitação gerencial e técnica, consolidando os objetivos previstos no Plano de Capacitação/2014. Ressalte-se que a promoção de capacitação para implementar um modelo de gestão por competências, marcou a reflexão sobre a necessidade de alinhar a capacitação às diretrizes estratégicas de desenvolvimento de pessoas e objetivos da instituição. A capacitação fomentou o estímulo ao autodesenvolvimento associado ao desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, **a meta prevista para capacitar 199 (cento e noventa e nove) servidores, foi parcialmente atingida, alcançando 170 (cento e setenta) servidores, representando 85,43%**. Considerando que **a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registra-se 639 (seiscentas e trinta e nove) inscrições efetivamente realizadas**.

g) Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2012 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 71,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,65 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 18,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 38,0 % (3º Ciclo 2013)


Jan a nov/2013 = 45,4 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 47% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 60% (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

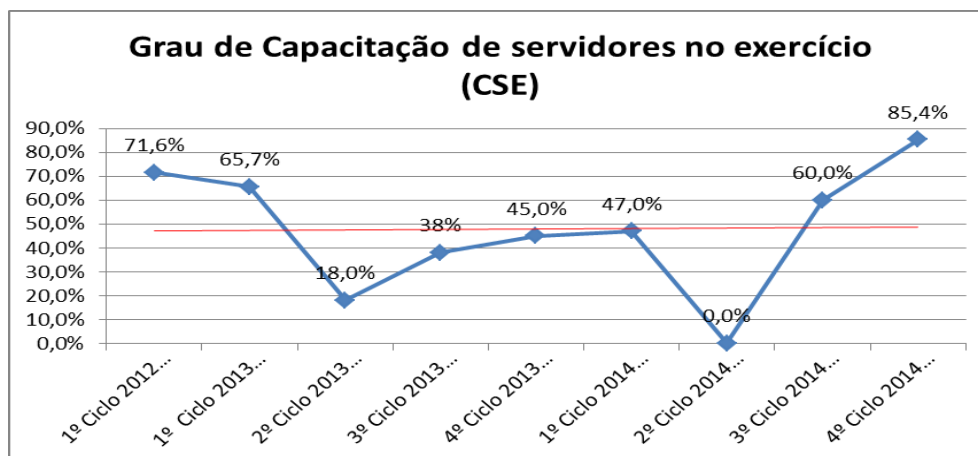

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{99 \times 100}{40} = 247,5\%$$

b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-nov/2014

f) Comentários: A inclusão de novos servidores no quadro de pessoal da Sudene impulsionou a realização de eventos de capacitação, expandindo-se as capacitações na área técnica, configuradas como preparação para o exercício profissional e para o desenvolvimento das competências exigidas para execução das atribuições específicas das unidades administrativas. **Foram realizados 99 (noventa e nove) eventos de capacitação, superando a meta prevista de 40 (quarenta) eventos de capacitação. O número representa 247,5% de realização, ou seja, 147,5% a maior da previsão.** Esse dado reflete o aumento da força de trabalho na Sudene e, especificamente na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, que contribuiu significativamente para a promoção dos eventos.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 66,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 80,0 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 17,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 60,0 % (3º Ciclo 2013)


Jan a nov/2013 = 157,0 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 174% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 90% (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

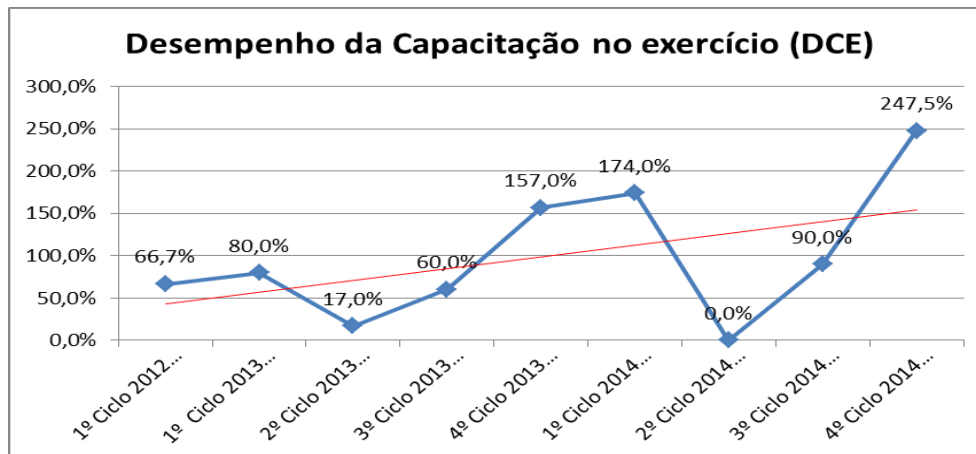

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{372.695,44 \times 100}{500.000,00} = 74,54\%$$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)

e) Periodicidade: jan-nov/2014

f) Comentários: O incremento na realização de capacitações *in company* refletiu nas metas do número de servidores atingidos, na quantidade de capacitações realizadas e no investimento. Ressalte-se que a Sudene arcou com o pagamento de capacitações, quer sejam individuais quer sejam de grupos, no valor de R\$ 204.774,44 (duzentos e quatro mil e setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Some-se a isso os custos com passagens e diárias no montante de R\$ 167.921,00 (cento e sessenta e sete mil e novecentos e vinte e um reais), perfazendo assim, o total de R\$ 372.695,44 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), representando 74,54% do valor previsto para o investimento em capacitação. Conclui-se, portanto, que a promoção de eventos fechados, que alcança um maior número de servidores, reduz os afastamentos que implicam gastos com passagens e diárias. Embora não tenha alcançado o valor previsto para o investimento em capacitações, a experiência traduz êxito, economia e racionalidade com o dinheiro público.

g) Resultados Anteriores (NIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 27,8 % (1º e único Ciclo 2012)


Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 8,49 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 29,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 37% (4º ciclo 2013)
 Jan a dez/2013 = 38,25% (1º ciclo 2014)
 Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)
 Jan a ago/2014 = 24,56% (3º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

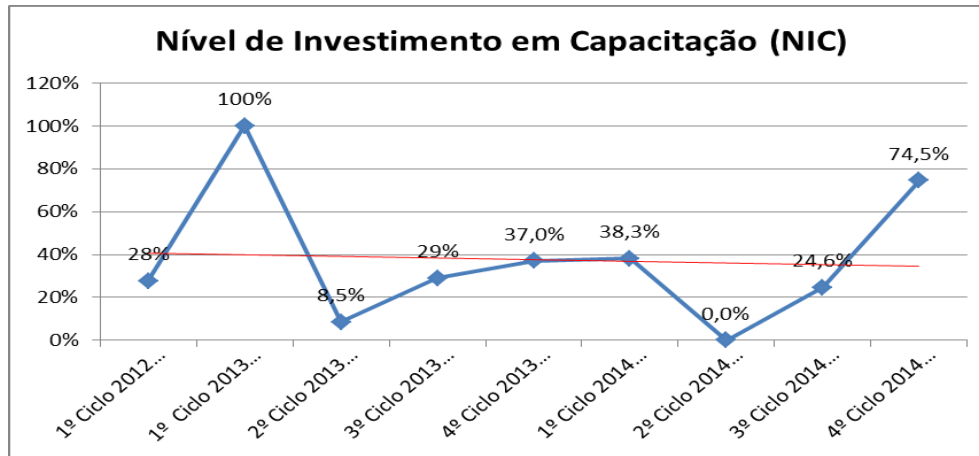

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{56\% + 18,4\% + 87\% + 25,65\%}{4} = 46,76\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG)/Coordenação-Geral de Administração e Finanças (CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 28/11/2014

f) Comentários:

Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (56%); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (18,4%); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (87%); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (25,65%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 (4 projetos) = 33,9 % (resultado influenciado pelo detalhamento previsto desses projetos) (1º Ciclo 2013)

Até mai/2013 = 43,67% (2º Ciclo 2013)

Até ago/2013 = 61,7% (3º Ciclo 2013)


Até nov/2013 = 38,55% (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 41,63% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 43,99% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 45,64% (3º ciclo 2014)

h) Representação gráfica

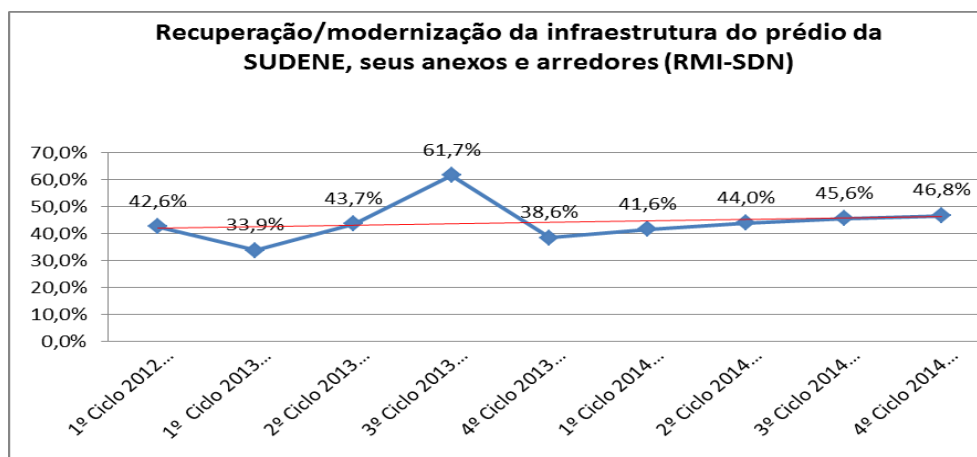

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é obtido do respectivo Plano Operativo interno.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula:
$$\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}} =$$

$$\frac{(2.630.114,65+30.000,00+5.115.374,59+100.000,00) \times 100}{3.193.554,19+30.000,00+8.229.186,02+100.000,00} = 68,17\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação das fundações do prédio sede, recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, sistema de combate a incêndio e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 28/11/2014

f) Comentários:

Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 2.630.114,65 e novo limite autorizado acumulado=R\$ 3.193.554,19); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (aplicado acumulado de R\$ 30.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 30.000,00). f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 5.115.374,59 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.229.186,02); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 100.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 48,5 % (1º Ciclo 2013)

Mai/2013 = 60,4 % (2º ciclo 2013)

Ago/2013 = 42,6 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 73,92 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 53,56% (1º ciclo 2014)


Jan a mai/2014 = 67,37% (2º Ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 67,37% (3º ciclo 2014)

Notas:

Os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

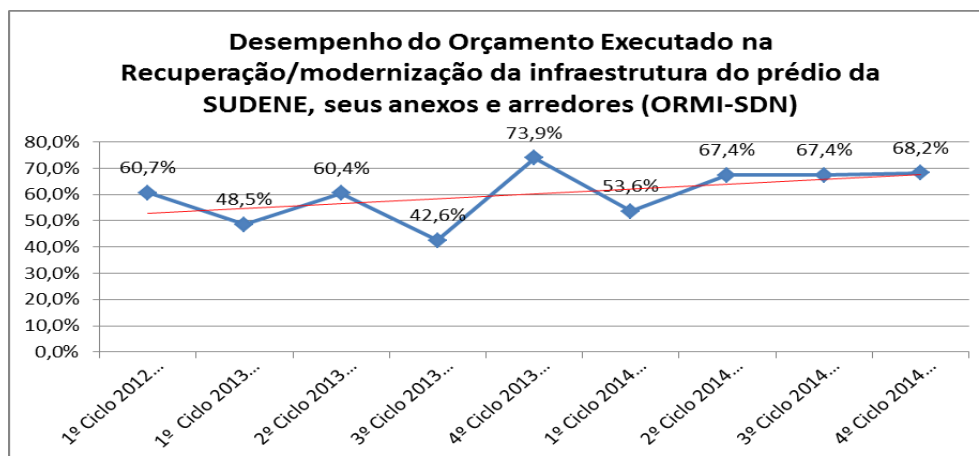

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 107, de 28/11/2013, alterado pela Portaria SUDENE nº 134, de 18/09/2014 (ADI)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc. executados das metas e dos projetos¹ =

$$\frac{94\% + 100\% + 94,43\% + 140,37\% + 100\% + 100\% + 87\% + 74\% + 100\% + 97\% + 80,5\%}{11} = 97,03\%$$

No cálculo abaixo estão consignados os resultados convertidos em pontos, como pede o Decreto nº 7.133/2010, cujo limite para valores iguais ou maiores que 100% está limitado a 80 pontos.

$$\frac{75,2 + 80 + 75,54 + 80 + 80 + 80 + 69,6 + 59,2 + 80 + 77,6 + 64,4}{11} = \frac{821,54}{11} = 74,69 \text{ pontos}$$

b) Objetivo: Aferir o estágio de execução do conjunto dos projetos estratégicos escolhidos como metas para avaliação de desempenho institucional, cuja apuração final compreendeu o período 01/out/2013 a 30/set/2014.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI).

Notas:

1-As fontes de dados são as detentoras de projetos inscritos na Portaria SUDENE nº 107, de 28/11/2013, alterada pela Portaria SUDENE nº 134, de 18/09/2014, adiante relacionadas: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN), da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN) e Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF/DFIN), ambas vinculadas à Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN); Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas (CGC/DAD), Coordenação de Serviços Gerais e Logística (CSG/DAD), Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI/DAD) vinculadas à Diretoria de Administração (DAD); e, Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

2-A Portaria SUDENE nº 134/2014 também suprimiu o projeto do Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, relacionado à Ações 8340-Rede Regional de Inovação (1 projeto) pois o Projeto de Inserção Tecnológica na Educação (PIT 3D) foi cancelado devido a cortes no orçamento; motivo semelhante que também atingiu o Objetivo Estratégico 1.1- Aumentar a Competitividade do Setor Produtivo, fortalecendo Cadeias e Arranjos Produtivos, Estimulando a Inovação, Articulando-os a Investimentos Estruturadores (2 projetos), pois o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro, não contou com limite orçamentário do MI e o da reorganização da Malha Aérea Regional, projeto cuja articulação foi pedida pela Casa Civil da Presidência da República, que passou a concentrar o trabalho.

3-Também foram ajustadas as metas da CGC, que a pedido da unidade, passou a trabalhar com “2 projetos realizados” como meta, incorporando as oficinas previstas, haja vista as dificuldades criadas pelos estados para dar o apoio necessário à realização desses eventos.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 30/10/2014 (Portaria SUDENE nº 150)

f) Comentários: Os valores utilizados no cálculo foram obtidos da relação entre metas alcançadas e previstas, e dos percentuais físicos dos planos operativos (projetos) selecionados

segundo programas e ações do PPA 2012-2015, e Diretrizes/Objetivos Estratégicos do planejamento estratégico da SUDENE, na data da aferição.

g) Quadro de metas e resultados alcançados:

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Prevista	Realizado no período	Percentual Atingido (%) (1)	Desempenho Institucional Atingido para fins de GDPGPE e GDACE (Pontos) (2)	Projetos ou metas
2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração da unidade	Projeto implementado	1	1	94,00%	75,20	DAD-PO 52 - Recuperação do anexo Nilo Coelho.
	4572- Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada	40	67	100,00%	80,00	DAD/CRH-Auto-explicável (67 capacitações realizadas entre out/2013 e set/2014) (3)
2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos atendidos	341	322	94,43%	75,54	DFIN/Incent Fiscais - Auto-explicável (286+36=322 pleitos atendidos entre out/2013 e set/214)
	0355- Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	R\$ 2.000.000.000	R\$ 2.807.476.613	140,37%	80,00	DFIN/FDNE-Cálculo computado após aprovação do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE. Acréscimos a projetos em execução, desde que aprovados pelo mesmo colegiado, poderão ser computados como meta física. Até set/2014=R\$ 2.807.476.612,52. (4)
	20N9-Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Projeto	1	1	100,00%	80,00	DPLAN/CGDS-PO 01- Cadeia do mel - Capacitação de 140 apicultores em associativismo, cooperativismo e formação de redes de comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel - Chapada do Araripe ou projeto novo.
	4640- Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Projeto	1	1	100,00%	80,00	DPLAN/CGDS-PO 08- Capacitação de recursos humanos para a competitividade - mulheres na construção civil.
	8902-Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Projeto	1	1	87,00%	69,60	DPLAN/CGDS- PO 05- Plano estratégico de consolidação dos eixos integrados de desenvolvimento do estado da Paraíba ou projeto novo.
	8918-Ampliação e fortalecimento das Estruturas Produtivas	Projeto	1	1	74,00%	59,20	DPLAN/CGDS-PO 04- APL da ovinocaprinocultura - Capacitação de produtores familiares e fortalecimento das estruturas produtivas da caprinocultura e apicultura no estado de Pernambuco ou projeto novo.

Continua

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Prevista	Realizado no período	Percentual Atingido (1)	Desempenho Institucional Atingido para fins de GDPGPE e GDACE (2)	Projetos ou metas
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.5-Fortalecer as administrações públicas	Projetos realizados	2	2	100,00%	80,00	CGC- Projeto 1 - (PO 50) - Oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados no SICONV, bem como, orientações legais, da fase inicial, de celebração dos convênios na área de atuação da SUDENE (5 foram realizadas); e, Projeto 2 - (PO 51) - oficina para transmitir aos convenentes, orientações de acompanhamento, execução e prestação de contas dos convênios vigentes.
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	1	1	97,00%	77,60	CGGI- PO 47- Regimento interno da SUDENE.
	O3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planos aprovados	2	2	80,50%	64,40	DAD/CGTI-(PO 58)-PETI e (PO 59)-PDTI aprovados pela Diretoria colegiada (RESULTADO DA MÉDIA)
MÉDIA ARITMÉTICA		-	-	-	-	74,69	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

(1)- Na coluna "Percentual Atingido" foram computados os resultados indicados pelo plano operativo, projeto ou meta, até de 30/09/2014 ou a razão entre o realizado e o previsto, no caso de metas. Em alguns casos de mais de um projeto numa mesma ação do PPA ou objetivo estratégico, foi calculada a média aritmética dos resultados.

(2) - Na coluna "Desempenho Institucional Atingido para fins de GDPGPE e GDACE", cada 1% (um por cento) equivale a 0,8 (oito décimos de ponto) para fins de conversão aos pontos da avaliação de desempenho institucional prevista pelo Decreto nº 7.133, de 19/03/2010, alterado pela Lei nº 12.277, de 30/06/10 e pelo Decreto nº 7.849, de 23/11/12, para fins de concessão da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE e da Gratificação de Desempenho de Atividades de Cargos Específicos - GDACE. O limite máximo é de até 80 pontos.

(3)- Capacitação realizada significa que o evento foi efetivamente autorizado e realizado.

(4) -Foram computados os financiamentos do FDNE aprovados no período, referentes a cinco projetos: Shineray do Brasil S/A (R\$ 61.867.350,00), Foz do Atlântico Saneamento S/A (R\$ 415.582.562,52), Braskem S/A (R\$ 50.000.000,00), Cia Siderúrgica Suape (R\$ 1.075.935.000,00) e Transnordestina Logística S/A - Aditivo - (R\$ 1.204.091.700,00).

Notas:


- Foi aplicado o dispositivo previsto pelo § 2º, art. 5º do Decreto nº 7.133/2010, em razão de fatores externos que contribuíram para inviabilizar a execução do Programa 2068-Saneamento Básico, do PPA, Ação 116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco em razão de fatores externos que contribuíram para dificultar a execução do programa, o mesmo se aplicando à Ação 8689 - Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico, com 1 projeto, em razão de mudanças no processo licitatório adotado pelo Estado de Pernambuco repercutindo nas dificuldades enfrentadas pelo executor, a Secretaria de Meio Ambiente.

- Todos os dados informados são de responsabilidade dos gestores de cada projeto.

- Período de referência dos dados: 01/out/2013 a 30/set/2014

- h) Resultados anteriores:
 Mar-2014 = 51 % (1º Ciclo 2014)
 Mai-2014 = 69 % (2º Ciclo 2014)
 Ago/2014 = 89,5% (3º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

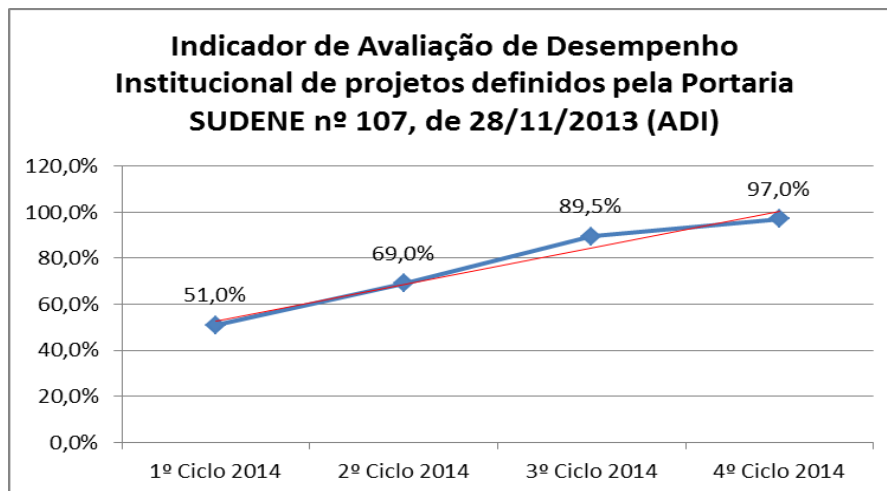

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

¹ Os projetos referenciados são os constantes de Planos Operativos internos que se utilizam de programas do PPA e das definições estratégicas da Superintendência da SUDENE, relacionadas no quadro acima, inclusive metas de investimento do FDNE.

- O percentual de 97,03%, convertido em pontos para fins de cálculo da parcela de desempenho institucional, cujo limite é de até 80 pontos, alcançou 74,69 pontos.

8 – Observações e Deliberações em plenária de 18/12/2014

As deliberações ou encaminhamentos foram postas na ordem de seu surgimento no debate, daí o sequenciamento das declarações vinculadas a POs.

- A Coordenação-Geral de Desenvolvimento Sustentável, através da servidora Maria Helena, reforçou o desejo de revisão do modelo de POs adotados pela unidade, retirando da etapa do PO o item que trata da emissão de Parecer Financeiro por se tratar de responsabilidade da unidade de Gestão de Convênios haja vista que o retardo de seu cumprimento tem afetado o percentual do andamento dos projetos, mantendo, entretanto, a emissão do Laudo Técnico. Esse assunto já havia sido registrado em reunião do ciclo anterior, sendo sugestão da CGGI uma reunião entre os Diretores para tratar do assunto, providência que não houve por razões de agenda do colegiado. Desta forma, o Diretor da diretoria de planejamento e também superintendente substituto, Sergio Alencar, propôs uma reunião com as unidades envolvidas no processo para discutir o assunto proposto, que já conta com posição favorável do gestor da unidade de convênios, Heber Leandro Nunes.

PO 09 – Por motivos do período eleitoral a liberação de recursos para este projeto atrasou, sendo assim a servidora Vera Assunção sinaliza a necessidade de prorrogação da vigência convênio. Nesse contexto, o Sérgio Alencar, como Diretor da DPLAN, pedirá celeridade à Procuradoria Jurídica junto à SUDENE para este e os outros processos novos, a serem celebrados.

PO 11 – A servidora Juliana Borges sinaliza necessidade de reajuste do cronograma. Sérgio Alencar, na condição de Diretor da PLAN alertou que se as dificuldades da EMATER se mantiverem até jan/2015, pedirá celeridade ao conveniente.

PO 15 – Trata-se de projeto que atende à recomendação do TCU no sentido de apresentar os resultados da avaliação dos projetos do Plano Regional de Desenvolvimento. De acordo com a DPLAN, a metodologia para avaliação de projeto piloto já está pronta. A CGGI sugeriu que a unidade preparasse expediente ao TCU informando da evolução da recomendação e dos resultados já alcançados como forma de evitar futuras e desnecessárias pressões. A DPLAN irá encaminhar expediente ao TCU informando dos resultados já alcançados no trabalho.

POs 16 a 42 - FDNE- A Coordenadora-Geral Sabrina Lyra alertou para a disparidade da realidade fática dos projetos com a situação representada nos PO's. Isso em função de alguns projetos já estarem em operação e fisicamente concluídos necessitando apenas a emissão de certificado de conclusão que é de responsabilidade dos agentes operadores, mas que por força do Decreto nº 7.838/2012 não têm prazo para a emissão do “Certificado de Empreendimento Implantado” ficando o projeto na condição de “Atrasado”. Explicou que já está pronta uma resolução para determinar prazo para a emissão de tal documento, bem como, foi novamente vislumbrada a ideia da Sudene emitir um documento que ateste a conclusão do projeto que assim finalizaria o PO.

- **PO 16** – Repactuação das datas das liberações. As liberações 8 e 9 (etapas 15 e 16) passam de dez/2014 e mai/2015, para fev e set/2015 respectivamente.

- **PO 19** – Segundo a Coordenadora-Geral Sabrina Lyra, em que pese o registro no PO, o projeto não se encontra “paralisado”, estando em uma situação peculiar no seu ritmo em função da transição do FDNE antigo para o novo.

- **PO 42** - informações atuais dão conta de que a Etapa 4 (contratação do banco operador) já se encontra com 100%.

PO 46 – Sistema de combate a incêndios – Tem havido dificuldade de surgimento de propostas nas licitações. O Coordenador-Geral, Hildo Pereira, informa que levará à Diretoria Colegiada a proposta de retirada do PO, alegando que com a mudança da SUDENE para outro local esse projeto seria responsabilidade do novo condômino. Foi colocada pela DAD a ideia de inclusão já no próximo ciclo do novo plano operativo de reforma do edifício da Sudene.

PO 49 e 50 – PROCONDEL – Foi levantada, pelo Coordenador-Geral Frederico Cavalcanti, a necessidade de nomeação de um servidor ou comissão da SUDENE para ser responsável pelo projeto. A CGGI informou que o Superintendente José Márcio já havia promovido reunião nesse sentido, envolvendo as unidades de documentação (biblioteca) e de Comunicação Social. A SUDENE está aguardando o relatório do projeto, a ser apresentado pela Universidade Federal de Pernambuco, para reconstruir as tratativas com aquela instituição e encaminhar as providências necessárias para a conclusão do projeto Procondel I e a retomada do Procondel II ouvida a responsável pelo Projeto até julho/2014, Senhora Ângela Nascimento, que não mais integra o quadro da Autarquia.

POs 52 e 53 - Sobre o projeto de “modernização da infraestrutura de rede local” e do “Sistema Informatizado de Gestão do FDNE” o Coordenador-Geral de TI, Josué Ribeiro, solicitou o apoio da Diretoria Colegiada na priorização de recursos para futuro investimento em equipamentos e sistema que ajudarão na mudança de local da SUDENE, e na documentação do sistema do FDNE. A propósito. a grande preocupação da unidade é com o processo de transferência tendo em vista a necessidade de recursos de investimento já no início do próximo ano. A CGGI alerta para que a Superintendência envide esforços junto à Coordenação-Geral de Orçamento/MI haja vista que normalmente, nos primeiros meses do ano os recursos recebidos são na forma de duodécimos, e para custeio, geralmente insuficientes e inadequados para as características das despesas pretendidas.

8 - Conclusões

Ao fim deste 4º ciclo de monitoramento que encerra os trabalhos de acompanhamento das ações da Sudene no ano de 2014, podemos observar uma evolução em boa parte dos indicadores bem como da gestão dos projetos como um todo. Nesse período, e em consonância com as deliberações e questionamentos surgidos durante o ano, foram introduzidas mudanças na metodologia do monitoramento para melhor refletir os trabalhos desenvolvidos. Todas estas mudanças solicitadas pelos setores foram expostas e detalhadas nos ciclos e referendadas pelos gestores.

Assim como nos outros ciclos, durante a reunião foi dada ênfase aos projetos que estavam na condição geral de “Atrasado” ou “Paralisado” ou que estavam em “Em Andamento”, mas tinham alguma etapa atrasada ou paralisada, ou que mereciam alguma observação tendo em vista sua relevância.

Outrossim, foram apresentadas nesse ciclo algumas sugestões que serão pontos de aperfeiçoamento para os ciclos do ano de 2015. Nesse sentido foi sugerida pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável que fosse revista a configuração dos planos operativos daquele setor com a transferência da etapa de “emissão do Parecer Financeiro” para a unidade de gestão de convênios que tem responsabilidade para tal, sugestão já acatada pelo Superintendente substituto e também pelo gestor de convênios, Heber Leandro Nunes.

Já a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento lembrou a necessidade de adequação dos planos operativos relativos ao FDNE para aqueles casos de projetos concluídos e que dependem apenas da emissão do Certificado de Empreendimento Implantado, de responsabilidade do Banco Operador, onde a SUDENE nada mais tem de compromisso. As providências necessárias estão sendo realizadas pelo setor ou em fase de discussão.

Para os próximos ciclos de 2015 o calendário está definido conforme abaixo, lembrando que a data de referência para os dados é a mesma para atualização dos indicadores. Significa que os indicadores cujo cálculo é cumulativo, deverão ser atualizados sempre de janeiro até a data de entrega dos dados.

Também cabe lembrar que o primeiro ciclo de 2015 funcionará como fechamento dos resultados do período jan-dezembro/2014, exceto para o indicador de avaliação de desempenho institucional, que compreende outro período.

Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos de Monitoramento da SUDENE para o Exercício de 2015

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	13/03/15	20/03/15	02/04/15
2º	29/05/15	05/06/15	18/06/15
3º	28/08/15	04/09/15	25/09/15
4º	27/11/15	04/12/15	17/12/15

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 01 (ex PO 02)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.			
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.			
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 234.105,49	R\$ 246.426,82

Cronograma de Desemboio				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 139.865,15	R\$ 7.361,32	mai/12	R\$ 147.226,47	Pago até o ano anterior	R\$ 139.865,15
R\$ 94.240,34	R\$ 4.960,01	jun/12	R\$ 99.200,35	A realizar no exercício (2014) RAP 2012	R\$ 94.240,34
R\$ 234.105,49	R\$ 12.321,33	-	R\$ 246.426,82	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 94.240,34
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 139.865,15

Previsão de Conclusão:	06/02/2015	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)
Data Atualização:	28/11/2014	

Vigência: 18/12/12 a 06/02/2015

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Juliana de Melo Borges, Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Glíeldson Alves da Silva - CONDEPE/FIDEM
--	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2012	02/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								47,1%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	6/2/2015		1/12/2013			36%	Em Andamento		
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social (R\$ 42.879,89)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/1/2014		1/12/2013	14/3/2014		100%	Concluído	O convênio atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100%	Concluído		
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	30/9/2014		14/3/2014			85%	Atrasado	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao convênio um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.

9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/11/2014	30/11/2014	R\$ 94.240,34			0%	A Iniciar		
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/10/2014	16/11/2014				0%	Atrasado	Data será repactuada a partir de nova agenda.	
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	6/5/2014	6/1/2015				0%	A Iniciar		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	07/02/2015	08/04/2015				0%	A Iniciar		
11	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGDS/DPLAN/SUDENE	07/02/2015	08/04/2015				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ 234.105,49	Valor realizado:	R\$ 139.865,15	67,13%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

4º Ciclo - 2014. Alterações realizadas na etapa 9.1, 9.3. e 9.4

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, conseqüentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 530.482,50	R\$ 589.425,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
R\$ 265.241,25	R\$ 58.942,50	DEZ/2012	R\$ 324.183,75	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ 265.241,25
R\$ 265.241,25	--	MAIO/2013	R\$ 265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 530.482,50	R\$ 58.942,50	-	R\$ 589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Previsão de Conclusão:	31/12/2014	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	28/11/2014	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Ferreira da Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012			100%	Concluído	
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012			100%	Concluído	
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012			100%	Concluído	
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012			100%	Concluído	
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012			100%	Concluído	
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012			100%	Concluído	
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012			100%	Concluído	
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013			100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									27,0%	Atrasado	
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100%	100%	Concluído	

6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado	--	65%	Em Andamento	Constavam no SICONV, até o ciclo anterior, informações relativas à contratação dos serviços de aluguel de veículos, aquisição de combustível e aquisição de material de consumo. Neste ciclo foram acrescidos dados relacionados à seleção para contratação de empresa especializada para a realização dos 61 encontros previstos na Etapa 1 / Meta 1 deste projeto.	
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco (R\$ 356.560,00)	SEMAS/PE	01/07/2014	31/12/2014				0%	A Iniciar	Foi encaminhado pelo Coordenador técnico do projeto da SEMAS/PE, em 24/11/2014, um Relatório Técnico das Atividades. Neste consta que foi realizada licitação e homologação de empresa para a realização dos 61 encontros previstos e que esta já teria apresentado à SEMAS/PE a metodologia e agenda propositiva para a realização destes eventos. Informa ainda a utilização dos veículos locados, sendo um para viagens de cotejamento das informações da verdade terrestre (Meta 2) e o outro para a mobilização dos municípios contemplados com os encontros previstos (Meta 1). Com relação a realização dos 14 Workshops, indicou a elaboração de um Termo de Referência e o encaminhamento para a Comissão Permanente de Licitação (CPL) para os procedimentos licitatório desses eventos.	
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano (R\$ 146.400,00)	SEMAS/PE	01/07/2014	31/10/2014				0%	Atrasado		
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir				0%	A Iniciar		
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/09/2014	30/09/2014	R\$ 265.241,25			0%	Atrasado		
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto (R\$ 176.960,00)	SEMAS/PE	01/11/2014	09/12/2014				0%	A Iniciar		
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da C34 Desertificação na Região Nordeste (R\$ 33.200,00)	SEMAS/PE	10/12/2014	31/12/2014				0%	A Iniciar		
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco (R\$ 232.865,00)	SEMAS/PE	01/05/2014	31/12/2014		Não informado		15%	Em Andamento	Neste relatório encaminhado informa também que a Embrapa vem realizando o processamento digital de imagens de satélite, verificando a verdade terrestre, identificando, preliminarmente os tipos de solo e a cobertura vegetal. Indica que está em elaboração uma versão preliminar dos indicadores de solos e cobertura vegetal (já apresentada a SEMAS/PE), bem como um documento para discussão nos Encontros previstos.	
8.1	META 2/ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas (R\$ 182.865,00).	SEMAS/PE	01/05/2014	31/12/2014		Não informado		30%	Em Andamento		
8.2	META2/ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas (R\$ 50.000,00)	SEMAS/PE	15/11/2014	31/12/2014				0%	A Iniciar		
***	Visita para emissão de Laudo/Parecer Técnico Final	CGDS/SUDENE	A definir	A definir				0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/01/2015	01/03/2015				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ 530.482,50	Valor realizado:	R\$ 265.241,25	47,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UE.

Observações:

4º ciclo 2014

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 03 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas		Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.			
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 4	30	R\$ 694.459,19	R\$ 771.621,32

Cronograma de Desemboço			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 419.104,63	R\$ 77.162,13	dez/12	R\$ 496.266,76
R\$ 137.677,28	--	jan/13	R\$ 137.677,28
R\$ 137.677,28	--	abr/13	R\$ 137.677,28
R\$ 694.459,19	R\$ 77.162,13	-	R\$ 771.621,32

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	419.104,63
A realizar no exercício (2014)	R\$	275.354,56
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	137.677,28
Saldo a liberar (2014)	R\$	137.677,28
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	556.781,91

Previsão de Conclusão:	30/12/2014	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)
Data Atualização:	28/11/2014	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Marcelo de Castro Viana, Victor Uchôa Ferreira da Silva e Marcelo Saiki Braga - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não Informado	10/05/2012		Não Informado	10/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								53,5%	Em Andamento		
8	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE	18/06/2013	02/07/2013		23/07/2013	28/08/2013		100%	Concluído		
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/10/2012	Não Informado	R\$ 419.104,63	23/11/2012	12/12/2012	R\$ 419.104,63	100%	Concluído		
9	Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		25/11/2013	15/09/2014		100%	Concluído		
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		13/01/2014			91%	Em Andamento	Realizados 11 cursos de apicultura, 91% do programado.	

	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	Não Informado		28/01/2014	06/02/2014		100%	Concluído	()	
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	R\$ 137.677,28	09/04/2014	19/05/2014	R\$ 137.677,28	100%	Concluído		
11	Adquirir 540 colméias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014			07/08/2014	22/08/2014		100%	Concluído	(**)	
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/11/2014	R\$ 137.677,28				0%	A Iniciar		
13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrífuga extratora de mel, Mesa desoperculadora de favos e Tanque decantador para mel (R\$ 204.702,72)	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob aspecto físico e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/SUDENE	18/08/2014	02/01/2015					0%	A Iniciar		Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
15	Análise da PTC, sob aspecto financeiro final.	CGC/SUDENE	18/08/2014	02/01/2015					0%	A Iniciar		Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
Valor Previsto:					R\$ 694.459,19	Valor realizado:			R\$ 556.781,91	73,5%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:

Em 16/06/2014 foi assinado o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 30/12/2014

(*) A viagem de supervisão foi realizada no período de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto

(**) A viagem de supervisão foi realizada no período de 07 a 08/08/2014 e 20 a 22/08/2014, na área de atuação do Projeto

4º ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 100	3330.41	30	R\$ 1.794.595,93	R\$ 2.000.000,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 732.887,59	R\$ 79.238,97	nov/12	R\$ 812.126,56	Pago até o ano anterior	R\$ 1.794.595,93
R\$ 527.102,12	R\$ 67.204,78	nov/13	R\$ 594.306,90	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
R\$ 534.606,22	R\$ 58.960,32	dez/13	R\$ 593.566,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 1.794.595,93	R\$ 205.404,07	-	R\$ 2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.794.595,93

Previsão de Conclusão:	28/05/2014	CONVÊNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)
Data Atualização:	28/11/2014	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel de Sá Jardim Neto - SUDENE / Gustavo Nogueira e Luiz Carlos Soares - SEPLAG-PB
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor (SUDENE)	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	14/12/2012	18/12/2012		14/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	02/01/2013		18/12/2012	02/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído	O convênio foi prorrogado "de ofício" após a data de referência do PO para 28/05/14.	
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	R\$ 732.887,59	01/11/2012	30/11/2012	R\$ 732.887,59	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/2013	25/07/2013		100%	Concluído	Edital da licitação (nº 001/2013) registrado na CGE-Controladoria Geral do Estado, sob nº 13-00476-0 e publicado em 23/04/2013, nos jornais de grande circulação e diários oficiais. Contrato com a empresa vencedora assinado em 25/07/13, mas só registrado no SICONV após formalização do 2º Termo Aditivo.	
9	Meta I: Estruturação do Plano Estratégico da Micrologística do Transporte de Cargas do Estado da Paraíba (R\$ 274.617,39)	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
9.1	Diagnóstico das cadeias produtivas paraibanas	SEPLAG/PB	01/08/2013	27/09/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.2	Diagnóstico da infra-estrutura da logística do transporte de cargas do estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	11/10/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.3	Priorização dos Projetos Estratégicos Micrologísticos para o estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	12/11/2013		100%	Concluído		

9.4	Relatório Intermediário do Plano de Micrologística do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	08/11/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído	
	Liberação da 2ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2013	30/11/2013	R\$ 527.102,12	25/11/2013	02/12/2013	R\$ 527.102,12	100%	Concluído	
9.5	Relatório Final do Plano de Micrologística do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
10	Meta II: Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial do Estado da Paraíba (R\$ 463.979,98)	SEPLAG/PB	30/08/2013	28/01/2014		30/08/2013	11/02/2014		100%	Concluído	
10.1	Avaliação do Potencial Econômico das Cadeias Produtivas	SEPLAG/PB	30/08/2013	18/10/2013		30/08/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
10.2	Estudo de Mercado dos Produtos Priorizados	SEPLAG/PB	13/09/2013	08/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
10.3	Priorização dos cinco Produtos-Chaves	SEPLAG/PB	01/11/2013	22/11/2013		01/11/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
10.4	Elaboração de um Plano de Implementação	SEPLAG/PB	22/11/2013	06/12/2013		22/11/2013	11/02/2014		100%	Concluído	
10.5	Relatório Intermediário do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	22/11/2013		01/08/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
10.6	Relatório Final do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	11/02/2014		100%	Concluído	
11	Meta III: Plano Estratégico de Energia do Estado da Paraíba (R\$ 298.553,40)	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
11.1	Avaliação da Situação Atual do Suprimento e Distribuição de Energia da Paraíba	SEPLAG/PB	13/09/2013	25/10/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
11.2	Avaliação das necessidades energéticas da Paraíba	SEPLAG/PB	11/10/2013	08/11/2013		11/10/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
11.3	Avaliação dos "gaps" e priorização dos investimentos em energia na Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	22/11/2013		25/10/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
11.4	Realização de 2ª visita técnica de acompanhamento	CGDS/SEPLAG	12/12/2013	12/12/2013		12/12/2013	12/12/2013		100%	Concluído	
11.5	Relatório Intermediário de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	22/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
	Liberação da 3ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2013	31/12/2013	R\$ 534.606,22	19/12/2013	30/12/2013	R\$ 534.606,22	100%	Concluído	
11.6	Relatório Final de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12	Meta IV: Plano Estratégico de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação (R\$ 380.603,91)	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
12.1	Verificar estado atual de TIC do Estado da Paraíba e estimar oferta de serviços.	SEPLAG/PB	27/09/2013	18/10/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.2	Identificar prioridades e demandas do plano de desenvolvimento industrial e logístico e mapear necessidades futuras de TIC.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.3	Explicitar lacunas entre necessidades projetadas e oferta planejada.	SEPLAG/PB	11/10/2013	15/11/2013		11/10/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.4	Identificar alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de uma infraestrutura de TI.	SEPLAG/PB	08/11/2013	22/11/2013		08/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.5	Desenvolver e priorizar iniciativas para atender à demanda por serviços.	SEPLAG/PB	15/11/2013	29/11/2013		15/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.6	Consolidar o Plano de TIC.	SEPLAG/PB	22/11/2013	20/12/2013		22/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.7	Relatório Intermediário do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	20/12/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.8	Relatório Final do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13	Meta V: Plano Estratégico de Capacitação do Capital Humano para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba (R\$ 376.841,25)	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído	
13.1	Mapear a demanda de recursos humanos, por tipo de capacitação profissional, visando o crescimento e investimentos do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.2	Projetara atual oferta de mão-de-obra no estado.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.3	Definir ajustes na oferta de capacitação de mão-de-obra visando o crescimento do estado.	SEPLAG/PB	29/11/2013	13/12/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.4	Dimensionar investimentos necessários para formação profissional.	SEPLAG/PB	13/12/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.5	Consolidar o Plano de Capacitação do Capital Humano do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	20/12/2013	28/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.6	Relatório Intermediário do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.7	Relatório Final do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído	

14	Relatório Final consolidado do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/04/2014		01/08/2013	18/02/2014		100%	Concluído		
15	Finalização do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	18/02/2014	28/05/2014		18/02/2014	28/05/2014		100%	Concluído	A SEPLAG formalizará solicitação de utilização dos recursos oriundos dos rendimentos de aplicação a serem aplicados em atividades de desdobramento do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									7,5%	Atrasado		
16	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/08/2014	01/10/2014		11/08/2014			75%	Atrasado	Relatórios de execução (técnico) aprovados, à emitir o laudo técnico.	O número de relatórios a serem analisados demandam um maior tempo para emissão do Laudo Técnico Final
16.1	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGDS/SUDENE	01/08/2014	01/10/2014		11/08/2014			0%	Atrasado	Não informado em razão de de não ser de responsabilidade desta unidade.	
			Valor Previsto:	R\$ 1.794.595,93	Valor realizado:		R\$ 1.794.595,93		87,5%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba (CNPJ: 08761124000100)

Observações:

2º Termo Aditivo foi solicitado pelo conveniente por meio do SICONV em 12/08/13, sendo publicado em 01/11/13.

Em 18/02/2014 a equipe técnica participou de um Seminário em João Pessoa/PB com o Governador do Estado, Secretário de Planejamento e Gestão, Gestores e Técnicos do Governo do Estado, Universidades Federal e Estadual, Parlamentares etc, onde foram apresentados o Plano Estratégico da Paraíba, relativo aos resultados do Projeto "Eixos Integrados de Desenvolvimento da Paraíba – uma visão estratégica para o Estado.

4º Ciclo 2014 - Repactuada a etapa 16

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 825.379,68

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 280.000,00
R\$ 280.000,00	R\$ 8.400,00		R\$ 288.400,00	A realizar no exercício	R\$ 520.000,00
R\$ 260.000,00	R\$ 8.400,00		R\$ 268.400,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 260.000,00	R\$ 8.579,68		R\$ 268.400,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 800.000,00	R\$ 25.379,68		R\$ 825.379,68	Valor liberado no Exercício	R\$ 520.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 800.000,00

Previsão de Conclusão:	10/03/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE (28/08/2014) - Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2012	13/06/2012		13/06/2012	13/06/2012		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/06/2012	16/06/2012		15/06/2012	16/06/2012		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	20/06/2012	21/06/2012		20/06/2012	21/06/2012		100%	Concluído		
4	Emissão de Parecer	CGDS/SUDENE	21/06/2012	28/06/2012		22/06/2012	28/06/2012		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	28/06/2012	23/08/2012		29/06/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	24/08/2012	24/08/2012		24/08/2012	24/08/2012		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2012	01/09/2012	R\$ 280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	R\$ 280.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 1ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi providenciada a Prorrogação de ofício pela SUDENE, por mais 36 dias, alterando a data de conclusão para 31/03/2014
9	Meta 1	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013		100%	Concluído	Houve atraso devido recurso judicial contra procedimento licitatório	O tribunal proferiu sentença favorável ao município. O processo licitatório foi concluído e homologado o licitante vencedor.
9.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
9.2	Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apilado.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
9.3	Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para execução das fundações.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/08/2013	30/09/2013		100%	Concluído		
9.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/06/2013	03/07/2013		27/03/2013	30/03/2013		100%	Concluído		
10	Meta 2	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	28/02/2014		01/09/2013	30/09/2014		100%	Concluído		

10.1	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2013	30/09/2013	R\$ 260.000,00	14/11/2013	14/11/2013	R\$ 260.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 2ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Solicitada prorrogação de ofício, por mais 73 dias, alterando a data de conclusão para 12/06/2014
10.2	Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	01/08/2013		01/09/2013	28/02/2014		100%	Concluído		
10.3	Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	09/12/2013	30/09/2014		01/12/2013	30/09/2014		100%	Concluído		
10.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/09/2013	02/10/2013		05/12/2013	08/12/2013		100%	concluído		
10.5	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	27/12/2013	27/12/2013	R\$ 260.000,00	06/04/2014	06/04/2014	R\$ 260.000,00	100%	concluído	Houve atraso na liberação da 3ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi solicitado termo aditivo ao convênio pelo covenente, por mais 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014
10.6	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/02/2014	17/02/2014		10/04/2014	17/04/2014		100%	Concluído		
11	Meta 3		01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100%	Concluído		
11.1	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final		10/01/2015	10/03/2015					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ 800.000,00	Valor realizado:	R\$ 800.000,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12

Informações referentes à data de 19/04/2013:

(2) Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Este atraso inicial repercutiu em todo o processo, gerando retardo nas demais etapas.

(3) Foi concluído o processo licitatório e homologada a empresa vencedora da licitação. Conforme informação do engenheiro civil responsável pelos projetos e acompanhamento de fiscalização da obra de construção da ponte de concreto armado no município de Ruy Barbosa/RN, a empresa vencedora já está instalada no canteiro de obras para iniciar os serviços preliminares de construção da ponte. Estas informações estão atualizadas até 31/05/2013.

Informações referentes à data de 29/11/2013:

(4) 4º ciclo 2013: alterações na etapa 1 da meta 2

(5) 1º ciclo 2014: Falta liberar a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, prevista para fevereiro/2014. Foi concluído a concretagem de pilares, longarinas e transversinas que compõem a estrutura de sustentação da ponte, restando a laje de concreto armado de piso, guarda-rodas e muro de proteção nas laterais da ponte. Foi concluído o muro de arrimo de proteção, constituindo-se de alvenaria de pedra argamassada, marroada, rejuntada com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4

(6) 2º ciclo 2014: foi liberada a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, em 06/04/2014.

(7) 3º ciclo 2014: Foi realizada uma vistoria de fiscalização em 10.04.2014; Foi concretada a laje de piso da ponte em concreto armado com concreto fck = 45 Mpa e espessura de 30 cm, de acordo com o projeto estrutural. Foi alocado no SICONV o termo aditivo de 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014.

(8) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em três parcelas, como segue: 1ª parcela: Out/2012 - 2ª parcela: Set/2013 - 3ª parcela: Abr/2014

(9) Em 28/08/2014, o Engº Civil Givanildo Ramos de Souza foi incorporado ao processo como responsável técnico auxiliar.

(10) Em 11/12/2014, o convenente solicitou prorrogação de ofício está prevista uma visita técnica para recebimento da obra e emissão de laudo técnico.

(11) Em 01/10/2014 foi aprovado termo aditivo de 90 dias, alterando a data de término do convênio para 10/01/2015.

(12) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.		
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas		
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	R\$ 9.452.840,00	R\$ 9.452.840,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 352.840,00
A realizar no exercício	R\$ 1.352.840,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício 2014	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.352.840,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício (2013)	R\$ 352.840,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013		100%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2013 ano base 2012(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais; Participação em Oficina de Trabalho "Balanços Energéticos Estaduais" na EPE em 27 e 28/11/2013	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	30/04/2015	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético.	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais maio/2014. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	30/04/2015		19/06/2013			80%	Em Andamento	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região	Previsto para o orçamento 2014(R\$ 5.000.000,00) ACT aprovado pela Diretoria Colegiada, enviado para chancela do Jurídico da UFPE e Ministério da Integração

8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnicas para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014			60%	Em Andamento	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Industrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil.
			Valor Previsto:		R\$ 4.452.840,00	Valor realizado:		R\$ 352.840,00	87,5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs. 4º Ciclo 2014 - Repactuadas as Atividades/Etapas 6, 7 e 8

Os recursos previstos nas Etapas 5, 6 e 7, são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 07 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014 (2ª Etapa)
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.		
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
IFPB	Sudene	1ª parc. Maio	R\$ 714.000,40	A realizar no exercício (2014)	R\$ 1.183.120,40
IFPB	Sudene	2ª parc. Agosto	R\$ 469.120,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
			R\$ 1.183.120,40	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.183.120,40
				Valor liberado no Exercício	R\$ 1.183.120,40
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.183.120,40

Previsão de Conclusão:	28/05/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Edson Fernando Laranjeiras, Macira Sotero, Vinícius Medeiros e Givanildo Ramos de Souza (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Prof.ª Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Alexandre Urquiza (IFPB).

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído	
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014	22/05/2015		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014		100%	Concluído	
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								46,5%	Em Andamento	
	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R\$ 1.183.120,40	100%	Concluído	
8	Capacitação de 200 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	30/01/2015		27/05/2014		--	73%	Em Andamento	
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído	
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído	
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014	--	100%	Concluído	
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		29/10/2013	31/10/2013	--	100%	Concluído	
8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013			--	--	100%	Concluído	
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	--	--	0%	Atrasado	Valor empenhado para a aquisição do laboratório móvel: R\$ 427.607,00. A empresa licitada não entregou no prazo a unidade móvel. Em negociação entre a empresa e o IFPB.
8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico; Curso de Pintura de Obras; Curso Auxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	Abril/Julho e Set/Nov/2014		01/04/2014			50%	Atrasado	A primeira turma foi concluída com a capacitação de 240 alunas. A meta de formação de 640 profissionais, será concluída no início do ano de 2015. O IFPB encaminhará o ajuste do plano de trabalho para repactuar um novo cronograma da segunda turma, com início em Dez./2014.
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	30/01/2015					30%	Em Andamento	Em negociação com os sindicatos da construção civil.
9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB	01/04/14	28/05/15		01/04/2014			60%	Em Andamento	Acompanhamento técnico do projeto pelos gestores do IFPB nos 4 campi, onde os cursos são ofertados.

9.1	Acompanhamento do Projeto	SUDENE	01/04/14	28/05/15		27/05/2014			60%	Em Andamento	Foram realizadas reuniões técnicas de acompanhamento nas datas 08/09/2014 e 07/10/2014 e visita técnica ao campus de Cabedelo em 24/11/2014, com relatórios de acompanhamento inclusos no processo.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
10	Relatório Final de Acompanhamento Técnico do Projeto	CGDS/SUDENE	22/06/2015	22/08/2015					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	R\$ 1.183.120,40	Valor realizado:	R\$ 1.183.120,40			66,5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

IFPB

Observações:

O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível concluí-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.

Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.

A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.

4º ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 08 (Ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2014	CONVÊNIO Nº 794997/2013
Data Atualização:	28/11/2014	Vigência: 31/12/13 a 30/12/14

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Juliana de Melo Borges, Isis Guimarães Moreira, Henrique Oliveira Pires e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Tiago Caçango Diniz - IDENE
--	--

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	R\$ 41.671,00	R\$ 281.295,52	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 230.151,48		R\$ 41.760,00	R\$ 230.151,48	A realizar no exercício (2014) RAP 2013	R\$ 485.874,65
485.874,65	25.572,35	-	511.447,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (2014)	R\$ 255.723,17
				Saldo a liberar (2014)	R\$ 230.151,48
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 255.723,17

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		28,8%	Em Andamento		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído		
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			40%	Em Andamento	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14			80%	Em Andamento	Segundo conveniente, empresa entregaria o produto 2 no final de novembro.	
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014						A Iniciar		
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48				0%	Atrasado	Pagamento será realizado após 2ª visita técnica de acompanhamento. Cronograma de desembolso será repactuado.	
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014					0%	A Iniciar		

8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014					0%	A Iniciar	
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	30/12/2014					0%	A Iniciar	
9	Evento de Divulgação	IDENE/SUDENE	20/10/2014	30/12/2014					0%	A Iniciar	
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir					0%	A Iniciar	
ENCERRAMENTO (Peso 20 %)									0,0%	A Iniciar	
18	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE							0%	A Iniciar	
18.1	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGDS/DPLAN/SUDENE							0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	R\$ 485.874,65	Valor realizado:	R\$ 255.723,17			48,8%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

4º Ciclo 2014 – Atualização das etapas 8, 8.2 e 8.3.

Fonte: CGDS/Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.			
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 207.542,62	R\$ 218.465,90

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 107.354,71	R\$ 5.650,24	FEV/2014	R\$ 113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 207.542,62
R\$ 100.187,91	R\$ 5.273,04	JUN/2014	R\$ 105.460,95	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 207.542,62	R\$ 10.923,28	-	R\$ 218.465,90	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 107.354,71
				Saldo a liberar (2014)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

Previsão de Conclusão:	01/03/2015	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)
Data Atualização:	28/11/2014	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Ferreira da Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013	100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013	100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013	100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013	100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013	100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							10,3%	A Iniciar		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	(a partir de) 27/10/2014		R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100%	Concluído	
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	01/09/2014	31/01/2015		01/09/2014	--	20%	Em Andamento	A Conveniente informou estar encontrando dificuldade em realizar os procedimentos licitatórios do Convênio 794329/2013. O principal fator seria o Modelo Atual do Termo de Referência que se encontra dividido em 03 (três) lotes, o que tornaria necessário o envio de 03 (três) cotações para cada lote somando um total de 09 (nove) cotações para abertura do processo licitatório. Indica ainda que desde setembro/2014 encaminharam propostas para empresas e, até a data desta informação (24/11/2014) não obtiveram resposta.	Desta forma, fizeram solicitação a esta Superintendência para readequarem o TR para um modelo de Lote Único, conforme realizado em outros convênios firmados entre esta Agência e a SUDENE. Diante da dificuldade e da adoção do modelo de lote único por outros convênios, a equipe técnica se manifestou pela aceitação da alteração no sentido do andamento do convênio.
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	02/09/2014	31/01/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	02/09/2014	31/10/2014	--	--	--	--	0%	Atrasado	Para que esta etapa se realize é necessário a conclusão do processo licitatório, que como indicado acima encontra-se com dificuldades em sua realização.

10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	01/11/2014	31/12/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	01/01/2015	31/01/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 100.187,91	--	--	--	0%	A Iniciar	
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	01/02/2015	01/03/2015		--	--	--	0%	A Iniciar	
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	01/02/2015	10/02/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	11/02/2015	19/02/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	20/02/2015	01/03/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
15	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
16	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGC/DAD/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	R\$ 207.542,62	Valor realizado:	R\$ 107.354,71	30,3%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros Institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral para início das atividades.

Item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 359.682,64	R\$ 378.613,30

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 221.267,56	R\$ 11.645,66	jun/14	R\$ 232.913,22	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 138.415,08	R\$ 7.285,00	dez/14	R\$ 145.700,08	A realizar no exercício (2014) RAP 2013	R\$ 359.682,64
R\$ 359.682,64	R\$ 18.930,66		R\$ 378.613,30	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 221.267,56
				Saldo a liberar	R\$ 138.415,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	28/11/2014

CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)

Vigência: 31/12/2014

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Juliana Borges, Manoel Jardim - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								22,5%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014			30%	Em Andamento	O edital da licitação foi aprovado pela Secretaria de Administração de Pernambuco e encontra-se no setor jurídico da Agência CONDEPE/FIDEM.	
9	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	30/12/2014					0%	A Iniciar		
	Realização do 1º Fórum de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data: 16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014			20%	Em Andamento	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	

9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social (R\$ 45.973,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	03/03/2014				0%	Atrasado	Foi solicitada pelo convenente a prorrogação do prazo do convênio para 31/12/2015. O aditivo foi aprovado tecnicamente, mas ainda está sendo apreciado por outros setores da SUDENE. Com a formalização do termo aditivo, o cronograma será atualizado.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir				0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 186.939,54)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/03/2014	06/06/2014				0%	Atrasado		
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2014	30/12/2014	R\$ 138.415,08			0%	A Iniciar		
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas (R\$ 67.618,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	07/06/2014	07/09/2014				0%	Atrasado		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano (R\$ 78.081,40)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	08/09/2014	03/12/2014				0%	A Iniciar		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	Atrasado		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ 359.682,64	Valor realizado:	R\$ 221.267,56	42,50%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

4º ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto:	PO 11 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil		Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil	
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres	
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almir Moreira Pinto	
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.			
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.			
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	R\$ 228.797,21	R\$ 254.219,12

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 167.999,61
R\$ 167.999,61	R\$ 25.421,91	dez/12	R\$ 193.421,52	A realizar no exercício	R\$ 60.797,60
R\$ 60.797,60	--	fev/13	R\$ 60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 228.797,21	R\$ 25.421,91	-	R\$ 254.219,12	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 60.797,60
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 167.999,61

Previsão de Conclusão:	31/05/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	28/11/2014	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcelo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
INICIAÇÃO (Peso 20%)												
									20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/3/2012	19/4/2012		20/3/2012	19/4/2012		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/4/2012	9/5/2012		23/4/2012	9/5/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	9/5/2012		Não informado	9/5/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	9/5/2012	25/6/2012		9/5/2012	25/6/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/6/2012	20/12/2012		25/6/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	4/1/2013	4/1/2013		Não informado	4/1/2013		100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)												
									21,4%	Em Andamento	O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2013, passando a vigência para 31/08/2014.	
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/6/2013	28/6/2013	R\$ 167.999,61	14/6/2013	28/6/2013	R\$ 167.999,61	100%	Concluído		
8	Processo Licitatório	Gov/PB	31/8/2013	20/3/2014		31/8/2013			50%	Atrasado	Os processos licitatórios estão em curso com previsão de conclusão no final de dezembro dos processos referentes à aquisição de equipamentos e material de consumo.	

9	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/1/2014	30/1/2014		30/1/2014	30/1/2014	100%	Concluído	Foram realizadas três visitas técnicas de acompanhamento: em 30/01/2014, em 06/06/14 e 24/11/2014. Esta última teve a finalidade de verificar o andamento dos processos licitatórios, a organização para início das capacitações e identificar os principais entraves na execução do projeto.	
10	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa Civil)	Gov/PB	30/04/2013	31/08/2014				0%	Atrasado	Os cursos estão previstos para iniciar em João Pessoa em janeiro de 2015 com a abertura do sistema de licitação do Governo do Estado da Paraíba.	A repactuação dos cronogramas do projeto está em negociação junto ao convenente.
11	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	1/5/2014	31/5/2014	R\$ 60.797,60			0%	Atrasado		A repactuação dos cronogramas do projeto está em negociação junto ao convenente.
13	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/2013	31/08/2014				0%	Atrasado	Previsão de conclusão do processo licitatório no final de dezembro.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%			
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico e emissão de Laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN/SUDENE	2/9/2014	17/11/2014				0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob os aspectos financeiros e emissão de parecer técnico final.	CGC/DAD/SUDENE	2/9/2014	17/11/2014				0%	A Iniciar	Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.	
			Valor Previsto:	R\$ 228.797,21	Valor realizado:	R\$ 167.999,61	41,4%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil

Observações:

4º Ciclo 2014.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objetivo do projeto:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	R\$ 350.978,27	R\$ 370.465,27

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 186.696,80	R\$ 19.487,00	dez/12	R\$ 206.183,80	Pago até o ano anterior	R\$ 186.696,80
R\$ 164.281,47	--	fev/13	R\$ 164.281,47	A realizar no exercício (2014)	R\$ 164.281,47
R\$ 350.978,27	R\$ 19.487,00		R\$ 370.465,27	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 164.281,47
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 186.696,80

Previsão de Conclusão:	28/12/2014	Convênio Nº 7703355/2012 (Proposta SICONV Nº 015048/2012)
Data Atualização:	28/11/2014	

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/Macira Régia Sotero e Marcélio de Castro Viana - CBMCE/ Aluizio Souza Freitas
--	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								47,5%	Em Andamento		
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	R\$ 186.696,80	29/11/2013	29/11/2013	R\$ 186.696,80		Concluído	A primeira parcela do convênio foi liberada em 29/11/2013, no valor de R\$ 186.696,80, através da ordem bancária 2013OB801500.	
8	Processo Licitatório	GOV/CE	28/12/2012	30/12/2013		25/07/14	19.08.2014		100%	Concluído	Processo concluído.	
9	Meta 1: Aquisição 13 notebooks	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013			50%	Atrasado	Licitação concluída. Aguardando autorização do limite financeiro do conselho de gestão e por resultados do Corpo de Bombeiros.	
10	Meta 2: Aquisição 08 projetores multimídia	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013	13/12/2013		100%	Concluído		
11	Meta 3: Aquisição 14 câmeras fotográficas integradas com GPS	GOV/CE	28/12/2012	13/12/2013		25/07/2014			50%	Atrasado	Formalização de termo ativo em 30/09/2014. Aguardando autorização de suplementação do projeto no sistema de monitoramento - MAP	
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	28/12/2012	13/12/2013		20/10/2014	22/10/2014		100%	Concluído	Realizado de 20 a 22/10/2014.	
	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	28/12/2012	28/11/2014	R\$ 164.281,47	13/11/2014			90%	Em Andamento	Solicitado a liberação da 2ª parcela em 13/11/2014	
13	Meta 4: Realização 14 cursos de capacitação de Agentes de Proteção de defesa Civil	GOV/CE	25.08.2014	05/12/2014		25.08.2014			93%	Em Andamento	Realizados 14 dos 15 cursos previstos.	

14	Meta 5: Realização um Fórum Internacional Sobre Evidência Sísmicas no Ceará.	GOV/CE	10/12/2014	13/12/2014					50%	Em Andamento	A logística (contratação de empresa, contatos com os palestrantes internacionais e outros) já foi efetuada. O evento deverá ocorrer de 10 a 13/12/2014.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
9	Visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC sob os aspectos financeiros e emissão de parecer final	CGC/DAD/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0,0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	R\$ 350.978,27				Valor realizado:	R\$ 186.696,80	67,5%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Observações:

4º cicl

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.			
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE			
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Descentralização	857.015,99	965.632,35

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		R\$
274.405,33	108.616,36	Maior/2013	383.021,69	Pago até o ano anterior	274.405,33
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	A realizar no exercício (RAP 2012)	582.610,66
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	-
				Valor Empenhado no Exercício	-
				Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	-
				Saldo a liberar	582.610,66
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	274.405,33

Previsão de Conclusão:	31/10/2015
Data Atualização:	03/12/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Prazo prorrogado para 31/12/2014
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		01/12/2014	03/12/2014		100%	Concluído	Datas serão repactuadas após assinatura de termo aditivo	
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66				0%	A Iniciar	Relatório da visita técnica recomendou liberação da 2a parcela. Aguardando liberação da CGAF/COCF	
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira)	01/12/2014	31/12/2014					0%	A Iniciar	Minuta de Termo Aditivo está na Procuradoria para Análise	
9	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira)	ago-15	ago-15					0%	A Iniciar		
10	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	01/08/2015	30/09/2015					0%	A Iniciar		

11	Realização de visita técnica para parecer, se houve incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira)	out/15	out/15					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	857.015,99	Valor realizado:	274.405,33	55%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

O termo de trabalho será atualizado após a assinatura do termo aditivo

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3.Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências		Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.2. Modernizar a Gestão.			
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Finalidade da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14			
Projeto:	Elaboração de uma metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE			
Objetivo do projeto:	Estabelecimento de uma metodologia geral de avaliação que possa ser aplicada em planos, programas e projetos de portes pequenos ou grandes, na área de atuação da SUDENE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	17/12/2014
Data Atualização:	03/12/2014

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel
--	-----------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Leitura da metodologia enviada ao TCU	Coordenação Lautemyr	14/10/2014	16/10/2014		14/10/2014	16/10/2014		100%	Concluído		
2	Análise crítica da metodologia enviada ao TCU para adequação à metodologia geral	Coordenação Lautemyr	17/10/2014	28/10/2014		17/10/2014	28/10/2014		100%	Concluído		
3	Elaboração do Relatório da Metodologia de Avaliação Geral	Coordenação Lautemyr	29/10/2014	18/11/2014		29/10/2014	18/11/2014		100%	Concluído		
4	Ajustes finais da Metodologia de Avaliação Geral	Coordenação Lautemyr	19/11/2014	05/12/2014		19/11/2014			90%	Em Andamento		
5	Elaboração do Plano de Trabalho do projeto a ser avaliado através Metodologia de Avaliação Geral e que será entregue ao TCU em 2015	Coordenação Lautemyr	05/12/2014	11/12/2014					0%	A Iniciar		
6	Aprovação final da Metodologia pelo gestor	Frederico/Lautemyr	12/12/2014	17/12/2014					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	65,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

A data acordada com o TCU para entrega do Relatório de Avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE é Dez-2015. Para elaborá-lo, será seguido o Plano de Trabalho a ser entregue como resultado da atividade 5 deste PO.

Plano de Trabalho para avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE será incluído como PO de monitoramento em 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3.Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.2. Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14		
Projeto:	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Estabelecimento de uma metodologia de avaliação e aplicação desta em um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	19/12/2014
Data Atualização:	03/12/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel
---	-----------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Relatório de seleção do projeto a ser avaliado, com justificativas	Coordenação Lautemyr	26/09/2014	13/10/2014		26/09/2014	13/10/2014		100%	Concluído		
2	Adaptação da metodologia de avaliação ao projeto avaliado	Coordenação Lautemyr	14/10/2014	18/11/2014		14/10/2014	18/11/2014		100%	Concluído		
3	Avaliação do projeto com base na metodologia aprovada	Coordenação Lautemyr	19/11/2014	12/12/2014		19/11/2014			54%	Em Andamento		
4	Relatório final de avaliação contendo metododologia proposta, resultados obtidos, recomendações e próximos passos	Coordenação Lautemyr	15/12/2014	18/12/2014					0%	A Iniciar		
5	Validar relatório e entrega final	Frederico/Lautemyr	19/12/2014	19/12/2014					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	50,8%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	Esta avaliação será um piloto da metodologia que está sendo desenvolvida. Não será entregue ao TCU

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TL5A			
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 2.265.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 1.204.091.700,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.204.091.700,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 800.000.000,00
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	21/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	3.876.491.700,00	Valor realizado:	3.065.105.668,00	77,78%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.

Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)			
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 387.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 1.572.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 505.925.388,15
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.066.074.611,85
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 892.925.388,15

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	639.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	639.000.000,00	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	191.544.000,00	27/11/14			50,00%	Atrasado	Proposta de liberação em análise.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	191.544.000,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	191.544.000,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	106.368.000,00				0,00%	A Iniciar		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:			R\$ 892.925.388,15	57,69%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:
Observações:
4º Ciclo 2014
Obs.1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs.2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs.3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs.4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)			
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

Previsão de Conclusão:	01/03/2010
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGGP-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado					0,0%	Atrasado	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. O banco estimou 30 dias para emissão do Certificado de Implantação. O prazo já expirou para o BNB.	
Valor Previsto:					61.728.156,00	Valor realizado:			61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs:1	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs:2	Atualizado em 08/04/2013.
	4º Ciclo 2014

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR				
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 53.576.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.576.481,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	Conforme ofício nº 0270/2014 - Dfin/Sudene, de 25.2.2014, encaminhado ao BNB solicitado aditamento ao contrato ou novo contrato.
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/04/14	01/05/14	42.477.417,00	-	-	-	0,00%	Paralisado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.	
6	Liberação 2	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/06/14	01/07/14	10.899.064,00	-	-	-	0,00%	Paralisado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.	
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					53.376.481,00	Valor realizado:			0,00	50,00%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:**Observações:****4º Ciclo 2014.**

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O B
Obs9:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.700.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 42.723.785,57
Saldo a liberar	R\$ 16.976.214,43
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.723.785,57

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					59.700.000,00	Valor realizado:			42.723.785,57	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014.

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 54.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 53.635.943,87
Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					54.900.000,00	Valor realizado:			53.635.943,87	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
- Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Falsa I Geração e Comercialização de Energia Ltda		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.439.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 63.942.862,59
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	25.868.946,48	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2		01/07/14	31/07/14	38.570.053,52				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					64.439.000,00	Valor realizado:			63.942.862,59	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Observações:

- 4º Ciclo 2014**
- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Falsa II Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.864.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 59.435.321,28
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(e) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	24.054.463,06	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	35.809.536,94				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					59.864.000,00	Valor realizado:			59.435.321,28	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 24 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Falsa III Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.278.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 54.848.909,88
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.848.909,88

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	22.192.548,86	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	33.085.451,14				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					55.278.000,00	Valor realizado:			54.848.909,88	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
 Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
 Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
 Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
 Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
 Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 25 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Falsa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Traíri/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.273.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 54.216.447,60
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído				
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	22.200.954,82	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.			
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	33.072.045,18				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.			
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar				
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					55.273.000,00	Valor realizado:					54.216.447,60	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 26 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Falsa V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 64.455.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluí/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	25.909.829,46				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	38.545.170,54				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
					Valor Previsto:	64.455.000,00	Valor realizado:	0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
	4º Ciclo 2014
	Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
	Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
	Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
	Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
	Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 27 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 33.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 28.688.696,90
Saldo a liberar	R\$ 5.211.303,10
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 28.688.696,90

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012. Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	-	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10					0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado						0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado						0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					33.900.000,00	Valor realizado:			28.688.696,90	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
4º Ciclo 2014.	

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 50.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 46.786.085,39
Saldo a liberar	R\$ 3.213.914,61
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 46.786.085,39

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		46.786.085,39	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
	4º Ciclo 2014

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 49.690.000,03
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 49.687.713,17
Saldo a liberar	R\$ (0,00)
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J.Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	Não há tempo determinado para a fiscalização.	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	Não há tempo determinado para a emissão do certificado de implantação	
Valor Previsto:					49.690.000,03	Valor realizado:			49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
4º Ciclo 2014.	

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 30 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	46.701.999,96	85.684.069,03

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 46.701.999,96
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 34.986.862,96
Saldo a liberar	R\$ 11.715.137,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 34.986.862,96

Previsão de Conclusão:	01/04/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	11.715.137,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	46.701.999,96	Valor realizado:	34.986.862,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
 Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
 Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
 Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
 Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
 4º Ciclo 2014.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 29.040.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 29.040.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído				
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído				
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.			
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar				
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					29.040.000,00	Valor realizado:					29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
4º Ciclo 2014

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 53.959.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 53.959.000,00
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluí/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					53.959.000,00	Valor realizado:			53.959.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

4º Ciclo 2014.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 99.970.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 96.407.194,96
Saldo a liberar	R\$ 3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					99.970.000,00	Valor realizado:			96.407.194,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraiba - CCP			
Objetivo do projeto:	Implantação de fabrica de Cimento			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 303.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 197.811.049,39
Saldo a liberar	R\$ 105.188.950,61
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 197.811.049,39

Previsão de Conclusão:	30/07/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído				
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído				
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.			
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído				
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído				
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,00	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído				
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	48.707.006,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.			
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	22.281.666,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.			
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/15	31/01/15	18.954.422,00				0,00%	A Iniciar				
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	15.245.856,75				0,00%	A Iniciar				
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar				
12	Emissão de Certificado de Emprend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					303.000.000,00	Valor realizado:					197.811.049,39	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Aratu Empreendimentos Ltda			
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	28/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 80.590.017,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 270.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	54.516.375,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	31/08/14	29/11/14	12.381.495,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/11/14	28/02/15	13.692.147,00				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	29/05/15	25.480.367,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/05/15	29/08/15	26.388.906,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	31/08/15	29/11/15	6.557.454,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	30/11/15	28/02/16	9.615.399,00				0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	29/02/16	29/05/16	26.795.017,00				0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	31/05/16	29/08/16	29.260.923,00				0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	31/08/16	29/11/16	20.665.368,00				0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	30/11/16	28/02/17	7.019.491,00				0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	28/02/17	29/05/17	4.091.190,00				0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	31/05/17	29/08/17	18.422.784,00				0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	31/08/17	29/11/17	15.695.324,00				0,00%	A Iniciar		
19	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
20	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					270.582.240,00	Valor realizado:			0,00	20,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 36 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.			
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	30/12/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 23.855.042,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 13.862.197,00
Saldo a liberar	R\$ 9.992.845,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 13.862.197,00

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/09/14	30/11/14	9.992.845,00			-	0,00%	A Iniciar		
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					23.855.042,00	Valor realizado:		13.862.197,00	62,50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 37 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Deten Química S.A.			
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 17.287.600,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 15.447.600,00
Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00

Previsão de Conclusão:	30/01/2016
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14	-	10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00			-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00			-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00			-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00			-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00			-	0,00%	A Iniciar		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					31.256.000,00	Valor realizado:			15.447.600,00	41,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.			
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 61.867.350,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 61.867.350,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14	-	27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87			-		Cancelado		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					61.867.350,00	Valor realizado:		61.867.350,00	75,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 39 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Cone Multicenter Ltda			
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2017
Data Atualização:	28/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 107.720.106,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsáv(e)l(e) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00			-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00			-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00			-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00			-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00			-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00			-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00			-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00			-	0,00%	A Iniciar		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					191.238.424,00	Valor realizado:			0,00	28,57%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014.

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Braskem S.A.			
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 50.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 50.000.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

Previsão de Conclusão:	30/11/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído			
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído			
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído			
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
Valor Previsto:					50.000.000,00	Valor realizado:			50.000.000,00	71,43%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 41 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.075.935.000,00	1.956.601.489,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.075.935.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Atrasado	O banco pode prorrogar por mais 60 dias e ainda pedir prorrogação à Sudene.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00				0,00%	A Iniciar		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					1.075.935.159,00	Valor realizado:			0,00	26,92%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 42
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Foz do Atlântico Saneamento S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 226.463.121,08
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 415.582.562,52
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/06/2016
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Cosulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído			
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído			
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14	-	21/02/14	22/08/14	-	50,00%	Em Andamento			
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	114.555.923,52				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	57.163.904,46				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/14	31/12/14	54.743.293,10				0,00%	A Iniciar			
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/06/15	01/07/15	75.370.699,94				0,00%	A Iniciar			
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	56.874.370,75				0,00%	A Iniciar			
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/06/16	01/07/16	56.874.370,75				0,00%	A Iniciar			
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-				0,00%	A Iniciar			
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-				0,00%	A Iniciar			
Valor Previsto:					415.582.562,52	Valor realizado:				0,00	29,17%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	R\$ -

Previsão de Conclusão:	29/12/2014
Data Atualização:	15/12/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/06/14	04/07/14		30/06/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Todo o andamento das providências para a construção do RI teve por começo a publicação do novo Decreto de estrutura regimental da SUDENE.	O Decreto nº 8.276 foi assinado em 27/06/14 e publicado no DOU de 30/06/14, Seção 1, pág. 5..
2	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	03/07/14	04/07/14		03/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
3	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/07/14	22/07/14		07/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
4	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/07/14	23/07/14		28/07/14	22/08/14		100,00%	Concluído		
5	Elaboração da Portaria que aprova as Siglas da Sudene. Abertura de processo, envio à Procuradoria, Assinatura do Superintendente.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/09/14	09/09/14		01/09/14	09/09/14		100,00%	Concluído	Só foi possível elaborar as siglas quando as unidades retornaram com as competências analisadas e os nomes correspondentes.	
6	Apresentação das siglas para conhecimento à Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/09/14	19/09/14		11/09/14	11/09/14		100,00%	Concluído	Em função de algumas observações que surgiram na reunião houve a necessidade de alguns ajustes	
7	Retorno das competências pelas unidades para apresentação dos resultados e novos ajustes	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/09/14	26/09/14		15/09/14	03/10/14		100,00%	Concluído		
8	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio às unidade para análise final	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	29/09/14	24/10/14		06/10/14	24/10/14		100,00%	Concluído		

9	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	24/10/14	31/10/14		29/10/14	14/11/14		100,00%	Concluído	
10	Encaminhamento à PRD para apreciação dos aspectos jurídicos da proposta (inclui apreciações preliminares e ajustes)	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	19/11/14	15/12/14		19/11/14	15/12/14		100,00%	Concluído	O prazo previsto desta etapa incluiu uma apreciação preliminar da PRD, que foi seguida por sugestões de ajustes e o envio para apreciação da versão final no dia 15/12/14.
11	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/12/14	29/12/14					0,00%	A Iniciar	
12	Publicação no DOU e Boletim interno.	Samuel (SAD/GAB)	29/12/14	29/12/14					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:				83,33%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Observações:

4º Ciclo 2014

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências		Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.			
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.			
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional	
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros	
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.			
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE			
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	1	90	0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	08/11/2015
Data Atualização:	15/12/2014

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca e Manoel Barreiros
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído		
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE, para nivelamento de conceitos e apresentação detalhada dos avanços do MI e da proposta de plano de trabalho da SUDENE, para construção de seu EP.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).	
3	Reunião com unidades internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.	
4	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explanção sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14		11/09/14	11/09/14		100%	Concluído		
5	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14		11/09/14	18/09/14		100%	Concluído		
6	Projeto piloto (mapeamento dos principais processos da CGGI)	Carmen Fonseca e Vinícius Vieira (CGGI/SUDENE)	11/08/14	30/09/14		11/08/14			30%	Atrasado	A retomada das discussões estava marcada para os dias 24 e 26/11, mas houve concorrência de eventos (Seminário no BNDES, Planejamento Estratégico, viagem de Carmen para o curso de Ética Pública e priorização do Regimento Interno, além de participação no curso de Gestão por competência) e não foi possível o cumprimento da agenda.	As discussões serão retomadas em jan/2015, com a realinhamento de datas
7	Retorno das unidades com a indicação dos nomes para o EP	Unidades da Sudene	18/09/14	23/09/14					0%	Atrasado		Será feito realinhamento de datas.
8	Reunião de planejamento, para discussão das propostas para a construção do EP (missão, visão, valores, objetivos do EP, Finalidade (papéis, responsabilidades, objetivos e funções/atribuições), apresentação do Mapa de Relacionamento, da minuta de portaria para implementação dos trabalhos e escolha dos primeiros processos a serem mapeados.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	08/10/14	08/10/14	-				0%	Atrasado		Será feito realinhamento de datas.

9	Ajuste do mapa de relacionamentos.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	08/10/14	15/10/14	-	-	0%	Atrasado	Será feito realinhamento de datas.
10	Reunião com o grupo para apresentar o trabalho realizado.Consolidação do plano de trabalho com cronograma para os primeiros processos a serem mapeados após a AGI. Selecionar nova unidade e metodologia de mapeamento e início dos trabalhos piloto.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	16/10/14	20/10/14			0%	Atrasado	Será feito realinhamento de datas.
11	Mapeamento piloto dos processos da unidade escolhida.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	20/10/14	30/10/14			0%	Atrasado	Será feito realinhamento de datas.
12	Reunião interna com gestores de todas as unidades para apresentação dos resultados dos primeiros processos mapeados (piloto) e preparação de apresentação sobre os resultados já alcançados, para a Diretoria Colegiada.	Equipe do EP, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e interlocutor da unidade trabalhada.	04/11/14	04/11/14			0%	Atrasado	Será feito realinhamento de datas.
13	Apresentação à Diretoria Colegiada da SUDENE, dos primeiros resultados mapeados no piloto, para deliberação.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir	-	-	0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
14	Atualização do cronograma de mapeamento, com inserção de novas unidades, ajustes na abordagem e nas estratégias de sensibilização.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir			0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
15	Reuniões com as novas unidades para preparação dos trabalhos de mapeamento.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir			0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
16	Início dos trabalhos de mapeamento de processos com as novas unidades incorporadas ao processo.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir			0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
17	Treinamento e teste de funcionalidade dos novos mapeamentos.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir			0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
18	Manualização e revisão/ajuste de todos os processos mapeados.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	a definir			0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
19	Aprovação geral da sistemática de procedimentos com base no mapeamento realizado.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	a definir	08/11/15	-	-	0%	A Iniciar	Será feito realinhamento de datas.
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	28%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014.

Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 45 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior	
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho			
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho			
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.482.242,89	7.482.242,89

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 2.397.648,13
A realizar no exercício 2014 (RAP 2013)	R\$ 563.439,54
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2014)	R\$ 1.000.000,00
Valor Empenhado no Exercício (2014)	R\$ 555.861,00
Valor liberado no Exercício (2014)	R\$ 232.466,52
Saldo a liberar (RAP 2013)	R\$ 563.439,54
Saldo a Empenhar no exercício (2014)	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 2.630.114,65

Previsão de Conclusão:	20/01/2016
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
--	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
3	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
4	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
5	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	
6	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	
7	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	16/01/15	0,00	20/01/14		0,00	75%	Em Andamento	O Edital da Tomada de Preços nº 01/2014 previu a abertura da licitação para o dia 1º/12/2014, quando serão recebidos os envelopes de habilitação e as propostas de preços das licitantes interessadas.	

8	Contratação das poltronas para os auditórios	Rebeca Ramalho e Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14		99%	Em Andamento	A Área de Engenharia recebeu proposta das empresas Flexform, Alberflex, Villanaro e Marelli, e recebeu autorização superior para aquisição das poltronas.	A proposta da empresa Marelli foi a mais vantajosa para esta Autarquia, no valor global de R\$ 555.861,00, cuja Nota de Empenho será realizada até 05/12/2014.
9	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Empresa a contratar	19/01/15	19/07/15	273.600,00			0%	A Iniciar	A empresa de projetos apresentará o Projeto Básico para a licitação da execução da obra, contendo o Orçamento Básico com todos os elementos necessários para essa contratação.	
10	Licitação da obra de ambientação final	Eneida (SUDENE/CPL)	19/03/15	19/07/15	0,00			0%	A Iniciar		
11	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	20/07/15	20/01/16	3.300.000,00			0%	A Iniciar	A Área de Engenharia estimou o valor global da execução da obra de ambientação em R\$ 3.300.000,00.	
12	Fiscalização da obra de ambientação final	José Wilson Galdino e José Villeneuve	20/07/15	20/01/16	0,00			0%	A Iniciar		
13	Entrega da obra			20/01/16				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		7.482.242,89	Valor realizado:		2.630.114,65	56%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 46 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior	
Problema (causa):	Desgaste dos equipamentos e instalações de combate a incêndio pela falta de manutenção e divergentes da atual norma brasileira vigente, colocando em risco a segurança do edifício.			
Projeto:	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.			
Objetivo do projeto:	Execução das obras de instalação de proteção contra incêndio do Edifício SUDENE e seus anexos (Biblioteca, Condel, Restaurante e Antigo serviço médico)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	2.700.000,00	2.700.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 700.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000,00

Previsão de Conclusão:	31/08/2016
Data Atualização:	28/11/2014

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico/Projeto executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	30.000,00	30/06/2009	22/09/2010	30.000,00	100%	Concluído	Entrega do projeto básico e do projeto executivo realizado pela empresa Policonsult.	Entrega do projeto básico à CPL para lançar licitação.
2	Licitação	Eneida (Sudene/CPL)	22/12/11	06/03/12	-	22/12/2011	06/03/2012	-	100%	Concluído	Licitação deserta	Revisar planilha orçamentária e relançar licitação.
4	Modificação do Projeto	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	15/06/12	30/07/12	-	15/06/2012	13/08/2012	-	100%	Concluído	O atraso se deu em virtude de estarmos aguardando o envio de informações técnicas adicionais pela empresa de consultoria (Policonsult)	Encaminhar e-mail à Policonsult cobrando informações e estabelecendo prazo.
5	Nova licitação (retomada)	Eneida (Sudene/CPL)	30/07/12	16/11/12	-	13/08/2012	05/12/2012	-	100%	Concluído	A fase de habilitação da licitação ocorreu em 08/10/2012, tendo comparecido apenas a empresa P. C. Campano Com. e Serv. ME, a qual foi inabilitada por questões formais, concedendo-se à licitante o prazo legal de oito dias úteis para apresentação dos documentos requeridos, para revisão da sua inabilitação.	Foi julgado improcedente o recurso da licitante pela CPL e mantida a inabilitação, o que ocasionou o fracasso da licitação. A SUDENE irá revisar as planilhas orçamentárias para abrir nova licitação e consultar a PRD sobre dispensa de licitação dessa obra.
6	Elaboração do Projeto Básico para contratação de empresa de consultoria	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	02/01/14	25/11/14	-	17/03/2014	25/11/14	-	60%	Paralisado	A Área de Engenharia paralisou a elaboração do Termo de Referência necessário para a contratação da empresa de consultoria em virtude da decisão superior de a Sudene transferir-se para outro empreendimento comercial, ficando a cargo do futuro administrador do Condomínio SUDENE a continuidade da contratação da instalação do sistema de prevenção e combate a incêndios.	A Área de Engenharia sugere a retirada desse Plano Operativo no próximo ciclo.
7	Licitação da Consultoria	Eneida (Sudene/CPL)	26/11/14	26/02/15	-				0%	A Iniciar		
8	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Empresa a ser contratada	27/02/15	27/05/15	30.000,00				0%	A Iniciar		
9	Relançamento da licitação da obra (3ª tentativa)	Eneida (Sudene/CPL)	28/05/15	28/08/15	-				0%	A Iniciar		
10	Execução da Obra	Empresa a ser contratada	31/08/15	31/08/16	2.400.000,00				0%	A Iniciar		
11	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização e Empresa a ser contratada	31/08/15	31/08/16	240.000,00				0%	A Iniciar		
12	Entrega da obra	Empresa a ser contratada		31/08/16	-				0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	2.700.000,00	Valor realizado:	30.000,00	18,40%	Paralisado	Status do Projeto
--	-----------------	--------------	------------------	-----------	--------	------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Ministério da Saúde; IBGE; CODEVASF; TRT 6ª Região; CTI/NE; Ministério do Planejamento; Banco do Brasil; Banco no Nordeste; INSS; IFPE; e DFRP/MI.

Observações:

4º Ciclo 2014

A Área de Engenharia sugere a retirada desse Plano Operativo no próximo ciclo.

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 47 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Previsão de Conclusão:	22/07/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 5.023.543,17
A realizar no exercício 2014 (RAP 2012+2013)	R\$ 4.649.498,06
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito 2014)	R\$ 500.000,00
Valor Empenhado no Exercício 2014	R\$ 443.855,21
Valor liberado no Exercício (RAP 2012/2013)	R\$ 91.831,42
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$ 3.113.811,43
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 56.144,79
Total Liberado até o exercício	R\$ 5.115.374,59

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Recebimento Definitivo da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	02/04/12	02/05/12	0,00	02/04/12	02/05/12	0,00	100%	Concluído	Somente foram recuperados 119 blocos de fundação com dotação de 2010 e 2011. A análise preliminar feita pela empresa contratada subestimou o tamanho do problema com as fundações do prédio, vindo a requerer complementação dos trabalhos.	Lançamento de licitação para complementação da obra.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12		100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/07/15	5.745.805,68	22/10/12		2.190.635,41	72%	Em Andamento	Após a celebração do 4º Termo Aditivo, a obra foi reiniciada em 13/10/2014, estando em execução os serviços de recuperação dos blocos, lay-out do subsolo e cravação das estacas para a rampa.	

9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012	22/10/12	22/07/15	0,00	22/10/12		72%	Em Andamento	A Comissão de Fiscalização foi modificada através da Portaria nº 153/2014, sendo composta pelos engenheiros civis Wilson Galdino e José Villeneuve, pela arquiteta Rebeca Ramalho e pelos engenheiros eletricitas Diego Vêras e Thiago Teles.	
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/07/15	0,00			0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		9.673.041,23	Valor realizado:		5.115.374,59	87%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2014

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 48 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior	
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.			
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.			
Objetivo do projeto:	Substituição (modernização) de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento alternativo de energia do prédio da SUDENE, que hoje serve a diversos condôminos, por sua vez consumidores de diferentes cargas, nele instalados			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	2.892.394,45	2.892.394,45

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 70.000,00
A realizar no exercício (2014) (RAP 2013)	R\$ 30.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2014)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (2014)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP 2013)	R\$ 30.000,00
Saldo a liberar (2014) RAP 2013	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício (2014)	R\$ 2.792.394,45
Total Liberado até o exercício (2012-2014)	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	06/08/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/12/14	0,00	18/08/14			90%	Em Andamento	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou uma primeira versão do Projeto Básico para análise da Área de Engenharia da Sudene.	Aguardando a entrega das cotações de preços por parte da empresa de consultoria.
7	Relançamento da Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	05/01/15	05/04/15	0,00				0%	A Iniciar		
8	Execução da Obra	A definir	06/04/15	06/08/15	2.732.394,45				0%	A Iniciar		
9	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Vêras e empresa de consultoria	06/04/15	06/08/15	60.000,00				0%	A Iniciar		
10	Entrega da obra			06/08/15					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	2.892.394,45	Valor realizado:	100.000,00	25,65%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	4º ciclo 2014

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2013
Programa:	2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	20WQ - PO 05 - Divulgação das Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO		
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE.				
Projeto:	PROCONDEL 1 - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970				
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	251.373,39	251.373,39

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 251.373,39
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 251.373,39

Previsão de Conclusão:	30/06/2014
Data Atualização:	16/12/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
---	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do projeto	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/08/2012	10/11/2012		15/08/2012	10/11/2012		100%	Concluído		
2	Captação de recursos	Angela Nascimento	11/11/2012	20/02/2013	-	11/11/2012	20/02/2013		100%	Concluído		
3	Contatos com articulistas	Marcos Costa Lima	02/01/2013	31/01/2013	-	02/01/2013	31/01/2013		100%	Concluído		
4	Identificação de recursos no orçamento 2013	Angela Nascimento e Frederico Cavalcanti	20/04/2013	20/04/2013		20/04/2013	20/04/2013		100%	Concluído		
5	Orientação para instrução do processo e abertura de processo	Shieley Câmara, Zizete Nogueira, Frederico Cavalcanti, Brivaldo Soares e Eva Porto	03/05/2013	20/05/2013		03/05/2013	20/05/2013		100%	Concluído		
6	Encaminhamento a DAD	Angela Nascimento	22/05/2013	22/05/2013		22/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído		
7	Emissão de Parecer pela Procuradoria Federal/SUDENE	Romoaldo Goulart	24/05/2013	06/06/2013		06/06/2013	06/06/2013		100%	Concluído		
8	Elaboração de Nota Técnica e Plano de Trabalho	Angela Nascimento/Adonis Oliveira	09/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
9	Encaminhamento a CGC	Angela Nascimento	10/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
10	Parecer da CGC	Zizete Nogueira	10/06/2013	11/06/2013		11/06/2013	11/06/2013		100%	Concluído		
11	Encaminhamento a COCF para informar liberação de limites orçamentários	Angela Nascimento	12/06/2013	12/06/2013		12/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído		
12	Atesto da COCF	Brivaldo Soares	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
13	Encaminhamento à Diretoria de Planejamento para inserção pauta de reunião da Diretoria Colegiada	Angela	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
14	Aprovação do Processo na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	14/06/2013	14/06/2013		14/06/2013	14/06/2013		100%	Concluído		
15	Encaminhamento do Termo de Cooperação à Universidade Federal de Pernambuco	Angela Nascimento	28/06/2013	28/06/2013		28/06/2013	28/06/2013		100%	Concluído		
16	Tramitação na UFPE	Diretoria Convênios	01/07/2013	19/07/2013		01/07/2013	19/07/2013		100%	Concluído		
17	Assinatura do Termo de Cooperação	Reitor e Superintendente	22/07/2013	26/07/2013		22/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído		
18	Publicação no DOU	Coordenação Convênios	25/07/2013	25/07/2013		25/07/2013	25/07/2013		100%	Concluído		
19	Encaminhamento de destaque orçamentário	COCF	26/07/2013	26/07/2013		26/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído		

20	Liberação e recebimento	COCF/UFPE	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	100%	Concluído	Foi transferido o valor total, do qual a UFPE irá desembolsar mensalmente os valores correspondente à folha de pagamento e contratação de serviços.
21	Empenho UFPE	UFPE/PROEXTE	06/08/2013	06/08/2013		06/08/2013	06/08/2013		100%	Concluído	
22	Execução: 1ª reunião com coordenadores UFPE	Angela/Marcos Costa Lima	02/08/2013	02/08/2013		02/08/2013	02/08/2013		100%	Concluído	
23	Seleção de bolsistas UFPE	Marcos Costa Lima/Vildeane Borba	05/08/2013	15/08/2013		05/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído	
24	Solicitação de material e equipamento na SUDENE	Angela Nascimento	07/08/2013	15/08/2013		07/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído	
25	Capacitação de 10 bolsistas nas atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	Májury Miranda/Vildeane Borba	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído	
26	Chamamento de bolsistas técnico de nível médio	Evaldo Souza/Angela Nascimento	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído	
27	Orientação de 02 bolsistas responsáveis pela pesquisa de campo e apresentação dos mesmos à instituição de pesquisa	Angela Nascimento	20/08/2013	23/08/2013		20/08/2013	23/08/2013		100%	Concluído	
28	Pesquisa de campo	Pedro Maranhão/Sergio Cavalcante	26/08/2013	20/12/2013		26/08/2013	28/02/2014		100%	Concluído	Foram pesquisado os anos 1959 a 1964
29	Atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	10 bolsistas	02/09/2013	20/012/2013		02/09/2013	28/02/2014		100%	Concluído	Todo o acervo foi digitalizado 1959 a 1970
30	Alteração de elemento de despesa e solicitação de pagamento de bolsas	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	23/05/2013	05/09/2013		23/05/2013	05/09/2013		100%	Concluído	
31	Acervo Sonoro - Identificação/Quantificação	Silva/Alais	02/09/2013	31/10/2013		09/09/2013	22/10/2013		100%	Concluído	
32	Acervo Sonoro - Higienização (142 fitas de rolo)	Silva/Alexandre	20/10/2013	10/11/2013		10/10/2013	25/10/2013		100%	Concluído	
33	Acervo Sonoro - Digitalização	Silva/Alexandre	11/11/2013	31/10/2013		10/10/2013	31/03/2014		100%	Concluído	O acervo 1960 a 1970; Iniciada digitalização fitas cassetes de 1971
34	Assinatura e publicação do 1º Termo Aditivo	UFPE/SUDENE	15/01/2014	31/01/2014		15/01/2014	24/03/2014		100%	Concluído	
35	Inclusão de pesquisadora da área de publicidade	Alaide Vilanova	03/02/2014	31/03/2014		03/02/2014			85%	Atrasado	Produção de peças para o site e seminário
36	Entrega dos artigos	Articulistas convidados	02/09/2013	31/01/2014		02/09/2013	21/03/2014		100%	Concluído	
37	Finalização (Relatório)	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	15/01/2014	30/06/2014					0%	Atrasado	O relatório final será encaminhado pela UFPE. Segundo orientação da Coordenação de Convênios, a solicitação à UFPE poderá ser feita pela responsável técnica.
			Valor Previsto:		251.373,39	Valor realizado:		251.373,39	97%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

4º ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO		
Problema (causa):	Disponibilização do acervo histórico do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.				
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000				
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	484.650,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 484.650,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ 484.650,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 484.650,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 484.650,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 484.650,00

Previsão de Conclusão:	31/01/2015
Data Atualização:	16/12/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
---	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májury Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014			50%	Em andamento		
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00) (642 docs./10.413 imagens)	Evaldo Souza/Májury Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014			75%	Em andamento	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014			50%	Em andamento	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/2014		15/04/2014			20%	Em andamento	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014			40%	Em andamento	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014			40%	Em andamento		
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014			40%	Em andamento		
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaide Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014			40%	Em andamento		
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	

15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014	Não Informado		100%	Concluído	
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros9organização); Realização igual a R\$ 100.00,00
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R\$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/2014	31/08/2014		02/06/2014	28/08/2014		100%	Concluído	
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)		02/06/2014	30/11/2014					0%	A Iniciar	
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)		02/06/2014	30/11/2014					0%	A Iniciar	
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)		02/06/2014	30/11/2014					0%	A Iniciar	
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/2014	15/08/2014		11/08/2014	15/08/2014		100%	Concluído	
			Valor Previsto:		484.650,00	Valor realizado:		484.650,00	66%	Em andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

4º ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 58)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação	
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro	
Problema (causa):	Com a criação do PEI, existe a obrigatoriedade de criação do PETI, em atendimento a legislação em vigor, acórdão 1233/2012 - TCU - Plenário.			
Projeto:	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.			
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PETI.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/10/2014
Data Atualização:	29/10/2014

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
---	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento da documentação necessária.	Luiz Carlos Dourado	28/03/2013	05/04/2013	não se aplica	03/04/2013	09/04/2013	0,00	100%	Concluído	Atraso em função da agenda dos participantes (Edgar, Josué e Luiz Carlos).	
2	Reuniões técnicas para definição do alinhamento do PETI ao Realinhamento Estratégico da Sudene - 2013/2015.	Área de TI	08/04/2013	19/04/2013	não se aplica	10/04/2013	12/04/2013	0,00	100%	Concluído		
3	Redação, revisão e publicação do PETI 2013/2015.	Luiz Carlos Dourado	25/06/2013	16/09/2013	não se aplica	23/07/2013	27/09/2013	0,00	100%	Concluído	Reprogramado em função das atribuições na Coordenação de TI - férias dos gestores. Previsão para 30/08/2013	
4	Análise, formatação e minuta dos Instrumentos Normativos - aprovados com o PETI - (Portaria) ¹	Luiz Carlos Dourado	19/09/2013	14/11/2013	não se aplica	30/09/2013	28/03/2014	0,00	100%	Concluído	Reprogramado (Sudam 26 a 30/09/2013) e Licitação de equipamentos dos novos servidores (funcionários). Férias. Alinhamento Modelo de Governança.	Ajustar ao Modelo de Governança.
5	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	18/11/2013	22/11/2013	não se aplica	22/04/2014	25/04/2014 ³	0,00	100%	Concluído	Elaboração de novos instrumentos para o CESTI (Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação)	
6	Alterações nos instrumentos normativos do Cesti (Aprovação da Portaria) ²	CGTI / Gabinete / Superintendência	13/10/2014	17/10/2014	não se aplica	13/10/2014	22/10/2014	0,00	0%	Concluído	Aguardando reformulação da Portaria 126/2009. Minuta, da nova PORTARIA, encaminhada à CGTI.	Data depende da aprovação da Portaria.
7	Apresentação da proposta do PETI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para conhecimento e	DC	20/10/2014	24/10/2014	não se aplica	***	***	0,00	0%	Cancelado	Atividade/tarefa cancelada. Ficará a critério da DC (após análise)	Reunião deverá ser agendada pelo Gabinete após aprovação da nova
8	Encaminhamento do PETI para aprovação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	21/10/2014	27/10/2014	não se aplica	29/10/2014	29/10/2014	0,00	100%	Concluído		
9	Apresentação da proposta do PETI a Diretoria Colegiada, para aprovação. ²	Luiz Carlos Dourado /Diretoria Colegiada	22/10/2014	29/10/2014	não se aplica	29/10/2014	29/10/2014	0,00	100%	Concluído		
10	Publicação da Portaria de aprovação do PETI.	DC	23/10/2014	30/10/2014	não se aplica	***	***	0,00	0%	Cancelado	Atividade/tarefa cancelada. Ficará a critério da DC (após análise)	Publicada após análise da DC
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2014.	
¹	No modelo proposto o CESTI é responsável, também, pela elaboração e aprovação do PETI e do PDTI (Portaria tem que ser publicada antes da aprovação do PETI)
²	Datas dependem do agendamento de terceiros.
³	Responsável pelo Projeto esteve afastado para tratamento de saúde

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 61)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI.		
Projeto:	Modernização da Infraestrutura da Rede Local		
Objetivo do projeto:	Melhoria da Infraestrutura de TI.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	a definir

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/03/2015
Data Atualização:	28/11/2014

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.	01/10/14	28/11/14	-	22/09/14	13/11/14	100%	Concluído			
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/12/14	29/08/14	-	14/11/14		95%	Atrasado			
3	Contratação.	Setor de Licitação	02/01/15	27/02/15	-			0%	A Iniciar			
4	Realização do serviço.	Fornecedor	02/03/15	31/03/15	a definir			0%	A Iniciar			
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	59%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
4º Ciclo 2014
O projeto anterior: "VIRTUALIZAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA", paralizado no 3º ciclo, foi ampliado e transformado no projeto "Modernização da Infraestrutura da Rede Local para melhor adequação às necessidades da Sudene.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 62)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	600.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 63.000,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 47.900,00
Saldo a liberar	R\$ 15.100,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ (63.000,00)
Total Liberado até o exercício	R\$ 47.900,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2015
Data Atualização:	01/12/2014

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14			1%	Em Andamento		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	01/04/15	31/07/15	-				0%	A Iniciar		
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	03/08/15	30/10/15	a definir				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		272.909,00	Valor realizado:		272.909,00	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
	4º Ciclo 2014
	a) O Valor Total do Projeto é estimado e refere-se apenas ao investimento por parte da Sudene. A SUDAM participa com igual valor.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 63)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação	
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)		Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Em atendimento a legislação em vigor.			
Projeto:	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação			
Objetivo do projeto:	Elaborar a proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, para elaboração da Posic / PSI, no âmbito desta Autarquia.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	30/09/2014
Data Atualização:	03/11/2014

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado.
---	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Levantamento da legislação em vigor.	Luiz Carlos Dourado.	10/06/2013	14/06/2013	0,00	10/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído		
2	Redação da proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.	Luiz Carlos Dourado.	29/07/2013	10/08/2013	0,00	25/07/2013	05/09/2013		100%	Concluído		
3	Revisão e publicação da proposta.	Área de TI.	09/09/2013	16/09/2013	0,00	04/11/2013	22/11/2013		100%	Concluído		
4	Análise, formatação e minuta dos Instrumentos Normativos ¹	Área de TI.	13/10/2014	31/10/2014	0,00	24/11/2014	27/11/2014		100%	Concluído	Falta definição dos instrumentos Normativos. O responsável pelo Projeto esteve em tratamento de saúde de 29/06 a 28/08/2014.	Alinhamento ao Modelo de Governança (PETI).
5	Encaminhamento da proposta para apreciação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	31/10/2014	***	0,00	03/11/2014	03/11/2014		100%	Concluído	Será elaborada Nota Técnica (DC)	
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:		0,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
4º Ciclo 2014.
¹ No modelo proposto é criado o CESIC - Comitê de SIC (Portaria tem que ser publicada antes da Homologação pela Diretoria Colegiada)

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2014)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + Créditos (a)	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000	A	1	23.482.274,00	11.835.403,54	11.835.403,54	50,40	100,00	-	-	-	-	-	
04	121	2111	2000/PO0001	A	1	500.000,00	500.000,00	441.826,20	100,00	88,37	Servidor capacitado	199	170	85,43		
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	342.000,00	342.000,00	277.042,01	100,00	81,01	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	39.600,00	39.600,00	9.177,30	100,00	23,18	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	118.000,00	118.000,00	97.263,46	100,00	82,43	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	962.288,00	962.288,00	831.848,65	100,00	86,44	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	42.000,00	42.000,00	22.045,03	100,00	52,49	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.612.829,00	3.612.829,00	2.622.375,99	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	24.304.013,00	24.304.013,00	20.762.606,31	100,00	-	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	53.459.104,00	41.812.233,54	78,21	88,25	-	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.141.678,00	2.141.678,00	1.746.437,07	100,00	81,55	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	2.141.678,00	1.746.437,07	100,00	81,55	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	2.423.950,00	1.185.000,00	1.183.120,40	48,89	99,84	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	3.000.108,00	3.000.000,00	2.000.000,00	100,00	66,67	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	1.280.000,00	930.000,00	0,00	72,66	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	2.000.000,00	450.000,00	0,00	22,50	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
19	691	2029	8902/0024	A	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/0020	A	1	750.000,00	460.000,00	0,00	61,33	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/0024	A	1	800.000,00		0,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
22	691	2029	8918	A	1	0,00	0,00	0,00	não inf.	não inf.	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	2.000.000,00	1.600.000,00	771.000,00	80,00	48,19	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1	500.000,00	400.000,00	0,00	80,00	0,00	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1	1.000.000,00		484.650,00	0,00	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	3.450.066,00	1.066.597,00	0,00	30,92	0,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	1.633.185,00	240.000,00	0,00	14,70	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7114	A	1	25.000.000,00		0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/7120	A	1	15.000.000,00		0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	59.537.309,00	10.031.597,00	16,85	51,23						
06	182	2040	8172	A	-	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	0,00					
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 30/11/2014 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III
Projetos tabulados segundo Diretrizes
e Objetivos Estratégicos da SUDENE

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(4º Ciclo 2014)

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até mar/14	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinoicultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R\$ 694.459,19	R\$ 556.781,91	80%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 352.840,00	4%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 255.723,17	53%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2030 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
9	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 274.405,33	32%
10	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
11	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 892.925.388,15	46%
12	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cadeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
13	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 0,00	0%
14	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 42.723.785,57	72%
15	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
16	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(4º Ciclo 2014)

17	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
18	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
19	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 0,00	0%
20	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 0,00	0%
21	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 28.688.696,90	85%
22	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
23	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
24	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%
25	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatéc Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
26	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
27	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
28	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 197.811.049,39	65%
29	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
30	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 13.862.197,00	58%
31	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(4º Ciclo 2014)

32	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
33	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
34	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
35	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.000,00	R\$ 0,00	0%
36	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Foz do Atlântico saneamento S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 1.1								9.167.118.086,93	4.978.435.874,12	54,3
37	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
Total do Objetivo Estratégico 1.5								234.105,49	139.865,15	59,7
Total da Diretriz Estratégica 1								9.167.352.192,42	4.978.575.739,27	54,3
38	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
Total do Objetivo Estratégico 2.3								530.482,50	265.241,25	50,0
39	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
40	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 350.978,27	R\$ 186.696,80	53%
Total do Objetivo Estratégico 2.4								579.775,48	354.696,41	61,2
Total da Diretriz Estratégica 2								1.110.257,98	619.937,66	55,8
41	14	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração de uma metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
42	15	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
43	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
44	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo Estratégico 3.1								0,00	0,00	-
45	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 251.373,39	R\$ 251.373,39	100%
46	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
47	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
48	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 272.909,00	45%
50	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Programa de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo Estratégico 3.2								1.336.023,39	1.008.932,39	75,5
51	45	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.482.242,89	R\$ 2.630.114,65	35%
52	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 2.700.000,00	R\$ 30.000,00	1%
53	47	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 8.229.186,02	R\$ 5.115.374,59	62%
54	48	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.892.394,45	R\$ 100.000,00	3%
Total do Objetivo Estratégico 3.3								21.303.823,36	7.875.489,24	37,0
Total da Diretriz Estratégica 3								22.639.846,75	8.884.421,63	39,2
TOTAL GERAL								9.191.102.297,15	4.988.080.098,56	54,3

Posição: 28/11/2014

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Referência dos dados: 4º Ciclo 2014

ANEXO IV
Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA 2012-2015

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(4º Ciclo 2014)

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até mar/14	(b/a) (%)
1	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 892.925.388,15	46%
3	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 0,00	0%
5	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 42.723.785,57	72%
6	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
7	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 0,00	0%
11	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 0,00	0%
12	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 28.688.696,90	85%
13	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
14	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 49.690.000,00	R\$ 49.687.713,17	100,00%
15	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(4º Ciclo 2014)

16	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 197.811.049,39	65%
20	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
21	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 13.862.197,00	58%
22	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suaepe S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.000,00	R\$ 0,00	0%
27	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Foz do Atlântico saneamento S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 0,00	0%
Total da Ação 0355 - Programa 2029								9.151.282.955,51	4.972.889.785,11	54,3
28	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
Total da Ação 4640 - Programa 2029								1.183.120,40	1.183.120,40	100,0
29	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 274.405,33	32%
Total da Ação 8340 - Programa 2029								857.015,99	274.405,33	32,0
30	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zonamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zonamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
Total da Ação 8689 - Programa 2029								530.482,50	265.241,25	50,0

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(4º Ciclo 2014)

31	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
32	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
33	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
34	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 352.840,00	4%
35	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 255.723,17	53%
36	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
Total da Ação 8902 - Programa 2029								13.127.098,71	3.564.291,81	27,2
37	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
Total da Ação 8917 - Programa 2029								207.542,62	107.354,71	51,73
38	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R\$ 694.459,19	R\$ 556.781,91	80%
Total da Ação 8918 - Programa 2029								694.459,19	556.781,91	80,2
Total do Programa 2029								9.167.882.674,92	4.978.840.980,52	54,31
38	11	2. Universalizar o acesso a atos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
39	12	2. Universalizar o acesso a atos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 350.978,27	R\$ 186.696,80	53%
Total da Ação 8172 - Programa 2040								579.775,48	354.696,41	61,2
Total do Programa 2040								579.775,48	354.696,41	61,2
40	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
41	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
42	45	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.482.242,89	R\$ 2.630.114,65	35%
43	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 2.700.000,00	R\$ 30.000,00	1%
44	47	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 8.229.186,02	R\$ 5.115.374,59	62%
45	48	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.892.394,45	R\$ 100.000,00	3%
46	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 251.373,39	R\$ 251.373,39	100%
47	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
48	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
50	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 272.909,00	45%
51	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total da Ação 2000 - Programa 2111								22.639.846,75	8.884.421,63	39,2
Total do Programa 2111								22.639.846,75	8.884.421,63	39,2
52	14	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração de uma metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	15	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total da Ação Interna								0,00	0,00	-
Total do Programa Interno								0,00	0,00	-
TOTAL GERAL								9.191.102.297,15	4.988.080.098,56	54,3

Posição: 28/11/2014

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Referência dos dados: 4º Ciclo 2014
