



# INFORME DE MONITORAMENTO DA AGENDA DE ARR 2023-2026

1º semestre/2024


# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

Total de ARRs  
**14**

Nº de ARRs Obrigatórias  
**9**

Nº de ARRs Eletivas  
**5**

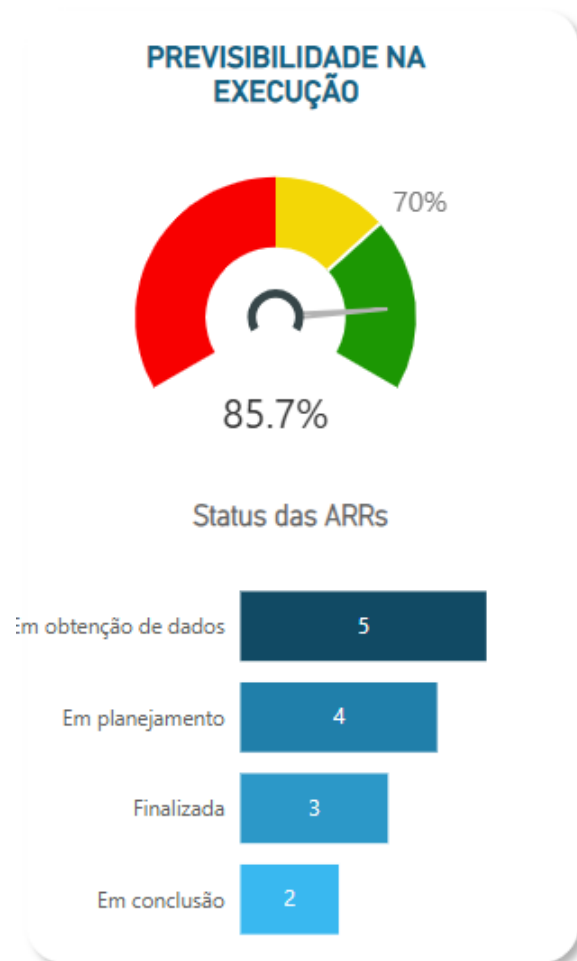


# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

## 1. PREVISIBILIDADE NA EXECUÇÃO DA AGENDA DE ARR (PrevExecARR)\*

**Meta:  $\geq 70\%$  das ARRs aderentes ao cronograma planejado**

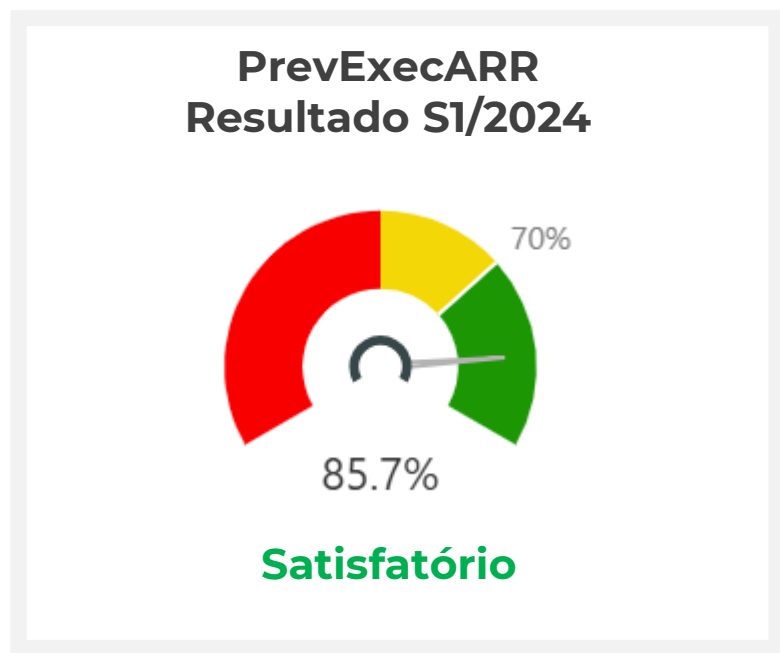

Fonte: Painel de Monitoramento da Agenda de ARR 2023-2026

- Obteve-se **85,7% de previsibilidade na execução da Agenda de ARR**, valor dentro da meta estabelecida para este indicador
- Das 14 ARRs constantes da Agenda, apenas 2 não estão aderentes ao cronograma planejado:
  - ARR da RDC nº 772/2022; e
  - ARR da RDC nº 595/2022.

\* O resultado do indicador PrevExecARR é definido pela comparação da execução informada das ARRs até o semestre monitorado com a execução planejada para o mesmo período, sendo:

**Satisfatório:**  $\geq 70\%$  das ARRs com execução aderente ao cronograma planejado;

**Alerta:** entre 50 e 69% das ARRs com execução aderente ao cronograma planejado; e

**Crítico:**  $< 50\%$  das ARRs com execução aderente ao cronograma planejado.

# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

## 1. PREVISIBILIDADE NA EXECUÇÃO DA AGENDA DE ARR (PrevExecARR)\*

### Detalhamento da execução informada para as ARRs em andamento


ARR	UORG Responsável	Caráter	Status	Planejamento da ARR	Obtenção de dados	Conclusão da ARR
RDC nº 750/2022	GGMED	Obrigatório	Em planejamento	Elaboração do Plano de ARR - tópicos 1 e 2 (50%)	Coleta – período inicial (40%)	Não iniciado (0%)
RDC nº 613/2022	GGPAF	Obrigatório	Em planejamento	Formalização do Plano de ARR (100%)	Não iniciado (0%)	Não iniciado (0%)
RDC nº 786/2023	GGTES	Obrigatório	Em planejamento	Elaboração do Plano de ARR - tópicos 1 e 2 (50%)	Coleta – período inicial (40%)	Elaboração do Relatório de ARR – até tópico 5 do modelo (60%)
RDC nº 814/2023	GHCOS	Obrigatório	Em planejamento	Não iniciado (0%)	Não iniciado (0%)	Não iniciado (0%)
IN nº 129/2022	GGFIS	Eletivo	Em obtenção de dados	Formalização do Plano de ARR (100%)	Coleta – período inicial (40%)	Não iniciado (0%)
IN nº 35/2019	GGFIS	Eletivo	Em obtenção de dados	Formalização do Plano de ARR (100%)	Coleta – período inicial (40%)	Não iniciado (0%)
RDC nº 658/2022	GGFIS	Eletivo	Em obtenção de dados	Formalização do Plano de ARR (100%)	Coleta – período inicial (40%)	Não iniciado (0%)
RDC nº 739/2022	GGTOX	Obrigatório	Em obtenção de dados	Formalização do Plano de ARR (100%)	Levantamento da linha de base ou atividades preparatórias (20%)	Não iniciado (0%)
RDC nº 595/2022	GGTPS	Obrigatório	Em obtenção de dados	Formalização do Plano de ARR (100%)	Coleta – período inicial (40%)	Não iniciado (0%)
RDC nº 772/2022	GHCOS	Eletivo	Em conclusão	Formalização do Plano de ARR (100%)	Coleta concluída (100%)	Relatório de ARR elaborado (90%)
RDC nº 562/2021	GGTPS	Obrigatório	Em conclusão	Formalização do Plano de ARR (100%)	Coleta concluída (100%)	Elaboração do Relatório de ARR – tópicos 6 a 9 do modelo (80%)

# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

## 2. PERCENTUAL DE ARRs OBRIGATÓRIAS CONCLUÍDAS NO PRAZO LEGAL (CumpPrazo)\*

**Meta: 100% das ARRs obrigatórias concluídas no prazo legal**

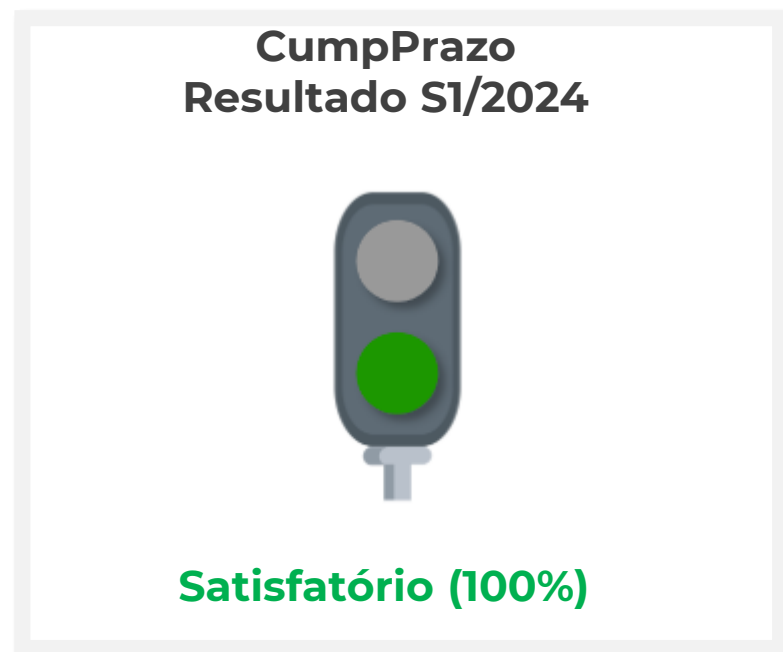

Fonte: Painel de Monitoramento da Agenda de ARR 2023-2026

- **Todas as ARRs obrigatórias já concluídas da Agenda de ARR observaram o prazo legal** estabelecido pelo Decreto nº 10.411, de 2020.
- São duas as ARRs obrigatórias já concluídas, que integram o macrotema Portos, Aeroportos e Fronteiras:
  - ARR da RDC nº 488/2021: concluída no 1º sem/2024; e
  - ARR das RDCs nº 754 e 759, de 2022: concluída no 2º sem/2023
- Os relatórios de todas as ARRs concluídas podem ser acessados [aqui](#).



\* Se pelo menos uma ARR obrigatória for concluída após o prazo de até 3 anos a partir da vigência do instrumento regulatório, o resultado desse indicador é interpretado como **Crítico**.

# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

## 3. RISCO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA ARR (RiscoPrazo)\*

**Meta: ≥ 70% das ARRs em situação Satisfatória e nenhuma Crítica**

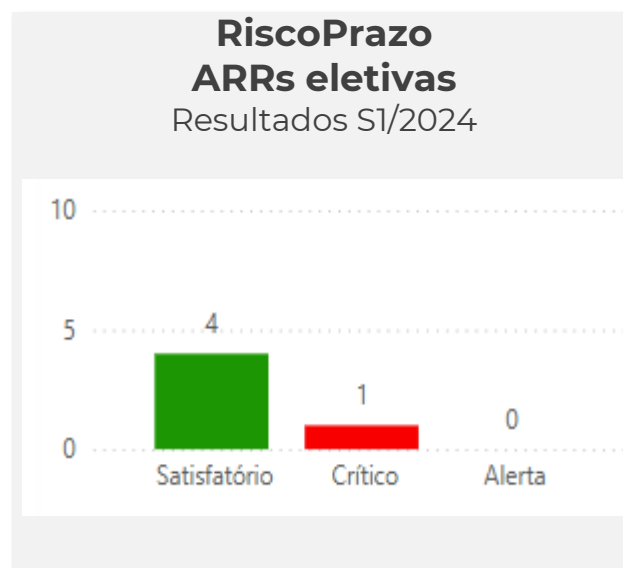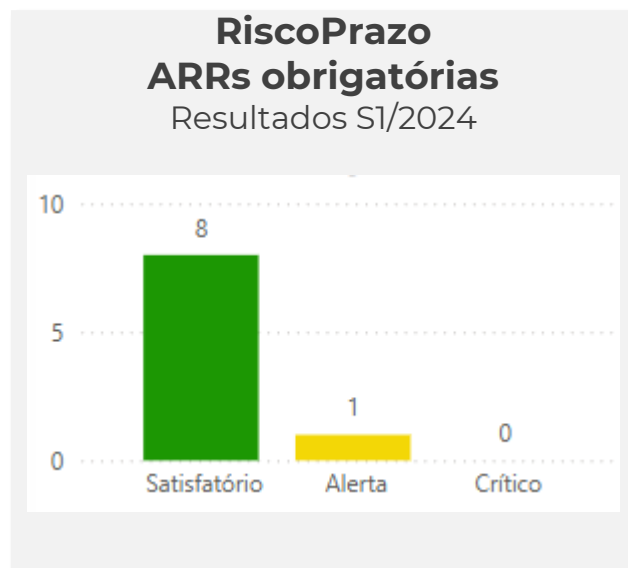

- Este indicador **não alcançou a meta estabelecida**: uma ARR eletiva está em situação crítica, pois ultrapassou o prazo definido em seu cronograma, embora esteja em execução avançada (97%), restando apenas a etapa de deliberação do Relatório de ARR pela Dicol.

Fonte: Painel de Monitoramento da Agenda de ARR 2023-2026

* CARÁTER DA ARR	RISCOPRAZO ALERTA	RISCOPRAZO CRÍTICO
ARR obrigatória	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se até a metade do prazo legal para conclusão, a UORG não tiver concluído a etapa "Planejamento da ARR"; <b>ou</b></li> <li>Se até o início do último semestre anterior ao vencimento do prazo legal para conclusão, a UORG não tiver pelo menos iniciado a etapa "Conclusão da ARR"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se no último ano do prazo legal, a UORG não tiver iniciado a ARR</li> </ul>
ARR eletiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>se até a metade do prazo previsto em cronograma, a UORG não tiver concluído a etapa "Planejamento da ARR"; <b>ou</b></li> <li>se até o início do último semestre anterior ao vencimento prazo previsto em cronograma, a UORG não tiver pelo menos iniciado a etapa "Conclusão da ARR"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se no último ano do prazo previsto no cronograma para realização da ARR, a UORG não tiver iniciado a ARR</li> </ul>

# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

## 3. Risco de descumprimento do prazo para conclusão da ARR (RiscoPrazo)

### Detalhamento das ARRs em situação **Alerta** ou **Crítico**

ARR	CARÁTER	UORG RESPONSÁVEL	PRAZO	EXECUÇÃO INFORMADA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES ASREG
RDC nº 750/2022	Obrigatório	GGMED	2º sem/25	<p>Planejamento da ARR: Elaboração do Plano de ARR - tópicos 1 e 2 (50%)</p> <p>Obtenção dos dados: Coleta – período inicial (40%)</p> <p>Conclusão da ARR: Não iniciado (0%)</p>	<b>ALERTA</b>	A ARR assumiu a classificação “Alerta” para esse indicador, pois já decorreu metade o prazo legal para conclusão e não foi concluída a etapa de Planejamento. No entanto, <b>importa destacar que a ARR está aderente ao cronograma planejado pela UORG responsável e, se assim permanecer, o prazo legal será cumprido.</b>
RDC nº 772/2022	Eletivo	GHCOS	1º sem/24	<p>Planejamento da ARR: Concluído</p> <p>Obtenção dos dados: Concluído</p> <p>Conclusão da ARR: Relatório de ARR elaborado (90%)</p>	<b>CRÍTICA</b>	A ARR assumiu a classificação “Crítica” para esse indicador, pois já está esgotado o prazo para conclusão previsto no Voto 301 (2087788). No entanto, <b>importa destacar que, conforme informado pela UORG responsável, a ARR está com 97% de execução, restando apenas a deliberação do Relatório de ARR pela Dicol.</b>

# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024


## 4. REPLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA

### Informativo



- Nesta janela de monitoramento, nenhuma UORG replanejou o cronograma de ARRs sob sua responsabilidade.

### + informações sobre o cronograma das ARRs

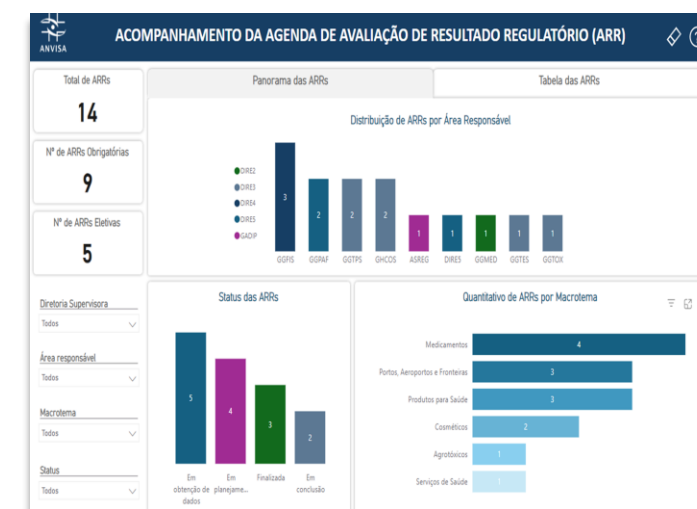

Fonte: Painel de Monitoramento da Agenda de ARR 2023-2026



# Informe de Monitoramento da Agenda de ARR

Resultados do 1º semestre de 2024

## 6. CONCLUSÃO DE ARR<sub>s</sub> NO SEMESTRE

### Lista de ARR<sub>s</sub> concluídas no semestre

ARR	CARÁTER	UORG RESPONSÁVEL	EMENTA	RELATÓRIO DE ARR
RDC nº 488/2021	Obrigatório	DIRE5	Dispõe sobre a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária por unidade de saúde, para seu uso exclusivo	<a href="#">Relatório de ARR da RDC 488/2021 (DIRE5)</a>



# OBRIGADA!

Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória
