

**PLANO DE AÇÃO INPI 2018:**  
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO (ATÉ **31/12/2018**)

## SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	3
2 METAS .....	4
3 AÇÕES.....	10

# 1 APRESENTAÇÃO

O presente Relatório divulga os resultados da execução das 10 metas e 21 ações do Plano de Ação do INPI – 1ª Revisão, até o último dia útil do ano de 2018. Também apresenta a visualização dos resultados em relação às metas previstas, e a classificação do status de execução das ações.

A revisão do Plano de Ação 2018 foi publicada em 30 de novembro<sup>1</sup>, após aprovação formal do MDIC. O objetivo da revisão do planejamento anual foi direcionar os recursos das unidades do Instituto nas prioridades da gestão para o encerramento do exercício.

Isto não representou prejuízo à execução das demais ações previstas na primeira versão do Plano, as quais permaneceram em execução pelos setores responsáveis. Porém, a alta direção do Instituto poderá, a partir deste enfoque trazido pela revisão, concentrar o monitoramento nas entregas prioritárias para o ano. Não houve alteração nas metas anuais de desempenho.

## **Destaques de desempenho**

Os resultados anuais consolidados evidenciam elevada capacidade de execução das metas e ações planejadas, bem a melhoria do desempenho operacional em relação no ano anterior. Dentre os avanços observados em 2018, podemos destacar:

- **Todas metas** previstas para o ano foram superadas; e
- Foram concluídas **80% das entregas** vigentes controláveis pelo INPI.

---

<sup>1</sup> Foram posteriormente acrescentadas, em relação àquela proposta submetida ao MDIC em 22/10, duas iniciativas, a saber: “Elaborar Manual de Desenho Industrial” e “Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas”.

## 2 METAS

A Tabela 1 apresenta os resultados alcançados na execução das metas do Plano de Ação do INPI para as atividades de exame de pedidos de propriedade industrial.

**As metas institucionais foram superadas.** Além disso, os **resultados de 2018 são melhores que os resultados alcançados em 2017**, com exceção do indicador de instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas, em virtude do trabalho realizado pela força-tarefa de exame de recursos de marcas em 2017.



**Tabela 1:** Metas de eficiência operacional em atividades de exame



Indicadores	Meta 2018	Resultado (em 31/12/2018)
Primeiro exame técnico de pedidos de patentes <sup>(1)</sup>	15.018	16.148
Decisão de exame técnico de pedidos de patentes <sup>(1)</sup>	13.948	17.264
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca	269.414	366.484
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	9.236	9.924
Taxa de desempenho de decisões emitidas de contratos e faturas averbadas ou registradas	97%	105%
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de patentes	1.888	2.373
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas	23.978	33.075
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de desenho industrial e outros registros	1.730	2.104
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedido de registro de marca	18 meses <sup>(2)</sup>	12 meses <sup>(2)</sup>
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	12 meses	8,3 meses <sup>(3)</sup>



<sup>(1)</sup> Não considera o impacto operacional da eventual aprovação de medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em 2018.



<sup>(2)</sup> Este tempo é referente à moda do tempo de todos os processos analisados, com e sem oposição. A moda do tempo de análise para processos com oposição é de 13 meses, para processos sem oposição é de 12 meses.

<sup>(3)</sup> Caso considerados apenas os pedidos depositados em 2018, o tempo médio de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial é de 3,8 meses. A existência residual de processos antigos no *backlog* pode causar uma elevação da variância nos dados relacionados a este indicador, como pode ser observado no gráfico dos resultados mensais (vide pág. 9).

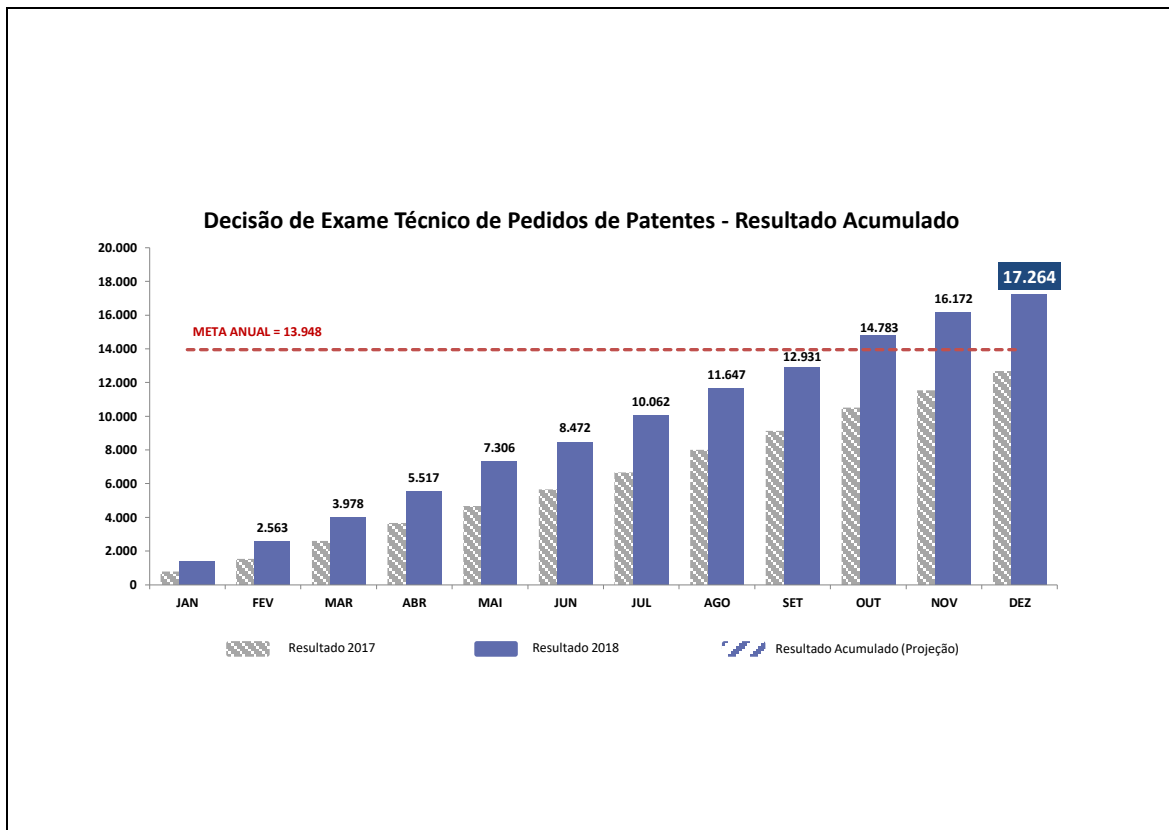
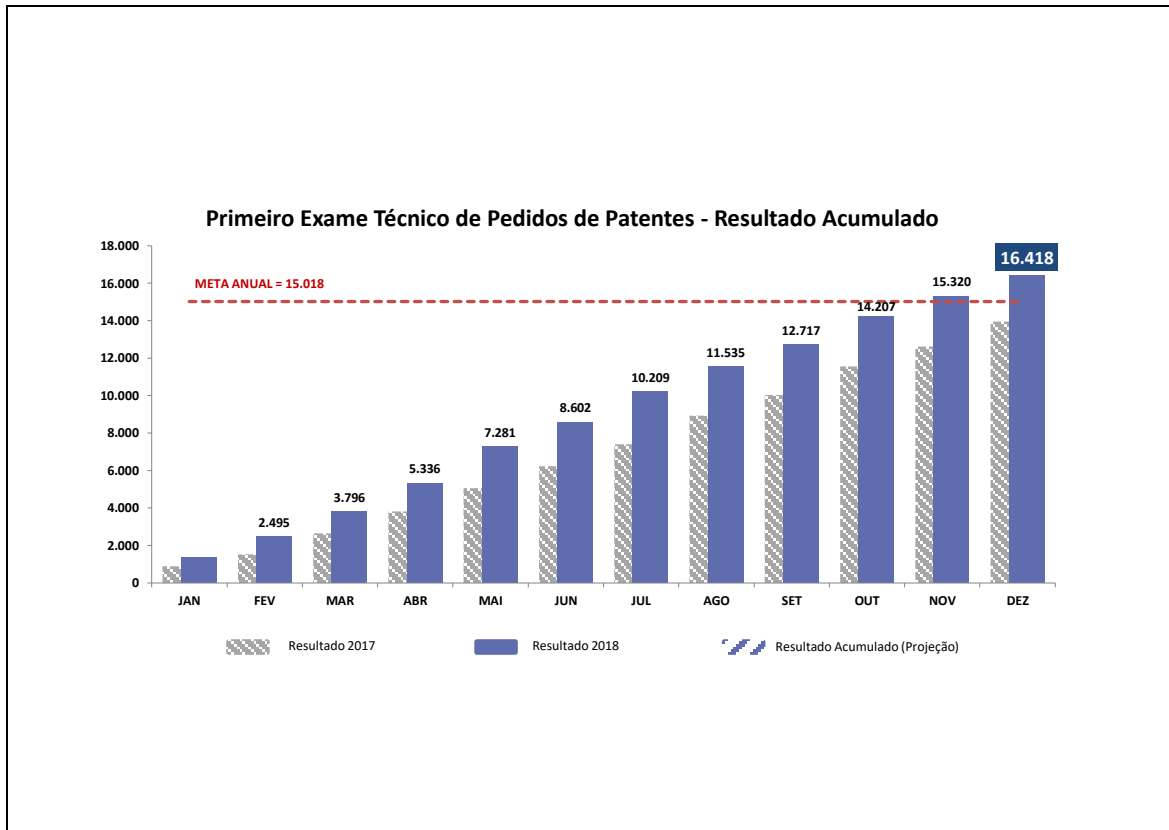


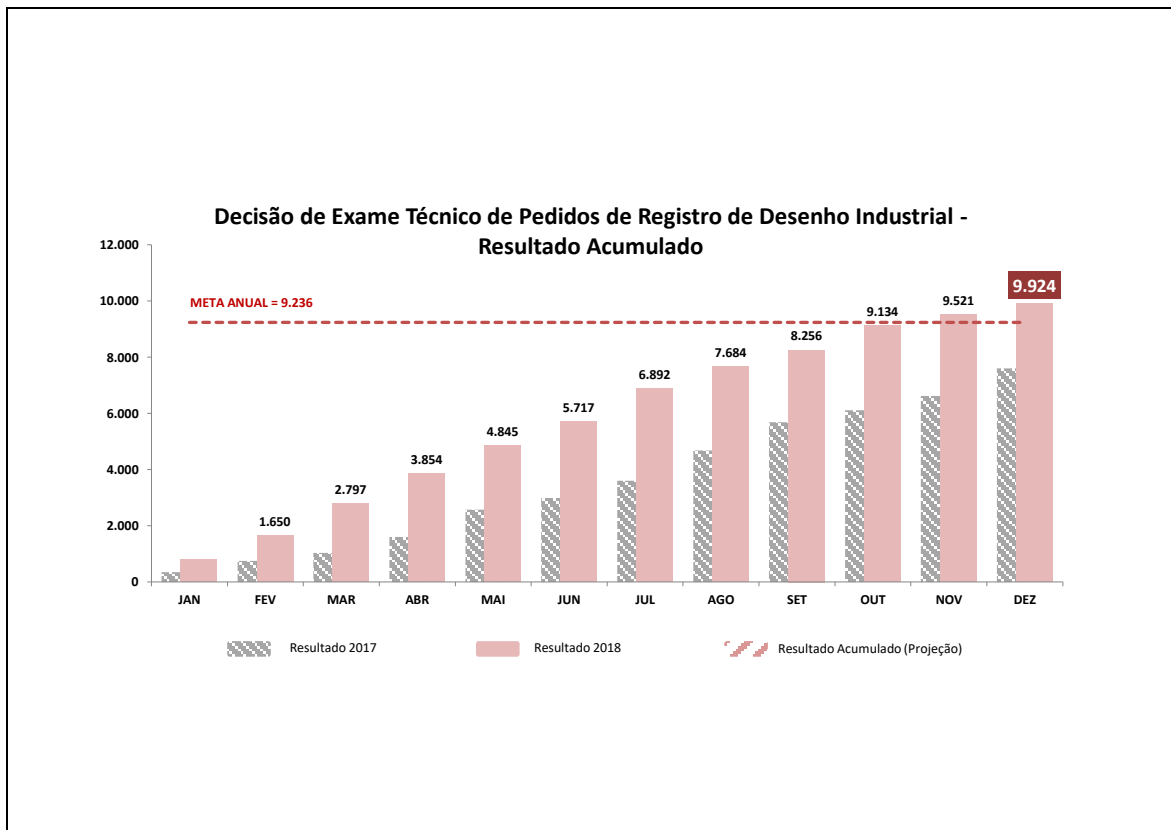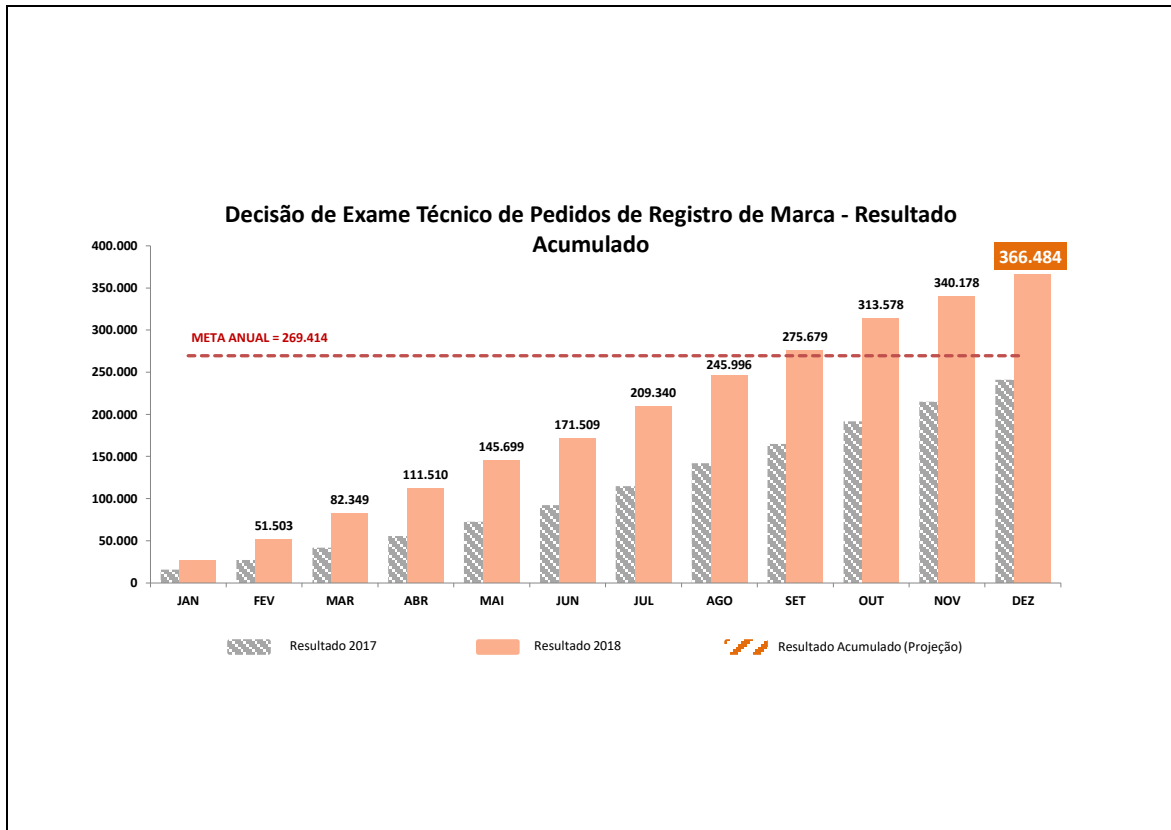

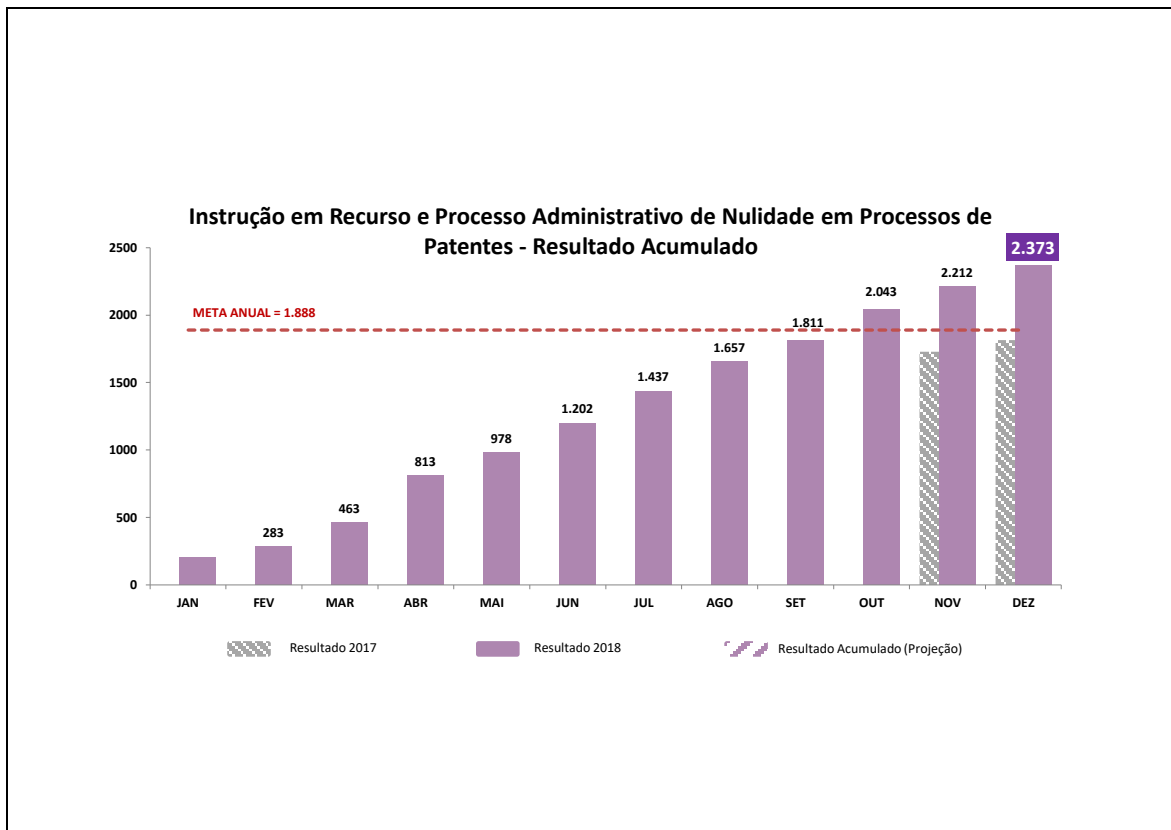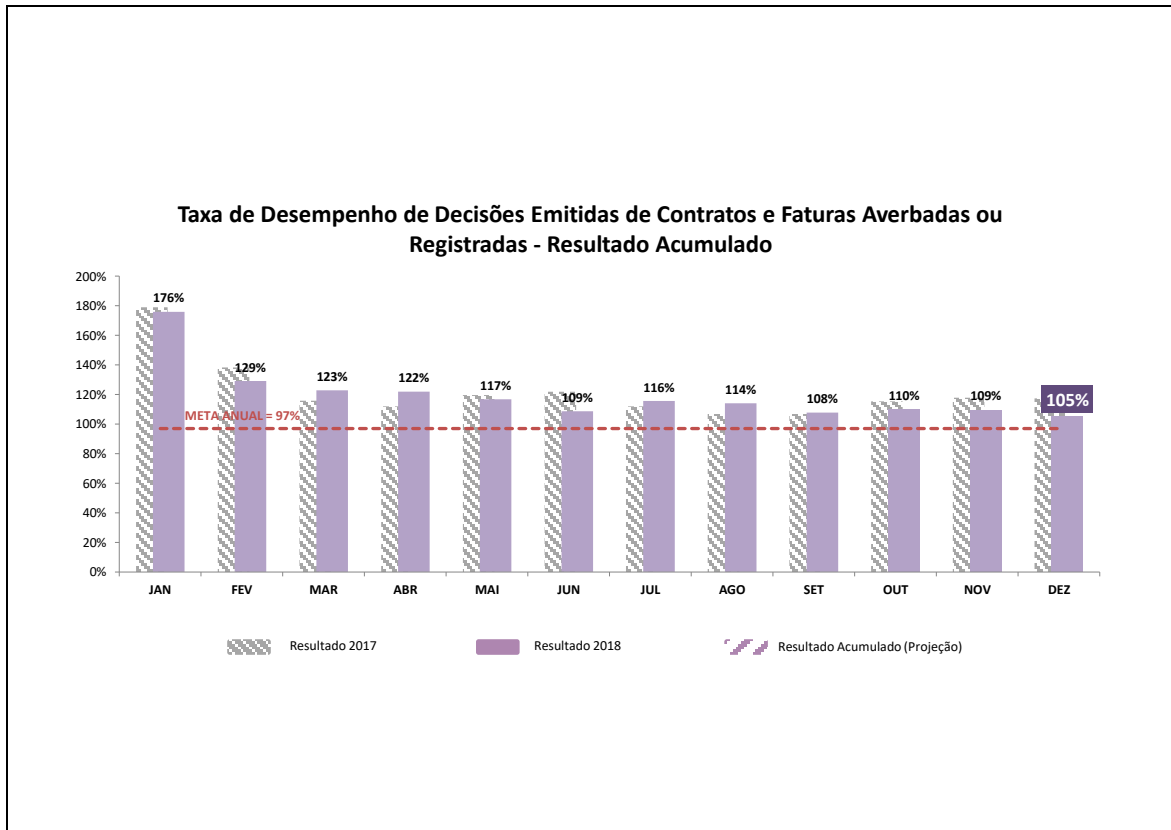

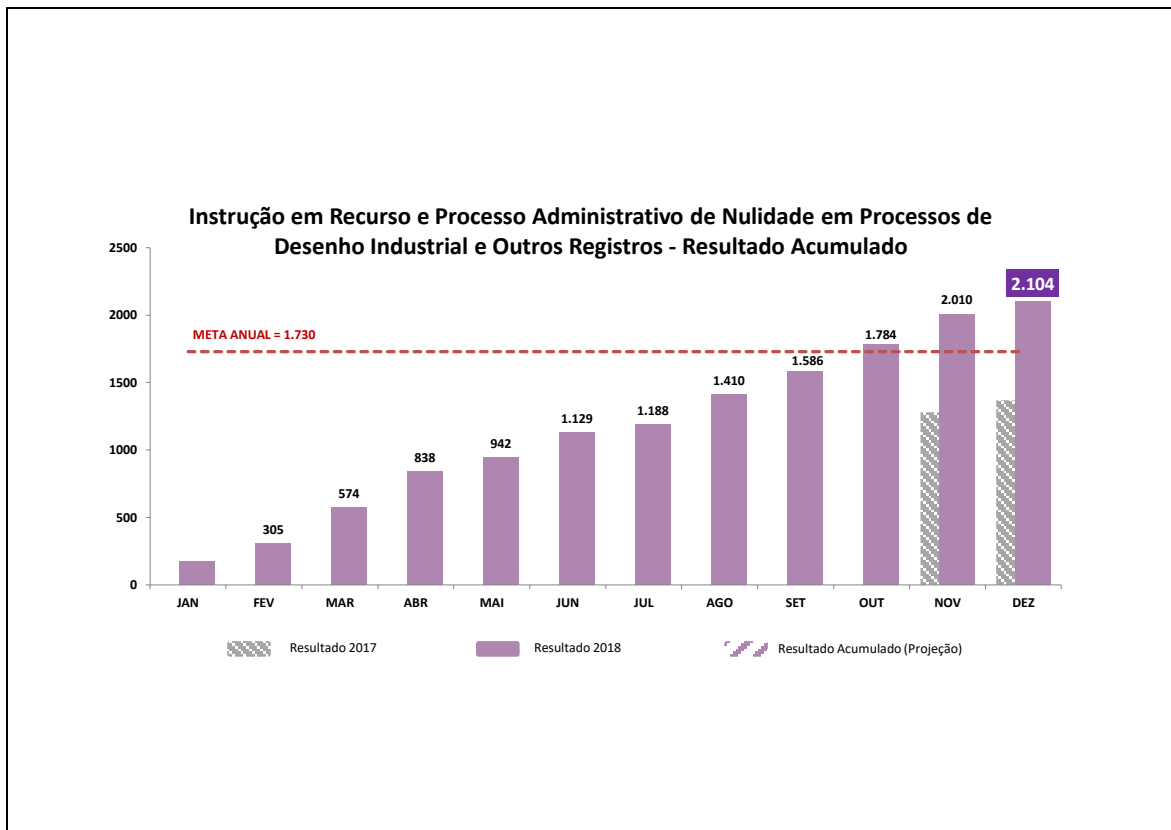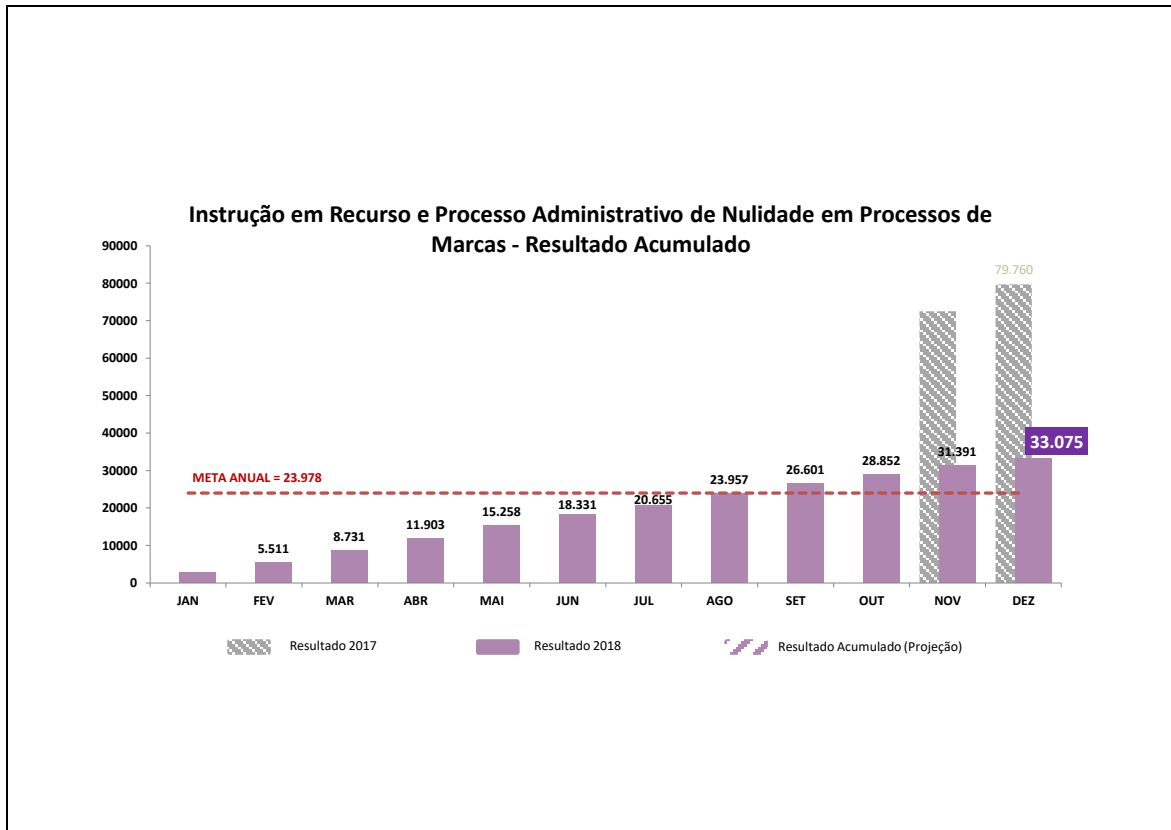



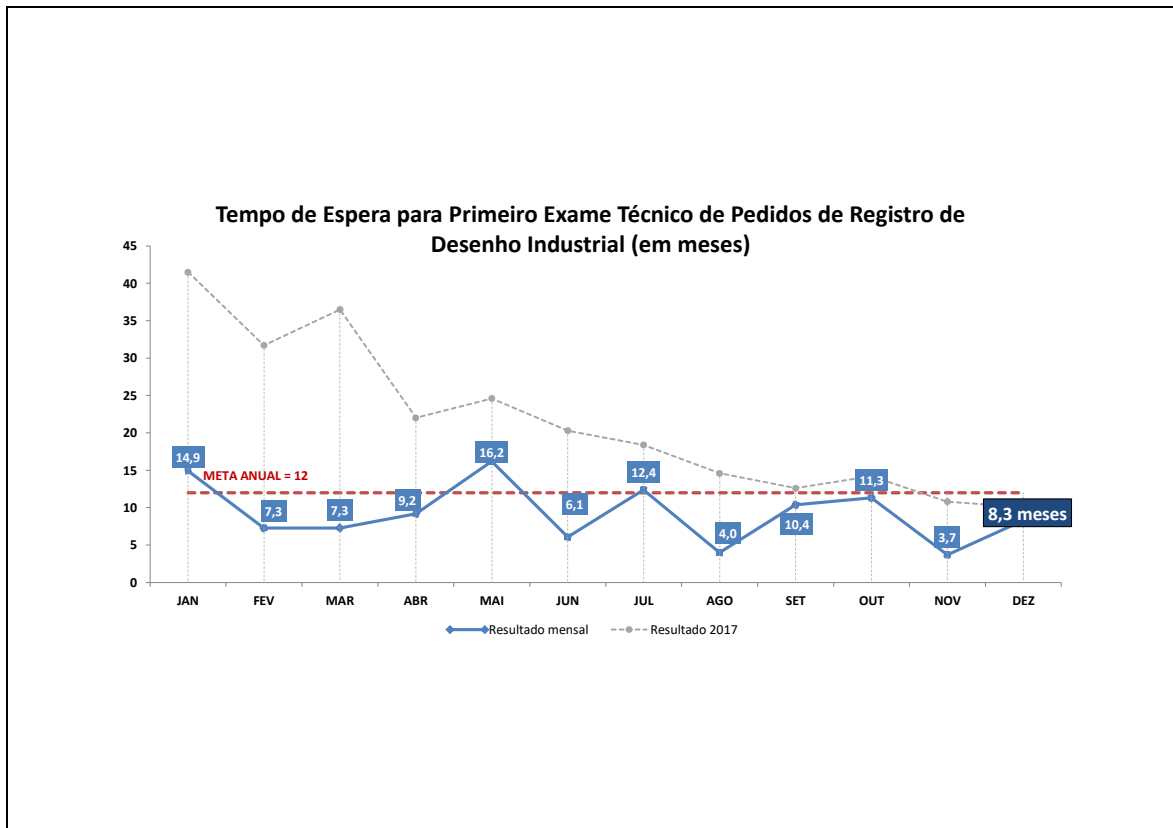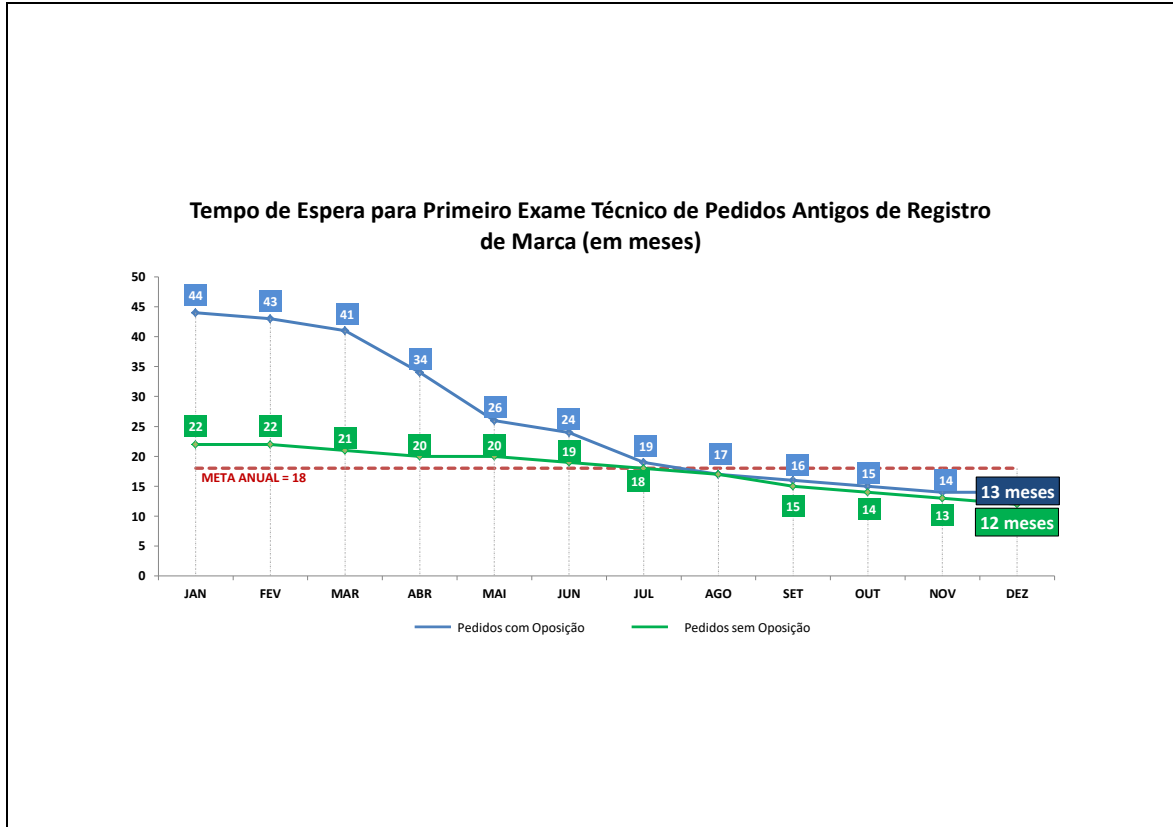


### 3 AÇÕES

Das 70 entregas vigentes<sup>2</sup> das 21 ações planejadas para 2018, temos: 44 (63%) concluídas, 17 (24%) estão atrasadas ( $\leq 30$  dias) e 9 (13%) estão muito atrasadas ( $> 30$  dias).

Vale destacar que a execução de 15 das 26 entregas vigentes atrasadas ou muito atrasadas depende de encaminhamentos e decisões externos fora da governabilidade do INPI<sup>3</sup>. **Foram concluídas 80%<sup>4</sup> das entregas vigentes controláveis pelo INPI.**

**Figura 1:** Status das entregas das ações – junho a dezembro/2018  
(70 entregas vigentes<sup>5</sup> de 21 ações)

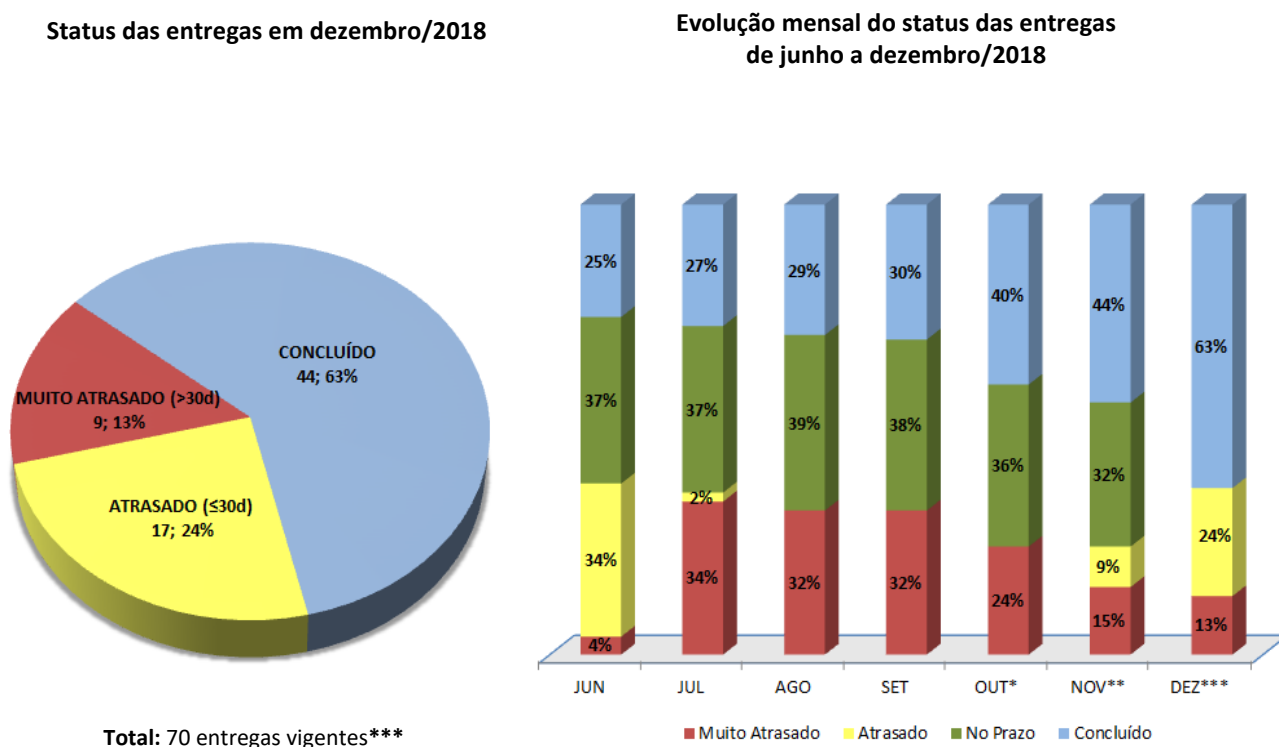

\*1 produto foi excluído em outubro; \*\*Revisão do Plano de Ação 2018; \*\*\*6 entregas suspensas e 1 entrega cancelada.

<sup>2</sup> Total de 80 entregas previstas originalmente.

<sup>3</sup> Envolvem outros órgãos e entidades públicas, ou de organizações internacionais com os quais o INPI se relaciona, por exemplo: MDIC, Congresso Nacional, Casa Civil, OMPI etc. Vide notas informativas nos quadros de detalhamento de status das iniciativas.

<sup>4</sup> Conclusão de 44 das 55 entregas vigentes controláveis pelo INPI.

<sup>5</sup> Não considera as 6 entregas suspensas e 4 canceladas.

**Quadro 2:** Status das Ações do Objetivo Estratégico 1 - Otimizar a qualidade e o tempo para a concessão de direitos de propriedade industrial

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
1. Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes e rever marco regulatório administrativo, para redução do backlog de pedidos pendentes de decisão em primeira instância ( <b>PD 2018 e ACT MDIC/ABDI/INPI</b> )	Medida legislativa aprovada pela Casa Civil	16/04/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Em análise na Casa Civil a proposta de Medida Provisória de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Medida legislativa aprovada pelo Congresso Nacional	31/05/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Não iniciada. Depende de aprovação da medida legislativa pela Casa Civil. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Contratações de infraestrutura e digitalização/saneamento realizadas	30/06/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Em 15/10/2018, a ABDI comunicou a assinatura do contrato com a empresa SOS Docs, que realizará os serviços de digitalização e saneamento dos documentos, selecionada por meio do Aviso de Licitação Pregão Eletrônica ABDI nº 0024/2018 (publicado em 07/08/2018 e pregão realizado em 20/08/2018). Quanto às contratações de infraestrutura, os três primeiros lotes foram entregues em 2018 e atualmente estão em curso os treinamentos em VM (virtual machine) das novas máquinas. Está previsto para fevereiro de 2019 o treinamento dos backups. O quarto (e último) lote foi entregue ao INPI em 08/01/2019: VDIs - infraestrutura de desktops virtuais. A previsão de instalação e de treinamento da equipe da CGTI é até março de 2019. <b>Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 14/2018 (publicado no DOU em 21/05/2018).</b>
	Procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em implementação	31/03/2019	<b>SUSPENSO</b> Não iniciado. Proposta em análise na Casa Civil.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
2. Implantar programa-piloto de colaboração técnica com instituições científicas e tecnológicas para expansão da capacidade de exame de pedidos de patentes pelo INPI (PD 2018)	Protocolo de Intenções assinado com o CNPq	17/09/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Protocolo de Intenções assinado em 05/09/2018.
	Programa de capacitação aprovado pelo INPI e CNPq	31/10/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> O INPI apresentou ao CNPq em 25/10/2018 o Piloto do Plano de Capacitação para formação de pesquisadores externos em atividades e opiniões para o exame técnico pelo INPI. Na mesma oportunidade, iniciou-se a confecção do Plano de Trabalho e do Termo de Execução Descentralizada (TED). Após reanálise do Piloto do Plano de Capacitação pelo CNPq, foram realizadas algumas considerações acerca do escopo do projeto. Próxima reunião entre o INPI e CNPq para redefinição conjunta do escopo e viabilidade da parceria deverá ser realizada em janeiro de 2019. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Instrumento jurídico assinado	28/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Depende da conclusão do Termo de Parceria, do Plano de Trabalho e do Termo de Execução Descentralizada (TED).

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
3. Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI (PD 2018)	Plano Executivo do projeto-piloto aprovado pelo Presidente do INPI	31/08/2018	<b>CONCLUÍDO.</b> Plano Executivo do projeto-piloto aprovado pelo Presidente do INPI.
	Minutas de atos normativos* encaminhados à PFE *Sobre procedimento de aproveitamento do resultado das buscas	15/09/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Minuta da Resolução sobre aproveitamento do resultado das buscas realizadas em escritórios de patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais enviada à PFE. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.212997/2018-77.</b></li> </ul>
	Minutas de atos normativos* encaminhados à PFE *Sobre dispensa do controle de assiduidade	15/10/2018	<b>CANCELADO</b> Solicitada diretamente a aprovação do MDIC do programa de gestão na modalidade “por tarefa”, por meio do ofício SEI nº 12/2018/PR de 20/12/2018. <b>Processo SEI nº 52402.007018/2018-41.</b> <b>Dependência Externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Parecer(es) jurídico(s) elaborados pela PFE* *Sobre procedimento de aproveitamento do resultado das buscas	15/10/2018	<b>CONCLUÍDO</b> em 15/10/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.212997/2018-77.</b></li> </ul>
	Parecer(es) jurídico(s) elaborados pela PFE* *Sobre dispensa do controle de assiduidade	15/11/2018	<b>CANCELADO</b> Solicitada diretamente a aprovação do MDIC do programa de gestão na modalidade “por tarefa”, por meio do ofício SEI nº 12/2018/PR de 20/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.007018/2018-41.</b></li> </ul> <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Atos normativos do INPI publicados	15/11/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Resolução INPI/PR N° 227, publicada em 25/10/2018. Instrução Normativa aguardando a aprovação pelo MDIC do pacote de documentos encaminhado através do ofício SEI nº 12/2018/PR de 20/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.007018/2018-41.</b></li> </ul> <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
3. Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI (PD 2018) (Continuação)	Ato normativo do MDIC publicado	15/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Depende da publicação da portaria de aprovação do programa de gestão pelo MDIC. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Projeto-piloto iniciado	28/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Depende da publicação da portaria de aprovação do programa de gestão pelo MDIC. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
4. Expandir os acordos de Patent Prosecution Highway (PPH)	Visita realizada (KIPO)	18/09/2018	<b>CONCLUÍDO</b> A visita ao KIPO foi realizada no período de 13 a 18/09/2018.
	Reunião realizada (KIPO)	26/09/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Reunião bilateral com o KIPO durante a Assembleia Geral da OMPI ocorrida no dia 25/09/2018.
	MdE assinado com KIPO	31/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> O KIPO informou que o MdE de Cooperação Geral será assinado somente junto com o MdE de projeto-piloto de PPH, o que deverá ocorrer somente em 2019. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
5. Implantar o sistema de gestão da qualidade dos processos de exame de propriedade industrial em conformidade com a ISO 9001:2015 (PD 2018)	Política da Qualidade do INPI publicada	31/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Despacho de aprovação do Diretor Executivo em 21/12/2018 encaminhado à Presidência do Instituto solicitando apreciação, com vistas à publicação. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.008522/2018-68.</li> </ul>
	Processo de recebimento mapeado e documentado	31/07/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Processo do RO/PCT mapeado e documento. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.000546/2018-77.</li> </ul>
	Processos de busca e exame de pedido internacional de patente mapeados e documentados	31/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> O mapeamento do processo ISA/PCT finalizado em 12/12/2018. Mapeamento do processo IPEA/PCT está em andamento. Será realizada uma reunião com a equipe do projeto em janeiro de 2019 para definir nova data de entrega. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.000546/2018-79.</li> </ul>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
6. Elaborar Manual de Desenho Industrial	Minuta de Manual revisada	07/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Manual revisado. Encaminhado à Presidência em 11/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo nº 52400.224.664/2017 (SINPI 297471).</b></li> </ul>
	Manual publicado	28/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Manual Publicado por meio da Resolução nº 232/2019 de 07/01/2019 na RPI 2505 de 08/01/2019. Processo nº 52400.224.664/2017 (SINPI 297471).
7. Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas	Consulta pública encerrada	06/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Consulta Pública nº 04, de 05/11/2018, encerrada em 06/12/2018. (DOU de 06/11/2018, Seção 1, página 29).
	Minuta de Instrução Normativa revisada	10/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Avaliação das manifestações da consulta pública concluída em 10/12/2018. Instrução Normativa elaborada e enviada à PFE em 11/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo Nº 52402.007434/2018-49.</b></li> </ul>
	Minuta revisada de Instrução Normativa analisada pela PFE	14/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Instrução Normativa elaborada e enviada à PFE em 11/12/2018. Parecer da PFE elaborado em 19/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo nº 52402.007434/2018-49.</b></li> </ul>
	Instrução Normativa publicada	21/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Instrução Normativa nº 95/2018 publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 2504, em 02/01/2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo nº 52402.007434/2018-49.</b></li> </ul>

**Quadro 3:** Status das Ações do Objetivo Estratégico 2 - Expandir e aperfeiçoar a disponibilização de dados e informações sobre propriedade industrial

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
8. Elaborar estudos de propriedade industrial para geração de inteligência competitiva <b>(ACT MDIC/ABDI/INPI)</b>	Plano de estudos aprovado pelo Comitê Gestor do ACT MDIC/ABDI/INPI	31/08/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Plano de Estudos aprovado na 5ª Reunião do Comitê Gestor do ACT, realizada em 27/11/2018.
	Relatórios e estudos elaborados pelo INPI	31/12/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Estudo sobre carros híbridos e elétricos e sobre mobilidade em cidades inteligentes elaborados e enviados para o MDIC e à ABDI, por e-mail, pelo Coordenador-Geral da CGPE, em 21/12/2018. Os estudos ainda serão encaminhados formalmente para o Ministério da Economia, por ofício da Presidência do INPI. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Processo SEI nº 52402.009773/2018-60.</b></li></ul>



**Quadro 4:** Status das Ações do Objetivo Estratégico 3 - Contribuir para a participação do Brasil no sistema internacional de propriedade industrial

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
9. Promover medidas operacionais e administrativas previstas no Projeto de Adesão ao Protocolo de Madri para simplificar o registro internacional de marcas (PD 2018)	Adesão autorizada pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo)	29/06/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Audiência Pública realizada em 07/08/2018. Questionamentos ABPI respondidos, inclusive em palestra do Diretor da DIRMA na ABPI em agosto. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Proposta de nova estrutura regimental do INPI apresentada ao MDIC	28/06/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Proposta encaminhada ao MDIC por meio do ofício nº 345/2018 INPI de 13/07/2018. Ofício nº 395/2018 INPI enviado a MDIC contendo a documentação complementar.
	Solicitação de concurso apresentada ao MDIC	30/04/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Solicitação de concurso enviada ao MDIC, por meio do ofício nº 186/2018, de 27/04/2018. Ofício nº 118/2018-SEI-GAB-SE não autorizando a realização de concurso.
	Sistema Multiclasse implementado	07/11/2018*	<b>SUSPENSO</b> Em implementação pequenas melhorias pontuais no sistema Busca Web e no XML para público externo. As modificações requeridas à OMPI no IPAS ainda não foram disponibilizadas, aguardando nova versão do IPAS 3.5.b. <i>*Pelo novo cronograma revisado do PD 2018, a previsão atual é 25/04/2019.</i> <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Proposta de nova Tabela de Retribuições do INPI apresentada ao MDIC	31/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> A Tabela de Retribuição do INPI encontra-se em processo de revisão. Em 04/01/2019 foi encaminhado às áreas técnicas, para manifestação até 04/02/2019, o resultado final do estudo realizado pela consultoria financiado pela UNESCO - Elaboração de proposta de critérios e parâmetros para o reajuste da tabela de retribuição dos serviços do INPI. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Processo SEI nº 52400.080336/2017.</b></li></ul>
	Decreto Executivo	30/03/2019*	<b>SUSPENSO</b> <i>*Pelo novo cronograma revisado do PD 2018, a previsão atual é 30/08/2019.</i> <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>

**Quadro 5:** Status das Ações do Objetivo Estratégico 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
10. Esvaziar e devolver o edifício A Noite	Manutenção realizada	28/12/2018	<p><b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Assinatura do Termo de Recebimento definitivo do serviço de retirada das treliças em 14/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.005471/2018-12.</b></li> </ul> <p>Entrega dos artefatos da fase de planejamento para a contratação da remoção do Gradil à área de Licitações prevista para 18/01/2019. Após a entrega do edifício ao TRF-2, o Tribunal contratará o projeto de engenharia.</p>
	Bens e documentos retirados do prédio com destinação adequada	02/01/2019	<p><b>SUSPENSO</b> Realizada a destinação de 25% dos bens móveis até 31/12/2018. Processos de doações instruídos para assinatura do Presidente. Processo de desfazimento/descarte de determinados bens de TI encaminhados à Presidência em 28/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo 52402.009447/2018-52.</b></li> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.009447/2018-52.</b></li> </ul> <p>Concluídos a classificação e destinação de documentos (exceto documentos de patentes para informação tecnológica e de programa de computador) e o processamento e a destinação de documentos de patentes para informação tecnológica (papel e CD). Realizados o processamento e a destinação de documentos técnicos de programa de computador (papel e CD).</p> <p>A transferência das equipes da prestadora dos serviços de manutenção para o edifício MV9 ocorrerá até o dia 29/05/2019, conforme acordado com os representantes do TRF-2.</p> <p>A contratação e ativação do serviço de “colocation full” está prevista para até 21/04/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo: 52402.005569/2018-70.</b></li> </ul>
	Contrato de cessão revogado	28/12/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Termo de Entrega do Edifício “À Noite” firmado entre a SPU e o TRF-2 em 06/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.001145/2018-36</b></li> </ul>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
11. Preparar a destinação do prédio do INPI na Praça da Bandeira	Avaliação realizada por empresa contratada	28/12/2018	<b>CANCELADO</b> Após estudos a opção do Instituto será a doação/cessão do imóvel da Praça da Bandeira. Desta forma, não haverá necessidade de contratar a avaliação desse imóvel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo nº 52400.127496/2018-97.</b></li> </ul>
	Imóvel em posse do INPI	31/10/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> O INPI notificou o INMETRO para a entrega das chaves e poderá encaminhar a demanda para a câmara de conciliação. Novo prazo para o recebimento formal do imóvel, dia 15/01/2019. Processo nº 52400.146571/2017-37. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Imóvel transferido para a SPU	31/10/2018	<b>SUSPENSO</b> A propriedade do imóvel não será mais transferida para a SPU. Após a avaliação do imóvel, o INPI alienará o bem.
12. Preparar a alienação dos imóveis funcionais do INPI em Brasília	Avaliação realizada por empresa contratada	28/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> O INPI iniciará planejamento para alienação internamente, uma vez que foi decidida a alienação do imóvel. Tanto a contratação da avaliação quanto a da alienação ocorrerão pela Caixa Econômica Federal.
	Imóvel transferido para a SPU	31/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> O INPI irá iniciar planejamento para alienação internamente, uma vez que foi decidida a alienação do imóvel. Tanto a contratação da avaliação quanto a da alienação ocorrerão pela Caixa Econômica Federal. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
13. Realizar a cessão parcial do prédio da unidade regional do INPI em Brasília para o MDIC	Laudo de vistoria elaborado	17/08/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Laudo de vistoria elaborado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo nº 52400.137551/2017-17.</li> </ul>
	Termo de cessão encaminhado à PFE	31/08/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Termo de cessão encaminhado à PFE em setembro/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo nº 52400.137551/2017-17.</li> </ul>
	Termo de cessão assinado	31/10/2018	<b>CONCLUÍDO</b> O termo de cessão parcial do imóvel foi assinado em 06/11/2018 e publicado no DOU nº 231 em 03/12/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.008576/2018-23.</li> </ul>
14. Ampliar e melhorar as condições de ocupação do edifício Mayrink Veiga, 9	Bicicletário construído pelo condomínio (10 Vagas)	30/11/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Instalado bicicletário na entrada de serviço do edifício MV9 em 26/12/2018.
	Sala de vistas da DIRMA em funcionamento	31/08/2018	<b>CONCLUÍDO</b> em 20/08/2018.
	13º e 14º locados	30/11/2018	<b>CONCLUÍDO</b> A assinatura do Termo Aditivo para a locação dos 13º e 14º andares foi realizada no dia 14/12/2018. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.005375/2018-74.</li> </ul>
	5º andar reestruturado	28/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> O INPI decidiu mudar o andar do refeitório para o 13º andar com previsão de inauguração no dia 21/01/2019. Layout aprovado em reunião pela DIRAD, em 27/12/2018.
	Obra iniciada pelo Condomínio (vestiário)	28/12/2019	<b>SUSPENSO</b> Houve um reposicionamento do condomínio no sentido de não realizar a construção do vestiário. As negociações para a viabilização do vestiário serão reiniciadas com o novo proprietário, no início de 2019. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
15. Alterar a estrutura organizacional do INPI (PD 2018)	Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MDIC	31/10/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Proposta encaminhado ao MDIC por meio do ofício nº 345/2018 INPI de 13/07/2018. Ofício nº 395/2018 enviado a MDIC contendo a documentação complementar. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
	Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MP	30/11/2018	<b>CANCELADO</b> Incorporação do MDIC e MP pelo novo Ministério da Economia.
	Decreto publicado	28/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Após a publicação do Decreto que aprovará a nova estrutura regimental, o INPI terá um prazo de 60 dias para encaminhar ao Ministério da Economia a minuta do novo regimento interno. <b>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</b>
16. Reestruturar as unidades regionais do INPI (PD 2018)	Indicadores elaborados e implementados	30/06/2018	<b>CONCLUÍDO</b> 1º Relatório Gerencial Semestral entregue no II Workshop das Regionais realizado na sede do INPI em 30-31/08/2018.
	Mudança da Unidade Regional de MG para o SENAI/DRMG realizada	30/06/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Mudança realizada em 25/06/2018.
	Contrato de link WAN assinado	31/07/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Contrato nº 007/2018 assinado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.005666/2018-62.</li> </ul>
	Instruções Normativas substitutas da IN nº 53/16 publicadas	31/10/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Publicadas a IN 89 de 01/11/2018 e a IN 90 de 01/11/2018 no Boletim de Pessoal de 06/11/2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo SEI nº 52402.000081/2017-75.</li> </ul>

16. Reestruturar as unidades regionais do INPI (PD 2018) (Continuação)	Contrato de mudança de bens assinado (exceção SC, SE, PE e MG)	31/10/2018	<p><b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Realizadas duas tentativas de pregão infrutíferas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.093209/2017.</b></li> </ul> <p>Para a decisão sobre a nova contratação e novos prazos possíveis, DIRAD/CENGE irá presencialmente a algumas unidades para avaliar as condições de infraestrutura. Vistorias ocorrerão a partir de 10/01/2019.</p>
	Lista dos servidores publicada, conforme Edital	15/10/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Homologação do resultado de remoção publicada no Boletim de Pessoal de 23/10/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.000081/2017-75.</b></li> </ul>
	Mudança da Unidade Regional do RS para o Tecnopuc realizada	31/12/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Mudança física realizada em 30/12/2018. Unidade Regional do RS aberta no novo endereço a partir de 02/01/2019. Contrato de locação de imóvel nº 16/2018 com a Tecnopuc assinado em 27/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.007102/2018-64.</b></li> </ul>
	Protocolo presencial encerrado	31/12/2018	<p><b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Aguardando avaliação do Presidente e Diretor Executivo, antes do encaminhamento à PFE. Apesar das manifestações técnicas já realizadas, o processo ainda carece de saneamento e maiores esclarecimentos que condicionam o processo decisório.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.122285/2017-86.</b></li> </ul>
	Contrato assinado	23/10/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Contrato nº 13/2018 assinado em 04/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.005381/2018-21.</b></li> </ul>
17. Implantar sistema eletrônico de controle de frequência	Sistema selecionado	30/10/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Realizada pesquisa e selecionado sistema Grifo em outubro de 2018.</p>
	Sistema instalado	30/11/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Sistema Grifo implantado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.009473/2018-81.</b></li> </ul>
	Ato normativo elaborado e publicado	31/12/2018	<p><b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Minuta do ato normativo encaminhada à PFE em 21/12/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52402.009473/2018-77.</b></li> </ul>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
18. Elaborar e aprovar a nova tabela de preços	Produto 1 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (benchmarking internacional)	13/08/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Prévia do Produto 1 entregue em 27/07/2018. Realizada videoconferência para apresentação e discussão do Estudo de Precificação do INPI (benchmarking internacional) em 30/07/2018. MDIC encaminhou ao INPI a versão final do estudo em 28/08/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.080336/2017.</b></li> </ul>
	Produto 2 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (relatório de entrevistas)	20/09/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Em 08/10/2018, foi realizada videoconferência com a participação do MDIC, ABDI e INPI para apresentação do Produto 2 pela consultora do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.080336/2017.</b></li> </ul>
	Produto 3 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (workshop)	10/10/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Em 16/10/2018, foi realizado o Workshop (Produto 3) com representantes dos usuários do sistema de propriedade industrial em São Paulo, com a participação do MDIC, ABDI e INPI (DIRAD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.080336/2017.</b></li> </ul>
	Produto 4 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (critérios e parâmetros para o reajuste da tabela)	06/11/2018	<p><b>CONCLUÍDO</b> Relatório do Produto 4 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (critérios e parâmetros para o reajuste da tabela).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.080336/2017.</b></li> </ul>
	Proposta de alteração da tabela encaminhada ao MDIC	28/12/2018	<p><b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> A Tabela de Retribuição do INPI encontra-se em processo de revisão. Em 04/01/2019 foi encaminhado às áreas técnicas, para manifestação até 04/02/2019, o resultado final do estudo realizado pela consultoria financiado pela UNESCO - Elaboração de proposta de critérios e parâmetros para o reajuste da tabela de retribuição dos serviços do INPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processo SEI nº 52400.080336/2017.</b></li> </ul>

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
19. Aperfeiçoar a gestão de processos, por meio da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) <b>(PD2018)</b>	Manual de gerenciamento de processos publicado	29/06/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Manual publicado. Portaria/INPI/PR Nº 109, de 27/06/2018.
	Processos administrativos em tramitação por meio eletrônico	28/10/2018	<b>CONCLUÍDO</b> A partir do dia 1º de outubro, todos os novos processos administrativos passaram a ser abertos exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme prazo de implantação previsto pelo Decreto nº 8.539, de 08/10/2015. Além disso, a partir do dia 15 de outubro, também todos os memorandos e ofícios do Instituto passaram a ser gerados somente no SEI.
20. Integrar os serviços do INPI à Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal <b>(PD2018)</b>	Adesão ao Plano de Integração assinada	31/05/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Adesão do INPI realizada em 14/06/2018.
	Cadastro de serviços revisado	29/06/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Revisão realizada em 11/06/2018. Carta de Serviços revisada e publicada no site do INPI.
	Métricas iniciais aferidas	31/07/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Métricas aferidas em 25/07/2018. Plano de Configuração enviado ao Ministério do Planejamento em 25/07/2018, por e-mail.
	Serviços projetados e automatizados	28/09/2018	<b>CONCLUÍDO</b> Plano de Configuração enviado ao Ministério do Planejamento em 25/07/2018, por e-mail.



**Quadro 6:** Status das Ações do Objetivo Estratégico 5 - Promover o desenvolvimento, o desempenho e o bem-estar dos profissionais do INPI

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (31/12/2018)
21. Reestruturar a carreira de Propriedade Industrial	Grupo de trabalho constituído	31/10/2018	<b>MUITO ATRASADO (&gt; 30 dias)</b> Em face da transição de governo, não foi possível obter agenda para discussão do assunto com o MP. <b><u>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</u></b>
	Propostas aprovadas no grupo de trabalho	28/11/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Depende da constituição do Grupo de Trabalho. <b><u>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</u></b>
	Proposta de alteração legal encaminhada para o MP	31/12/2018	<b>ATRASADO (≤ 30 dias)</b> Depende da constituição do Grupo de Trabalho. <b><u>Dependência externa: fora da governabilidade do INPI.</u></b>
