

PLANO DE AÇÃO INPI 2018:
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ATÉ **30/11/2018**

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	3
2 METAS	4
3 AÇÕES.....	10

1 APRESENTAÇÃO

O presente Relatório divulga os resultados da execução das 10 metas e 21 ações do Plano de Ação do INPI – 1ª Revisão, até o último dia útil do mês de novembro de 2018. Também apresenta as projeções de resultados até o final do ano, em relação às metas previstas, e a classificação do status de execução das ações.

A revisão do Plano de Ação 2018 foi publicada em 30 de novembro¹, após aprovação formal do MDIC. O objetivo da revisão do planejamento anual foi direcionar os recursos das unidades do Instituto nas prioridades da gestão para o encerramento do exercício.

Isto não representou prejuízo à execução das demais ações previstas na primeira versão do Plano, as quais permaneceram em execução pelos setores responsáveis. Porém, a alta direção do Instituto poderá, a partir deste enfoque trazido pela revisão, concentrar o monitoramento nas entregas prioritárias para o ano. Não houve alteração nas metas anuais de desempenho.

¹ Foram posteriormente acrescentadas, em relação àquela proposta submetida ao MDIC em 22/10, duas iniciativas, a saber: “Elaborar Manual de Desenho Industrial” e “Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas”.

2 METAS

A Tabela 1 apresenta os resultados alcançados na execução das metas do Plano de Ação do INPI para as atividades de exame de pedidos de propriedade industrial.

Cabe destacar que **todas as metas institucionais já foram superadas**. Além disso, os **resultados projetados para 2018 são melhores que os resultados alcançados em 2017**, com exceção do indicador de Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas, em virtude do trabalho realizado pela força-tarefa de exame de recursos de marcas em 2017.



Tabela 1: Metas de eficiência operacional em atividades de exame



Indicadores	Meta 2018	Resultado (em 30/11/2018)
Primeiro exame técnico de pedidos de patentes ⁽¹⁾	15.018	15.321
Decisão de exame técnico de pedidos de patentes ⁽¹⁾	13.948	16.164
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca	269.414	340.178
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	9.236	9.521
Taxa de desempenho de decisões emitidas de contratos e faturas averbadas ou registradas	97%	109%
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de patentes	1.888	2.212
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas	23.978	31.391
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de desenho industrial e outros registros	1.730	2.010
Tempo de decisão de exame técnico de pedido de registro de marca	18 meses ⁽²⁾	13 meses ⁽²⁾
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	12 meses	3,7 meses ⁽³⁾



⁽¹⁾ Não considera o impacto operacional da eventual aprovação de medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em 2018.



⁽²⁾ Este tempo é referente à moda do tempo de todos os processos analisados, com e sem oposição. A moda do tempo de análise para processos com oposição é de 14 meses, para processos sem oposição é de 13 meses.

⁽³⁾ Caso considerados apenas os pedidos depositados em 2018, o tempo médio de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial é de 2,8 meses. A existência residual de processos antigos no *backlog* pode causar uma elevação da variância nos dados relacionados a este indicador, como pode ser observado no gráfico dos resultados mensais (vide pág. 11).

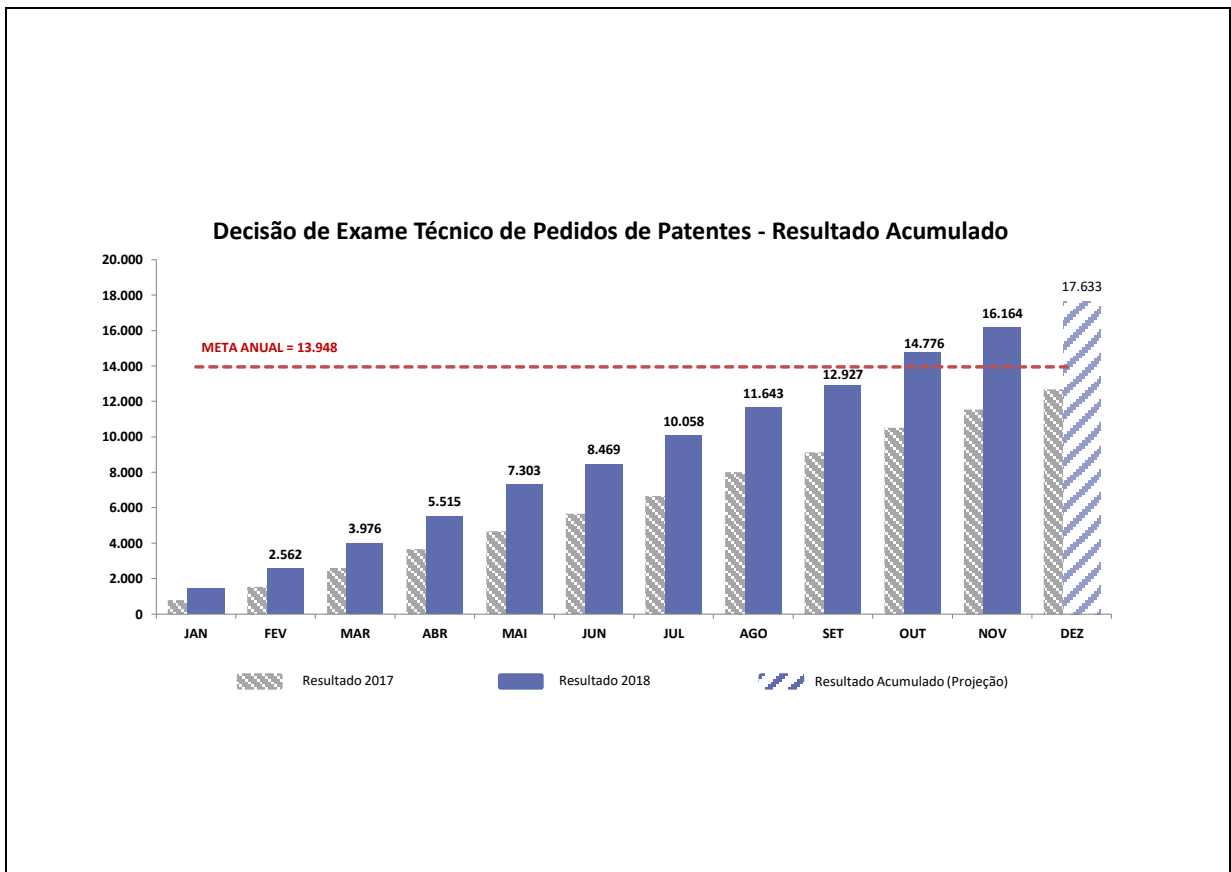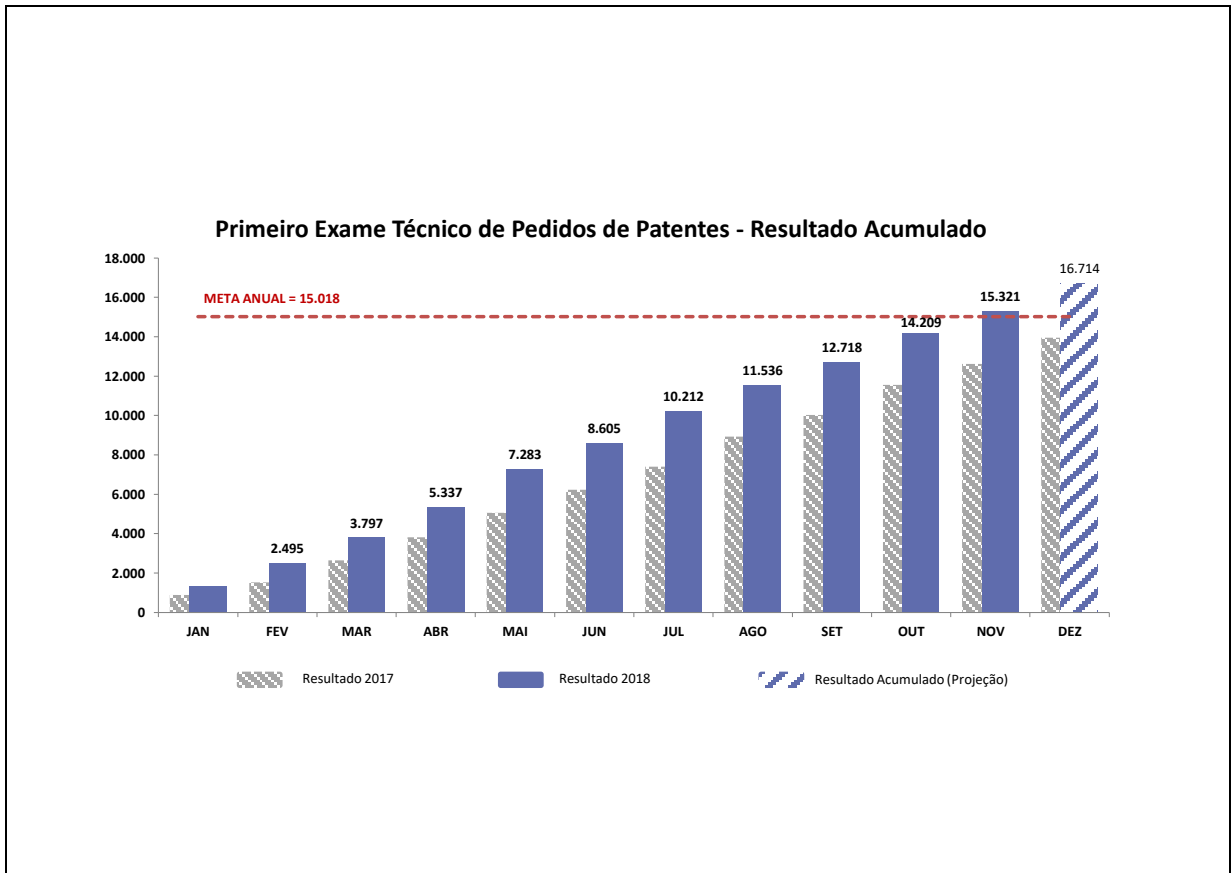


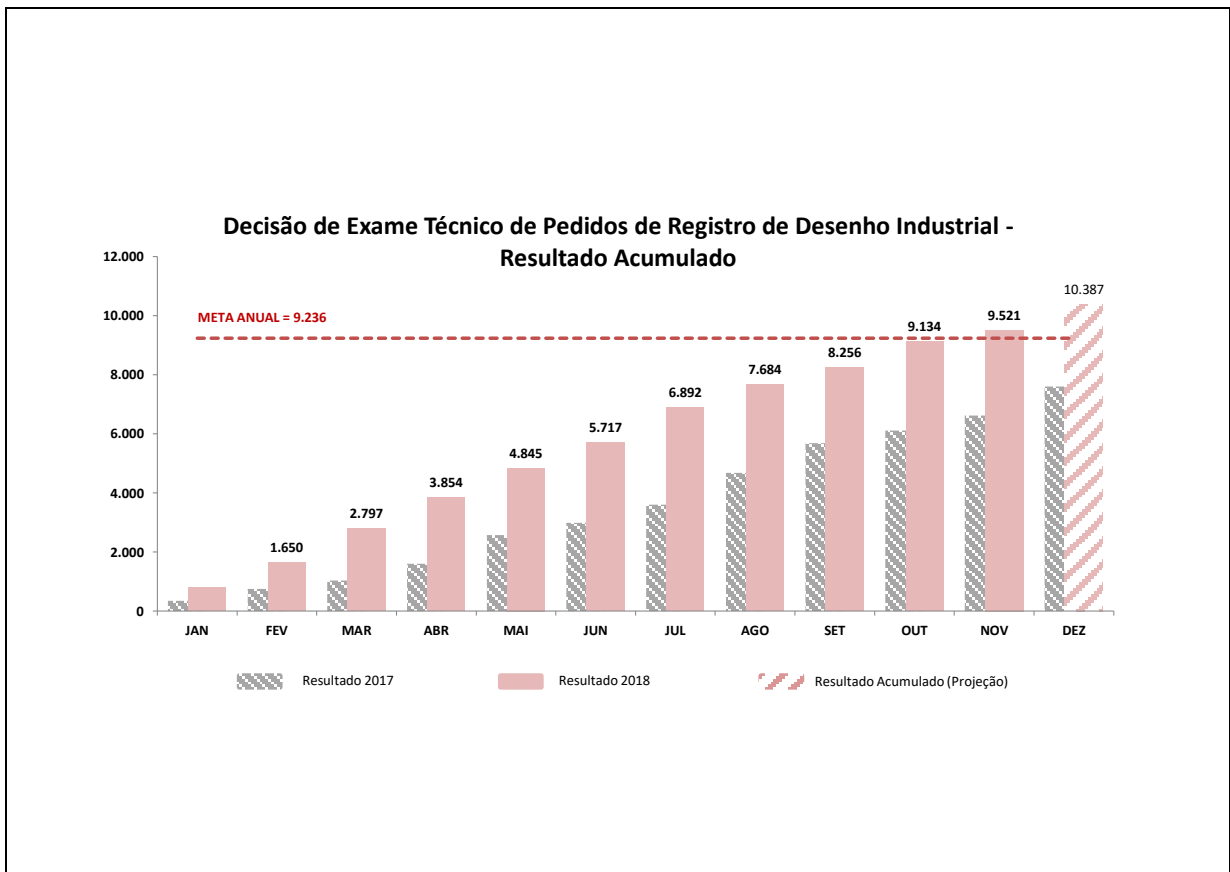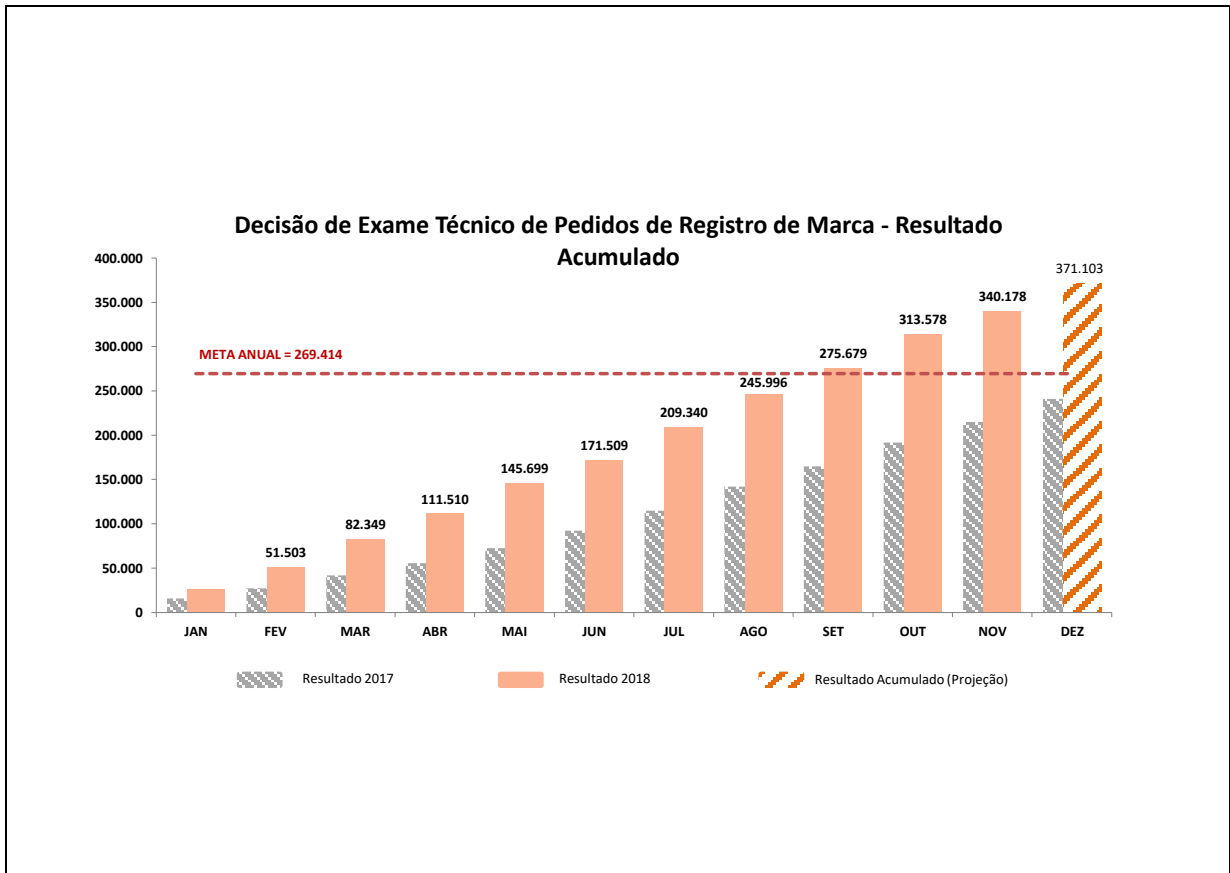

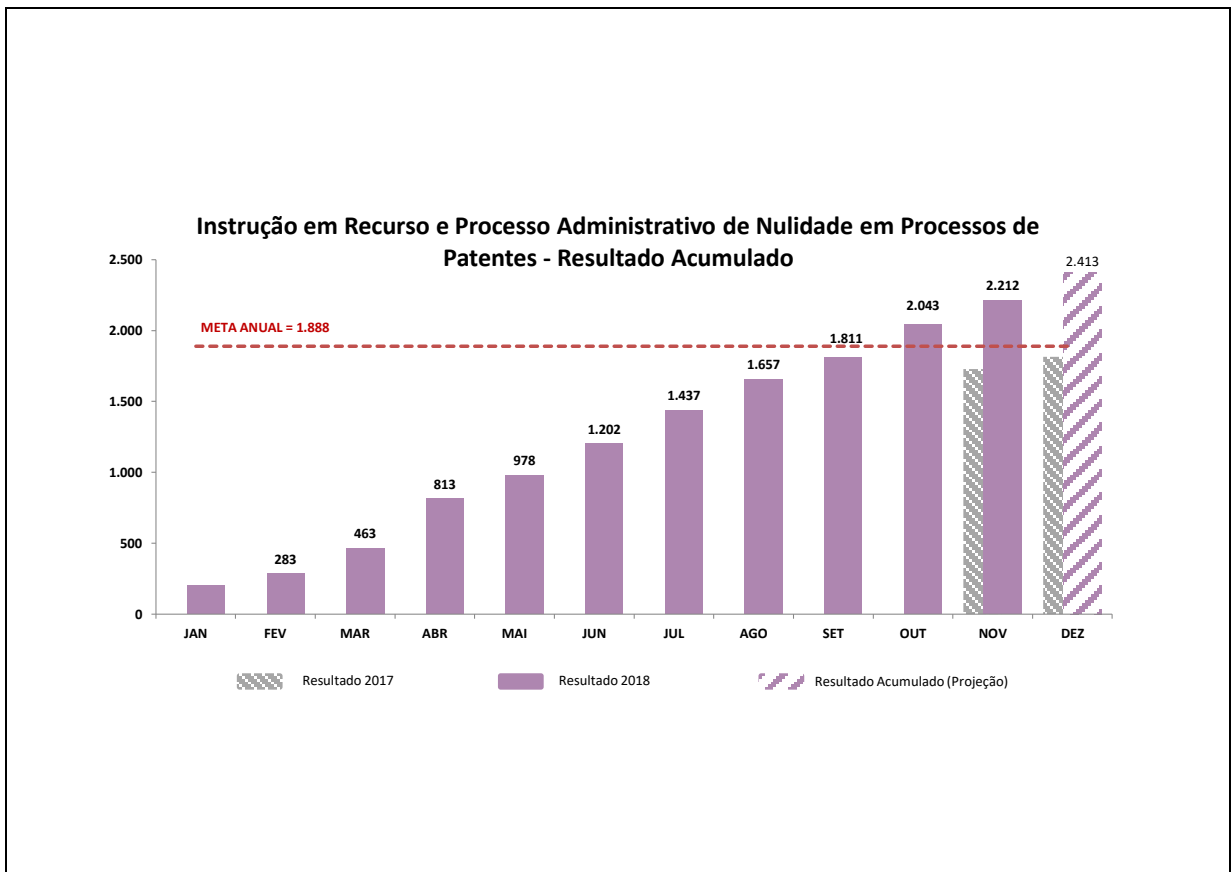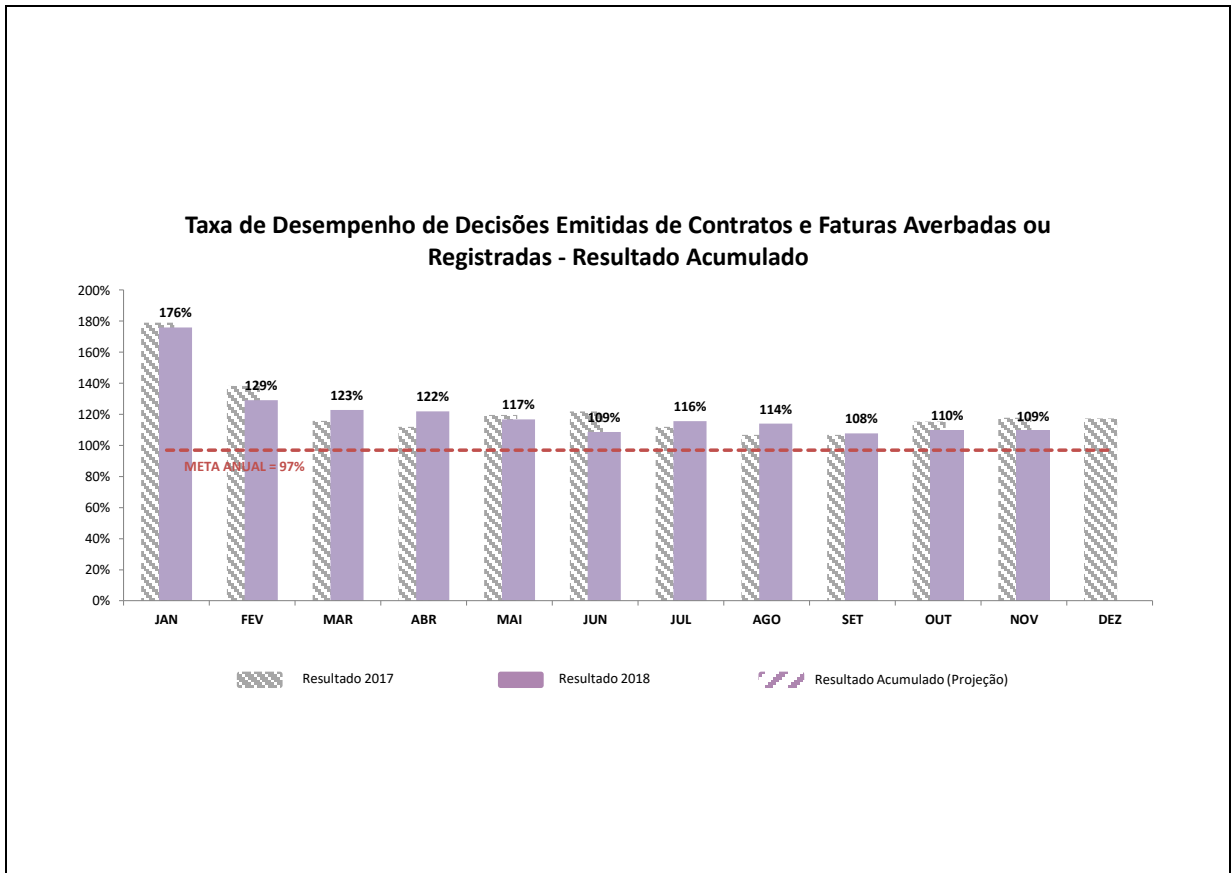


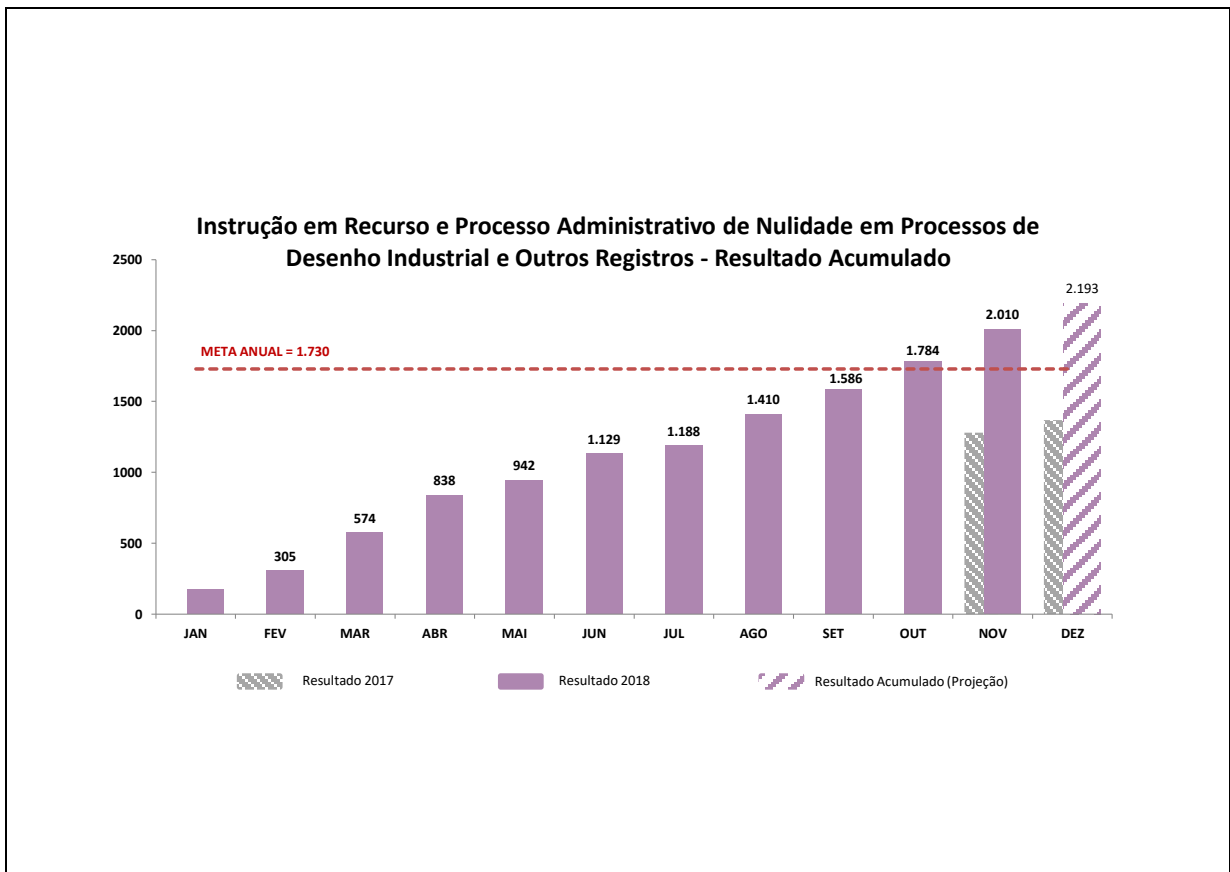

Tempo de Espera para Primeiro Exame Técnico de Pedidos Antigos de Registro de Marca (em meses)

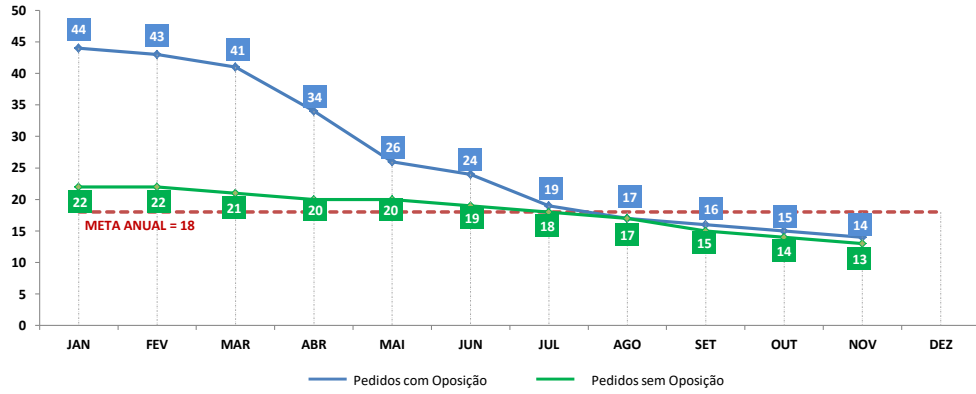

Tempo de Espera para Primeiro Exame Técnico de Pedidos de Registro de Desenho Industrial (em meses)

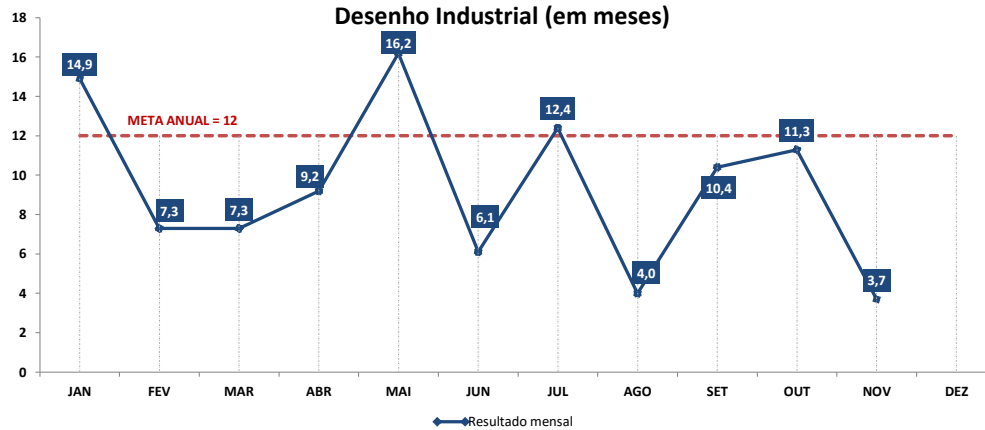


3 AÇÕES

Do total de 21 ações do Plano de Ação, temos: 2 (10%) foram concluídas; 8 (38%) estão no prazo previsto, 1 (4%) está atrasada (em até 30 dias) e 10 (48%) estão muito atrasadas (> 30 dias), tendo como referência o final do mês de novembro de 2018.

Das 78 entregas vigentes² das ações, temos: 34 (44%) concluídas, 25 (32%) no prazo programado, 7 (9%) estão atrasadas (≤ 30 dias) e 12 (15%) estão muito atrasadas (> 30 dias), tendo como referência dez de dezembro de 2018.

Vale destacar a dependência externa (fora da governabilidade do INPI) da execução de 7 das 21 ações e de 11 das 20 entregas atrasadas ou muito atrasadas, cuja execução exige encaminhamentos por parte de outros órgãos e entidades públicas, ou de organismos internacionais com os quais o INPI se relaciona³.

Figura 1: Status das entregas das ações – Junho a novembro/2018
(78 entregas vigentes⁴ de 21 ações)

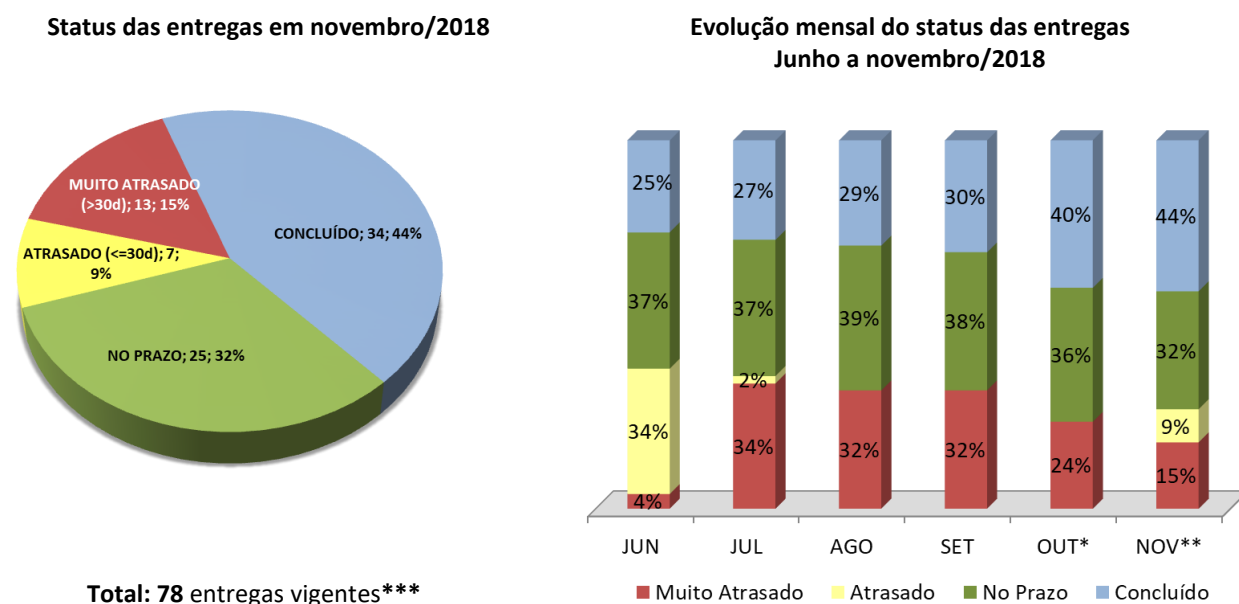

*1 produto foi excluído em outubro; **Revisão do Plano de Ação 2018; ***2 entregas suspensas.

² Total de 80 entregas planejadas originalmente.

³ Ex.: MDIC, Congresso Nacional, Casa Civil, OMPI etc. Vide notas informativas nos quadros de detalhamento de status das iniciativas.

⁴ Duas entregas foram suspensas: uma da Ação 11; outra da Ação 14.

Quadro 2: Status das Ações do Objetivo Estratégico 1 - Otimizar a qualidade e o tempo para a concessão de direitos de propriedade industrial

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
1. Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes e rever marco regulatório administrativo, para redução do backlog de pedidos pendentes de decisão em primeira instância (PD 2018 e ACT MDIC/ABDI/INPI)	Medida legislativa aprovada pela Casa Civil	16/04/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Em análise na Casa Civil a proposta de Medida Provisória de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Medida legislativa aprovada pelo Congresso Nacional	31/05/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Não iniciada. Depende de aprovação da Medida Provisória pela Casa Civil. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Contratações de infraestrutura e digitalização/saneamento realizadas	30/06/2018	CONCLUÍDO Em 15/10/2018, a ABDI comunicou a assinatura do contrato com a empresa SOS Docs, que realizará os serviços de digitalização e saneamento dos documentos, selecionada por meio do Edital ABDI nº 0024/2018 (publicado em 07/08/2018 e pregão realizado em 20/08/2018). Quanto às contratações de infraestrutura, o cronograma do Plano de Implementação da Infraestrutura Básica de TI no INPI prevê que as entregas referentes às aquisições sejam realizadas gradativamente, e grande parte das entregas previstas para 2018 já foi realizada.
	Procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em implementação	31/03/2019	NO PRAZO Não iniciado.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
2. Implantar programa-piloto de colaboração técnica com instituições científicas e tecnológicas para expansão da capacidade de exame de pedidos de patentes pelo INPI (PD 2018)	Protocolo de Intenções assinado com o CNPq	17/09/2018	CONCLUÍDO Protocolo de Intenções assinado em 05/9/2018.
	Programa de capacitação aprovado pelo INPI e CNPq	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O INPI apresentou ao CNPq em 25/10/2018 o Piloto do Plano de Capacitação para formação de pesquisadores externos em atividades e opiniões para o exame técnico pelo INPI. Na mesma oportunidade, iniciou-se a confecção do Plano de Trabalho e do Termo de Execução Descentralizada (TED). Após reanálise do Piloto do Plano de Capacitação pelo CNPq, foram realizadas algumas considerações acerca do escopo do projeto. Dessa forma, foi agendada para início de dezembro/2018 reunião INPI-CNPq para redefinição conjunta do escopo e viabilidade da parceria. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Instrumento jurídico assinado	28/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. Depende da conclusão do Termo de Parceria, do Plano de Trabalho e do Termo de Execução Descentralizada (TED).

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
3. Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI (PD 2018)	Plano Executivo do projeto-piloto aprovado pelo Presidente do INPI	31/08/2018	CONCLUÍDO
	Minutas de atos normativos encaminhados à PFE (Resolução INPI)	15/09/2018	CONCLUÍDO Minuta da Resolução sobre aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais enviada à PFE (processo INPI nº 52400.212997/2018-77).
	Minutas de atos normativos encaminhados à PFE (Instrução Normativa INPI e Portaria MDIC)	15/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Minuta da Instrução Normativa sobre aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais e da Portaria MDIC em elaboração (processo SEI nº 52402.007018/2018-41).
	Parecer(es) jurídico(s) elaborados pela PFE	15/10/2018	CONCLUÍDO Minuta da Resolução sobre aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais aprovada pela PFE.
	Parecer(es) jurídico(s) elaborados pela PFE	15/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) Não iniciado. Aguardando elaboração da minuta.
	Atos normativos do INPI publicados	15/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) Resolução INPI/PR Nº 227, publicada em 25/10/2018 e Instrução Normativa em elaboração.
	Ato normativo do MDIC publicado	15/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. Dependendo da conclusão da minuta de Instrução Normativa do INPI. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Projeto-piloto iniciado	28/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. A minuta do programa-piloto de treinamento já se encontra em revisão pela ACAD/CGDI-DIRPA.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
4. Expandir os acordos de <i>Patent Prosecution Highway</i> (PPH)	Visita realizada	18/09/2018	CONCLUÍDO A visita ao KIPO integrando delegação ministerial foi realizada no período de 13 a 18/09/2018.
	Reunião realizada	26/09/2018	CONCLUÍDO Reunião bilateral com o KIPO durante a Assembleia Geral da OMPI ocorrida no dia 25/09/2018.
	MdE assinado com KIPO	31/12/2018	NO PRAZO O KIPO informou que o MdE de Cooperação Geral será assinado somente junto com o MdE de projeto-piloto de PPH. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
5. Implantar o sistema de gestão da qualidade dos processos de exame de propriedade industrial em conformidade com a ISO 9001:2015 (PD 2018)	Política da Qualidade do INPI publicada	31/12/2018	NO PRAZO Política da Qualidade foi aprovada e será publicada até o final de dezembro.
	Processo de recebimento mapeado e documentado	31/07/2018	CONCLUÍDO
	Processos de busca e exame de pedido internacional de patente mapeados e documentados	31/12/2018	NO PRAZO O fluxo de trabalho do ISA foi finalizado no software Bizagi. O fluxo de trabalho do IPEA ainda não foi iniciado.
6. Elaborar Manual de Desenho Industrial	Minuta de Manual revisada	07/12/2018	CONCLUÍDO
	Manual publicado	28/12/2018	NO PRAZO Pronto para publicação.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
7. Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas	Consulta pública encerrada	06/12/2018	CONCLUÍDO Consulta Pública nº 04, de 05/11/2018.
	Minuta de Instrução Normativa revisada	10/12/2018	CONCLUÍDO Instrução Normativa elaborada e enviada à PFE Quando?
	Minuta revisada de Instrução Normativa analisada pela PFE	14/12/2018	NO PRAZO Em andamento.
	Instrução Normativa publicada	21/12/2018	NO PRAZO Não iniciado.

Quadro 3: Status das Ações do Objetivo Estratégico 2 - Expandir e aperfeiçoar a disponibilização de dados e informações sobre propriedade industrial

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
8. Elaborar estudos de propriedade industrial para geração de inteligência competitiva (ACT MDIC/ABDI/INPI)	Plano de estudos aprovado pelo Comitê Gestor do ACT MDIC/ABDI/INPI	31/08/2018	CONCLUÍDO Plano aprovado na 5ª Reunião do Comitê Gestor do ACT ABDI, em 27/11/18, conforme registrado no RELATO 5ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR.
	Relatórios e estudos elaborados pelo INPI	31/12/2018	NO PRAZO Estudo sobre carros híbridos e elétricos concluído e ainda não publicado. Estudo sobre mobilidade em cidades inteligentes não concluído.

Quadro 4: Status das Ações do Objetivo Estratégico 3 - Contribuir para a participação do Brasil no sistema internacional de propriedade industrial

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
9. Promover medidas operacionais e administrativas previstas no Projeto de Adesão ao Protocolo de Madri para simplificar o registro internacional de marcas (PD 2018)	Adesão autorizada pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo)	29/06/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Audiência Pública realizada em 07/08/2018. Questionamentos ABPI respondidos, inclusive em palestra do Diretor da DIRMA na ABPI em agosto. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Proposta de nova estrutura regimental do INPI apresentada ao MDIC	28/06/2018	CONCLUÍDO Em 13/07/2018, foi encaminhado ao MDIC o Ofício nº 345/2018 formalizando a solicitação de alteração da estrutura regimental do INPI. Em 09/08/2018, após finalizar a revisão da minuta de decreto de estrutura regimental, a partir das considerações feitas pela SE/MDIC e pela PFE/INPI, o INPI encaminhou ao MDIC o Ofício nº 395/2018 com a documentação complementar. A proposta ainda se encontra em análise na SIGE/SE/MDIC.
	Solicitação de concurso apresentada ao MDIC	30/04/2018	CONCLUÍDO Aguardando autorização para contratação de novos Tecnologistas em Propriedade Industrial. Solicitação de concurso enviada ao MDIC, por meio do Ofício nº 186/2018, de 27/04/2018.
	Sistema Multiclasse implementado	07/11/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Alterações em todos os sistemas do INPI (exceto IPAS), faltando pequenas melhorias no Busca Web e no XML para público externo. As modificações requeridas à OMPI no IPAS ainda não foram apresentadas e estão agendadas para serem apresentadas em 04/12/2018 pelo ponto focal da OMPI em missão no INPI. Fluxo do indeferimento parcial recusado no CPAPD e assunto pendente de próxima reunião onde serão discutidas opções para definição. Trata-se da última definição de fluxo pendente para Multiclasse e Cotitularidade. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Proposta de nova Tabela de Retribuições do INPI apresentada ao MDIC	31/12/2018	NO PRAZO Novos serviços e alterações em serviços já existentes para a Adesão ao Protocolo de Madrid (incluindo início do Multiclasse e da Cotitularidade) encaminhados pela DIRMA para a CGOF em 29/11/2018.
	Decreto Executivo	30/03/2019	NO PRAZO Não iniciado. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.

Quadro 5: Status das Ações do Objetivo Estratégico 4 - Alcançar a excelência organizacional do INPI

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
10. Esvaziar e devolver o edifício A Noite	Manutenção realizada	28/12/2018	NO PRAZO A ordem de execução da retirada das treliças foi emitida no dia 06/12/2018. A empresa está se preparando para o início da execução, com data estimada de início até 14/12/2018.
	Bens e documentos retirados do prédio com destinação adequada	02/01/2019	NO PRAZO Os bens móveis do edifício foram inventariados e classificados. O processo de doação dos bens ociosos continua. Os bens requeridos pelos órgãos do Exército e pelos diferentes campi da UFRJ encontram-se separados e aguardam os trâmites processuais internos para a conclusão da doação.
	Contrato de cessão revogado	28/12/2018	CONCLUÍDO Contrato de cessão assinado em 07/12/2018 pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e pelo presidente do TRF-2.
11. Preparar a destinação do prédio do INPI na Praça da Bandeira	Avaliação realizada por empresa contratada	28/12/2018	NO PRAZO O Termo de Referência para a contratação de empresa de avaliação de bens imóveis está em elaboração.
	Imóvel em posse do INPI	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) O INPI aguarda o posicionamento da SPU para dar continuidade ao processo de alienação dos imóveis. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Imóvel transferido para a SPU	31/10/2018	SUSPENSO A propriedade do imóvel não será mais transferida para a SPU. Após a avaliação do imóvel, o INPI alienará o bem.
12. Preparar a alienação dos imóveis funcionais do INPI em Brasília	Avaliação realizada por empresa contratada	28/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. O INPI está aguardando o posicionamento da SPU. A avaliação do imóvel, conforme tratativas anteriores, será realizada pela SPU.
	Imóvel transferido para a SPU	31/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
13. Realizar a cessão parcial do prédio da unidade regional do INPI em Brasília para o MDIC	Laudo de vistoria elaborado	17/08/2018	CONCLUÍDO
	Termo de cessão encaminhado à PFE	31/08/2018	CONCLUÍDO
	Termo de cessão assinado	31/10/2018	CONCLUÍDO O termo de cessão parcial do imóvel foi assinado em novembro.
14. Ampliar e melhorar as condições de ocupação do edifício Mayrink Veiga, 9	Bicicletário construído pelo condomínio (10 Vagas)	30/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) O INPI está aguardando a conclusão do projeto de revisão da fachada do Ed. MV9, realizado pelo condomínio. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Sala de vistas da DIRMA em funcionamento	31/08/2018	CONCLUÍDO
	13º e 14º locados	30/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) A assinatura do Termo Aditivo para a locação dos 13º e 14º andares será realizada até o dia 14/12/2018.
	5º andar reestruturado	28/12/2018	NO PRAZO O INPI está realizando negociações com o condomínio para reestruturar o 5º andar. Aguardando a assinatura do Termo Aditivo para a locação dos 13º e 14º andares.
	Obra iniciada pelo Condomínio	28/12/2019	SUSPensa Houve um reposicionamento do condomínio no sentido de não realizar a construção do vestiário. As negociações para a viabilização do mesmo serão reiniciadas com o novo proprietário, no início de 2019. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
15. Alterar a estrutura organizacional do INPI (PD 2018)	Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MDIC	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Proposta encaminhado ao MDIC em 13/07/2018 (Ofício nº 345/2018). DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MP	30/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) Não iniciado. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Decreto publicado	28/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
16. Reestruturar as unidades regionais do INPI (PD 2018)	Indicadores elaborados e implementados	30/06/2018	CONCLUÍDO 1º Relatório Gerencial Semestral entregue no II Workshop das Regionais realizado na sede do INPI em 30-31/08/2018.
	Mudança da Unidade Regional de MG para o SENAI/DRMG realizada	30/06/2018	CONCLUÍDO Mudança realizada.
	Contrato de link WAN assinado	31/07/2018	CONCLUÍDO Contrato assinado.
	Instruções Normativas substitutas da IN nº 53/16 publicadas	31/10/2018	CONCLUÍDO Publicadas a IN 89 de 01/11/2018 e a IN 90 de 01/11/2018 no Boletim de Pessoal.
	Contrato de mudança de bens assinado (exceção SC, SE, PE e MG)	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Ainda não há previsão.
	Lista dos servidores publicada, conforme Edital	15/10/2018	CONCLUÍDO Homologação do resultado de remoção publicada no Boletim de Pessoal de 23/10/2018. PROAMB será realizado no período de 17-21 de dezembro de 2018. Remoção será realizada no período janeiro-março de 2019, em razão da necessidade prévia de ratificação da infraestrutura. Mudança física de computadores e mobiliário será iniciada em novembro de 2018 (empresa já contratada).

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
16. Reestruturar as unidades regionais do INPI (PD 2018) - (Continuação)	Mudança da Unidade Regional do RS para o Tecnopuc realizada	31/12/2018	NO PRAZO Contrato Tecnopuc: para assinatura desde 27/11/2018. Contrato mudança: previsão da DIRAD de assinatura até 07/12/2018.
	Protocolo presencial encerrado	31/12/2018	NO PRAZO Processo 52400.122285/2017-86 na Presidência, aguardando anuência da instrução e remessa à PFE para análise jurídica da minuta de Resolução.
	Contrato assinado	23/10/2018	CONCLUÍDO Contrato da mudança assinado. Contrato nº 13/2018 (empresa REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELLI). Processo SEI nº 52402.005381/2018-21.
17. Implantar sistema eletrônico de controle de frequência	Sistema selecionado	30/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) A CGRH/DIREF começou testes internos na ferramenta.
	Sistema instalado	30/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) Sistema de captação de dados implantado desde 07/11/2018, passando a migrar dados para o Grifo e visando implantar as regras de negócio que obedecem à agenda da CGTI. Previsão de implantar o piloto em janeiro de 2018.
	Ato normativo elaborado e publicado	31/12/2018	NO PRAZO Ato normativo em elaboração pela CQUAL.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
18. Elaborar e aprovar a nova tabela de preços	Produto 1 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (benchmarking internacional)	13/08/2018	CONCLUÍDO Prévia do Produto 1 entregue em 27/07/2018. Realizada videoconferência para apresentação e discussão do Estudo de Precificação do INPI (benchmarking internacional) em 30/07/2018. MDIC encaminhou ao INPI a versão final após ajustes realizados pela consultora em 28/08/2018.
	Produto 2 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (relatório de entrevistas)	20/09/2018	CONCLUÍDO Em 08/10/2018, foi realizada videoconferência com a participação do MDIC, ABDI e INPI para apresentação do Produto 2 pela consultora.
	Produto 3 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (workshop)	10/10/2018	CONCLUÍDO Em 16/10/2018, foi realizado o Workshop (Produto 3) com representantes dos usuários do sistema de propriedade industrial em São Paulo, com a participação do MDIC, ABDI e INPI (DIRAD).
	Produto 4 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (critérios e parâmetros para o reajuste da tabela)	06/11/2018	CONCLUÍDO Produto em fase de análise pelo MDIC; documento ainda de circulação restrita até aprovação final.
	Proposta de alteração da tabela encaminhada ao MDIC	28/12/2018	NO PRAZO Não iniciado.
19. Aperfeiçoar a gestão de processos, por meio da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) (PD2018)	Manual de gerenciamento de processos publicado	29/06/2018	CONCLUÍDO Manual publicado. PORTARIA/INPI/PR Nº 109, de 27/06/2018.
	Processos administrativos em tramitação por meio eletrônico	28/10/2018	CONCLUÍDO A partir do dia 1º de outubro, todos os novos processos administrativos passaram a ser abertos exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme prazo de implantação previsto pelo Decreto nº 8.539, de 08/10/2015. Além disso, a partir do dia 15 de outubro, também todos os memorandos e ofícios do Instituto serão gerados somente no SEI.

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
20. Integrar os serviços do INPI à Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal (PD2018)	Adesão ao Plano de Integração assinada	31/05/2018	CONCLUÍDO Adesão do INPI realizada em 14/06/2018
	Cadastro de serviços revisado	29/06/2018	CONCLUÍDO Revisão realizada em 11/06/2018
	Métricas iniciais aferidas	31/07/2018	CONCLUÍDO Métricas aferidas em 25/07/2018
	Serviços projetados e automatizados	28/09/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Encontra-se em fase inicial de cumprimento ante o credenciamento das configurações de arquitetura dos serviços que serão impactados pela integração ao Acesso Digital Único, conforme apresentado no Plano de Configuração ao Brasil Cidadão.

Quadro 6: Status das Ações do Objetivo Estratégico 5 - Promover o desenvolvimento, o desempenho e o bem-estar dos profissionais do INPI

AÇÕES	ENTREGAS	PRAZO	STATUS (10/12/2018)
21. Reestruturar a carreira de Propriedade Industrial	Grupo de trabalho constituído	31/10/2018	MUITO ATRASADO (> 30 dias) Em face da transição de governo, não foi possível obter agenda no MP. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Propostas aprovadas no grupo de trabalho	28/11/2018	ATRASADO (≤ 30 dias) Não iniciado. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
	Proposta de alteração legal encaminhada para o MP	31/12/2018	NO PRAZO Não iniciado. DEPENDÊNCIA EXTERNA: fora da governabilidade do INPI.
