

<b>ATA DE REUNIÃO DO CGEE</b>	<b>Brasília – DF</b>
<b>Assunto: 19ª Reunião do Comitê Gestor de Eficiência Energética - CGEE</b>	<b>Data: 01/07/2021</b> <b>Videoconferência</b>

### PARTICIPANTES

NOME	INSTITUIÇÃO	E-MAIL	
<b>Paulo César Domingues</b>	<b>MME</b>	<b>paulo.domingues@mme.gov.br</b>	<b>AUSENTE</b>
Alexandra Albuquerque Maciel	MME	alexandra.maciel@mme.gov.br	PRESENTE
Carlos Alexandre P. Pires	MME	carlos.pires@mme.gov.br	PRESENTE
<b>Samira de Sousa Carmo</b>	<b>MME</b>	<b>samira.sousa@mme.gov.br</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Paulo César Alvim</b>	<b>MCTI</b>	<b>paulo.alvim@mctic.gov.br</b>	<b>AUSENTE</b>
Jairo José Coura	MCTI	jairo.coura@mctic.gov.br	PRESENTE
<b>Paulo Luciano de Carvalho</b>	<b>ANEEL</b>	<b>paulol@aneel.gov.br</b>	<b>PRESENTE</b>
Renata Leite Falcão	Eletrobrás	renata_falcao@eletrobras.com	PRESENTE
Estefânia Melo	Eletrobrás	estefania.melo@eletrobras.com	PRESENTE
<b>Marcel Siqueira</b>	<b>Eletrobrás</b>	<b>marcel@eletrobras.com</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Victor Hugo Iocca</b>	<b>ABRACE</b>	<b>victor@abrace.org.br</b>	<b>AUSENTE</b>
<b>José Gabino M. dos Santos</b>	<b>ABRADEE</b>	<b>gabino@abradee.org.br</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Juliana Borges de Lima Falcão</b>	<b>CNI</b>	<b>juliana.falcao@cni.com.br</b>	<b>AUSENTE</b>
Pedro Henrique de Aguiar Pontes	CNI	pedro.pontes@cni.com.br	PRESENTE

### AGENDA GERAL – 01/07/2021 (14h00 – 17h00)

1. ABERTURA
2. ANDAMENTO DOS PROJETOS
3. DELIBERAÇÕES SOBRE PROJETOS ESPECÍFICOS
4. DELIBERAÇÃO SOBRE REMANEJAMENTO DE RECURSOS
5. ENCERRAMENTO

A reunião foi realizada por meio da ferramenta de reuniões virtuais MS Teams, tendo em vista as restrições para realização de reuniões presenciais relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente na Covid-19.

#### 1. ABERTURA

O Sr. Carlos Alexandre Príncipe Pires, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético (DDE) da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do Ministério de Minas e Energia (MME), deu as boas-vindas a todos e iniciou a reunião. Justificou a ausência do Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Sr. Paulo César Domingues, que teve que atender a outros compromissos assumidos.

#### 2. ANDAMENTO DOS PROJETOS

O Sr. Carlos Alexandre passou a palavra ao Sr. Marcel Siqueira, gerente do Procel, para que fizesse a apresentação sobre o andamento dos projetos. Conforme orientação das reuniões

anteriores, o material com o status dos projetos em execução no Procel foi encaminhado com antecedência à reunião, para análise prévia dos membros, e o Sr. Marcel então focou seu relato apenas naqueles projetos que apresentavam andamento crítico. A apresentação está em anexo.

Foram feitos os seguintes destaques:

- Procel Indústria: os projetos “Estudos sobre sistemas motrizes no Brasil”, “Impacto das técnicas de reparo de motores elétricos sobre seus rendimentos” e “Programa de Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido nas Médias e Grandes Indústrias e de instalações industriais de Micro e Pequenas Empresas”, todos do 2º PAR, estão sendo adequados e passarão por nova licitação em breve. O Programa Aliança 2.0 (2º PAR) está em processo de assinatura do convênio, sendo que está sendo aguardada apenas a finalização da prestação de contas do primeiro convênio para se dar início ao segundo. O Projeto “Eficiência Energética Digital” (2º PAR) está em situação crítica, devido a dificuldades enfrentadas pelo Senai/RS em finalizar a revisão do plano de trabalho. O projeto “Elaboração de Plano de Comunicação do Material de Reparo de Motores” (3º PAR) está em status de atenção pelo fato de o empenho dos recursos ainda não ter sido realizado. O termo de referência está em fase de consolidação para permitir o empenho dos recursos ainda na próxima semana.
- Procel Edifica: O “Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade para Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (PEES)” (3º PAR) está em situação de atenção, tendo em vista que, conforme deliberação do CGEE na 17ª Reunião, a forma de contratação foi alterada, de convênio para contrato, e, portanto, o termo de referência teve que ser remodelado. Ademais, a proposta teve que ser completamente remodelada, uma vez que a metodologia inicialmente proposta pela CNC não poderia ser utilizada em razão dos direitos autorais envolvidos.
- Procel Reluz: A 2ª Chamada Pública do Procel Reluz (2º PAR) está em plena execução, sendo que 25 municípios estão com obras iniciadas. A 3ª Chamada Pública (3º PAR) foi lançada em 19 de maio de 2021, e ficará com inscrições abertas até 30 de julho de 2021.
- Procel Sanear: Todos os projetos com andamento de acordo com o cronograma.
- Procel Educação: Todos os projetos com andamento de acordo com o cronograma. Destaque foi dado ao projeto “Desenvolvimento de Nova Metodologia Procel nas Escolas” (2º PAR), cujo edital foi de difícil estruturação, mas que estava pronto para ser publicado na primeira semana de julho.
- Procel Marketing: A 3ª campanha de marketing do Procel já em fase de execução do plano de mídia, e a pesquisa de recall já foi iniciada. A 4ª campanha estava em fase de produção, com veiculação prevista para julho de 2021. Também já foi iniciado processo de contratação para futura campanha, para 2022, tendo o novo perfil do contrato já sido autorizado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM/PR). O contrato está sendo analisado pela área de contratação da Eletrobras.
- Selo Procel: O projeto “Programa de Ensaios de Proficiência por Comparação Interlaboratorial” (2º PAR) está em status crítico pelo fato de ter havido a necessidade de uma análise detalhada da aplicação da Lei Complementar nº 123, de 2006. O processo de revisão legal já foi encerrado e o processo de contratação está prosseguindo, com previsão de lançamento do edital de licitação em breve. O projeto “Capacitação laboratorial para ensaio de equipamentos de refrigeração e ar condicionado” (2º PAR) está com o cronograma

atrasado, e por isso, em status crítico. O atraso se deveu a dificuldade encontradas pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) em contratar as empresas para realização de alguns dos trabalhos previstos. O projeto “Metodologia para avaliação de impactos regulatórios da Lei 10.295/2001 (Lei de Eficiência Energética)” (3º PAR) está em status de atenção pelo fato de a elaboração do plano de trabalho com a Universidade Federal do ABC (UFABC) ter demorado mais que o previsto, bem como a identificação da fundação que será a interveniente no convênio.

- Procel Info: O edital para a licitação do projeto de “Reestruturação do Portal Procel Info” (2º PAR) está em revisão final pela área de contratações, e será submetido à área jurídica da Eletrobras em breve.
- Procel GEM: Todos os projetos com andamento de acordo com o cronograma. Recordou-se que, na 18ª Reunião do CGEE, os membros haviam deliberado pela descontinuidade do projeto “Inclusão de Parâmetros de Eficiência Energética em Códigos de Obras”, do 3º PAR, e este foi retirado da planilha de “projetos em andamento”, passando a incluir a planilha de “projetos encerrados”, conforme orientação dos membros na 18ª Reunião.
- Projetos Estruturantes:
  - O projeto “Desenvolvimento e implantação inicial de metodologias de avaliação de resultados de ações de Eficiência Energética implementadas no Brasil e Guia e exemplos práticos de M&V no âmbito dos subprogramas atendidos pelo PAR” (2º PAR) está em status de atenção. A documentação está em análise no Departamento Jurídico, para, na sequência, ser submetido à Diretoria Executiva da Eletrobras para aprovação.
  - O “Programa de Eficiência Energética no âmbito do Comando da Aeronáutica” (2º PAR) apresenta status crítico, pelo fato de a forma de contratação ter sido alterada, de convênio para um Acordo de Cooperação Técnica com a FAB e a contratação de uma empresa para a realização dos serviços nas instalações da Aeronáutica. O Acordo de Cooperação Técnica está em análise na área jurídica da FAB, e o contrato de prestação de serviços depende da definição do Acordo.
  - O projeto “Monitoramento e identificação dos “gaps” de evolução da eficiência energética de transformadores” (2º PAR) está em situação de atenção, devido a atraso na liberação da segunda parcela do convênio, tendo em vista que uma licitação realizada pelo Cepel no âmbito do convênio superou o valor estimado. O Cepel está verificando o procedimento a ser adotado para sanar o problema.
  - O projeto “Fundo Garantidor para Crédito a Eficiência Energética (“FGEnergia”)” (3º PAR) está com status crítico pelo fato de o empenho dos recursos ainda não ter sido realizado, a poucos dias do encerramento da vigência do 3º PAR. O atraso se deve à complexidade da modelagem que foi desenvolvida para a operacionalização do fundo. Apesar disso, a modelagem já foi aprovada internamente pela Diretoria do BNDES e a minuta do contrato está sendo desenvolvida pelos jurídicos da Eletrobras e do BNDES. A Diretoria Executiva da Eletrobras deu autorização prévia para empenho dos recursos em 28 de junho de 2021.
  - O projeto “Esplanada Eficiente” (3º PAR) passou ao status regular, tendo em vista a aprovação do edital da chamada pública pelo jurídico da Eletrobras, conforme as

alterações aprovadas pelo CGEE na 18ª Reunião. A matéria será submetida a aprovação da Diretoria Executiva da Eletrobras em 05 de julho de 2021.

- O projeto “Prêmio Procel” (3º PAR) está em status de atenção, pelo fato de o processo de cotação de preços não ter sido bem-sucedido – foi recebido apenas um orçamento, com valor bastante abaixo do estimado. Serão solicitados outros orçamentos para composição do preço base e então permitir o empenho do valor.
- A modelagem e os critérios do projeto “Mecanismos de Financiamento para Alavancar Projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída” (3º PAR) estão em fase de finalização. Todavia, foi identificada a necessidade de se prolongar o prazo de execução do projeto para 60 (sessenta) meses, a fim de permitir sua viabilização. Tal questão submetida à deliberação do CGEE na sequência da reunião.
- O projeto “Piloto para implantação de equipamentos para gestão da demanda” (3º PAR) teve recursos empenhados em valor um pouco abaixo do previsto no 3º PAR. Os documentos para contratação estão sendo finalizados.
- O projeto “Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétrica Investirem em Eficiência Energética” (3º PAR) está com o termo de referência finalizado e a pesquisa de preços finalizada. Todavia, todos os orçamentos apresentados foram em valor superior ao valor de referência, cabendo deliberação do CGEE para a continuidade do projeto.

Por fim, o Sr. Marcel esclareceu que os projetos concluídos ou descontinuados foram realocados na planilha de Projetos Encerrados”, conforme sugestão dos membros na reunião anterior.

### **3. DELIBERAÇÕES SOBRE PROJETOS ESPECÍFICOS E REMANEJAMENTO DE RECURSOS**

Passando então para as deliberações sobre projetos específicos, o Sr. Carlos Alexandre pediu ao Sr. Marcel para apresentar as deliberações. O Sr. Marcel informou que as deliberações envolveriam tanto os projetos que já havia mencionado, como o remanejamento de recursos.

#### **Deliberação 1: Autorizar a mudança no prazo de execução para o projeto do 3º PAR “Mecanismos de Financiamento para Alavancar Projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída” de 24 meses para 60 meses.**

O Sr. Marcel explicou que, em tratativas com os possíveis parceiros para esse projeto, foi identificado que o prazo de financiamento de 24 meses para projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída não era adequado. Havia a necessidade de se considerar um prazo de carência para início dos pagamentos pelo tomador do empréstimo; além disso, de forma geral, além do prazo de execução para esse tipo de projeto, estimado entre 12 e 24 meses, ainda havia a necessidade de se contemplar o prazo de pagamento do financiamento. Por fim, após o início da vigência do instrumento jurídico a ser celebrado com a Eletrobras, ainda haverá etapas para avaliação e seleção dos projetos e assinatura de contratos de financiamentos, que precedem a execução do projeto.

Feitos todos os esclarecimentos por parte dos membros, o Sr. Carlos Alexandre colocou a proposta em deliberação. **Os membros do CGEE deliberaram por autorizar a mudança**

no prazo de execução do projeto do 3º PAR “Mecanismos de Financiamento para Alavancar Projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída” de 24 meses para 60 meses.

**Deliberação 2: Autorizar a adequação orçamentária na rubrica "Serviço administrativo para análise de prestação de contas de convênios e cooperações técnicas" e para o projeto “Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétricas investirem em Eficiência Energética” previstos no 3º PAR.**

O Sr. Marcel relatou que os custos pesquisados para os serviços de análise de prestação e contas de convênios e cooperação técnicas foram superiores aos orçados no 3º PAR, superando-os pelo montante de R\$ 803.562,69 (oitocentos e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Da mesma forma, como explicado durante a apresentação do andamento dos projetos, o na pesquisa de preços realizada para definir o valor base para a licitação do projeto “Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétrica Investirem em Eficiência Energética”, todos os orçamentos apresentados foram em valor superior ao valor de referência, que foi superado em R\$ 612.181, 25 (seiscentos e doze mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Nestes dois casos, cabe deliberação do CGEE para a continuidade das contratações. Conforme explicado pelo Sr. Marcel, existe espaço orçamentário para a realização dos ajustes propostos.

Feitos todos os esclarecimentos por parte dos membros, o Sr. Carlos Alexandre colocou a proposta em deliberação. **Os membros do CGEE deliberaram por autorizar a adequação orçamentária na rubrica "Serviço administrativo para análise de prestação de contas de convênios e cooperações técnicas" e para o projeto “Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétricas investirem em Eficiência Energética” previstos no 3º PAR, conforme proposto.**

O Sr. José Gabino, representante da ABRADDEE no Comitê, solicitou que fosse compartilhado com os membros o termo de referência desenvolvido para realização da pesquisa de preços para o projeto “Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétricas investirem em Eficiência Energética”. Em especial a ABRADDEE tem interesse em conhecer a proposta que está sendo desenvolvida para este estudo, que tem estreita relação com o negócio das distribuidoras de energia elétrica. O Sr. Marcel informou que encaminhará o documento por e-mail a todos os membros.

**Deliberação 3: Autorizar o remanejamento de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) entre as rubricas "Custeio de pessoal referente aos projetos dos Planos anteriores" e “Secretaria Executiva” previstos no 3º PAR.**

O Sr. Marcel esclareceu que tal remanejamento se fez necessário devido ao fato de o custeio de pessoal referente aos projetos dos Planos anteriores ter superado o estimado para a rubrica. Tendo em vista que a rubrica de Secretaria Executiva não utilizou a totalidade dos recursos direcionados a ela, o remanejamento poderia ser feito, sem afeta os recursos disponíveis no orçamento.

Feitos todos os esclarecimentos por parte dos membros, o Sr. Carlos Alexandre colocou a proposta em deliberação. **Os membros do CGEE deliberaram por autorizar o remanejamento de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) entre as rubricas "Custeio de**

**pessoal referente aos projetos dos Planos anteriores" e "Secretaria Executiva" previstos no 3º PAR.**

A Sra. Samira Sousa, representante do MME no CGEE, informou que a possibilidade de se fazer a contribuição voluntária do Brasil ao Energy Efficiency Hub não se concretizou e que os recursos também estariam disponíveis para remanejamento. Todavia, os membros e decidiram não deliberar pelo remanejamentos de recursos restantes, devido o pequeno montante.

#### **4. ENCAMINHAMENTOS**

A Sra. Samira que esta foi a última reunião de acompanhamento do 3º PAR, que se encerrará em 09 de julho de 2021. O CGEE então será convocado posteriormente, em data a ser definida, para apreciar a Prestação de Contas do 3º PAR Procel, depois de ela ter sido apreciada pelo GCCE.

#### **5. ENCERRAMENTO**

Sem outras considerações, a Sra. Samira agradeceu aos presentes e encerrou a reunião.

## ANEXO

- 1) Apresentação Procel – andamento dos projetos.

# 19ª Reunião do Comitê Gestor de Eficiência Energética

Brasília, 1º de julho de 2021



Ministério de  
**Minas e Energia**





## Agenda:

- Acompanhamento do 1º, 2º e 3º PAR PROCEL
- Projetos encerrados
- Desempenho econômico-financeiro
- Deliberações



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Indústria	Suporte para desenvolvimento da ISO 50.000	ABRINSTAL	705.114,60	1º	Em execução conforme o cronograma: i) Plano de Negócios concluído; ii) Trabalhos de normalização em andamento (2 reuniões do CB-116 realizadas no último mês e plenária internacional agendada para os dias 25/6 e 2/7); iii) 3º workshop realizado no dia 7/4, 10º Fórum realizado no dia 9/06 e elaboração do site em andamento.
Indústria	Estudos sobre sistemas motrizes no Brasil	N/A	2.559.859,38	2º	Termo de Referência em revisão e cronograma físico remodelado considerando o “feedback” de proponentes, após o Pregão “resultar vazio”. Após completar revisão, será devolvido a área de contratação (para remodelagem do Edital). Prazo estimado: segunda semana de julho.
Indústria	Programa Aliança 2.0	CNI	10.000.000,00	2º	Em processo de assinatura do convênio.
Indústria	Desenvolvimento da Estratégia para a Criação do Centro de Excelência em EE Industrial no Brasil	UBEA (PUC/RS)	237.400,00	2º	Contrato assinado em 23/06/2021.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Indústria	Impacto das técnicas de reparo de motores elétricos sobre seus rendimentos	N/A	820.000,00 (Valor do 2ºPAR)	2º	Processo reenviado para a área de contratações da Eletrobras após ajustes no termo de referência e nova pesquisa de mercado.
Indústria	Programa de Eficiência Energética em sistemas de ar comprimido nas Médias e Grandes Indústrias e de instalações industriais de Micro e Pequenas Empresas	N/A	6.508.800,00	2º	Edital de licitação em elaboração na área de contratação.
Indústria	Eficiência Energética Digital	CNI / SENAIRS	2.500.000,00	2º	Plano de Trabalho em revisão no SENAI/RS. Aguardando retorno formal para elaboração da minuta de convênio.
Indústria	Desenvolvimento de metodologia e realização de diagnóstico energético em sistemas térmicos e motrizes associados	FUPAI	750.000,00	2º	Contrato assinado em 26/04/21. Projeto iniciado desde então, estando a contratada atuando na elaboração do Produto 1.
Indústria	Laboratório Didático de Referência em Reparo de Motores Elétricos	SENAI/SP	620.000,00	3º	Convênio aprovado pela Eletrobras. Análise de integridade em andamento. Após aprovação deste, o Convênio será enviado ao Senai-SP para assinatura.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Indústria	Aplicação de sistemas Termossolares de baixa e média temperatura em indústrias de bebidas de pequeno e médio porte	N/A	2.441.788,00	3º	Edital elaborado pela área de contratação e encaminhado ao Jurídico da Eletrobras dia 04/06/21.
Indústria	Elaboração de Plano de Comunicação do Material de Reparo de Motores	N/A	460.000,00	3º	TR e RFP em consolidação visando ao empenho financeiro.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Edifica	Implementação de projetos de EE e GD em edificações	Creto Consultoria e Projetos Ltda.	1.133.000,00	1º	Treinamentos realizados para 06 beneficiários em dez/20, jan e fev/21. Elaborados 2 diagnósticos energéticos dos 3 previstos. Elaborados 2 levantamentos das coberturas dos 3 previstos.
Edifica	Benchmarks Energéticos	CBCS	1.719.272,07	1º	Entrega de todos os relatórios (produtos) o que inclui todas as 15 equações de benchmark. Alguns produtos aguardando revisão e outros em avaliação pela Eletrobras.
Edifica	Concurso NZEB - Edificações "Near Zero Energy Building"	CEPEL, UFPel, UNB e UNILA	4.000.000,00	2º	Acordo de cooperação CEPEL assinado em fev/21. Minuta do TCT em análise jurídica na UnB. UFPel finalizando alinhamento com a fundação. UNILA documento de concessão do novo terreno em andamento (previsão - início julho/21).
Edifica	Novo método do PBE Edifica	UFSC	1.770.204,84	2º	Publicação da portaria definitiva da INI-C em 9/3/21. Consulta pública do RAC finalizada em 27/04/21. Texto da INI-R para Consulta Pública enviado ao Inmetro em 01/04/21 (ainda em tramitação no Inmetro).
Edifica	Criação de grupo de estudo permanente para a elaboração / atualização de normas técnicas relacionadas à EEE	SINDUSCON /SP	750.000,00	2º	Atraso de 2 meses para o início da execução técnica, já em recuperação. 2 Comissões de Estudo de norma abertas na ABNT e 1º workshop realizado.

## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Edifica	Plano para a compulsoriedade e estudo de impacto regulatório para Edificações	Mitsidi	1.325.000,00	2º	Contrato em andamento, com atraso no cronograma devido à complexidade do trabalho. Será necessário estender o prazo de execução (+6 meses) , passando de 18 para 24 meses. 2º workshop previsto para dia 15/7.
Edifica	Programa de Eficiência Energética e Sustentabilidade para Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (“PEES”)	N/A	4.400.000,00	3º	O CGEE optou por dar continuidade ao projeto como contrato, em vez de convênio. Termo de Referência em elaboração para cotação de preços de mercado.
Edifica	Utilização de rodas dessecantes para redução do consumo de energia elétrica em sistemas de condicionamento de ar e refrigeração.	N/A	750.000,00	3º	Aguardando data disponível para publicação do edital
Edifica	Levantamento de requisitos para desenvolvimento de plataforma de cadastro e monitoramento de dados de edificações.	N/A	793.000,00	3º	Aguardando data disponível para publicação do edital

## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Reluz	Chamada Pública – Procel Reluz 01/19	Diversos	29.950.000,00	2º	Chamada <u>concluída</u> : 77 municípios selecionados (2 Consórcios); 69 Termos de Cooperação. Status: 4 desistências; 60 TCTs assinados; 5 TCTs NÃO assinados (ausência de regularidade fiscal); 25 municípios com obra iniciada.
Reluz	Estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia (Neipa) para ampliação de projetos de eficiência energética em IP na Amazônia Legal	CEEAC	1.874.697,14	3º	Convênio aprovado pela Eletrobras e pronto para assinatura das partes. A conveniente está analisando os termos do Convênio e dirimindo dúvidas sobre o processo administrativo para que, assim, seja assinado.
Reluz	Iluminação Pública para Cidades Inteligentes	UNICAMP	4.999.950,89	3º	Convênio aprovado pela Eletrobras e enviado para assinatura da UNICAMP.
Reluz	Chamada Pública – Procel Reluz 2020/2021	Diversos	65.000.000,00	3º	Chamada lançada em 19.05.2021, inscrições e envio de propostas entre os dias 31.05.2021 e 30.07.2021



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Sanear	Pesquisa de Informações Hidroenergéticas no Saneamento - PIHES	Mitsidi	435.000,00	2º	Contrato em andamento e sem atraso no cronograma. 1º e o 2º Produtos, que incluiu o 1º Workshop, finalizados e aprovados. 3º e 4º Produtos finalizados, incluindo 2º Workshop, aguardando recebimento do Relatório de entrega dos Produtos 3 e 4 para análise final, posterior aprovação e encerramento do contrato .
Sanear	Governança da Rede LENHS e estabelecimento de rede de aprendizagem para entes reguladores	N/A	2.948.750,00	3º	Em análise na área de contratação para confecção de Edital e submissão ao Jurídico.
Sanear	Eficiência energética no saneamento por meio de normativos	N/A	969.126,80	3º	Pesquisa de preços concluída. Valor obtido está dentro do previsto. Será providenciado o encaminhamento do processo à área de contratação.





## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Educação	Desenvolvimento de Nova Metodologia Procel nas Escolas	N/A	2.517.275,68	2º	O edital está pronto e será publicado na primeira semana de julho.
Educação	EnergIF – Programa para o desenvolvimento de energias renováveis e eficiência energética na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	IF-SC	9.826.132,75	3º	Convênio aprovado pela Eletrobras. Análise de integridade em andamento para realização da assinatura
Educação	Sistematização da governança do Procel Educação	N/A	969.109,63	3º	Processo em análise na área de contratação.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Marketing	3ª Campanha de publicidade	Agência 3	7.000.000,00	3º	Campanha já passou pela fase de produção. O plano de mídia em fase de execução e pesquisa de recall já iniciada.
Marketing	4ª Campanha de publicidade	Agência 3 e Nova SB	22.000.000,00	3º	Campanha em fase de produção e veiculação prevista para julho de 2021.
Marketing	5ª Campanha de publicidade	N/A	14.000.000,00	3º	Foi iniciado novo processo de contratação para futura campanha em 2022. Novo perfil do contrato autorizado pela SECOM e está em análise pela área de contratação.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Selo	Acompanhamento de mercado/produção	Diversos	813.365,00	2º	Contratos em andamento, sem atraso no cronograma.
Selo	Pesquisa de Percepção do Selo Procel	Ágora Pesquisa	159.000,00	2º	Contrato em andamento, com pesquisa de opinião já iniciada.
Selo	Pesquisa de Mercado sobre Equipamentos Consumidores de Energia Elétrica	Euromonitor	469.000,00	2º	Contrato em andamento com a Euromonitor, sem atraso no cronograma.
Selo	Programa de Ensaios de Proficiência por Comparação Interlaboratorial	N/A	521.405,20	2º	Processo de contratação aguardando publicação do edital para realização da licitação. Atraso ocasionado em função de análise detalhada sobre aplicação da Lei Complementar 123.
Selo	Capacitação laboratorial para ensaio de equipamentos de refrigeração e ar condicionado	Cepel	5.000.000,00	2º	O Cepel realizou pregões relativos aos trabalhos 3 e 4 no dia 15/6. Foi contratada a empresa para realizar o trabalho 2, com expectativa de término em 30/7. No trabalho 1 a previsão para a apresentação do projeto básico é na segunda semana de julho. Cronograma em atraso.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Selo	Capacitação laboratorial para ensaio de motores elétricos	Cepel	6.600.00,00	2º	1º Relatório de avanço físico enviado à Eletrobras e aprovado. O projeto segue dentro do planejado com modesto atraso, o qual pode ser compensado nas próximas etapas.
Selo	Adequação do Regulamento e Reposicionamento do Selo Procel	N/A	2.420.000,00	3º	Edital aprovado com publicação prevista para o mês de julho/2021.
Selo	Acompanhamento da produção de equipamentos elétricos com Selo Procel, etiquetados ou regulados pela Lei de Eficiência Energética	N/A	9.014.029,10	3º	Licitação ocorrida no dia 02/06/21 em fase de homologação. Dos 11 grupos de equipamentos licitados, apenas o grupo de módulos fotovoltaicos fracassou e será relicitado.
Selo	Metodologia para avaliação de impactos regulatórios da Lei 10.295/2001 (Lei de Eficiência Energética)	UFABC	350.000,00	3º	Plano de Trabalho em elaboração com a Universidade Federal do ABC junto com a Fundação que deverá gerir o recurso.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Info	Reestruturação do Portal Procel Info	N/A	1.335.000,00	2º	Edital para a licitação do projeto em revisão final junto a área de contratações para submissão ao jurídico da Eletrobras.
Info	Conteúdo para o Procel Info	Info 4	124.800,00	3º	Segundo aditivo ao contrato. Geração de conteúdo conforme cronograma.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
GEM	Atualização da Metodologia do PLANGE	Eco-Power Soluções Tecnológicas Ltda.	174.000,00	2º	Contribuições dos usuários coletadas. Relatórios de melhorias do PLANGE e do SIEN elaborados. Manual da nova metodologia de PLANGE em elaboração, com aproximadamente 80% concluído (dentro do prazo).
GEM	Treinamentos em Eficiência Energética para o Poder Público	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	147.800,00	2º	Treinamento 1 realizado de forma online nos dias 01, 02, 09 e 10/03. Nota de avaliação geral: 8,98. Treinamento 2 a ser realizado de forma online entre 06 e 09/07.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Estrut.	Concurso de Inovação para Soluções em Eficiência Energética	SENAI/RJ	15.000.000,0	2º	Convênio com pequeno atraso no cronograma de aproximadamente 2 meses, decorrentes da assinatura dos contratos de aceleração e execução de contratações, afetados pela pandemia. Em elaboração final a organização do Hackathon Pré-Aceleração, com previsão de divulgação da 3ª Chamada destinada a este evento em 06/07/2021.
Estrut.	Melhoria do Sistema de Gestão Físico-Financeira de Projetos do PROCEL	N/A	400.000,00	2º	A empresa que prestaria serviço, sem representação no Brasil, foi adquirida pela Microsoft e a aplicação da solução de integração usando as ferramentas oferecidas no pacote Office 365 vem se mostrando viável em testes iniciais, e provavelmente essa contratação será dispensada.
Estrut.	Desenvolvimento e implantação inicial de metodologias de avaliação de resultados de ações de Eficiência Energética implementadas no Brasil e Guia e exemplos práticos de M&V no âmbito dos subprogramas atendidos pelo PAR	FUPAI	2.600.000,00	2º	Matéria para a apresentação à Diretoria Executiva da Eletrobras em análise no Departamento Jurídico.

## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Estrut.	Programa de Eficiência Energética no âmbito do Comando da Aeronáutica	FAB	2.000.000,00	2º	Na impossibilidade de realização de convênio com a FAB, foi elaborado um Acordo de Cooperação Técnica e um processo de contratação de empresa para que os serviços sejam executados nas instalações da aeronáutica. O Acordo de Cooperação Técnica encontra-se em análise do jurídico da FAB e o contrato de prestação de serviço depende da definição do Acordo.
Estrut.	Sistema de indicadores para Eficiência Energética	Mitsidi	370.000,00	2º	Contrato sem atraso no cronograma. Já foram entregues e aprovados 2 produtos, nos quais houve a definição dos 5 setores alvo do estudo e dos indicadores correspondentes a cada setor. Para validação dos indicadores, houve workshops com stakeholders dos setores, assim como com a EPE e o IBGE.
Estrut.	Monitoramento e identificação dos "gaps" de evolução da eficiência energética de transformadores	Cepel	R\$ 465.973,20	2º	Convênio celebrado com o Cepel, sem atraso no cronograma físico, porém há atraso na liberação da parcela 2 dos recursos financeiros, pois o Cepel está verificando o procedimento a ser adotado para depósito, na conta do convênio do valor da licitação prevista, do valor que superou o estimado no convênio.



## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Estrut.	Fundo Garantidor para Crédito a Eficiência Energética ("FGEnergia")	BNDES	45.000.000,00	3º	A modelagem para operacionalização do Fundo foi aprovada internamente pela Diretoria do BNDES. A minuta do Contrato está sendo desenvolvida pelos jurídicos da Eletrobras e BNDES. Autorização prévia de empenho apreciada pela Diretoria Executiva da Eletrobras em 28/6/2021.
Estrut.	Esplanada Eficiente (Eficiência Energética em Prédios Públicos em geral)	Diversos	69.000.000,00	3º	Edital de chamada pública aprovado pelo jurídico, conforme alterações aprovadas pelo CGEE em 8/6/2021. Matéria será submetida para aprovação da Diretoria Executiva da Eletrobras em 05/07/2021.
Estrut.	Esplanada Eficiente (Esplanada Solar)	Diversos	31.000.000,00	3º	Termos de Referência e pesquisa de preço para realização dos empenhos já concluídos. Autorização prévia de empenho e início de contratação apreciada pela Diretoria Executiva da Eletrobras em 28/6/2021.
Estrut.	Prêmio Procel	N/A	4.000.000,00	3º	Termo de Referência pronto e enviado para cotação de preços. Até 23/06 foi recebido apenas 01 orçamento, no valor de R\$1,5 milhão. Em busca de outros orçamentos para compor o preço base e realizar o empenho do valor no orçamento.

## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Estrut.	Smart Selo Procel	N/A	2.973.693,00	3º	O termo de referência foi enviado ao setor Transformação Digital - DSID da Eletrobras para ajustes e posterior elaboração do Edital e análise do jurídico. O empenho do projeto foi realizado.
Estrut.	Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso no Setor Comercial – PPH Comercial	N/A	2.344.979,80	3º	O TR foi modificado para possibilitar maior abrangência às pesquisas da PPH e, por isso, foi necessário refazer a pesquisa de preços. O novo TR foi enviado a área de contratação, aguardando nova análise por esta, para então ser enviado para análise jurídica da Eletrobras.
Estrut.	Mecanismos de Financiamento para Alavancar Projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída	Agências de Fomento	15.000.000,00	3º	Modelagem e critérios do programa em etapa de finalização. Necessidade de prolongar o prazo de execução do projeto para 60 meses <u>depende de deliberação do CGEE</u> .
Estrut.	Sistema Informatizado para o PBE e Selo Procel	N/A	580.952,50	3º	O processo retornou do jurídico se encontra na área de contratação com publicação do Edital prevista para julho/2021.
Estrut.	Medidas de incentivo para a implementação de projetos de eficiência energética em prédios públicos	N/A	820.000,00	3º	O processo retornou do jurídico se encontra na área de contratação com publicação do Edital prevista para julho/2021.

## Andamento dos projetos

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Estrut.	Metodologia de avaliação do efeito de mercado das iniciativas de Eficiência Energética	N/A	780.000,00	3º	Documentos encaminhados para a avaliação da área de contratação.
Estrut.	Piloto para implantação de equipamentos para gestão da demanda	N/A	9.996.305,00	3º	Empenho feito com um valor um pouco abaixo do previsto no PAR (R\$10 milhões). Finalização dos documentos necessários para envio a área de contratação.
Estrut.	Análise dos resultados da PPH 2019 e construção de cenários tendenciais	N/A	R\$ 910.700,00	3º	Documentação enviada a área de contratação e edital em avaliação na área jurídica da Eletrobras
Estrut.	Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétrica Investirem em Eficiência Energética	N/A	2.612.181,25	3º	Termo de Referência elaborado e pesquisa para formação do preço de referência da licitação finalizada. Valor de todos os orçamentos foi superior ao valor de referência. O valor médio dos orçamentos foi de R\$2.612.181,25. Alteração de valor <u>depende de deliberação do CGEE.</u>



# Projetos encerrados



## Projetos encerrados

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Indústria	Programa Aliança	CNI	5.400.00,00	1º	Convênio <u>concluído</u> com todas as metas físicas cumpridas.
Indústria	Brasil + Produtivo + EE	CNI	4.855.000,00	1º	Convênio encerrado e Prestação de Contas Final em análise.
Indústria	Avaliação da infraestrutura e condições operativas dos Lamotriz	PUC/RS	473.208,08	2º	Contrato <u>concluído</u> antes do prazo final (02/07/2021) e atendendo às expectativas.
Edifica	Chamada Pública Procel Edifica 01/18	Diversos	N/A	1º	Chamada cumpriu seu objetivo e demanda acompanhamento dos acordos. Um dos beneficiários já cumpriu metade da contrapartida.
Edifica	PBE Edifica nas construtoras	Ares e Trisul	690.000,00	1º	Contrato <u>concluído</u> , resultando inclusive no lançamento do Selo Procel para edificações residenciais.
Edifica	Avaliação Global de Edificações em Operação	Mitsidi	800.000,00	1º	Contrato <u>concluído</u> .

## Projetos encerrados

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Reluz	Chamada Pública – Procel Reluz 01/17	Diversos	17.538.000,00	1º	Chamada cumpriu seu objetivo e todos os 22 Termos de Cooperação Técnica (TCT) foram <u>concluídos</u> , dos quais 20 municípios cumpriram plenamente as metas previstas, 1 cumpriu parcialmente e 1 município rescindiu o TCT.
Reluz	Estudo para descarte de luminária LED	Genos	381.000,00	1º	Contrato <u>concluído</u> . Os relatórios e a atualização do guia de Descarte do Reluz estão disponíveis no Procel Info.
Reluz	EAD para projetos de IP	Osmose Cursos Técnicos	292.000,00	1º	Contrato para desenvolvimento de conteúdo <u>concluído</u> e foi contratada empresa de TI para hospedagem do conteúdo em plataforma EAD que será lançado na próxima Chamada pública do Reluz 2021
Reluz	Cadastro de Iluminação Pública	Kirchner	63.000,00	1º	Contrato <u>concluído</u> .
Reluz	Suporte a revisão das normas de IP	Omatic	56.855,00	1º	Todos os produtos foram concluídos e entregues dentro do prazo. Contrato <u>concluído</u> .
Sanear	Plano Diretor da Rede LENHS	LIDERA	690.000,00	1º	Projeto <u>concluído</u> . Continuação aprovada para o 3º PAR.
Sanear	EE em Sistemas de Saneamento	FAPEC	3.988.694,28	1º	Devido à falta de interesse no projeto e retorno do conveniente no prazo de vigência sobre um possível aditivo de prazo, o <u>convênio foi extinto</u> , sem apresentar qualquer avanço físico. Os recursos aportados, referentes à primeira parcela, foram restituídos integralmente.

## Projetos encerrados

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Educação	Energia que transforma 2	Fundação Roberto Marinho	3.910.638,00	1º	Contrato encerrado formalmente, porém a parceria colaborativa com a Fundação Roberto Marinho continua, visando novas estratégias para multiplicação alternativa à implementação presencial da proposta original do projeto. Projeto continua sendo monitorado pela equipe do Procel.
Educação	Projeto Energe – EAD	UNIFEI	362.650,00	1º	A UNIFEI apresentou dificuldades para contratação dos profissionais previstos no convênio e devido a impossibilidade de pagamento de bolsas ao corpo docente, foi avaliada a possibilidade de substituição do convênio por contrato, conforme orientação do CGEE. Essa operação exigia a celebração do Termo de cessão de direito da metodologia por parte da UNIFEI. A negociação para celebração do termo não evoluiu e o <u>convênio se extinguiu pelo prazo</u> , sem apresentar avanço físico.
Educação	Procel Escola Virtual	N/A	1.000.000,00	2º	Após dificuldades de realização de convênio com ENAP e orientação do CGEE para realização de contratação, projeto foi integrado a reestruturação do portal Procel Info.
Marketing	1ª Campanha de publicidade	Agência 3 e Nova SB	2.557.476,72	1º	Campanha <u>concluída</u> .

## Projetos encerrados

Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Marketing	2ª Campanha de publicidade	Nova SB e Agência 3	7.128.587,38	2º	Campanha <u>concluída</u> .
Selo	Metodologia p/ Condicionador de Ar Split	PUC/RS	1.400.000,00	1º	Contrato <u>concluído</u> . Proposta do novo método já apresentada ao setor e novo regulamento do Selo Procel já publicado.
Selo	Acompanhamento de mercado/produção	Diversos	910.889,38	1º	Contratos <u>concluídos</u> e empresas que não apresentaram justificativas para as não-conformidades foram retiradas da tabela do Selo Procel.
Info	Conteúdo para o Procel Info	Info 4	124.800,00	1º	Geração de conteúdo para o Portal compatível com o cronograma. Recurso previsto para o 1º PAR já utilizado. Contrato segue por meio de aditivo, com recurso do 3º PAR.
GEM	Melhoria de Gestão da RCE	Mitsidi	94.525,00	2º	Contrato <u>concluído</u> , com todos os produtos entregues.
GEM	Inclusão de parâmetros de Eficiência Energética em Códigos de Obra	N/A	2.000.000,00	3º	Projeto descontinuado na 18ª reunião do CGEE.





## Projetos encerrados


Área	Projeto	Parceiro	Valor (R\$)	Ciclo PAR	Status
Estrut.	PPH	Zaytec	834.500,00	1º	Contrato <u>concluído</u> , com resultado apresentado em seminário.
Estrut.	PPH WEB	Analítica Soluções Inovadoras	158.999,82	2º	Contrato <u>concluído</u> . A ferramenta foi lançada em 01/06/2021 ( <a href="http://www.eletronbras.com/pphweb">www.eletronbras.com/pphweb</a> )
Estrut.	Plano Decenal de Eficiência Energética	IX Projetos	1.755.000,00	2º	Contrato <u>concluído</u> , com todos os produtos entregues. Reunião final realizada no dia 25/03/2021



**ORÇAMENTO PAR/2020-2021**

Atualizado em: 23/06/2021

OUTRAS RUBRICAS			
Rubrica	Previstos	Empenhados	%
Projetos	R\$ 293.384.144,45	R\$ 193.517.091,64	66,0%
Patrocínio ou Promoção de Eventos	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,0%
Publicidade / Marketing	R\$ 43.000.000,00	R\$ 27.000.000,00	62,8%
Serviço de Tecnologia da Informação para promoção de soluções e desenvolvimento de sistemas para o Procel	R\$ 500.000,00	R\$ 28.550,00	5,7%
Cooperação Internacional / Treinamento e Capacitação da Equipe do Procel	R\$ 1.000.000,00	R\$ 45.590,48	4,6%
Auditoria Externa Contábil-Financeira	R\$ 123.060,00	R\$ 123.060,00	100,0%
Serviço administrativo para análise de prestação de contas de convênios e cooperações técnicas	R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00	0,0%
Custeio de pessoal referente aos projetos do PAR vigente	R\$ 3.657.108,00	R\$ 1.964.091,26	53,7%
Custeio de pessoal referente aos projetos dos Planos anteriores	R\$ 4.912.392,00	R\$ 4.624.638,43	94,1%
Custeio de pessoal referente ao período entre o término do PAR anterior e início do PAR vigente	R\$ 2.865.562,00	R\$ 2.865.562,00	100,0%
Secretaria Executiva	R\$ 3.900.000,00	R\$ 1.411.330,77	36,2%
Taxa de Administração (1%)	R\$ 3.554.422,66	R\$ 2.843.030,66	80,0%
<b>(1) Saldo Comprometido PAR/2020-21</b>	<b>R\$ 358.996.689,11</b>	<b>R\$ 234.422.945,24</b>	<b>65,3%</b>
(2) Recolhido Distribuidoras PAR/2020-2021		<b>R\$ 361.892.703,10</b>	
(3) Alteração de orçamento após cotação preços (após remanejamentos autorizados reunião CGEE)		<b>R\$ 44.445,64</b>	
(4) Rendimento aplicação 3º PAR		<b>R\$ 3.453.965,95</b>	
Saldo disponível para uso (2) - (1) + (3) + (4)		<b>R\$ 6.394.425,58</b>	

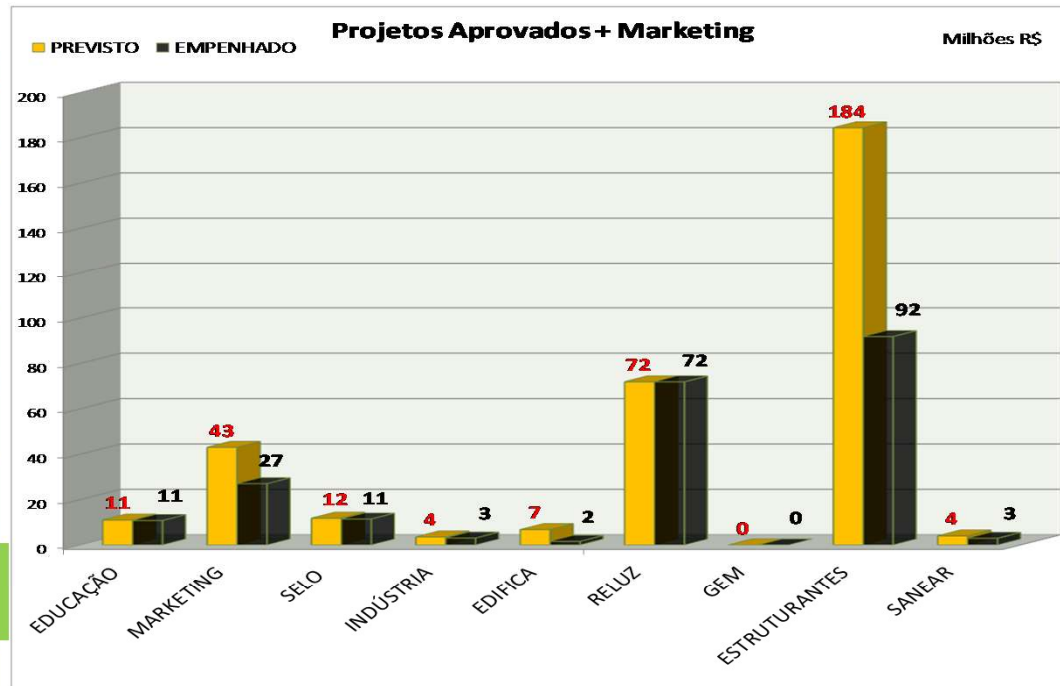

Saldo conta bancária PROCEL 23/06/2021	<b>R\$ 478.345.495,96</b>
Saldo conta bancária PROCEL PAR/2017 (incluído rendimentos/tarifas)	<b>R\$ 40.043.362,03</b>
Saldo conta bancária PROCEL PAR/2018 (incluído rendimentos/tarifas)	<b>R\$ 86.621.440,82</b>
Saldo conta bancária PROCEL PAR/2020-2021 (incluído rendimentos/tarifas)	<b>R\$ 351.680.693,11</b>



## Realização financeira por ciclo do PAR

### Quadro resumo - Dados financeiros PAR/PROCEL

Atualizado: 23/06/2021

PAR	Orçamento (Plano Original Aprovado)	Empenhado	Realizado	A realizar (com base no Empenhado)	Saldo conta Procel (inclui rendimentos)
<b>1º PAR</b>	R\$ 107.767.000,00	R\$ 71.244.054,72	R\$ 49.346.417,85	R\$ 845.583,33	R\$ 40.043.364,02
<b>2º PAR*</b>	R\$ 134.306.321,99	R\$ 136.810.987,09	R\$ 54.855.371,27	R\$ 72.632.011,79	R\$ 86.621.440,82
<b>3º PAR**</b>	R\$ 322.321.868,04	R\$ 234.422.945,24	R\$ 13.665.975,94	R\$ 220.756.969,30	R\$ 351.680.693,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 564.395.190,03</b>	<b>R\$ 442.477.987,05</b>	<b>R\$ 117.867.765,06</b>	<b>R\$ 294.234.564,42</b>	<b>R\$ 478.345.497,95</b>

\*recurso ajustado - R\$ 146.198.321,99

\*\*orçamento ajustado - R\$ 358.996.689,11



## Deliberações

1. Autorizar a mudança no prazo de execução para o projeto do 3º PAR “Mecanismos de Financiamento para Alavancar Projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída” de 24 meses para 60 meses.

### JUSTIFICATIVA:

- Em tratativas com os possíveis parceiros para esse projeto foi identificado que o prazo de financiamento de 24 meses para projetos de Eficiência Energética e Geração Distribuída não é adequado;
- Há necessidade de considerar um prazo de carência para início dos pagamentos pelo tomador do empréstimo;
- De uma forma geral, o prazo de execução para esse tipo de projeto é de 12 a 24 meses, no entanto, há necessidade de contemplar também o prazo de pagamento do financiamento.
- Após o início da vigência do instrumento jurídico a ser celebrado com a Eletrobras, haverá etapas para avaliação e seleção dos projetos e assinatura de contratos de financiamentos, que precedem a execução do projeto.



## Deliberações

2. Autorizar a adequação orçamentárias na rubrica "Serviço administrativo para análise de prestação de contas de convênios e cooperações técnicas" e para o projeto "Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétricas investirem em Eficiência Energética" previstos no 3º PAR.

Título do Projeto	Orçamento PAR (A)	Orçamento Revisado (B)	Variação (A) - (B)
Serviço administrativo para análise de prestação de contas de convênios e cooperações técnicas.	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.403.562,69	-R\$ 803.562,69
Modelagem de Incentivos Regulatórios para as Distribuidoras de Energia Elétrica Investirem em Eficiência Energética.	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.612.181,25	-R\$ 612.181,25
<b>TOTAL</b>			<b>-R\$ 1.415.743,94</b>



## Deliberações

3. Autorizar o remanejamento de R\$ 700.000,00 entre as rubricas "Custeio de pessoal referente aos projetos dos Planos anteriores" e "Secretaria Executiva" previstos no 3º PAR.

Rubrica	Orçamento PAR (A)	Orçamento Revisado (B)	Varição (A) - (B)
Custeio de pessoal referente aos projetos dos Planos anteriores.	R\$ 4.912.392,00	R\$ 5.612.392,00	R\$ 700.000,00
Secretaria Executiva	R\$ 3.900.000,00	R\$ 3.200.000,00	-R\$ 700.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 0,00





Obrigado!
