



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Indicadores do Monitoramento e Controle
da Programação**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação

2013

**Recife
27 de junho de 2013**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015	4
2 – Resultados do enquadramento dos projetos nas diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015	6
3 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	8
4 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	19
5 – Indicadores de Gestão de Convênios	25
6 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	33
7 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE..	36
8 – Indicadores de Gestão dos Projetos Estratégicos da SUDENE	38
9 – Deliberações da Diretoria Colegiada, em plenária de 27/06/2013	40
10 – Conclusão	43
Anexo I – Quadros do monitoramento	44
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2013	111
Anexo III – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015	113

Introdução

Neste documento encontram-se os resultados do monitoramento interno e da avaliação por meio de indicadores referentes ao 2º Ciclo de monitoramento da gestão, cuja reunião foi realizada no dia 27 de junho de 2013, na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar, Ala Norte do ed. sede.

Na oportunidade, utilizando-se de sistemática aprovada pela Diretoria Colegiada em 01 de novembro de 2012, na 121ª plenária, os gestores de projetos, alguns foram substituídos pelos seus suplentes, fizeram detalhada exposição dos projetos sob suas responsabilidades, tendo como suporte apresentação em power point para todos os presentes, oportunidade em que foram destacados os avanços, razões dos atrasos, paralisações e restrições enfrentadas em consequência das dificuldades para definição dos limites orçamentários por parte do Ministério da Integração Nacional.

Os responsáveis por projetos ouviram do Diretor de Gestão de Fundos e Incentivos da Autarquia, na oportunidade representando o Superintendente, a recomendação de que dêem em suas agendas, prioridade aos eventos futuros, evitando conflito de compromissos como o acontecido com a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, em que parte da equipe teve que participar de reunião com Secretaria do estado de Pernambuco.

Neste evento foram expostos os resultados de 50 projetos, categorizados como Planos Operativos, sendo 10 da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, 5 da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento, 8 da Diretoria de Administração, 19 da Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos, 6 da Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede e 2 da Assessoria de Gestão Institucional. Alguns desses projetos poderão ser adiados, e por isso, suprimidos dos próximos relatórios pois a execução depende: da disponibilidade de limites orçamentários e até a data deste relatório os montantes ainda eram desconhecidos, bem como, de negociações interinstitucionais e até, da capacidade executiva da unidade.

Quanto aos indicadores trabalhados, foram aqui considerados 30 (trinta) indicadores, dos quais 22 (vinte e dois) de capacidade ¹ e 8 (oito) de produtividade ². No detalhe, são 10 (dez) indicadores para Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE); 6 (seis) indicadores para Gestão dos Incentivos e Benefícios Fiscais; 6 (seis) indicadores para Gestão de Convênios; 3 (três) indicadores para Gestão de Recursos Humanos; 2 (dois) indicadores para Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos; 2 (dois) indicadores para Gestão dos Projetos Estratégicos da SUDENE; e, 1 (um) indicador para Gestão Orçamentária e Financeira.

Quanto aos quadros do monitoramento, alguns convênios estão sendo considerados como projetos pela sua importância e porque assim foram enquadrados para se habilitarem ao rol daqueles eleitos no planejamento estratégico. São os casos de convênios que foram celebrados no final do ano passado e sua execução continua neste ano. Mas também serão encontrados vários novos, como os relacionados com o Concurso Público, com Tecnologia da Informação e outros. Vale adiantar que além dos 50 (cinquenta) projetos aqui trabalhados, outros poderão se incorporar ao monitoramento no decorrer do ano.

¹ Indicador de Capacidade mede a capacidade de resposta de um processo através da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo.

² Indicador de Produtividade (eficiência) mede a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos.

Por sua vez, no que tange à execução orçamentária e financeira finalística, a mudança de procedimento da Coordenação-Geral de Orçamento do Ministério da Integração Nacional, contingenciando ou ampliando a burocracia para a autorização de limites vem frustrando o alcance de melhores resultados, repercutindo diretamente no desempenho da instituição. Ou seja, a SUDENE dispõe de bons projetos, de receita proveniente de seus recursos próprios, mas não está recebendo sequer a contrapartida desses recursos próprios no tempo devido, consignáveis a partir da receita proveniente de 1,5% do retorno das operações do FDNE, 2% das liberações efetivadas pelo mesmo fundo, além de 1% advindos da administração dos incentivos fiscais do Reinvestimento do IRPJ, autorizados.


Esses resultados referem-se, em suma, ao que estava em execução até 31 de maio, em alguns casos, até a data da reunião, mas se reportando ao exercício de 2013 e pontuam o esforço da atual administração no sentido de buscar consolidar um processo de controle sobre os principais projetos em curso na Autarquia. Um esforço iniciado no segundo semestre de 2012, que se tornou parte do conhecido ciclo do PDCA, abaixo reproduzido:



1 – Diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015

Conforme decisão da Diretoria Colegiada da SUDENE, prolatada na sua 132ª reunião, realizada em 27/02/2013, o planejamento estratégico, coordenado pela Assessoria de Gestão Institucional e elaborado conjuntamente com as Diretorias de Planejamento, de Fundos e Incentivos, e de Administração, foi assumido como marco estratégico destinado a referenciar os projetos a serem trabalhados pela Autarquia para o período 2013-2015.

Com base nessa decisão, o citado referencial foi aqui adotado, onde destacam-se as quatro diretrizes estratégicas do nosso planejamento estratégico, abaixo graficamente representadas, para fins de enquadramento dos projetos inseridos no monitoramento interno.



O referido referencial abriga 14 objetivos, alinhados segundo cada diretriz, e convergentes com as atribuições estabelecidas para a SUDENE pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007 e pelas políticas nacionais setoriais. São eles:

1.1 - Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Objetivo 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva;

Objetivo 1.3 – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;

Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;

Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.

1.2 - Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos

Objetivo 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;

Objetivo 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;

Objetivo 2.3 - Promover a sustentabilidade ambiental;

Objetivo 2.4 – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

1.3 - Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE

Objetivo 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

Sub-objetivo 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras;

Sub-objetivo 3.1.2 – Modernizar a gestão;

Sub-objetivo 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores;

Objetivo 3.2 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;

Objetivo 3.3 – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Nota:

- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

1.4 - Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivo 4.1 - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);

Objetivo 4.2 – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

Notas:

- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.

- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês, sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

2 – Resultados do enquadramento dos projetos nas diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE para o período 2013-2015

Como consequência do enquadramento dos projetos nas diretrizes e prioridades estratégicas da SUDENE foi possível vislumbrar a distribuição da alocação orçamentária, a execução financeira global, e o andamento segundo esses marcos estratégicos, conforme retrata a tabela adiante.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento

Diretriz Estratégica (1)	Objetivo Estratégico (1)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	28	5.700.317,39	1.679.387,90	-	-	20	6	1	1	28
	1.2	1	800,00	280,00	-	-	1	-	-	-	1
	1.5	1	234,10	0,00	-	-	-	1	-	-	1
Sub-Total		30	5.701.351,49	1.679.667,90	-	-	21	7	1	1	30
2	2.1	1	6.496,60	0,00	-	-	-	1	-	-	1
	2.3	1	530,48	0,00	-	-	-	1	-	-	1
	2.4	2	579,78	0,00	-	-	-	2	-	-	2
Sub-Total		4	7.606,86	0,00	-	-	-	4	-	-	4
3	3.1	3	3.354,86	0,00	1	-	2	-	-	-	3
	3.2	7	701,37	0,00	1	-	5	1	-	-	7
	3.3	6	24.218,91	5.859,58	-	-	4	1	-	1	-
Sub-Total		16	28.275,14	5.859,58	2	-	11	2	-	1	16
TOTAL		50	5.737.233,49	1.685.527,48	2	-	32	13	1	2	50

Fonte: AGI/SUDENE

(1) - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos seguem a mesma numeração citada no tópico anterior.

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 2º Ciclo de monitoramento

A tabela 1 revela que o maior volume de recursos está direcionado para a diretriz 1, que trata da “Promoção da Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste”. Entre esses projetos destacam-se os apoiados por meio de convênios e os financiados pelo FDNE, que respondem pela maior parte dos recursos nessa diretriz. A outra diretriz, a 3, trata da promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão. Neste caso, o maior peso dos recursos encontra-se nos projetos destinados à recuperação da estrutura física do prédio da SUDENE e seus anexos. Os recursos previstos nessas diretrizes referem-se a orçamentos aprovados para os projetos, e os recursos liberados incluem os Restos a Pagar de anos anteriores.

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	20N9	1	126,37	74,84				1			1
	0355	19	5.679.229,16	1.676.833,82			17	1	1		19
	4640	1	2.462,95	0,00				1			1
	8689	1	530,48	0,00				1			1
	8918	2	5.694,46	419,10				2			2
	8340	3	8.053,62	974,41			1	2			3
	8902	5	12.281,54	1.365,73			3	1		1	5
Sub-Total		32	5.708.378,57	1.679.667,90							
2040	8172	2	579,78	0,00				2			2
Sub-Total		2	579,78	0,00							
2111	2000	16	28.275,14	5.859,58	2	11		2		1	16
Sub-Total		16	28.275,14	5.859,58							
TOTAL		50	5.737.233,49	1.685.527,48	2	11	21	13	1	2	50

Fonte: AGI/SUDENE

(1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 20N9 – Apoio ao Associativismo e Cooperativismo; 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas; 8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica). Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade).

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias. os de financiamento do FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento financiado pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Nota: Os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 2º Ciclo de monitoramento

A tabela 2 mostra que o maior volume de recursos está concentrado no Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, porém, sob o efeito dos recursos do FDNE. Neste programa (2029) estão concentrados 32 projetos cujos recursos previstos somam R\$ 5,71 bilhões, dos quais R\$ 1,68 bilhão haviam sido aplicados até a data deste relatório, lembrando que alguns desses projetos, particularmente os do FDNE, são plurianuais. E os recursos liberados incluem os Restos a Pagar de exercícios anteriores.

No Anexo 1 encontram-se os 50 planos operativos trabalhados neste ciclo, dos quais 30 estão relacionados com a promoção da competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, 4 com universalização do acesso a ativos estratégicos, e 16, com a promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão da SUDENE. São ao todo, 50 projetos homologados para serem implementados a

partir deste ano ou continuarem a sua execução com base em Restos a Pagar. Alguns dos projetos, conforme já dito, terminam resultando em plurianuais, como os do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, ou os de recuperação estrutural, de segurança do ambiente de trabalho, ou ainda, de modernização da gestão.

No espaço destinado às deliberações recomenda-se uma detida leitura sobre as determinações do Coordenador da reunião do dia 27/06, o Diretor Henrique Tinoco, da Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos, representando o Superintendente da SUDENE, que por motivo de viagem a serviço não pode estar presente. Entre as deliberações encontra-se recomendação para repactuação de datas em diversos projetos que integram o portfólio do monitoramento.

No **Anexo I** poderão ser observados maiores detalhes dos projetos e as etapas alcançadas em sua execução. No **Anexo II**, por sua vez, encontra-se, de forma resumida, a execução orçamentária geral, alcançada pela SUDENE em cada programa e ação do PPA, e no **Anexo III**, um resumo dessa execução sob os “olhos” programáticos do PPA.

Alguns projetos continuam a sofrer a consequência do retardo na liberação dos limites orçamentários pelo MI, se prolongando indesejadamente na execução física, e isso pode ser sentido na baixa evolução da execução orçamentária e financeira quando se compara os resultados das duas tabelas anteriores com o informado no relatório do primeiro ciclo.

Em relação aos indicadores, alguns depoimentos colhidos de diferentes unidades mostraram a sua importância para a gestão, e estão reproduzidos no final este relatório, no item Conclusões.

3 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

3.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias protocoladas}^1} = \frac{24 \times 100}{24} = 100,00 \%$$

b)Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e)Status hierárquico: uso interno e externo

f)Periodicidade: jan-jun/2013

g)Comentários: houve tempestividade nas análises das Consultas Prévias protocoladas, obtendo-se, assim, o resultado ideal.

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídos as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 98,6 %.

Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 57,14% (1º Ciclo 2013).

i) Representação gráfica

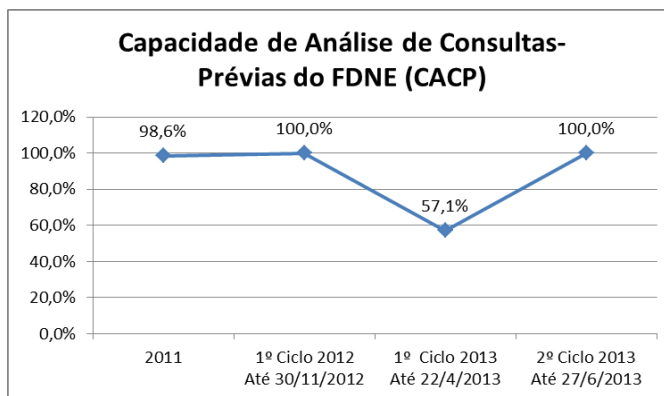

3.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{24}{4} = 6 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico: uso interno

f) Periodicidade: jan-jun/2013

g) Comentários: a performance é significativamente influenciada pela demanda de financiamento do FDNE. Tendo em vista que todas as Consultas Prévias apresentadas no período foram analisadas considera-se ótimo o resultado obtido.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 2,05 análises/técnico.

Nov/2012 = 0,67 análise/técnico (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 2,67 análises/técnico. (1º Ciclo 2013).

i) Representação gráfica

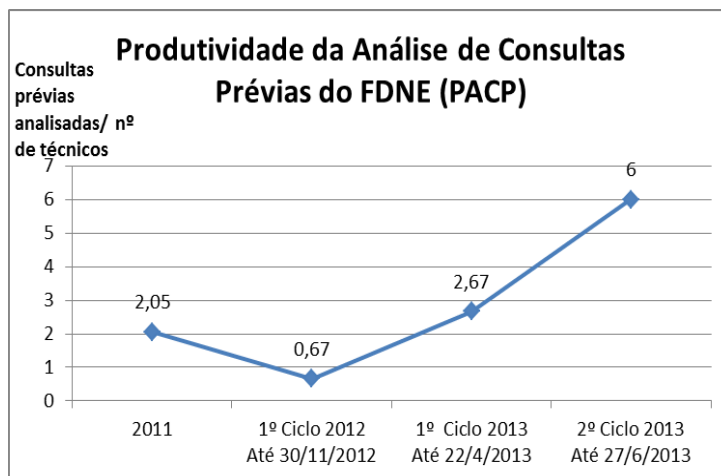

3.3 - Consistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{12 \times 100}{24} = 50,00 \%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: jan-jun/2013

g) Comentários: A devolução de Consultas Prévias foi decorrente de ausência de documentos necessários à conclusão da análise e/ou preenchimento inadequado do formulário padrão estabelecido.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 40,8 %.

Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013).

i) Representação gráfica

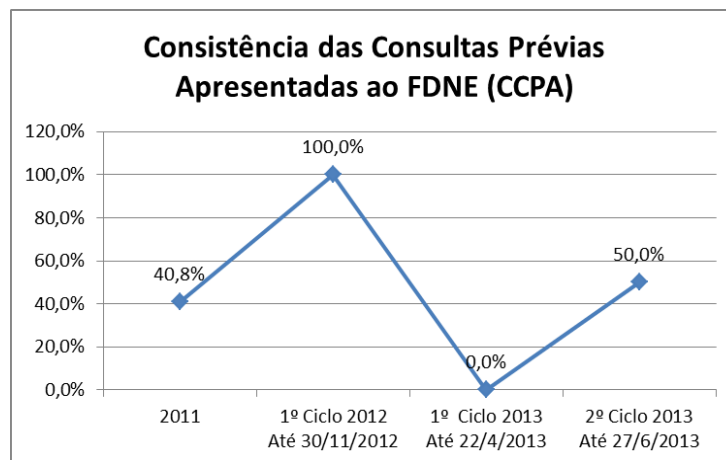

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{121,14}{90} = 1,35$$

a.2)– Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{63,5}{90} = 0,70$$

a.3) - Caixa Econômica Federal - CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{147}{90} = 1,63$$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: jan-jun/2013

g)Comentários: Projetos a cargo do BNB e da CEF tiveram prazo de análise prorrogado devido à necessidade de complementação de informações solicitadas pelos analistas.


h)Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas. (1º Ciclo 2013). Incluía até então, apenas o BNB.

i)Representação gráfica

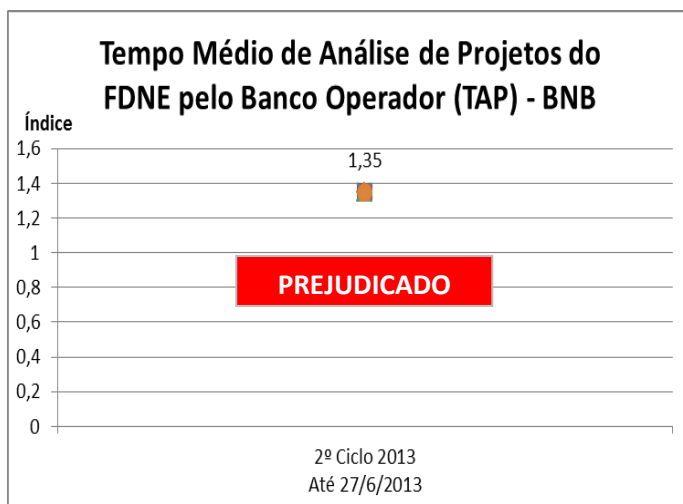

Obs.: Não foi possível, com um único resultado, no caso, apenas o do BNB, a obtenção de uma representação do comportamento do indicador.

Atenção: O **cálculo foi prejudicado** por que com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, foi reiniciada do zero a contagem do tempo de tramitação.

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto no período considerado. Não são computados os projetos em análise.

3.5 – Inconsistência dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{14} = 0,00 \%$$


a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{5} = 0,00 \%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

Fórmula:
$$\frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{1} = 0,00 \%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico: uso interno e público
- f) Periodicidade: jan-jun/2013.
- g)Comentários: não houve arquivamento de projetos apresentados no período.
- h)Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = **cálculo prejudicado** pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013) (incluía até então, apenas o BNB)
- i)Representação gráfica

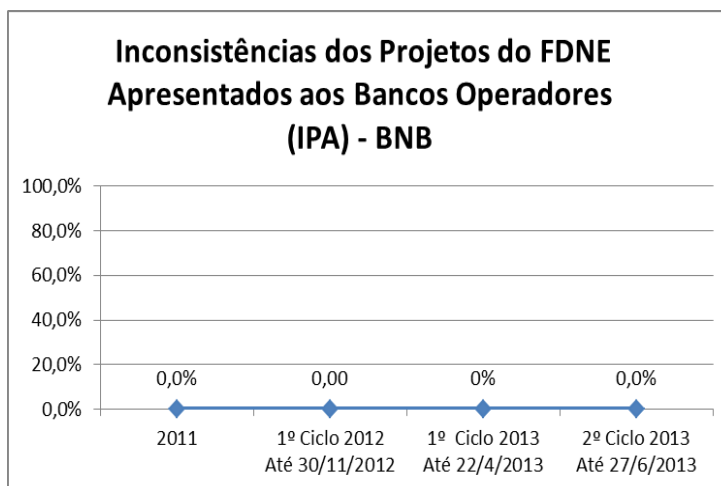

Obs.: dados inexistentes nos períodos considerados.

Atenção: O cálculo foi temporariamente prejudicado por força das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, que levou ao reinício do zero a contagem do tempo de análise.

3.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a)Fórmula:
$$\frac{\text{Valor empenhado} \times 100}{\text{Dotação LOA 2013}} = \frac{1.238.475.822,85 \times 100}{2.022.481.635,00} = 61,24\%$$

b)Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício 2013.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e)Status hierárquico: uso interno e público

f)Periodicidade: jan-jun/2013

g)Comentários: A meta de 100% de empenho deverá ser alcançada no próximo semestre.


h)Resultados anteriores:

Dez/2011 = 100,0 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 99,14 % (referência LOA 2012 e RAPs) (1º Ciclo 2013)

i)Representação gráfica

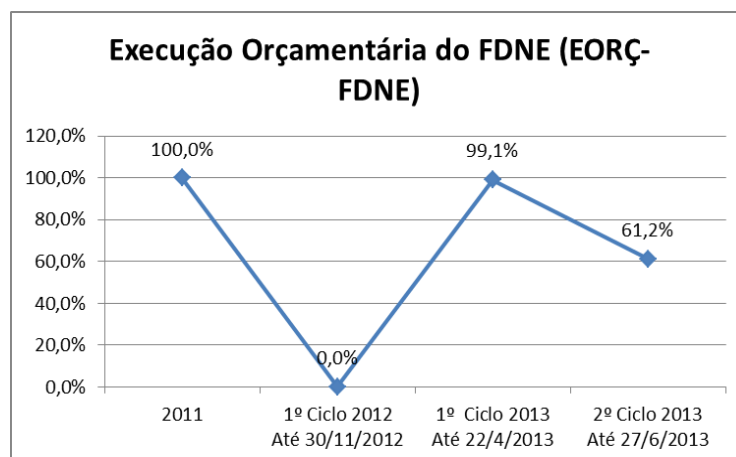

3.7 – Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a)Fórmula: $\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Recursos Empenhados}} = \frac{685.750.000,00 \times 100}{5.861.649.965,86} = 11,70\%$

b)Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e)Status hierárquico: uso interno e público

f)Periodicidade: jan-jun/2013

g)Comentários: O baixo desempenho se deveu ao atraso na execução de obras na Ferrovia Transnordestina e alterações na legislação que permitiu o empenho de recursos do FDNE quando da aprovação da Consulta Prévia. Os recursos referem-se a Restos a Pagar de 2010, 2011 e 2012 e empenhos da dotação da LOA 2013.


h)Resultados anteriores:

Dez/2011 = 14,2 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 3,25% (1º Ciclo 2013)

i)Representação gráfica

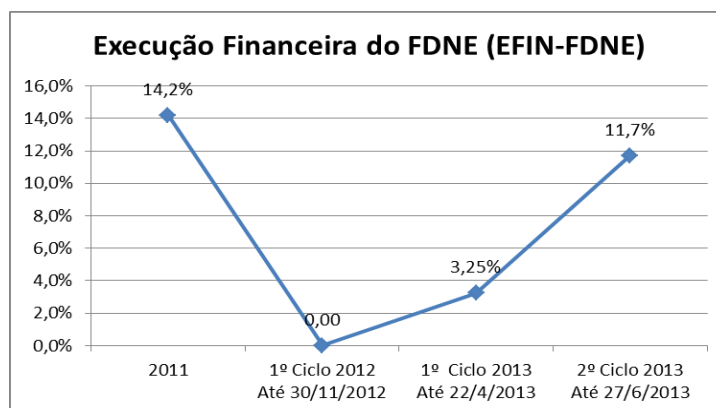

Atenção: A baixa liberação em abr/2013 (3,25 % do total empenhado) decorreu das mudanças legais do FDNE, pois além da MP nº 564, de abr/2012, e da regulamentação feita pelo Decreto nº 7.838, em nov/2012, ainda houve a expedição da Resolução nº 4.171 , do Conselho Monetário Nacional, em 24/12/2012, normatizando complementarmente, as condições do financiamento.

3.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a)Fórmula: $\frac{M_1 \times 100}{30 \text{ dias}^1} = \frac{10,95 \times 100}{30} = 36,50 \%$

b)Objetivo: Aferir o percentual que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (%): 0,00 (quanto menor melhor)

e)Status hierárquico: uso interno e público

f)Periodicidade: jan-jun/2013

g)Comentários: O percentual reflete a eficiência da equipe técnica, que utilizou apenas 36,50% do tempo máximo legal para tanto.


h)Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = **cálculo prejudicado.** (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = **cálculo prejudicado.** (1º Ciclo 2013)

i)Representação gráfica



Obs.: Não foi possível, com um único resultado, a obtenção de uma representação do comportamento do indicador.

Atenção: em relação aos resultados de nov/2012 e abr/2013, ainda não existiam dados para o cálculo do tempo médio dessa tramitação pois os projetos registrados nos diferentes agentes operadores: BNB; Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – ainda estavam em análise. Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, que levou ao reinício do zero a contagem do tempo de análise.

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

3.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP, ex-TDCCP-FDNE)

a)Fórmula:
$$T_m = \frac{2.768 \text{ dias}}{n} = 138,4 \text{ dias}$$

b)Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: jan-jun/2013

g) Comentários: No cálculo do tempo médio foi descontado o sobrestamento de prazos de análise de projetos (MP 564, de 03.04.2012, convertida na Lei nº 12.712, de 30.08.2012, e Portaria MI nº 353^a, de 26.06.2012)

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = **cálculo prejudicado**. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = **cálculo prejudicado**. (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica



Obs.: Não foi possível, com um único resultado, a obtenção de uma representação do comportamento do indicador.

Atenção: em relação aos resultados de nov/2012 e abr/2013, ainda não existiam dados para o cálculo do tempo médio dessa tramitação pois os projetos registrados nos diferentes agentes operadores: BNB; Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – ainda estavam em análise. Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012, que levou ao reinício do zero a contagem do tempo de análise.


Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CC + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

3.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF, ex-IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{20}{20} = 1,0$
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): 1,0 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Status hierárquico: uso interno e público
- f) Periodicidade: jan-jun/2013
- g) Comentários: todos os projetos aprovados pelos Agentes Operadores (BB, BNB e CEF) tiveram o financiamento aprovado pela SUDENE.
- h) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 = **cálculo prejudicado**. (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 = **cálculo prejudicado**. (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica



Obs.: Não foi possível, com um único resultado, a obtenção de uma representação do comportamento do indicador.

Atenção: em relação aos resultados de nov/2012 e abr/2013, ainda não existiam dados para o cálculo do índice pois os projetos registrados nos diferentes agentes operadores: BNB; Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – ainda estavam em análise. Isso decorreu das alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 564, de 03/04/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.838, de 09/11/2012.

4 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

4.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

a) Fórmula:
$$\frac{T1}{N} = \frac{3.051 \text{ dias}}{40 \text{ pleitos}} = 76 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal: Resultado ideal (dias/processo): Quanto menor melhor.

e) Status Hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de maio de 2013, foram **vistoriados 40 estabelecimentos dos 42 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados nesse mesmo intervalo.** A diferença, de 2 pleitos, refere-se a processos de transferência de benefício. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 76 dias.** O resultado foi basicamente afetado pelo período de férias uma vez que em janeiro não foram realizadas vistorias e em fevereiro as vistorias somente tiveram início a partir do dia 25.

Em comparação com igual período de 2012, o resultado desses primeiros 5 meses foi mais favorável, uma vez que o **Tempo Médio de Espera dos 5 primeiros meses de 2012 foi de 80 dias.**


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 64,54 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 30,1 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

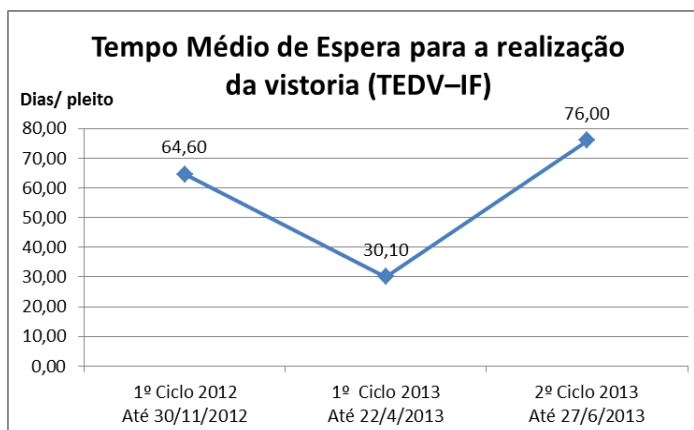

O quadro abaixo distribui, nos meses indicados, os processos e suas respectivas vistorias.

Meses	Processos formalizados	Vistorias realizadas
2012	21	7
Janeiro 2013	8	-
Fevereiro 2013	11	15
Março 2013	1	8
Abril 2013	1	10
Mai 2013		
Total	42	40

Notas:

T1 = Σ do número de dias observados entre a data de formalização do pleito (mesma data da formalização do processo) e a data da vistoria.

N = Número de empreendimentos vistoriados no período considerado

- Para efeito de homogeneização, um processo equivale a um pleito.

4.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no semestre} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no semestre}} =$$

$$= \frac{0 \times 100}{96} = 0\%$$

b)Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d)Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e)Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f)Periodicidade: jan-mai/2013

g)Comentários: não há.


h)Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 2,36 % (1º e único Ciclo 2012)

Jul-dez/2012 = 0,00 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

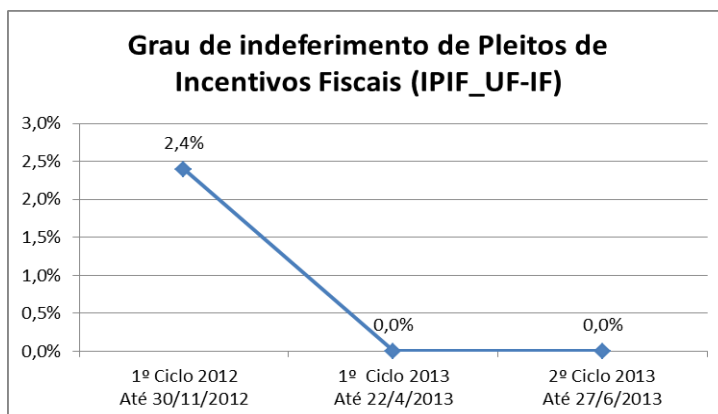

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no semestre e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, no caso, 100% para o período considerado, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Para efeito de homogeneização, um processo equivale a um pleito.

4.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de análises concluídas no período} \times 100}{\text{n}^\circ \text{ de pleitos formalizado no período}} = \frac{96 \times 100}{96} = 100\%$$

Análises Concluídas: 96 processos diversos, sendo 42 de redução do imposto de renda, 40 pleitos de isenção do AFRMM, 12 de reinvestimento e 2 de transferência de benefício concedido anteriormente.
Pleitos Formalizados: 96 processos diversos

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vitorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: no período, foram concluídas 96 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 100% dos pleitos ingressados.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 77,16 %. (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 90,00% (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica



Nota:

- Para efeito de homogeneização, um processo equivale a um pleito;
- Pleito protocolado é o mesmo que pleito formalizado.

4.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

a) Fórmula:
$$T1 = \frac{6.500 \text{ dias}}{96 \text{ pleitos formalizados}} = 67,7 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (média): Quanto menor melhor

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: semestral

g) Comentários: o prazo médio observado, de **67,7 dias/pleito** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros cinco meses de 2013 (96). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 76 dias/processo, sendo de 30 dias para os processos de isenção do AFRMM e de reinvestimento.

Em igual período de 2012 o prazo médio observado foi de **82,5 dias/pleito**.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 53,86 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 52,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

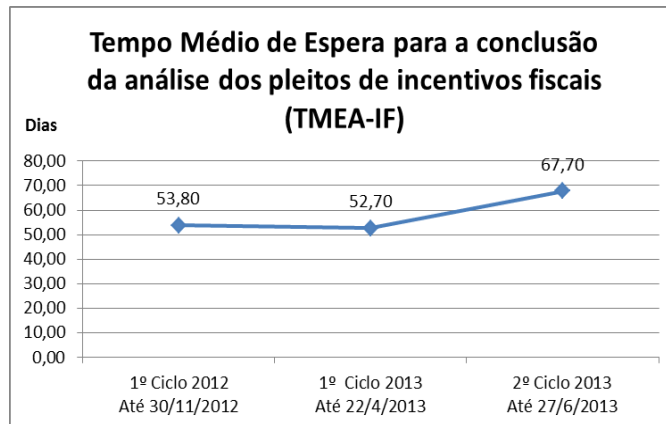

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

Notas:

- Para efeito de homogeneização, um processo equivale a um pleito.

- Pleito protocolado é o mesmo que pleito formalizado.

4.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{96}{10} = 9,6$ análises/técnico

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: o número observado, de 9,6 análises por técnico, é a nosso ver mais que satisfatório se levarmos em conta, além do período de férias de junho, o número de dias gastos com a realização das vistorias uma vez que é o mesmo servidor que formaliza o processo, realiza a vistoria e complementa o exame do processo.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 12,7 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 14,4 análises/técnico (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

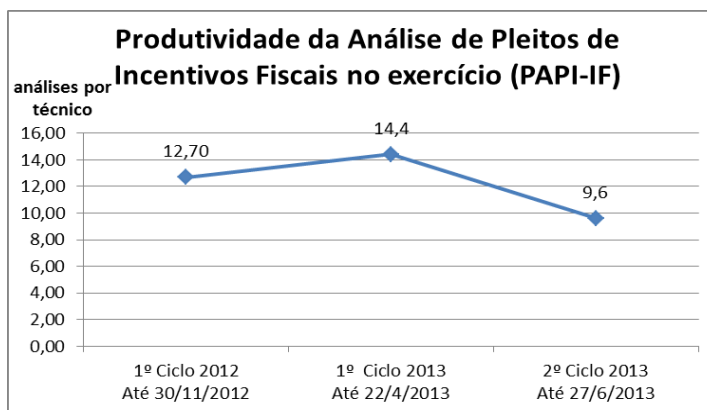

4.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{40}{5} = 8$ vistorias/equipe

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 40 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 12,4 vistorias/equipe. (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 18,2 vistorias/equipe (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

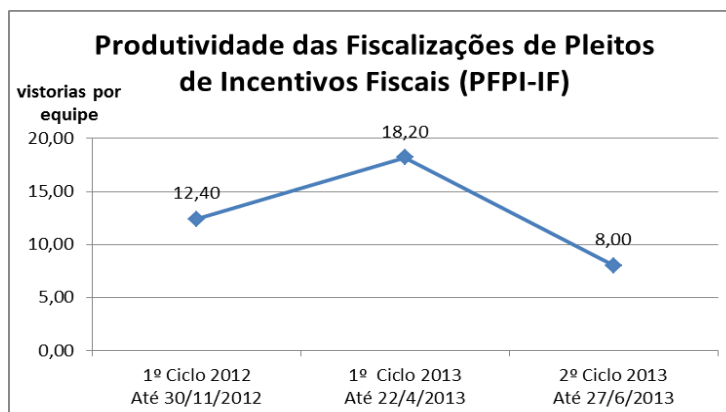

Nota:


Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

5 – Indicadores de Gestão de Convênios

5.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0 \%$$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- f) Período de aferição: jan-mai/2013.
- g) Comentários: Não houve apresentação de pleitos.
- h) Resultados Anteriores (CAPC):
 Dez/2011 = 100,0 %
 Jan a nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012)
 Jan a dez/2012 = 65,6 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

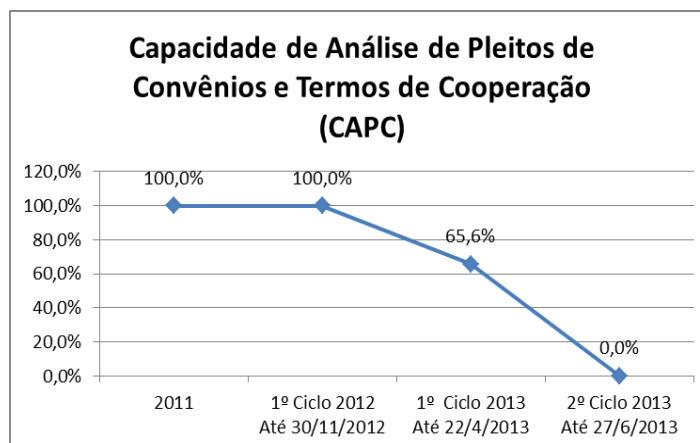

Nota:

A Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN) informa que no período de jan a 31/mai/2013 não teve nenhuma análise de projetos uma vez que após a publicação da LOA, iniciou no dia 04/05 o Chamamento Público que se estendeu até 03/05 e foi prorrogado até 18/05/13. Cabe lembrar que esta é uma etapa precedente ao acolhimento de pleitos via SICONV. Também não recebeu nenhum pleito /projeto fora SICONV nem efetuou nenhuma viagem de fiscalização no período.

As unidades da Diretoria de Planejamento também não analisaram ou protocolaram pleitos para fins de celebração de convênios.

5.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0 \%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período da aferição: jan-mai/2013

g) Comentários: Não houve apresentação de pleitos.


h) Resultados Anteriores (CPCA):

Dez/2011 = 14,6 %

Jan a nov/2012 = 21,74 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 38,6 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

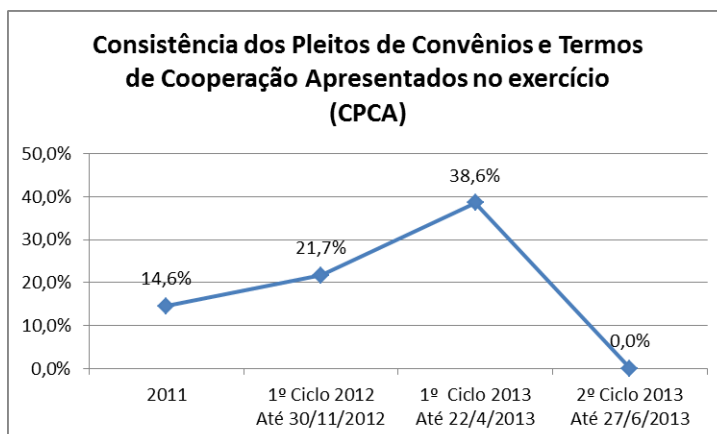

Nota:

A Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN) informa que no período de jan a 31/mai/2013 não teve nenhuma análise de projetos uma vez que após a publicação da LOA, iniciou no dia 04/05 o Chamamento Público que se estendeu até 03/05 e foi prorrogado até 18/05/13. Cabe lembrar que esta é uma etapa precedente ao acolhimento de pleitos via SICONV. Também não recebeu nenhum pleito /projeto fora SICONV nem efetuou nenhuma viagem de fiscalização no período.

As unidades da Diretoria de Planejamento também não analisaram ou protocolaram pleitos para fins de celebração de convênios.

5.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{0 \times 100}{0} =$$

$$= 0 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período da aferição: jan-mai/2013

g) Comentários: Não houve apresentação de pleitos. A Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN) informa que no período de jan a 31/mai/2013 não teve nenhuma análise de projetos uma vez que após a publicação da LOA, iniciou no dia 04/05 o Chamamento Público que se estendeu até 03/05 e foi prorrogado até 18/05/13. Cabe lembrar que esta é uma etapa precedente ao acolhimento

de pleitos via SICONV. Também não recebeu nenhum pleito /projeto fora SICONV nem efetuou nenhuma viagem de fiscalização no período.

As unidades da Diretoria de Planejamento também não analisaram ou protocolaram pleitos para fins de celebração de convênios.


h) Resultados Anteriores (IIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 13,04 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 74,6 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica



Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

5.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula:
$$\left(\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \right) = \frac{0 \times 100}{0} = 0 \%$$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período da aferição: jan-mai/2013

g) Comentários: Não houve fiscalizações no período.


h) Resultados Anteriores (DFCON):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = não informado pela unidade. (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 100 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica



Nota:

O número de fiscalizações realizadas no exercício normalmente é afetado pelas disponibilidades financeiras para diárias e passagens ou por possíveis atrasos de documentação a ser apresentada pelo conveniente, porém no período não houve fiscalizações.

5.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{0 \text{ dias}}{0 \text{ pleitos}} = 0 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado ideal (dias/pleito): (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: Não houve ingresso de pleitos para convênios no período. Encontra-se em andamento o processo de Chamamento Público que será disponibilizado até 14/06/13 no SICONV.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = 13,8 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 13,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

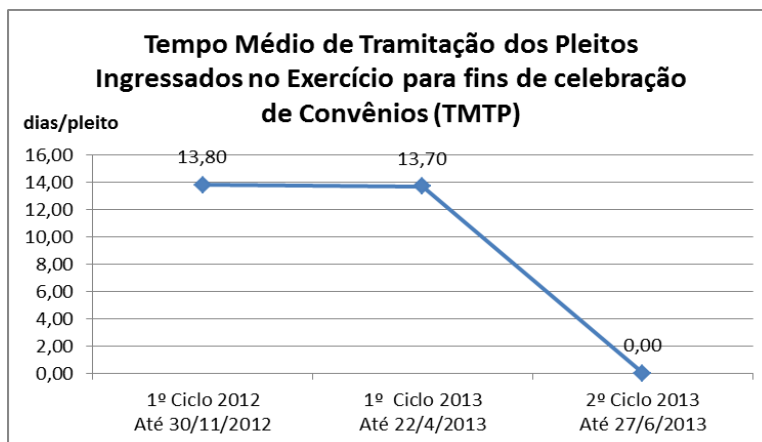

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.
- Embora o exercício seja a referência adotada, a aplicação do indicador poderá ser semestral.

5.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

- a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{0 \text{ dias}}{0 \text{ pleitos}} = 0 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- d) Resultado ideal (dias/pleito): (quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- f) Periodicidade: jan-mai/2013
- g) Comentários: Não houve ingresso de pleitos para Termos de Cooperação no período


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = Não existia o indicador (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = Não existia o indicador (1º Ciclo 2013).

i) Representação gráfica

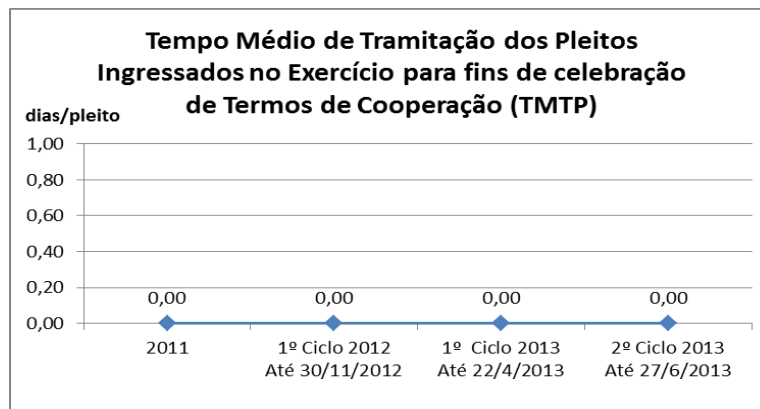

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.
- Embora o exercício seja a referência adotada, a aplicação do indicador poderá ser semestral.

5.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"}}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} \times 100 = \frac{39 \times 100}{41} = 95,1\%$$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre. Se subtraído de 1 esse resultado revelará o quanto de prestações de contas, em percentual, se tem na condição de “A Aprovar” no final do período considerado.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado Ideal (%) :100% (Quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: A SUDENE vem reduzindo, de forma significativa o passivo dos Convênios, no entanto os processos aqui citados são Convênios celebrados pelas extintas SUDENE e ADENE, ou seja, fazem parte do passivo oriundo desses órgãos, onde na época não foram tomadas as providências internas e externas necessárias ao encerramento das avenças, desde 2009, estamos adotando, dentro do possível, as providências necessárias ao encerramento das avenças: emissão de Laudo Técnico, emissão de Análise Financeira e Notificação aos convenentes, entretanto temos dificuldade de pessoal.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = não existia o indicador.

Jan a out/2012 = não foi apurado. (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 80,4 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica



5.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"} \times 100}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} = \frac{5 \times 100}{7} = 71,4\%$$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre. Se subtraído de 1 esse resultado revelará o quanto de prestações de contas, em percentual, se tem na condição de “A Aprovar” no final do período considerado.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: jan-mai/2013

g) Comentários: Os convênios são regulamentados pelo Decreto 6170/07 e pela Portaria 127/08, onde os procedimentos de celebração, execução e prestação de contas foram realizados no SICONV.


h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = 92,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 75 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

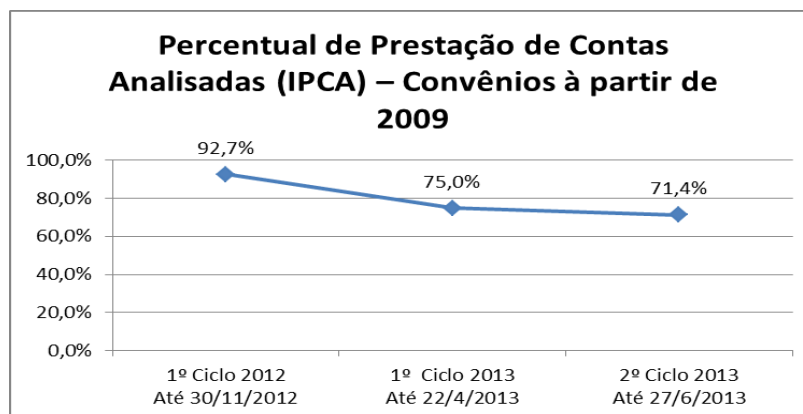

6 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

6.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{33 \times 100}{185} = 18\%$$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de recursos humanos para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CRH/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período da aferição: jan-mai/2013

g) Comentários: O Plano de Capacitação está sendo realinhado, tendo em vista que o levantamento de capacitação não correspondeu ao objetivo almejado, prejudicando o planejamento da capacitação.


h) Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2012 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 71,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,65 % (1º Ciclo 2013)


i) Representação gráfica

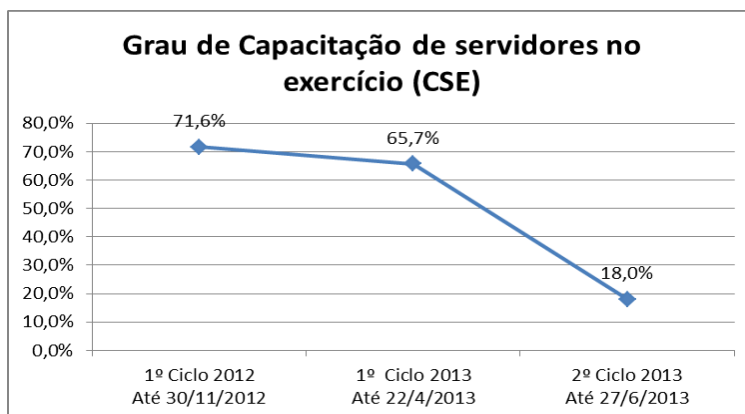

6.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{15 \times 100}{90} = 17\%$$
- b) Objetivo: Complementa o indicador CSE e se destina a aferir a meta estabelecida pela unidade de Recursos Humanos quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período, que pode ser o mês, o semestre ou o exercício.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CRH/CGAF).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- f) Período da aferição: jan-mai/2013
- g) Comentários: Aplicam-se os mesmos do item anterior.
- h) Resultados Anteriores (DCE):
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Jan-nov/2012 = 66,7 % (1º e único Ciclo 2012)
 Jan a dez/2012 = 80,0 % (1º Ciclo 2013)


i) Representação gráfica

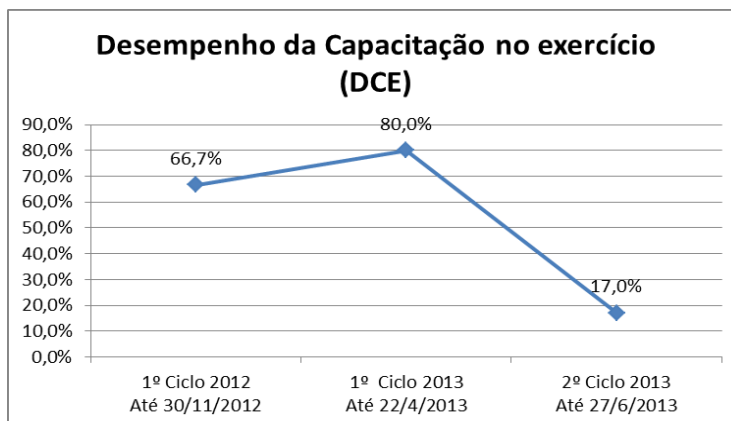

6.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{42.471,65 \times 100}{500.000,00} = 8,49\%$$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil, também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CRH/CGAF).
- d) Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- f) Periodicidade: jan-mai/2013
- g) Comentários: Aplicam-se os mesmos do item anterior.
- h) Resultados Anteriores (NIC):
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Jan-nov/2012 = 27,8 % (1º e único Ciclo 2012)
 Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

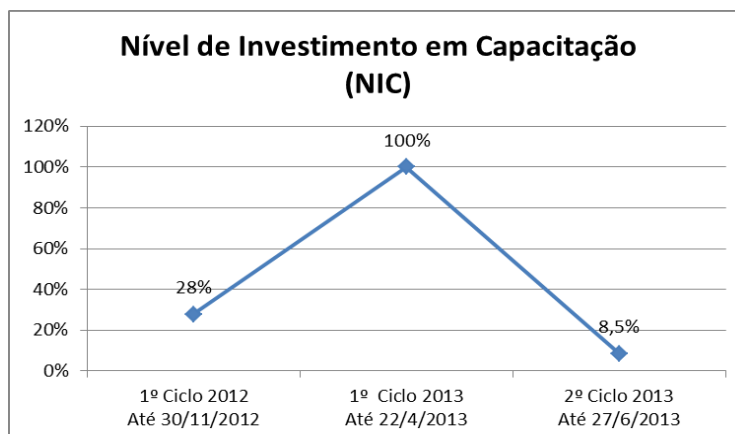

7 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE

7.1 – Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{60\% + 20\% + 83\% + 11,67\%}{4} = 43,67\%$$

b) Objetivo: Aferir o estágio de execução dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Data da aferição: 27/jun/2013

g) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (60 %); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (20%-detalhamento revisto das etapas da obra); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (83%-detalhamento revisto das etapas da obra); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (11,67%-detalhamento revisto das etapas da obra). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.


h) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 (4 projetos) = 33,9 % (resultado influenciado pelo detalhamento revisto desses projetos) (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

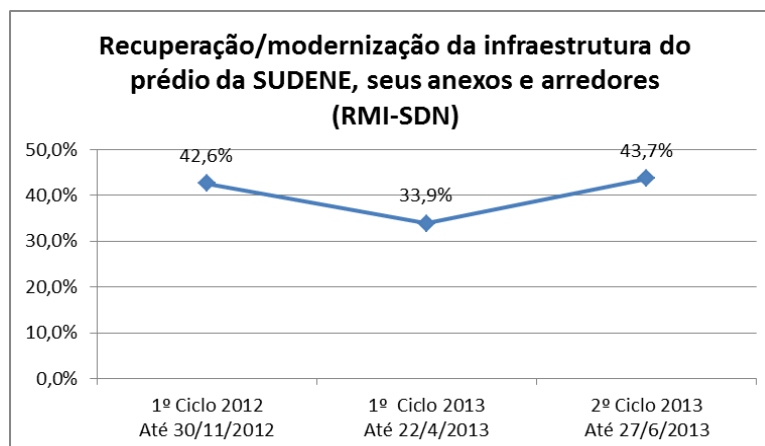

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é dado pela média aritmética global apontada no respectivo Plano Operativo interno.

² O resultado apresentou-se menor que no relatório anterior em razão da incorporação de etapas que haviam sido inicialmente suprimidas em dois dos Planos Operativos dessas obras.

³ Com o quinto projeto: Recuperação das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE entre o 7º ao 12º andares (8 %), o percentual do indicador cai para 28,53 %.

7.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}}$

$$\frac{(1.381.023,82+30.000,00+4.238.554,76+70.000,00) \times 100}{2.138.556,06+30.000,00+7.268.165,04+30.000,00} = 60,42\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para os projetos relacionados com a infraestrutura da SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF)

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 27/jun/2013

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (R\$ 1.381.023,82 e novo limite autorizado acumulado=R\$ 2.138.556,06); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (montante aplicado acumulado=R\$ 30.000,00 e limite autorizado acumulado=R\$ 30.000,00). f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (montante aplicado acumulado=R\$

4.238.554,76 e limite autorizado acumulado=R\$ 7.268.165,04); f.4) modernização das subestações elétricas do Edif. SUDENE (montante aplicado acumulado=R\$ 70.000,00 e limite autorizado acumulado=R\$ 30.000,00-valor reduzido após nova comprovação). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).


g) Resultados Anteriores (ORMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 48,5 % (1º Ciclo 2013)

h) Representação gráfica

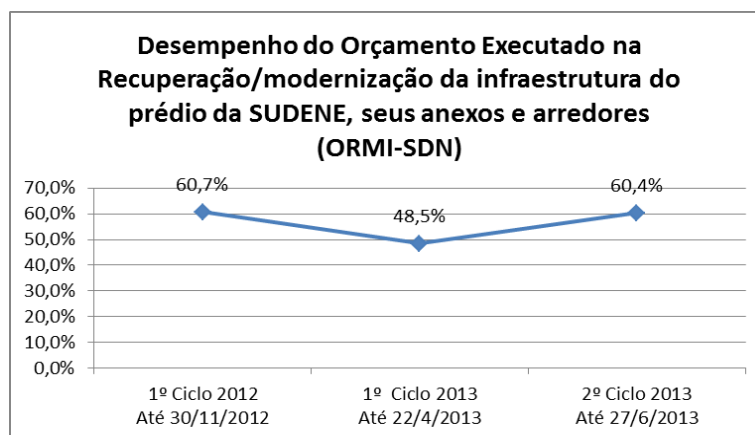

Nota:

Os projetos de Recuperação das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE e de recuperação dos estacionamentos foram transferidos para o ano de 2014 por questões de limitação do quadro de supervisão técnica.

8 – Indicadores de Gestão dos Projetos Estratégicos da SUDENE

8.1 – Modernização/ampliação/melhoria da estrutura econômica e social da área de atuação da SUDENE (MES)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc. executados dos projetos =

$$\frac{18,89\% + 69,40\% + 19,44\%}{3} = 35,91\%$$

b) Objetivo: Aferir o estágio de execução dos projetos estratégicos para o desenvolvimento regional.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento (Adonis Oliveira); Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (Maria Helena); e, Técnica em Assuntos Educacionais, da Diretoria de Planejamento (Albertina Pereira) sob supervisão da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

- e) Período da aferição: e.1) Malha Aérea Regional (31/mai/13); e.2) Plano Regional de Energia – Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas (31/mai/13); e, e.3) Projeto de Inserção Tecnológica em Educação (31/05/13).
- f) Comentários: Os valores utilizados no cálculo do percentual de execução dos projetos de modernização/ampliação/melhoria da estrutura econômica e social foram obtidos dos planos operativos dos três projetos em andamento pela Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas: f.1) Malha Aérea Regional (18,89%); f.2) Plano Regional de Energia – Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas (69,40%); e, f.3) Projeto de Inserção Tecnológica em Educação (19,44%).

Notas:

¹ Os projetos referenciados são os constantes de Planos Operativos internos que se utilizam de programas do PPA ou de definições estratégicas da Superintendência da SUDENE. E o percentual de execução de cada projeto foi extraído dos percentuais globais apontados no respectivo Plano Operativo interno.


g) Resultados Anteriores (MES):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = 34,3 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 29,6 % (Houve redução do percentual realizado em razão da inserção de etapas que não constavam do primeiro Plano Operativo.) (1º Ciclo 2013)

i) Representação gráfica

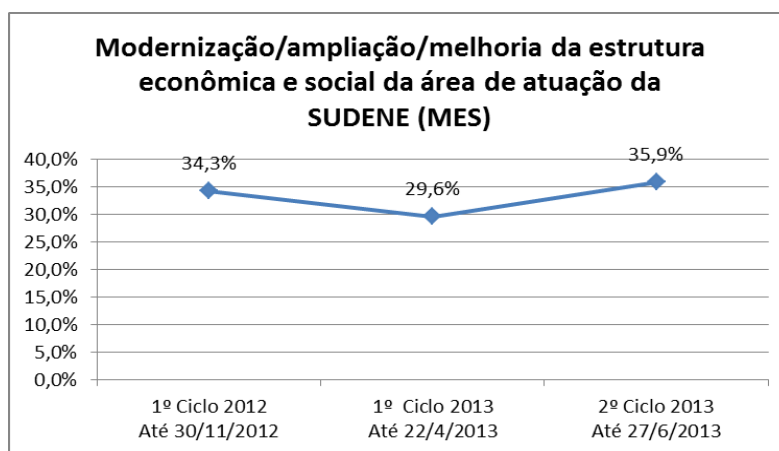

8.2 – Desempenho do Orçamento Executado na modernização/ ampliação/melhoria da estrutura econômica e social da área de atuação da SUDENE (OMES)

a) Fórmula: $\frac{\sum \text{dos montantes aplicados nos Projetos}}{\sum \text{dos limites autorizados para os Projetos}} \times 100 =$

$$= \frac{352.840,00 \times 100}{352.840,00} = 100 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado em função dos limites fixados para os projetos relacionados com a programação de desenvolvimento do exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 31/mai/13.

f) **Comentários:** Até a data da aferição, em relação aos projetos de modernização/ampliação/melhoria da estrutura econômica e social, só havia execução orçamentária para o Convênio objetivando a estruturação do Sistema de Informações Energéticas, celebrado entre a SUDENE e a ATECEL, do projeto do Plano Regional de Energia – Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas.


g) Resultados Anteriores (OMES):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012) (refere-se a liberação apenas para um projeto)

Dez/2012 = 100 % (1º Ciclo 2013) (refere-se a liberação apenas para um projeto).

i) Representação gráfica

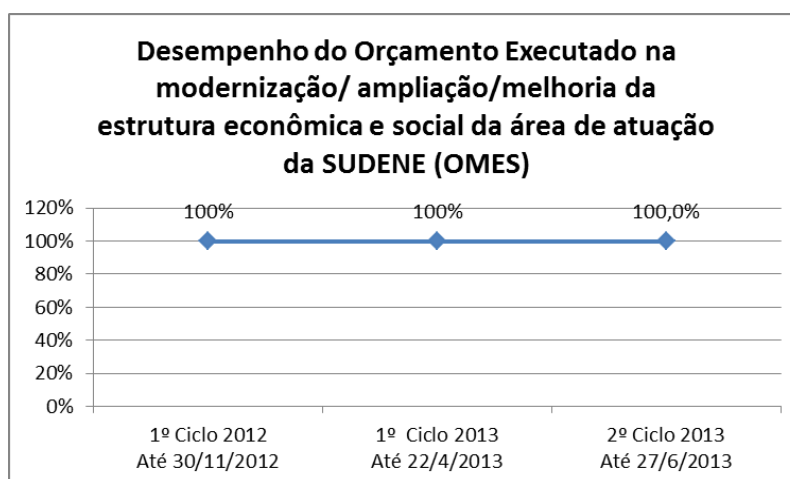

9- Deliberações da Diretoria Colegiada, em plenária de 27/06/2013

Na reunião de monitoramento realizada em 27 de junho de 2013, na presença do Senhor Diretor de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Henrique Tinoco de Aguiar, representando o Senhor Superintendente da SUDENE, Paes Landim, foram deliberadas as seguintes providências, a serem seguidas pelas unidades internas:

- 1- O monitoramento, pela sua importância, deverá ser o guia para a avaliação institucional, avaliação essa que deverá servir como referência no preenchimento dos cargos na nova estrutura da SUDENE;
- 2- O projeto deverá obedecer datas, tanto para a apresentação dos resultados quanto no avanço das etapas, caso contrário o projeto não se justifica;
- 3- Como se trata de uma reunião da equipe de gestão é importante que estejam nela presentes o Coordenador-Geral, os coordenadores e os responsáveis por projetos (inclusive seus suplentes), mas o fato é que o Coordenador-Geral deve dominar o conteúdo de todos os projetos sob sua gestão;
- 4- Que os próximos chamamentos públicos, mesmo não sendo obrigatórios para estados e municípios, sejam preparados de forma que bons projetos possam ser apresentados à SUDENE. Aliás, “escolher bons projetos e responsabilidade da equipe”;
- 5- No caso de desatualizações de preenchimento a AGI deverá cobrar também do Diretor responsável, a superação do problema;

- 6- Pediu aos responsáveis por projetos que sempre que for registrado algum problema em algum projeto, mencione também, a “Ação Corretiva” adotada;
- 7- Que fosse feito o registro da sugestão ao Engº Civil Villeneuve, no sentido de preparar Nota Técnica alinhando sua opinião sobre as surpresas que estão afetando a recuperação do Prédio Anexo Nilo Coelho e influenciando um possível retardo da conclusão das obras para muito além de set/2013;
- 8- O PO 18 – projeto do GDK (FDNE) foi cancelado e será retirado a partir do 3º Ciclo de monitoramento;
- 9- Pedido ao responsável pela AGI, com referência ao PO 34 – Nova Estrutura Regimental da SUDENE, que peça por e-mail à CGPM/DGE/MI, a posição da proposta de novo decreto em tramitação no MPO, verbalizada pela própria área técnica da CGPM/MI em contato telefônico de 26/06/2013 (medida já adotada e retorno da CGPM/DGE feito).
- 10- Com relação ao PO 39, que trata da recuperação das fundações do prédio da SUDENE, e diante das dificuldades criadas pelo TRT para desocupação de áreas foi sugerido preparar ofício destacando a necessidade dessa liberação, com prazo para essa desocupação, questão endossada pelo Chefe de Gabinete, acrescentando que a Diretoria de Administração tem que resolver esse problema junto ao TRT formalmente;
- 11- Sobre os POs 42 e 43 “Reforma das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE (7º ao 12º andares)” e “Recuperação dos Estacionamentos”, respectivamente, foi decidido pelo Diretor de Administração a transferência da execução desses projetos para 2014 e, conseqüentemente, a sua retirada temporária da agenda de monitoramento por razões de limitação orçamentária.
- 12- Com relação ao registro de “Paralisado” no Projeto do PO 44 “Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)” há recomendação da Diretoria de que nenhum projeto considerado estratégico deva ser paralisado, portanto o Chefe de Gabinete, Epitácio Pedrosa Ribeiro da Costa, deverá providenciar a atualização do referido PO que a informação prestada pelo Coordenador Luiz Carlos Dourado não confere com a realidade atestada pelo próprio Chefe de Gabinete, temporariamente respondendo pela Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
- 13- Em relação ao PO 46 – Melhoria da Infraestrutura de Comunicação, foi sugerido conversar com a SUDECO e SUDAM para fazer-se em conjunto, uma sala de vídeo-conferência também no escritório de Brasília.
- 14- Sobre o PO 47 faz-se necessário que a Coordenação de Segurança da Informação ..., apresente o percentual que de fato defina o que foi alcançado.
- 15- Quanto ao PO 48 – Sistema Informatizado de Gestão do FDNE, FDA e FDCO, foi pedido à Coordenação de Segurança da Informação... a atualização do percentual, que deve espelhar o trabalho tripartite (MI+SUDENE+Empresa contratada). Sugere que seja contactada a técnica Edilena no MI.
- 16- Em relação ao PO 50 – Preservação e Disponibilização do acervo do CONDEL da antiga SUDENE, faz-se necessário expandir as etapas e atualizar pois a PRD já se posicionou favoravelmente, e a Diretoria Colegiada já aprovou o projeto, contudo essas etapas não constam.
- 17- A Coordenadora de Gestão e Desenvolvimento de Rh, Ângela Lima deverá preparar PO sobre capacitação. A Coordenadora afirmou que antes precisará fazer um realinhamento da proposta de capacitação tendo em vista que as áreas finalísticas praticamente não atenderam ao pedido de indicação dos temas para capacitação;
- 18- Fazem-se necessárias repactuações de datas (atualização de datas de previsão (início ou fim), realização (início ou fim) e conclusão), para os seguintes projetos:

POs 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 e 11, todos da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável/DPLAN.

PO 15, da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento/DPLAN.

POs 16; 19 e 20, todos da Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento, relacionados a projetos do FDNE/DFIN.

PO 41, que trata da modernização das subestações de energia, sob responsabilidade da Diretoria de Administração.

POs 46 e 48, da Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.

19-Não foi apresentada, apesar de solicitada, a devida atualização do PO 09, que trata de estudos e pesquisas de oleaginosas, sob controle da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento/DPLAN.

O Auditor-Chefe, Paulo Campelo, fêz o seguinte registro:

20-Eventualmente, por mera coincidência, a AUD poderá promover Auditoria sobre indicações contidas no monitoramento ou atendendo pedido de uma Diretoria;

A Procuradora-Chefe Elvira Carrasqueira fez os seguintes registros:

21-A Procuradoria Federal junto à SUDENE está passando por um processo de modificação e o Procurador Federal Thiago está voltando para a SUDENE e nesse contexto de mudanças, até para facilitar a fluidez da emissão de pareceres pediu que as unidades trocassem ideias com a PRD antes de ultimar algum encaminhamento.

22-Destacou, outrossim, que projetos paralisados por questões judiciais poderão receber o apoio da PRD;

23-Quanto a projetos semelhantes com a SUDECO e SUDAM, irá articular com a Consultoria Jurídica do MI e as PRDs dessas vinculadas para uniformizar posicionamentos antes tão díspares;

24-Também pediu que as unidades evitassem o encaminhamento de pedido de pareceres em prazos que muitas das vezes chega a ser muito curto, particularmente para os pleitos da Diretoria de Administração, que sempre chegam com pedido de urgência. Para preventivamente sanar alguns problemas de rotina, que muitas das vezes são resolvidos com simples esclarecimentos, a PRD estará encaminhando manuais e roteiros orientativos que acredita, poderão balizar muitos procedimentos internos.

10 - Conclusão

De forma bastante convergente, o registro das diretorias de gestão de fundos, de planejamento e de administração, além de atribuir importância ao processo de monitoramento, instituído internamente no final de 2012, é de que embora se tratando de um processo recém iniciado, os referidos indicadores já são utilizados para subsidiar as discussões internas, na própria unidade, com possibilidade de, a partir de seus resultados e a médio prazo, produzir-se um benchmark inicial que certamente repercutirá com os dados do primeiro semestre de 2013, e mais, será ainda mais relevante e fundamental para a tomada de decisão, incorporando-se paulatinamente nas agendas de trabalho e tomadas de decisão.

Como se sabe, alguns indicadores, particularmente os de produtividade, são capazes de sinalizar a situação do que foi realizado em relação ao planejado. Nestes casos, adquirem conotação de ferramenta explícita para o realinhamento de estratégias. É o caso dos registros a seguir.

De acordo com a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, “os indicadores que servem à capacitação, possibilitam avaliar os resultados planejados e direcionam para o replanejamento, ou mesmo, para reflexões acerca dos êxitos e impasses no processo de gestão da unidade dentro do tema monitorado, ou ainda, no direcionamento do nível de desenvolvimento da capacidade técnica, gerencial e operacional da SUDENE”, e resume, “seus resultados também funcionam como “lentes” para a concepção do perfil de pessoal da Autarquia, oferecendo ranks”.

Já para a unidade de Engenharia, da Diretoria de Administração, a leitura é mais ampla, e abriga tanto o plano operativo, instrumento que integra o monitoramento, como o indicador, que consolida os resultados dos planos operativos trabalhados pela unidade. Segundo ela, “o instrumento “Plano Operativo”, que subsidia as informações utilizadas no cálculo de tais indicadores de gestão, têm sido uma excelente ferramenta de planejamento das atividades técnicas desta área [...], com o qual temos procurado aperfeiçoar as ações e o emprego dos recursos públicos alocados para nossa administração”. Isto se dá por que os indicadores que servem a isto, consolidam, por meio de um único percentual da evolução física das medidas administrativas adotadas na condução das obras, chamar a atenção do gestor para o andamento normal ou o retardo do conjunto das execuções, fazendo-o “se debruçar” nos quadros do monitoramento para verificar o que está ocorrendo.

ANEXO I

Quadros do Monitoramento

Planos Operativos de projetos apoiados por convênios, exclusive Termos de Cooperação	(6)
Planos Operativos de Projetos Estratégicos	(3)
Planos Operativos de Projetos do FDNE	(19)
Planos Operativos de Obras e Serviços no Prédio da SUDENE	(6)
Planos Operativos de Modernização/Melhoria da Gestão	(16)
Total	(50)



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 01
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo e	
Finalidade da ação:	Apoiar a organização social de atores, visando à gestão compartilhada do desenvolvimento, estimulando a sinergia de ações, o comprometimento e a capacidade de identificação e o encaminhamento de demandas, por meio da formação de capital social, ...; ampliar a viabilidade e a sustentabilidade das atividades produtivas, fortalecendo o associativismo e (ou) o cooperativismo como opções de organização social e produtiva. Ampliar as oportunidades de acesso ao mercado e ao desenvolvimento do APL em que as cooperativas e associações estão envolvidas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almir Moreira Pinto	
Problema (causa):	Organização social, frágil; Mercado restrito.			
Projeto:	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.			
Objetivo do projeto:	Fortalecer a organização social, criar uma rede de comunicação entre as associações de Apicultores dos munic. principais produtores Cadeia do Mel-Meso do Araripe, visando para ampliar oportunidades de inserção produtiva.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros		
					CONCEDENTE	CONVENIENTE	PERÍODO	TOTAL	Pago até o ano anterior (em 2012)	R\$	
	250	GND 3	30	133.269,00	74.838,00	4.486,00	NOV-DEZ	79.324,00	Pago até o ano anterior (em 2012)	R\$	74.838,00
				T = 126.368,00 + 6.901,00	40.962,00	1.725,00	DEZ-JAN	42.687,00	A realizar no exercício (2013)	R\$	51.530,00
					10.568,00	690,00	FEV-MAR	11.258,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$	126.368,00
					126.368,00	6.901,00	-	133.269,00	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$	126.368,00
									Valor liberado no Exercício (2013)	R\$	-
									Saldo a liberar (2013)	R\$	51.530,00
									Saldo a Empenhar no exercício (2013)	R\$	-
									Total Liberado até o exercício (2013)	R\$	74.838,00

Previsão de Conclusão:	18/08/2013
Data Atualização:	31/05/2013

CONVÊNIO Nº 771203/2012 (Proposta SICONV 027116/2012)

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Maria do Socorro Vilar - SUDENE / Gliedson Alves e Paulo da Fonte - CONDEPE/FIDEM
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	03/04/2012		20/03/2012	03/04/2012		100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	05/04/2012	19/04/2012		05/04/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS - ASCOM	10/05/2012	14/05/2012		10/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
5	Divulgação Chamamento - Prorrogação	CGDS/SUDENE	25/05/2012	31/05/2012		25/05/2012	31/05/2012		100%	Concluído		
6	Análise técnica	CGDS/SUDENE	01/06/2012	15/06/2012		01/06/2012	15/06/2012		100%	Concluído		
7	Resultado do Chamamento - prorrogação	CGDS - ASCOM	19/06/2012	29/06/2012		19/06/2012	29/06/2012		100%	Concluído		
8	Análise técnica e parecer	CGDS/SUDENE		07/07/2012			29/06/2012		100%	Concluído		
9	Etapas de formalização do convênio	CGC - COCF - PRD				29/06/2012	18/10/2012		100%	Concluído		
10	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					18/10/2012		100%	Concluído		
11	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					30/10/2012		100%	Concluído		
12	Liberção da primeira parcela	SUDENE	30/10/2012	30/10/2012	74.838,00	30/10/2012	14/12/2012	74.838,00	100%	Concluído		
13	Realização do processo de cotação e licitação.	CONDEPE/FIDEM							100%	Concluído		

15	Meta 1: Capacitar 140 Apicultores em Associativismo (R\$ 79.324,00)	CONDEPE/FIDEM	19/05/2013	15/06/2013								Em Andamento	* Previsão de início e término reprogramado em razão de ajuste no plano de trabalho após aditivo de prazo. Aguardando conclusão do proc. Licitatório e contratações. A meta terá início após contratação de serviço. O Plano de Trabalho foi ajustado em função do aditivo que prorrogou a vigência até 18/08/2013. Destaca-se que foi encaminhado, em 03/05/2013, o Ofício Nº 002/2013 - DPLAN/SUDENE, ao presidente da CONDEPE/FIDEM, Dr. Maurílio Soares de Lima, solicitando informação sobre as medidas adotadas referentes ao processo de licitação e contratação prevista. Em resposta, foi enviado a esta SUDENE o Ofício CONDEPE/FIDEM Nº 124/2013-PRE, informando que a instauração do processo licitatório foi submetida à autorização prévia do Secretário Executivo de Administração do Estado de Pernambuco, tendo em vista o atendimento ao disposto no Decreto Estadual Nº 39.081 de 25/01/2013 e encontra-se aguardando retorno da citada Secretaria.		
16	– Mobilização Social	CONDEPE/FIDEM											Atrasado		
17	– Realizar 7 oficinas (Associativismo / Cooperativismo) p/ 140 Apicultores associados = 20 associados x 7 associações	CONDEPE/FIDEM											Atrasado		
20	Meta 2: Capacitar 140 Apicultores em Formação de Redes de Comunicação (R\$ 42.687,00)	CONDEPE/FIDEM	26/01/2013	17/02/2013									Atrasado	Repactuar datas previsto e realizado.	
21	– Realizar 07 oficinas sobre Formação de Redes de Comunicação												Atrasado		
24	Meta 3: Realizar 1 Seminário Temático sobre Formação de Redes de Comunicação p/140 Apicultores (R\$ 11.258,00)	CONDEPE/FIDEM	18/02/2013	18/03/2013									Atrasado	Repactuar datas previsto e realizado.	
18	* Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE		A definir									Atrasado		
19	Liberação da segunda parcela		01/07/2013	30/07/2013	40.962,00								A Iniciar		
22	* Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE		A definir									A Iniciar		
23	Liberação da terceira parcela	CONDEPE/FIDEM	01/08/2013	30/08/2013	10.568,00								A Iniciar		
25	- Realizar seminário temático; diagnóstico - potencialidades/desafios com vistas a construção de uma Rede de comunicação (Plano)	CONDEPE/FIDEM											A Iniciar		
26	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE											A Iniciar		
					Valor Previsto:	126.368,00	Valor realizado:	74.838,00	52%	Atrasado	Status do Projeto				

Parceiros institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

a) 2º Ciclo 2013

obs.: faz-se necessário a repectuação para registro da data de conclusão do projeto.

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 006/2012 / Programa: 5320320120015. Enviada para análise em 31/05/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 29/06/2012, seguindo nessa data p/ CGC/DAD. Retornou à CGDS em meados de julho para indicação dos técnicos responsáveis, devolvido no dia seguinte c/ Mem. informando responsáveis.(...) Data de assinatura: 18/10/2012. Publicação DOU: 30/10/2012. Depósito da contrapartida realizado em 29/11/2012. Liberação da 1ª parcela: 14/12/2012, após novo ajuste do PT. Solicitado, analisado e aprovado aditamento da vigência do convênio, para recomposição de prazo; cf. 1 TA, de 18/03/2013, vigência prorrogada até 18/08/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (M):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (M):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	246.426,82

Previsão de Conclusão:	18/07/2013	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012) Vigência: 18/12/12 a 18/07/13
Data Atualização:	31/05/2013	

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Mês	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício (2013)	R\$ -
139.865,15	7.361,32	abril	147.226,47	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 234.105,49
94.240,34	4960,01	junho	99.200,35	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 234.105,49
234.105,49	12.321,33		246.426,82	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2013)	R\$ 234.105,49
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável (e)(is) técnico(s) pelo Projeto	Juliana de Melo Borges e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Glieldson Alves da Silva - CONDEPE/FIDEM
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012			11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE		07/08/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013			02/01/2013		100%	Concluído		
8	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2012	30/04/2013	139.865,15	17/04/2013	30/4/213		50%	Atrasado	Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Aguardando liberação de restos a pagar pelo MI desde do dia 10/05.	Repactuar datas previsto e realizado.

9	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	fev/13							Atrasado	Processo de licitação em fase de cotação de preços. De acordo com o projeto, a licitação tem a previsão de dois meses.	Repactuar datas previsto e realizado.
10	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/12/2012	18/07/2013							Atrasado	As metas só serão iniciadas após conclusão de processo licitatório de contratação de serviço. Desta maneira, os cronogramas das metas serão ajustados.	
11	Proposta metodológica e mobilização social (R\$ 42.879,89)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/12/2012	17/01/2013							Atrasado		Repactuar datas previsto e realizado.
12	Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/01/2013	17/03/2013							Atrasado		Repactuar datas previsto e realizado.
13	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/06/2013	30/06/2013	94.240,34						Atrasado		
14	Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/03/2013	17/05/2013							Atrasado		Repactuar datas previsto e realizado.
15	Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM/ SUDENE	18/05/2013	18/07/2013							Atrasado		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE		18/07/2013							Atrasado		
			Valor Previsto:	234.105,49	Valor realizado:				50%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

2º Ciclo - 2013 - SUDENE.



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 03
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, conseqüentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	589.425,00

T = 530482,50 + 58942,50

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
265.241,25	58.942,50	DEZ/2012	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 530.482,50
265.241,25	--	MAIO/2013	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 530.482,50
530.482,50	58.942,50	-	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 530.482,50
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 530.482,50
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	12 meses após 1ª liberação
Data Atualização:	07/06/2013

CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Ferreira da Silva e Maria do Socorro R. Morais Vilar - SUDENE
	Conveniente	Sérgio de Azevedo Mendonça e Maria das Graças Sobreira de Moura - SEMAS/PE

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico								100%	Concluído		
2	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
3	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012			11/05/2012		100%	Concluído		
5	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
6	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
7	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE		28/12/2012			28/12/2012		100%	Concluído		
8	Publicação do convênio	CGC/SUDENE		03/01/2013			03/01/2013		100%	Concluído		
9	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/12/2012	30/12/2012	265.241,25					Atrasado	<p>Conforme documentos anexados ao processo físico, a instituição conveniente informou que efetuou o depósito da contrapartida no dia 02/04/2013. Entretanto, o momento, não é possível localizar esta operação no SICONV, nem no SIAFI, apesar de todo o esforço demonstrado pelas frequentes mensagens eletrônicas enviadas pela representante da SEMAS/PE, para os técnicos da Caixa Econômica Federal (CEF), do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), no intuito de solucionar esta pendência.</p>	<p>Uma vez que a articulação apenas em nível técnico, como vinha ocorrendo, não surtiu os efeitos esperados, principalmente no que se refere à CEF, foi enviado, em 07/06/2013, para o Secretário da SEMAS/PE, Dr. Sérgio Xavier, o Ofício Nº 005/2013 - DLAN/SUDENE, solicitando deste providências mais efetivas e definitivas, com a articulação e acionamento das demais instituições envolvidas, para a solução do problema que vem impedindo e atrasando o início dos trabalhos deste projeto. Repactuar datas previsto e realizado.</p>

10	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE									Atrasado		
11	Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco (R\$ 356.560,00)	SEMAS/PE	17/12/2012	16/12/2013							Atrasado		
12	– Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano (R\$ 146.400,00)	SEMAS/PE	17/01/2013	16/05/2013							Atrasado		
13	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Definir								A Iniciar		
14	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/05/2013	30/05/2013	265.241,25						A Iniciar		
15	– Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto (R\$ 176.960,00)	SEMAS/PE	17/05/2013	16/08/2013							A Iniciar		
16	– Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da C34 Desertificação na Região Nordeste (R\$ 33.200,00)	SEMAS/PE	17/11/2013	16/12/2013							A Iniciar	Início da execução das Metas e respectivas Etapas está condicionado aos anteriores.	Repactuar datas previsto e realizado.
17	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco (R\$ 232.865,00)	SEMAS/PE	17/12/2012	16/12/2013							A Iniciar		
18	– Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas (R\$ 182.865,00).	SEMAS/PE	17/12/2012	16/12/2013							A Iniciar		
19	– Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas (R\$ 50.000,00)	SEMAS/PE	17/11/2012	16/12/2013							A Iniciar		
20	*Realização de visita para emissão de Laudo/Parecer Técnico Final	CGDS/SUDENE									A Iniciar		
			Valor Previsto:	530.482,50	Valor realizado:	40%	Atrasado	Status do Projeto					

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJUPE.

Observações:

a) N.E. - N° da etapa; b) 2º Ciclo 2013

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 04
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.		
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
					Concedente	Conveniente	Liberação	Total	Pago até o ano anterior (2012)	
	100/250	GND 3 e 4	30	771.621,32	419.104,63	77.162,13	dez/12	496.266,76	A realizar no exercício (2013)	R\$ 419.104,63
					137.677,28	--	jan/13	137.677,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	R\$ 275.354,56
					137.677,28	--	abr/13	137.677,28	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 694.459,19
					694.459,19	77.162,13	-	771.621,32	Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
Previsão de Conclusão:	17/10/2013	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)								
Data Atualização:	31/05/2013									
Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Marcélio de Castro Viana e Victor Uchôa Ferreira da Silva - SUDENE/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco (SARA/PE)									
									Saldo a liberar (2013)	R\$ 275.354,56
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
									Total Liberado até o exercício	R\$ 419.104,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012			100%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012			100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		10/05/2012			10/05/2012			100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012			100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012			100%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012			18/10/2012				100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012			26/10/2012				100%	Concluído	
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	12/12/2012		419.104,63	12/12/2012	12/12/2012	419.104,63		100%	Concluído	
9	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE									Atrasado	O conveniente está elaborando o Edital de Licitação para posterior publicação.
10	Meta 1: Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores (R\$ 112.588,20)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013							Atrasado	
11	Meta 2: Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores (R\$ 108.324,00)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013							Atrasado	
12	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/01/2013	30/01/2013							Atrasado	Repactuar datas previsto e realizado
13	Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	30/01/2013	137.677,28						Atrasado	
14	Meta 3: Adquirir 540 colméias Langstroth. (R\$ 346.006,40)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013							Atrasado	
15	**Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Definir								Atrasado	
16	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/04/2013	137.677,28						Atrasado	Repactuar datas previsto e realizado

17	Meta 4: Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrífuga extratora de mel, Mesa desoperculadora de favos e Tanque decantador para mel (R\$ 204.702,72)	SARA/PE	18/12/2012	17/10/2013							Atrasado
18	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A Definir								Atrasado
			Valor Previsto:	694.459,19	Valor realizado:	419.104,63	44%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.			
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250 e 100	3330.41	30	R\$ 2.000.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Mês	TOTAL		
732.887,59	79.238,97	nov	812.126,56	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 732.887,59
527.102,12	67.204,78	reprog	594.306,90	A realizar no exercício (2013)	R\$ 1.061.708,34
534.606,22	58.960,32	reprog	593.566,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 1.794.595,93
1.794.595,93	205.404,07	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 1.794.595,93
				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.061.708,34
				Saldo a Empenhar no exercício (2013)	R\$ -
				Total Liberado até o exercício (2013)	R\$ 732.887,59

Previsão de Conclusão:	07/12/2013
Data Atualização:	31/05/2013

CONVÊNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Juliana de Melo Borges - SUDENE / Gustavo Nogueira e Roberto Alves de Araújo - SEPLAG-PB
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor (SUDENE)	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/12	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/12	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012			11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/12	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/12	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE		18/12/2012			18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE		02/01/2013			02/01/2013		100%	Concluído		
8	Regularização de conta bancária e contrapartida	COF/SUDENE		23/11/2012			23/11/2012		100%	Concluído		
9	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	732.887,59	01/11/12	30/11/2012	732.887,59	100%	Concluído		
10	Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/13			50%	Em Andamento	Edital da licitação (nº 001/2013) registrado na CGE-Controladoria Geral do Estado, sob n.º 13-00476-0 e publicado em 23/04/2013, nos jornais: A União; Correio da Paraíba; Jornal da Paraíba; Diário Oficial do Estado da Paraíba e Diário Oficial da União, segundo informações da SEPLAG em 09/05/13. A data prevista para o recebimento das propostas é 18/06/2013.	Governo do Estado solicitou prorrogação da vigência do convênio para 31/12/13, alegando que o atraso na execução e na licitação decorreu do fechamento dos sistemas orçamentários e de licitação no final do exercício de 2012 e 2013. Procuradoria questiona esclarecimentos sobre a não execução durante os cinco meses de vigência do projeto e recomenda a não realização do Termo Aditivo caso não haja um posicionamento do Conveniente que justifique a não execução. Parecer da procuradoria não está no SICONV. Governo do Estado esclareceu atraso, apresentando justificativas por meio do Ofício n.º 303/GS/SEPLAG em 01/04/13. Termo Aditivo foi assinado em 05/04/13 com vigência até 31/12/13.

11	Estruturação do Plano Estratégico da Micrologística do Transporte de Cargas do Estado da Paraíba (R\$ 274.617,39)	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar	Prazos das etapas serão incluídas, após análise de novo cronograma físico. As metas só serão iniciadas após conclusão de processo licitatório que contrata empresa(s) para realização dos planos.	Foi realizada reunião em 31/01/13 na qual foi acordada atualização do cronograma físico detalhado a ser enviado pela SEPLAG no final de fevereiro. SEPLAG encaminhou em 15/03/13 cronogramas físico e de desembolso. A partir da prorrogação da vigência do convênio para 31/12/13, os cronogramas serão atualizados no SICONV. Repactuar datas previsto e realizado.	
12	Diagnóstico das cadeias produtivas paraibanas	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
13	Diagnóstico da infra-estrutura da logística do transporte de cargas do estado da Paraíba	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
14	Priorização dos Projetos Estratégicos Micrologísticos para o estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
15	Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial do Estado da Paraíba (R\$ 463.979,98)	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
16	Avaliação do Potencial Econômico das Cadeias Produtivas	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
17	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir											
18	Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	A definir			527.102,12								
19	Estudo de Mercado dos Produtos Priorizados	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
20	Priorização dos cinco Produtos-Chaves	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
21	Elaboração de um Plano de Implementação	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
22	Plano Estratégico de Energia do Estado da Paraíba (R\$ 298.553,40)	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
23	Avaliação da Situação Atual do Suprimento e Distribuição de Energia da Paraíba	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
24	Avaliação das necessidades energéticas da Paraíba	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
25	Avaliação dos "gaps" e priorização dos investimentos em energia na Paraíba.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
26	Plano Estratégico de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação (R\$ 380.603,91)	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
27	Verificar estado atual de TIC do Estado da Paraíba e estimar oferta de serviços.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
28	Identificar prioridades e demandas do plano de desenvolvimento industrial e logístico e mapear necessidades futuras de TIC.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
29	Explicitar lacunas entre necessidades projetadas e oferta planejada.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
30	Identificar alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de uma infraestrutura de TI.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
31	Desenvolver e priorizar iniciativas para atender à demanda por serviços.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
32	Consolidar o Plano de TIC.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
33	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir											
34	Liberação da 3ª parcela	CGDS/SUDENE	A definir			534.606,22								
35	Plano Estratégico de Capacitação do Capital Humano para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba(R\$ 376.841,25)	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
36	Mapear a demanda de recursos humanos, por tipo de capacitação profissional, visando o crescimento e investimentos do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
37	Projetara atual oferta de mão-de-obra no estado.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
38	Definir ajustes na oferta de capacitação de mão-de-obra visando o crescimento do estado.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
39	Dimensionar investimentos necessários para formação profissional.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
40	Consolidar o Plano de Capacitação do Capital Humano do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	08/06/2013	07/12/2013							A Iniciar			
41	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A definir								A Iniciar			
					Valor Previsto:	1.794.595,93	Valor realizado:	732.887,59	26%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo - 2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa e o centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	825.379,68

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	PERÍODO	TOTAL		
280.000,00	8.400,00	out a dez/12	288.400,00	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 280.000,00
260.000,00	8.400,00	reprog	268.400,00	A realizar no exercício	R\$ 520.000,00
260.000,00	8579,68	reprog	268.400,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício (2012)	R\$ 800.000,00
800.000,00	25.379,68	-	825.379,68	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 800.000,00
				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
				Saldo a liberar (2013)	R\$ 520.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 280.000,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2014	Convênio nº 770860/2012	Proposta nº 24955/12
Data Atualização:	31/05/2013		

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE e Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.
--	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Divulgação do Programa no SICONV	CGDS							100%	Concluído		
2	Recebimento da proposta, análise	CGDS							100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS							100%	Concluído		
4	Emissão de Parecer	CGDS							100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGC - COCF - PRD							100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGC							100%	Concluído		
8	*Liberação da 1ª parcela	CGDS/SUDENE	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	100%	Concluído		
9	Meta 1: Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013			Em Andamento	A obra encontra-se em atraso devido a recurso judicial. Processo julgado com parecer favorável ao município. Aguardando o início do processo licitatório.	Repactuar data de término previsto.
10	Meta 1 (parte):Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apiloado.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013			A Iniciar		Repactuar data de término previsto.
11	Meta 1 (parte)Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013			A Iniciar		Repactuar data de término previsto.
12	*Realização de visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS/SUDENE	30/06/2013							A Iniciar		
13	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	30/09/2013		260.000,00					A Iniciar		
14	Meta 2:Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2013	28/02/2014						A Iniciar		

15	Meta 2 (parte):Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2013	28/02/2014							A Iniciar	
16	*Realização de visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS/SUDENE	30/09/2013								A Iniciar	
17	Liberação da 3ª parcela	CGDS/SUDENE	30/12/2013		260.000,00						A Iniciar	
18	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/03/2014	30/06/2014							A Iniciar	
19	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A definir								A Iniciar	
			Valor Previsto:	800.000,00	Valor realizado:	280.000,00	42%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

* Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00.
 Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Aguarda-se julgamento final.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.			
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas			
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	R\$ 9.452.840,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 352.840,00
A realizar no exercício (2013)	R\$ 1.352.840,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) 201	R\$ 352.840,00
Valor Empenhado no Exercício 2012	R\$ 352.840,00
Valor liberado no Exercício 2013	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício (2013)	R\$ 352.840,00

Previsão de Conclusão:	30/12/13
Data Atualização:	31/05/2013

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena
--	--------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	03/05/2013		90%	Em Andamento	Em negociação realinhamento no Plano de Trabalho.	Prorrogação da Vigência. Repactuar datas de término previsto e realizado.		
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas - SUDENE/ATECEL - Pagamento total efetuado	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	90%	Em Andamento	Decreto nº 7592 de 28/10/2011	Em andamento a entrega dos relatórios e do sistema de informações. Repactuar datas de término previsto e realizado.		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100%	Concluído				
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE			
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013		100%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.		
6	Elab. Balanço Energético Regional 2012 ano base 2011(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	01/03/2013	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013	30/04/2014		25%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais abril/2013. Repactuar data de término previsto.		
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	01/12/2013		19/06/2013			10%	Em Andamento	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região	Previsto para o orçamento 2014(R\$ 5.000.000,00)		
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em setembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético	SUDENE	24/05/13	01/09/13	R\$ 100.000,00	24/05/2013			40%	Em Andamento	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Industrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa	Realização da 2ª reunião do Fórum dos Secretários para assuntos de Energia do Nordeste em 24/05/2013 em razão da impossibilidade da participação do Presidente da Frente Parlamentar Mista de Energias Alternativas será entregue uma "Carta dos Secretários" com as recomendações/conclusões da reunião ao Presidente da Comissão.		
Valor Previsto:					R\$ 4.452.840,00	Valor realizado:					R\$ 352.840,00	69,4%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: 1º Ciclo 2013

Obs2 Estabelecimento de parceria com a ELETROBRAS, para implementação de ações voltadas para o uso eficiente de energia. No momento a diretoria da Eletrobrás que tratará do tópico "Eficiência Energética está passando por reestruturação. Foi realizada reunião com a Eletrobrás, em dez/12, para dar continuidade ao trabalho.

Obs3 Revisão do Acordo de Cooperação Técnica Com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo techno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.			
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil			
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	2.462.950,00

Cronograma de Desembolso			
Concedente	Conveniente	Liberação	Total
IFPB	junho	única	#####
IFRN	julho	...	
IFPE	julho	...	

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior (2012)	
A realizar no exercício (2013)	R\$ 2.462.950,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	
Valor Empenhado no Exercício (2012)	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ 2.462.950,00
Saldo a Empenhar no exercício	
	R\$ -
Total Liberado até o exercício	

Previsão de Conclusão:	12 meses após 1ªliberação
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Juliana de Melo Borges e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Prof.ª Edelcides Vasconcelos (Pró-Reitora de Extensão do IFPB). A definir no IFRN e IFPE.

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Capacitação de 520 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 16 turmas de 20 alunos	IFPB	01/06/2013	01/06/2014	1.018.500,00	--	--	--	0%	Em Andamento	Termo de Cooperação a ser assinado pelo Superintendente da SUDENE para realizar a descentralização de crédito.	
1.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		--	--	--	0%	A Iniciar		
1.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		--	--	--	0%	A Iniciar		
1.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		--	--	--	0%	A Iniciar		
1.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		--	--	--	0%	A Iniciar		
1.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		--	--	--	0%	A Iniciar		
1.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		--	--	--	0%	A Iniciar		
1.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico;Curso de Pintura de Obras; CursoAuxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	01/08/2013	31/10/2013					0%	A Iniciar		
1.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	01/11/2013	31/12/2013					0%	A Iniciar		
1.9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/12/2013	31/05/2014					0%	A Iniciar		
2	Implantação de Projeto em Pernambuco pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE.	IFPE/SUDENE	A definir.	A definir.					0%	A Iniciar	Fase de negociação do projeto com o IFPE.	
3	Implantação de Projeto no Rio Grande do Norte pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN.	IFRN/SUDENE	A definir.	A definir.					0%	A Iniciar	O IFRN apresentará até 17 de junho Termo de Referência do projeto tendo como referência projeto da SUDECO.	
					Valor Previsto:	1.018.500,00	Valor realizado:	0,00	0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	Valor do Projeto do IFPB em 2012 de R\$ 992.219,00 será atualizado com cotações realizadas em 2013. Em 22/03/13, foi realizada reunião na SUDENE para apresentar a proposta de projeto Mulheres na Construção implantado pela SUDECO para IFRN e IFPE. Na ocasião, o IFPB apresentou projeto elaborado em 2012 a ser executado em 2013-2014. Responsáveis Técnicos pela SUDENE: Juliana Borges e Macira Sotero (Projeto com IFPB) Responsáveis técnicos pela SUDENE: Vera Assunção e Maria Helena (Projeto com IFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 09
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Vernon George Walmsley
Problema (causa):	Insuficiência de opções de oleaginosas apropriadas (matéria prima) para viabilizar o avanço do Programa Nacional de Biodiesel no Nordeste.		
Projeto:	Estudos e pesquisas de oleaginosas típicas do Nordeste, para produção de biodiesel.		
Objetivo do projeto:	Caracterização físico-química de oleaginosas oriundas do nordeste brasileiro.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250		Descentralização	700.000,00

Crono Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL
700.000,00	0,00		700.000,00
700.000,00			

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 700.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 700.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 700.000,00
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/03/2014
Data Atualização:	23/04/2013

Total



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Vernon George Walmsley e Rubem Fernandes Monteiro Filho
	Conveniente	Andre Galenbeck

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Termo de Cooperação	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	18/12/2012	18/12/2012	Não se aplica	18/12/2012	18/12/2012	Não se aplica	100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	20/12/2012	20/12/2012	Não se aplica	20/12/2012	20/12/2012	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Liberação da parcela única	SUDENE (COCF-Brivaldo Soares)	01/01/2013	31/03/2013	700.000,00	27/03/2013	27/03/2013	700.000,00	100%	Concluído		
4	Aquisição de equipamentos	CETENE (Andre Galenbeck)	31/01/2013	30/05/2013					0%	Atrasado		
5	Instalação dos equipamentos	CETENE (Andre Galenbeck)	30/05/2013	31/06/2013					0%	Atrasado		
6	realização de ensaios	CETENE (Andre Galenbeck)	31/06/2013	31/11/2013					0%	Atrasado		
7	Apresentação de relatório final	CETENE (Andre Galenbeck)	01/12/2013	31/12/2013					0%	A Iniciar		
8	Emissão de Laudo Técnico	SUDENE (Vernon Walmsley)	02/01/2014	31/01/2014					0%	A Iniciar		
9	Análise da Prestação de Contas	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	01/02/2014	28/02/2014					0%	A Iniciar		
10	Encerramento	SUDENE (Vernon Walmsley)	01/03/2014	31/03/2014					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	700.000,00	Valor realizado:	700.000,00	30%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
O projeto será executado através de descentralização orçamentária e financeira para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)- MCT
Observações:
a) N.E. - Nº da etapa;
b) 2º Ciclo

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250/280	GND 3 e 4	30	254.219,12

T= R\$ 228.797,21 + R\$ 25.421,91

Cronograma de Desembolso					Valores Orçamentários/ Financeiros	
Concedente	Conveniente	Liberação	Total	Pago até o ano anterior (2012)	R\$	
167.999,61	25.421,91	dez/12	193.421,52	A realizar no exercício (2013)	R\$	228.797,21
60.797,60	--	fev/13	60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	R\$	228.797,21
228.797,21	25.421,91	-	254.219,12	Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$	228.797,21
				Valor liberado no Exercício	R\$	-
				Saldo a liberar	R\$	228.797,21
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
				Total Liberado até o exercício	R\$	-

Previsão de Conclusão:	27/12/2013	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	31/05/2013	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana borges e Marcelo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	25/06/2012		09/05/2012	25/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/2012	20/12/2012		25/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/12/2013	30/12/2013	167.999,61				0%	Atrasado	O conveniente está realizando o ajuste do Plano de Trabalho no SICONV.	
9	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa Civil) (R\$ 213.749,21)	Gov/PB	28/12/2012	27/12/2013					0%	Atrasado		
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir						0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	A definir		60.797,60				0%	A Iniciar		
12	Adquirir 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos (R\$ 40.469,90).	Gov/PB	28/12/2012	27/12/2013					0%	Atrasado		
13	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A Definir						0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		228.797,21	Valor realizado:		0,00	54%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
Observações:	<p>Não houve a liberação da 1ª parcela até a data deste monitoramento.</p> <p>O Governo do estado não depositou a contrapartida.</p>

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 11
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objetivo do projeto:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250/280	GND 3 e 4	30	370.465,27

Cronograma de Desemboço				Valores Orçamentários/ Financeiros	
Concedente	Conveniente	Liberação	Total		
186.696,80	19.487,00	dez/12	206.183,80	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ -
164.281,47	--	fev/13	164.281,47	A realizar no exercício (2013)	R\$ 350.978,27
350.978,27	19.487,00		370.465,27	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012	R\$ 350.978,27
				Valor Empenhado no Exercício (2012)	R\$ 350.978,27
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 350.978,27
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	13/12/2013	Convênio Nº 770335/2012(Proposta SICONV Nº 015048/2012)
Data Atualização:	31/05/2013	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Macira Régia Sotero e Marcelo de Castro Viana - CBMCE/ Aluizio Souza Freitas
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS								Atrasado	Não houve liberação da 1ª parcela com função de não ter sido ainda, a depositado a contrapartida	Encaminhado ofício em 06/05/2013 ao Governo do Estado solicitando que seja procedido o depósito da contrapartida. Repactuar data de término previsto.
9	Meta 1: Adquirir 13 notebooks (R\$ 19.487,00)	GOV/CE	01/12/2012	30/12/2012	186.696,80				0%	Atrasado		
10	Meta 2: Adquirir 08 projetores multimídia (R\$ 15.109,28)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013					0%	Atrasado		
11	Liberação da 2ª parcela	SUDENE/CGDS	A definir		164.281,47					Atrasado		
12	Meta 3: Adquirir 14 câmeras fotográficas integradas com GPS (R\$ 22.227,52)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013					0%	Atrasado		
13	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir						0%	Atrasado		
14	Liberação da 2ª parcela	SUDENE							0%	Atrasado		
15	Meta 4: Realizar 14 cursos de capacitação de Agentes de Proteção de defesa Civil (R\$ 149.360,00)	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013					0%	Atrasado		
16	Meta 5: Realizar um Fórum Internacional Sobre Evidência Sísmicas no Ceará (R\$ 164.281,47).	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013					0%	Atrasado		
17	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	A definir						0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		350.978,27	Valor realizado:		0,00	44%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Observações:	Não houve a liberação da 1ª parcela O Governo do estado não depositou a contrapartida.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)		Gestor da subunidade:	Vernon George Walsmsley
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.			
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE			
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação, para replicagem em outros estados do Nordeste.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	Investimento		965.632,35

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		
274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69	Pago até o ano anterior	R\$ -
582.610,66	0,00	Julho/2013	582.610,66	A realizar no exercício	R\$ 857.015,99
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 857.015,99
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ 857.015,99
				Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ 274.405,33
				Saldo a liberar	R\$ 582.610,66
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 274.405,33

Previsão de Conclusão:	26/02/2014
Data Atualização:	25/06/2013

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Vernon George Walsmsley e Rubem Fernandes Monteiro Filho
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para proceguimento do projeto.	
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	01/07/2013	30/07/2013					0%	A Iniciar		
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/08/2013	30/08/2013	582.610,66				0%	A Iniciar		
7	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	01/12/2013	20/12/2013					0%	A Iniciar		
8	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves)	02/01/2014	26/02/2014					0%	A Iniciar		
9	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	A definir.						0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	857.015,99	Valor realizado:	274.405,33	44%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
a) N.E. - Nº da etapa; b) 1º Ciclo 2013

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)	Gestor da subunidade:	Adônis Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Malha aeroviária regional		
Objetivo do projeto:	Articulação para incrementar malha aérea na área de atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	A definir			0

Previsão de Conclusão:	a ser redefinida.
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Marcus Vinicius/Francisco Linhares
---	------------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Composição de equipe interna	Marcus/Adônis	19-jun-12	10-ago-12	-	19-jun-12		-	100,00%	Concluído		
2	Elaboração do plano de trabalho	Marcus/Adônis	01-ago-12	10-ago-12	-	31-jul-12		-	50,00%	Paralisado		
3	Levantamento da malha institucional	Marcus/Adônis	01-ago-12	20-ago-12	-	24-jul-12		-	20,00%	Paralisado		
4	Identificação dos marcos legais	Marcus/Adônis	21-ago-12	10-set-12	-				0,00%	Paralisado		
5	Levantamento do estado da arte	Marcus/Adônis	11-set-12	28-set-12	-				0,00%	Paralisado		
6	Definição do modelo de governança do projeto	Marcus/Adônis	01-out-12	31-out-12	-				0,00%	Paralisado		
7	Definição de critérios para estabelecimento da malha	Marcus/Adônis	01-nov-12	30-nov-12	150.840,00				0,00%	Paralisado		
8	Definição da malha aérea	Marcus/Adônis	03-dez-12	07-dez-12	-				0,00%	Paralisado		
9	Termo de Referência da malha aérea	Marcus/Adônis	10-dez-12	21-dez-12	27.600,00				0,00%	Paralisado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 703/2012, de 14/05/2012.	
Valor Previsto:					178.440,00	Valor realizado:			0,00	18,89%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs3:	Atualizado em 30/07/2012.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto:	PO 14
Objetivo estratégico:	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação.		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover a difusão da inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)		Gestor da subunidade:	Adônis Oliveira
Problema (causa):	Baixo IDEB e alta evasão escolar.			
Projeto:	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE - 3D			
Objetivo do projeto:	Aumentar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem, incorporando tecnologias já existentes, no ensino público fundamental e médio, na rede pública estadual da área de atuação da SUDENE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250/650	4.4.90.00	Pregão	R\$ 6.496.600,00
				4015000
				2481600
				6496600

Previsão de Conclusão:	31/07/13
Data Atualização:	31/05/13

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 6.496.600,00
Orçamento Autorizado no exercício	R\$ 6.496.600,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 6.496.600,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 6.496.600,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
---	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE (Marlene Franklin)	09/11/12	09/11/12		09/11/12	09/11/12	0,00	100,00%	Concluído	Processo aberto com o Nº 000261/2012-32, para apreciação do Acordo de Cooperação Técnica em 10 de agosto de 2012. Aprovado pela Diretoria Colegiada em 18/07/12 (113ª reunião). Assinados em 09 de novembro de 2012 e publicados no DOU.	
2	Licitação para compra dos equipamentos	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13	4.015.000,00	01/04/13			25,00%	Em Andamento	Licitação adiada de 2012 para 2013.	
3	Licitação para compra dos softwares e licenças.	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13	2.481.600,00	01/04/13			50,00%	Em Andamento	Licitação adiada de 2012 para 2013.	
4	Assinatura do contrato de aquisição do software (encaminhamento do processo).	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13		-	-		0,00%	Atrasado	O Processo para aquisição do Software pela inexigibilidade teve Parecer Favorável da PRD. Porém teve parecer contrário da área de Informática quanto a inexigibilidade e foi elaborado outro TR, para compra do Software por Pregão Eletrônico.	
5	Assinatura do contrato para Aquisição de equipamentos (Encaminhamento do processo)	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13		-	-		0,00%	Atrasado	O Processo para aquisição de equipamentos está aguardando a Ata e o Registro de Preços para compra dos Projeto pres, pelo processo de registro de preços. Falta autorização do MI.	
6	Entrega e instalação dos equipamentos nas escolas	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/08/13	30/08/13					0,00%	Atrasado		
7	Entrega e instalação dos softwares	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/08/13	30/08/13					0,00%	Atrasado	Licitação não realizada no período previsto	
8	Treinamento dos Professores e gestores escolares	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	01/08/13	30/08/13	0,00				0,00%	A Iniciar		
9	Acompanhamento sistemático	SUDENE (Frederico Cavalcanti)	09/11/12	31/07/13	0,00				0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	6.496.600,00	Valor realizado:	0,00	19,44%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Secretarias de Educação dos Estados da área de atuação da SUDENE
Observações:	
Obs.1:	29º Ciclo
Obs.2:	A técnica Marlene Franklin foi substituída pelo técnico Frederico Cavalcanti em razão de aposentadoria.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	A definir		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	A definir		Subunidade responsável:	CGPD
Diretoria responsável:	DPLAN		Gestor da subunidade:	Adonis Oliveira
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco de Aguiar (substituto interino)			
Problema (causa):	Existência de impedimentos técnicos e estruturais ao desenvolvimento do Nordeste			
Projeto:	Superção de obstáculos ao desenvolvimento regional (Projeto CAPES)			
Objetivo do projeto:	Estudos e pesquisas de soluções aos entraves ao desenvolvimento regional			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00		5.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 5.000.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 5.000.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/07/2013
Data Atualização:	31/05/213

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
---	----------------------

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Assinatura do Termo de Cooperação	Frederico Cavalcanti	01/12/12	01/04/13	0,00				25%	Paralisado	Foram enviados emails e realizados telefonemas, mas não foi obtida resposta por parte da CAPES	Repactuar datas início e término previsto e realizado.
2	Descentralização Orçamentária	Frederico Cavalcanti	01/05/13	01/06/13	5.000.000,00				0%	Atrasado		
3	Implementação da proposta	Frederico Cavalcanti		31/07/13					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	8%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
a) N.E. - Nº da etapa;	
b) 2º Ciclo	
Obs.: Tratativas estão sendo internamente entabuladas para que o projeto com a CAPES seja integrado ao projeto de "Altos Estudos" para ser transformado em um único.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TL5A			
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 2.672.400.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.615.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 785.764.778,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.057.294.332,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.615.105.668,00

Previsão de Conclusão:	01/12/15
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	1615105688
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	176.963.988,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	68,86%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	

12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	-	95,00%	Em Andamento	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013. Repactuar datas.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	-	50,00%	Em Andamento	O valor previsto de aporte adicional do FDNE é de R\$.1.204.000.000,00.	Repactuar datas.
14	Liberações							0,00%	A Iniciar		
15	Fiscalizações							0,00%	A Iniciar		
16	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado							0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	1.670.210.107,00	Valor realizado:	1.615.105.668,00	76,33%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 17
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)		
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 1.959.000.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/17
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 1.959.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 310.198.234,18
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 310.198.234,18
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.959.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	R\$ 1.959.000.000,00	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	R\$ 0,00	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	ROBERTO (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberações								0,00%	A Iniciar		
7	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:			R\$ 0,00	62,50%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs.1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs.2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs.3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs.4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5:	O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 18
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	GDK S/A				
Objetivo do projeto:	Fabricação de Máquinas e Equipamentos - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 155.354.519,50

**Projeto Cancelado.
Será retirado a partir do 3º Ciclo**

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 56.106.724,20
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	A definir
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	10/10/11	09/12/11	-	10/10/11	22/11/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/04/12	22/06/12	-	23/04/12	22/05/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	22/06/12	10/02/13	-	22/06/12	-	-	100,00%	Cancelado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 0934/2012, de 22/06/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada								0,00%	A Iniciar				
5	Contratação do banco operador								0,00%	A Iniciar				
6	Liberações								0,00%	A Iniciar				
7	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					R\$ -	Valor realizado:					R\$ -	37,50%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs3:	Reiniciada a contagem de prazo, a partir da publicação, em 12.11.2012, do Decreto nº 7.838/2012, de 09.11.2012.
Obs4:	Empresa formalizou junto à SUDENE desistência do pedido de financiamento do FDNE ainda no Exercício de 2012.
Obs5:	2º Ciclo-O PO será excluído do acompanhamento.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 19
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)			
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 61.728.156,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

Previsão de Conclusão:	Não definido
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGGP-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
6	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	71,43%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs:1	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs:2	Atualizado em 08/04/2013.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 20
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR			
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 53.576.481,00

Previsão de Conclusão:	01/05/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 53.576.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.576.481,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.			
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.			
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.			
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.			
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	11/01/12	10/02/12	42.477.417,00	11/01/12	-	-	80,00%	Atrasado	A SUDENE solicitou ao MI a disponibilização de R\$ 42.477.417,00 por meio do ofício nº 003/2012/GAB-SUDENE, de 11/01/12. Aguardando liberação.	Recursos foram disponibilizados pelo Tesouro em Março/2013. Estão sendo adotadas providências para liberação com emissão de debêntures, conforme contrato existente. Repactuar data de término previsto		
6	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					42.477.417,00	Valor realizado:					0,00	68,57%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:**Observações:**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.

Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.

Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.

Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.

Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 21
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 59.700.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.700.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 59.700.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 22
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 54.900.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 54.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 54.900.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísia I Geração e Comercialização de Energia Ltda				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 64.439.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.439.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 2.439.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 2.439.000,00
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 64.439.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 24
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca II Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 59.864.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	15/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.864.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 954.400,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 954.400,00
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 59.864.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 25
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca III Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 55.278.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.278.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 898.200,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 898.200,00
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 54.379.800,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 26
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 55.273.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 55.273.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 890.800,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 890.800,00
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 54.382.200,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 27
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 64.455.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 1.017.100,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.017.100,00
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 64.455.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberações								0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 28
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 33.900.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 33.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 33.900.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 29
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 50.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 50.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 50.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberações								0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 30
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 49.690.000,03

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 49.690.000,03
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 1.781.532,56
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.781.532,56
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 49.690.000,03
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J. Emerson/ A.F. Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
[Círculo Branco]	A Iniciar
[Círculo Verde]	Concluído
[Círculo Amarelo]	Em Andamento
[Círculo Vermelho]	Atrasado
[Círculo Cinza]	Cancelado
[Círculo Azul]	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 31
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 46.701.999,96

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 46.701.999,96
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 46.701.999,96
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 32
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eolicotec Sobradinho S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 29.040.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 29.040.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 29.040.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberações								0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 33
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 53.959.000,00

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 53.959.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 1.192.389,95
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.959.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 1.192.389,95
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 34
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	5	90	R\$ 99.970.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 99.970.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 99.970.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/07/2013
Data Atualização:	31/05/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído				
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído				
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.		
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Claudio/Emilia no	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.			
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído				
7	Liberações								0,00%	A Iniciar				
8	Fiscalizações								0,00%	A Iniciar				
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado								0,00%	A Iniciar				
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 35
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2008
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.				
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional		
Responsável:	Luiz Gonzaga Paes Landim (Superintendente)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros		
Problema (causa):	Disfunções/desvios entre atribuições e a ocupação de cargos em decorrência de não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219, de 04/10/2007.				
Projeto:	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Elaborar novo Decreto de estrutura regimental para corrigir as não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219/2007, particularmente a recomposição de funções e atribuições funcionais.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	1	90	1.354.857,53

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/09/2013
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Encaminhamento do Projeto de Lei de criação de cargos pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados.	Casa Civil da Presidência da República (MPO)	16/05/08	01/12/08	-	16/05/08	11/10/12	-	100%	Concluído				
2	Aprovação da Lei de criação dos novos cargos e funções gratificadas	Presidência da República (Casa Civil, Min. Fazenda e MI)	02/12/08	04/03/09	-	02/12/08	17/12/12	-	100%	Concluído	Lei nº 12.742, de 17/12/2012			
3	Elaboração de minuta de decreto de Estrutura Regimental para a SUDENE	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	04/01/13	11/01/13	-	04/01/13	11/01/13	-	100%	Concluído	Of. nº 003/2013/SUDENE/GAB			
4	Solicitação de ajustes à minuta de decreto de estrutura regimental com o corte de 3 cargos DAS.	Amarildo Baesso (Diretor de Programas do MI)	18/03/13	18/03/13	-	18/03/13	18/03/13	-	100%	Concluído				
5	Revisão da proposta de Decreto da nova estrutura regimental da SUDENE e envio ao MI.	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	18/03/13	19/03/13	-	18/03/13	19/03/13	-	100%	Concluído	O MI em 09/05 encaminhou ajustes na estrutura sem possibilidade de alteração, solicitando do Superintendente, a validação para continuidade da tramitação. Esses ajustes unilaterais não conferem com a posição da AGI.	Of. nº 074/2013/SUDENE/GAB, RATIFICADO PELO Of. nº 109/2013/SUDENE/GAB, DE 09/04/2013 e nº 0161/2013/SUDENE/GAB, de 09/05/13.		
6	Encaminhamento da minuta pelo MI ao MPO	Secretaria Executiva/MI	15/05/13	15/05/13	-	15/05/13	07/06/13	-	100%	Concluído				
7	Análise Técnica e aprovação pela SEGEP/MPOG	Secretaria de Gestão Pública/MPOG	08/06/13	29/08/13	-	08/06/13		-	20%	Em Andamento	Os prazos dados são expectativas baseadas em experiências do MI.	Prazos repactuados em razão de atrasos.		
8	Manifestação da CONJUR/MPOG	Consultoria Jurídica do MPOG	30/08/13	12/09/13	-			-	0%	A Iniciar		Prazos repactuados em razão de atrasos.		
9	Publicação do Decreto de estrutura regimental da SUDENE	Casa Civil da Presidência da República (MPO e MI)	13/09/13	20/09/13	-			-	0%	A Iniciar		Prazos repactuados em razão de atrasos.		
10	Apostilamentos (elaboração de portarias SUDENE, aprovação e publicação DOU)	CRH/SUDENE	23/09/13	30/09/13	-			-	0%	A Iniciar	Os apostilamentos serão feitos em até 4 dias após a publicação do novo decreto de estrutura regimental.	Prazos repactuados em razão de atrasos.		
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	62%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2013.

Nota: O valor total do projeto corresponde aos gastos anuais estimados com os 107 cargos e funções gratificadas.

obs.: Previsão de conclusão revista em função do andamento do projeto no MPOG.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 36
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Luiz Gonzaga Paes Landim (Superintendente)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	18/10/2013
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
--	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	01/10/2013	04/10/2013					0%	A Iniciar		Prazos repactuados		
2	Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	07/10/2013	10/10/2013					0%	A Iniciar		Prazos repactuados		
3	Reunião para apresentação dos resultados e novos ajustes.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	14/10/2013	14/10/2013					0%	A Iniciar		Prazos repactuados		
4	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Manoel Barreiros (AGI)	16/10/2013	16/10/2013					0%	A Iniciar		Prazos repactuados		
5	Publicação no DOU e Boletim interno.	Nivaldo Andrade (CGAF) e Samuel (SAD/GAB)	18/10/2013	18/10/2013					0%	A Iniciar		Prazos repactuados		
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:					0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	Unidades Administrativas; Recursos Humanos.
Observações:	2º Ciclo 2013 obs.: Previsão de conclusão revista em função do andamento do projeto da nova estrutura no MPOG.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 37
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Suplementação emergencial do quadro funcional.				
Diretoria responsável:	Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos		
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia		
Problema (causa):	Aguda escassez de servidores comprometendo a eficiência da gestão.				
Projeto:	Concurso Público da SUDENE				
Objetivo do projeto:	Agilizar a realização do concurso público e a recomposição do quadro funcional.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250			2.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 2.000.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	15/10/2013
Data Atualização:	22/05/2013

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Maria Lima Gouveia
--	---------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião técnica no MI sobre elaboração de concurso	Ângela Lima	22/01/13	22/01/13		22/01/13	22/01/13		100%	Concluído		
2	Pesquisa de referências para elaboração de perfis de cargos	Comissão de concurso	29/01/13	05/02/13		29/01/13	05/02/13		100%	Concluído		
3	Estudo e análise da demanda de cargos por unidade administrativa da Sudene	Comissão de concurso	05/02/13	07/02/13		05/02/13	07/02/13		100%	Concluído		
4	Elaboração de requisitos e atribuições de cargos	Comissão de concurso	08/02/13	25/02/13		08/02/13	25/02/13		100%	Concluído		
5	Elaboração do Projeto Básico do Concurso	Comissão de concurso	26/02/13	28/02/13		26/02/13	28/02/13		100%	Concluído		
6	Apresentação dos trabalhos ao Sr. Diretor de Administração e ao Sr. Superintendente da Sudene para apreciação	Comissão de concurso	04/03/13	04/03/13		04/03/13	04/03/13		100%	Concluído		
7	Ajustes e adequação do Projeto Básico	Comissão de concurso	04/03/13	05/03/13		04/03/13	05/03/13		100%	Concluído		
8	Expedição de correspondência a instituições para fins de enquadramento em processo de contratação	Angela Lima	05/03/13	06/03/13		05/03/13	06/03/13		100%	Concluído		
9	Apreciação e análise comparativa das propostas	Comissão de concurso	25/03/13	03/04/13		25/03/13			100%	Concluído		
10	Expedição de correspondência a instituições para fins de enquadramento em processo de contratação por insuficiência de propostas.	Angela Lima	03/04/2013	04/04/2013		03/04/2013	04/04/2013		100%	Concluído		
11	Apreciação e análise comparativa das propostas	Comissão de concurso	12/04/2013	12/04/2013		12/04/2013	12/04/2013		100%	Concluído		

12	Apresentação das considerações sobre as propostas ao Sr. Diretor de Administração e ao Sr.	Comissão de concurso	15/04/2013	17/04/2013		15/04/2013	17/04/2013		100%	Concluído		
13	Elaboração de Despacho para encaminhamento de celebração de contrato	Comissão de concurso	18/04/2013	18/04/2013		18/04/2013	18/04/2013		100%	Concluído		
14	Elaboração de Contrato e análise jurídica	Comissão de concurso	18/04/2013	26/04/2013		26/04/2013	29/04/2013		100%	Concluído		
15	Devolução do Jurídico (Adequação ao Acórdão TCU)	Comissão de concurso	29/04/2013	21/05/2013		21/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído		
16	Análise jurídica	Procuradoria	23/05/2013	27/05/2013					0%	A Iniciar		
17	Assinatura do Contrato e reunião técnica com a empresa contratada	Superintendente/Empresa	27/05/2013	31/05/2013					0%	A Iniciar		
18	Apresentação de cronograma das atividades relativas ao concurso	Empresa contratada	31/05/2013	07/06/2013					0%	A Iniciar		
19	Publicação do edital de abertura	Sudene	07/06/2013	21/06/2013					0%	A Iniciar		
20	Aplicação das provas	Empresa contratada	15/09/2013	15/09/2013					0%	A Iniciar		
21	Aplicação de perícia médica	Empresa contratada	30/09/2013	30/09/2013					0%	A Iniciar		
22	Resultado final da perícia e do concurso	Empresa contratada	15/10/2013	15/10/2013					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	68%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

a) 2º Ciclo 2013

OBS: AS DATAS PODERÃO SER ALTERADAS, TENDO EM VISTA A DINÂMICA DE AGENDAS.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 38
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade		
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do anexo Nilo Coelho				
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho				
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	44	90	R\$ 2.256.756,70

Previsão de Conclusão:	11/09/2013
Data Atualização:	27/06/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 819.804,18
A realizar no exercício 2013 (RAP 2012)	R\$ 127.296,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$ 1.318.751,88
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$ 1.318.751,88
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ 561.219,64
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$ 884.828,24
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.381.023,82

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
---	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos (2 x R\$ 190.944,00)).	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura (R\$ 747.060,82)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/2012	23/07/2012		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de engenharia elaborar projeto básico.
3	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	24/07/2012	06/09/2012		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
4	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/2012	21/02/2013	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.

5	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/09/13	1.127.807,88	13/03/13	-	472.112,44	30%	Em Andamento	A obra foi iniciada em 11/03/2013, quase no 4º mês, tendo já realizados alguns serviços iniciais, bem como os serviços técnicos propriamente ditos. Seu ritmo é normal
6	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	11/03/13	11/09/13		13/03/13	-		30%	Em Andamento	Através da Portaria nº 27/2013, foi designado o engenheiro Wilson Galdino como Fiscal do Contrato, tendo sido contratada em 12/06 a empresa CONSTREL para prestação dos serviços de consultoria na fiscalização.
7	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		11/09/13					0%	A Iniciar	
					Valor Previsto:	2.256.756,70	Valor realizado:	1.381.023,82	60%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2013

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 39
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade
Problema (causa):	Desgaste dos equipamentos e instalações de combate a incêndio pela falta de manutenção e divergentes da atual norma brasileira vigente, colocando em risco a segurança do edifício.		
Projeto:	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.		
Objetivo do projeto:	Execução das obras de instalação de proteção contra incêndio do Edifício SUDENE e seus anexos (Biblioteca, Condel, Restaurante e Antigo serviço médico)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 2.084.970,60

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000,00
A realizar no exercício	R\$ 330.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 700.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 700.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000,00

Previsão de Conclusão:	05/08/2014
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Básico/Projeto executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	30.000,00	30/06/09	22/09/10	30.000,00	100,00%	Concluído	Entrega do projeto básico e do projeto executivo realizado pela empresa Policonsult.	Entrega do projeto básico à CPL para lançar licitação.
2	Licitação	Eneida (Sudene/CPL)	22/12/11	06/03/12	0,00	22/12/11	06/03/12	0,00	100,00%	Concluído	Licitação deserta	Revisar planilha orçamentária e relançar licitação.
4	Modificação do Projeto	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	15/06/12	30/07/12	0,00	15/06/12	13/08/12	0,00	100,00%	Concluído	O atraso se deu em virtude de estarmos aguardando o envio de informações técnicas adicionais pela empresa de consultoria (Policonsult)	Encaminhar e-mail à Policonsult cobrando informações estabelecendo prazo.
5	Nova licitação (retomada)	Eneida (Sudene/CPL)	30/07/12	16/11/12	0,00	13/08/12	05/12/12		100,00%	Concluído	A fase de habilitação da licitação ocorreu em 08/10/2012, tendo comparecido apenas a empresa P. C. Campano Com. e Serv. ME, a qual foi inabilitada por questões formais, concedendo-se à licitante o prazo legal de oito dias úteis para apresentação dos documentos requeridos, para revisão da sua inabilitação.	Foi julgado improcedente o recurso da licitante pela CPL e mantida a licitação, o que ocasionou o fracasso da licitação. A SUDENE irá revisar as planilhas orçamentárias para abrir nova licitação e consultar a PRD sobre dispensa de licit. dessa obra.
6	Relançamento da licitação	Eneida (Sudene/CPL)	02/04/13	02/08/13	0,00	18/03/13			30,00%	Em Andamento	A CPL recebeu, até o momento, apenas uma proposta prévia à licitação, estando com dificuldade de conseguir outras duas propostas, para finalização e publicação do Edital.	A PRD da SUDENE não se mostrou favorável a uma dispensa de licitação e a Autarquia manteve contato com a Diretoria Administrativa do TRT 4ª Região, tendo enviado toda a doc da licitação anterior para análise da área de engenharia daquele órgão no sentido de colaborar na elaboração do projeto básico, mas sem nenhum retorno até o momento.
7	Execução da Obra	Empresa a ser contratada	05/08/13	05/08/14	1.874.970,60				0,00%	A Iniciar		
8	Fiscalização da Obra	Empresa a ser contratada	05/08/13	05/08/14	180.000,00				0,00%	A Iniciar		
9	Entrega da obra	Empresa a ser contratada		05/08/14					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:			2.084.970,60			Valor realizado:			30.000,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Ministério da Saúde; IBGE; CODEVASF; TRT 6ª Região; CTI/NE; Prométropole; Ministério do Planejamento; Banco do Brasil; Banco no Nordeste; INSS; IFPE; e DFRP/MI.

Observações:

2º Ciclo

A empresa P.C. Campano Com. e Serv. foi definitivamente inabilitada por falta de capacidade técnica, pois não conseguiu comprovar seu acervo técnico junto ao CREA/PE (exigência do Edital).

A Administração está aguardando dotação orçamentária, Exercício 2013, para relançamento da licitação.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 40
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade	
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.			
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.			
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo adequando-as ao novo layout.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100/250	44	90	R\$ 8.152.494,76

Previsão de Conclusão:	22/04/2014
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 3.002.025,76
A realizar no exercício 2013 (RAP 2012)	R\$ 2.463.093,33
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito 2013)	R\$ 787.880,60
Valor Empenhado nos Exercícios (2012/2013)	R\$ 6.252.999,69
Valor liberado nos Exercícios (2012/2013)	R\$ 4.238.554,76
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$ 2.014.444,93
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.238.554,76

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0,00	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.964,51	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Recebimento Definitivo da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	02/04/12	02/05/12	0,00	02/04/12	02/05/12	0,00	100%	Concluído	Somente foram recuperados 119 blocos de fundação com dotação de 2010 e 2011. A análise preliminar feita pela empresa contratada subestimou o tamanho do problema com as fundações do prédio, vindo a requerer complementação dos trabalhos.	Lançamento de licitação para complementação da obra.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar editaL de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.

7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12		100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/04/14	4.225.259,21	22/10/12		1.313.590,25	45%	Em Andamento	Os serviços de recuperação dos blocos de fundação estão com 66 blocos concluídos, dos 147 previstos e os serviços de reforma do subsolo estão em andamento.	
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012	22/10/12	22/04/14	0,00	22/10/12			45%	Em Andamento	A Comissão de Fiscalização é composta pelos engenheiros civis dos seguintes Órgãos: SUDENE - Wilson Galdino e José Villeneuve; Ministério da Saúde - Cláudia Nascimento e IBGE - Edith Negromonte.	
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/04/14	0,00				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	8.152.494,76	Valor realizado:	4.238.554,76	83%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo
I Etapa - 119 blocos recuperados/reforçados. R\$ 2.924.764,51. Data de Início: 04/09/2009 e Término: 02/05/2012. Nivaldo Andrade.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 41
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade		
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.				
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Substituição (modernização) de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento alternativo de energia do prédio da SUDENE, que hoje serve a diversos condôminos, por sua vez consumidores de diferentes cargas, nele instalados				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 2.184.685,55

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior (2012)	R\$	70.000,00
A realizar no exercício (2013) (RAP 2012)	R\$	30.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$	1.100.000,00
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$	-
Saldo a liberar (2013)	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício (2013)	R\$	1.100.000,00
Total Liberado até o exercício (2012+2013)	R\$	70.000,00

Previsão de Conclusão:	25/04/2014
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galvão e José Villeneuve Peixoto.
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido, porém, limitações orçamentárias e Decreto suspendaram obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12			45%	Em Andamento	A CPL está enfrentando dificuldades na contratação da empresa de consultoria, para elaboração do Projeto Básico.	Repactuar as etapas 3 a 7 em 60 dias. A Sude ne está em tratativas com um Engenheiro eletricista da CHESF, que ficará responsável pela elaboração do projeto básico para a licitação e posterior fiscalização dos serviços. Repactuar data de término previsto.
4	Revisão do Projeto Básico	A definir	21/05/13	21/07/13	30.000,00				0%	A Iniciar	A empresa de consultoria é quem irá revisar e/ou alterar o projeto básico que foi realizado em 2010.	
5	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	24/07/13	24/10/13	0,00				0%	A Iniciar		
6	Execução da Obra	A definir	25/10/13	25/04/14	2.024.685,55				0%	A Iniciar	Valor decorrente do orçamento detalhado, elaborado pela empresa Policonsult em abril/2010.	
7	Fiscalização da Obra	A definir	25/10/13	25/04/14	60.000,00				0%	A Iniciar		
8	Entrega da obra								0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	2.184.685,55	Valor realizado:	70.000,00	11,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º ciclo

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 42
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade		
Problema (causa):	Degradação das instalações pelo tempo e pelo uso (exaustão), particularmente afetada pela salinidade sobre a estrutura armada.				
Projeto:	Reforma das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE (7º ao 12º andares)				
Objetivo do projeto:	Recuperação das instalações elétricas e hidrosanitárias e substituição de móveis e utensílios.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 8.640.000,00

Projeto será transferido para 2014 devido a limitações de orçamento. Não constará no 3º Ciclo

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior (2012)	R\$	140.000,00
A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2013)	R\$	8.500.000,00
Valor Empenhado no Exercício (2013)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (2013)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	8.500.000,00
Total Liberado até o exercício (2012+2013)	R\$	140.000,00

Previsão de Conclusão:	10/03/2015
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	140.000,00	30/06/09	22/09/10	140.000,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/11	15/07/11		02/02/11	-		0%	Cancelado	Cancelado em virtude da necessidade de autorização ministerial, de acordo com o Decreto Presidencial nº 7.446/2011.	Enviar pedido de autorização ao MI para dar continuidade do processo licitatório.
3	Atualização do Projeto Básico	Villeneuve / Wilson (Sudene/CGAF)	04/03/13	04/05/13		-	-		50%	Paralisado	Em virtude da insuficiência de engenheiros no setor, deu-se prioridade a outras obras, de forma que o Projeto Básico encontra-se paralisado.	Repactuar as etapas 3 a 6
4	Nova Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	06/05/13	09/09/13					0%	A Iniciar		
5	Execução da obra	A definir	10/09/13	10/03/15	8.500.000,00				0%	A Iniciar	Valor decorrente do orçamento detalhado, elaborado pela empresa Policonsult em julho/2010.	
6	Fiscalização	Villeneuve / Wilson (Sudene/CGAF)	10/09/13	10/03/15					0%	A Iniciar		
7	Entrega da obra	Empresa a ser contratada							0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	8.640.000,00	Valor realizado:	140.000,00	8%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	2º ciclo 2013

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 43
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2010
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Vieira Andrade	
Problema (causa):	Adequar as guaritas dos estacionamentos para melhorar a segurança, reaterrar a piscina no estacionamento norte que servia para resfriar o antigo sistema de ar condicionado central do prédio da SUDENE, adequar o novo layout para o estacionamento sul interligando o inferior e o superior, bem como recuperar as muretas dos jardins desgastadas pela ação do tempo e falta de manutenção, pavimentar o estacionamento do IFPE e substituir os passeios internos e externos em pedra portuguesa por concreto polido.			
Projeto:	Recuperação dos Estacionamentos.			
Objetivo do projeto:	Recuperar e melhorar os estacionamentos norte, sul e IFPE, bem como, substituir as pedras portuguesas dos passeios externos e internos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	R\$ 900.000,00

Projeto será transferido para 2014 devido a limitações de orçamento. Não constará no 3º Ciclo.

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) 2013	R\$ 900.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 900.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	12/02/2014
Data Atualização:	27/06/2013

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Projeto Básico	Roberto Pina	21/10/10	08/11/10	0,00	21/10/10	08/11/10	0,00	100%	Concluído				
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPLI)	08/11/10	11/05/12	0,00	11/01/12	-	0,00	0%	Cancelado	Cancelamento em virtude da insuficiência de engenheiros para modificar o projeto básico.	Revisão do projeto básico pela Área de Engenharia		
3	Modificação do projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	11/05/12		0,00	11/05/12		0,00	40%	Atrasado	Paralisação necessária para revisão do projeto básico, porém como existe uma insuficiência de engenheiros no quadro técnico da SUDENE, outros empreendimentos foram priorizados.			
4	Retomada do Projeto Básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	04/03/13	29/03/13	0,00	04/03/13			70%	Atrasado	A área de Engenharia não conseguiu concluir a atualização dos preços no mês de março.			
5	Retomada da Licitação	Eneida (SUDENE/CPLI)	06/05/13	09/08/13	0,00				0%	A Iniciar				
6	Execução da Obra	Empresa a ser Contratada	12/08/2013	12/02/2014	900.000,00				0%	A Iniciar				
7	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	12/08/2013	12/02/2014					0%	A Iniciar				
8	Entrega da obra	Empresa a ser contratada	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
Valor Previsto:					900.000,00	Valor realizado:					0,00	26%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
2º ciclo

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 44
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.	
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:		
Problema (causa):	Com a criação do PEI, existe a obrigatoriedade de criação do PETI, em atendimento a legislação em vigor, acórdão 1233/2012 - TCU - Plenário.			
Projeto:	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.			
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PETI.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
				0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/08/2013
Data Atualização:	26/07/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
---	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Levantamento da documentação necessária.	Luiz Carlos Dourado	28/03/2013	05/04/2013	não se aplica	03/04/2013	09/04/2013		100%	Concluído	Atraso em função da agenda dos participantes (Edgar, Josué e Luiz Carlos).	
2	Reuniões técnicas para definição do alinhamento do PETI ao Realinhamento Estratégico da Sudene - 2013/2015.	Área de TI	08/04/2013	19/04/2013	não se aplica	10/04/2013	12/04/2013		100%	Concluído		
3	Redação, revisão e publicação do PETI 2013/2015.	Luiz Carlos Dourado	25/06/2013	06/07/2013	não se aplica	23/07/2013			20%	Em Andamento	Reprogramado em função das atribuições na Coordenação de TI - férias dos gestores. Previsão para 16/08/2013	
4	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	19/08/2013	23/08/2013	não se aplica				0%	A Iniciar		
5	Apresentação da proposta do PETI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para conhecimento.	Luiz Carlos Dourado	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar		
6	Encaminhamento do PETI para aprovação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar		
7	Apresentação da proposta do PETI a Diretoria Colegiada, para aprovação.	Luiz Carlos Dourado.	agenda da Diretoria	agenda da Diretoria	não se aplica				0%	A Iniciar		
8	Publicação da Portaria de aprovação do PETI.	Área de TI.	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar		
9	Implementação	Área de TI.	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					0,00	Valor realizado:			0,00	24%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	2º Ciclo SUDENE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 45
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Necessidade de alinhamento ao PETI.		
Projeto:	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.		
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PDTI alinhando-o ao Plano Estratégico da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
				0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	27/09/2013
Data Atualização:	26/07/2013

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
--	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Análise do PETI.	Luiz Carlos Dourado							0%	A Iniciar	Aguardando conclusão e aprovação do PETI.	
2	Relacionar projetos de TI (PDTI atual) aos objetivos estratégicos.	Luiz Carlos Dourado							0%	A Iniciar		
3	Redação, revisão e publicação da proposta do PDTI 2013/2014.	Luiz Carlos Dourado							0%	A Iniciar		
4	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.							0%	A Iniciar		
5	Apresentação da proposta do PDTI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para aprovação.	Área de TI.							0%	A Iniciar		
6	Revisão e publicação da proposta.	Luiz Carlos Dourado							0%	A Iniciar		
7	Encaminhamento do PDTI para homologação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.							0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
a) O início deste projeto depende da conclusão do projeto nº 44, item estratégico nº 3.2.1 - PETI. 2º Ciclo SUDENE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 46
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Aumento da demanda de acesso a Internet.		
Projeto:	Melhoria da infraestrutura de comunicação		
Objetivo do projeto:	Aumentar a velocidade de acesso a Internet.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	33	90	180.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	27/12/2013
Data Atualização:	14/06/2013

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Antônio Edgar Cunha e Josué da Silva Ribeiro
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço com novo provedor de internet.	Antônio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	01/04/2013	31/05/2013	-	17/06/2013			20%	Em Andamento	Repactuar data de fim previsto
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação (Mariza)	02/09/2013	31/10/2013	-				0%	A Iniciar	
3	Contratação.	Setor de Licitação (Mariza)	01/11/2013	27/11/2013	-				0%	A Iniciar	
4	Realização do serviço.	Fornecedor	28/11/2013	27/12/2013	180.000,00				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		180.000,00	Valor realizado:		0,00	5%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1) O valor previsto do projeto é referente a estimativa de custo anual do serviço.
2) O trabalho irá demandar repactuação de datas de execução.
2º Ciclo.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 47
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.		
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Jisué Ribeiro		
Problema (causa):	Proporcionar melhor desempenho e disponibilidade de máquinas servidoras e PCs, com menor custo..				
Projeto:	Virtualização de recursos de informática.				
Objetivo do projeto:	Reduzir o custo com aquisição de máquinas servidoras e PCs.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	33	90	120.000,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2013
Data Atualização:	14/06/2013

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Antônio Edgar Cunha e Josué da Silva Ribeiro.
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antônio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	02/05/2013	28/06/2013	-	17/06/2013			20%	Em Andamento		
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	22/08/2013	22/10/2013	-				0%	A Iniciar		
3	Contratação.	Setor de Licitação	23/10/2013	13/11/2013	-				0%	A Iniciar		
4	Realização do serviço.	Fornecedor	14/11/2013	30/12/2013	120.000,00				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		120.000,00	Valor realizado:		0,00	5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	1) O trabalho irá demandar repactuação de datas de execução. 2º Ciclo.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 48
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Jisué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	150.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/03/2014
Data Atualização:	14/06/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Josué da Silva Ribeiro.
---	-------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/2013	03/05/2013	-	04/02/2013			20%	Em Andamento	Repactuar data de fim previsto.
2	Desenvolvimento do módulo de Consulta Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/2013	30/09/2013	-				0%	Atrasado	Datas a serem repactuadas
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/10/2013	31/10/2013	a definir				0%	A Iniciar	Datas a serem repactuadas
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/10/2013	29/11/2013	-				0%	A Iniciar	Datas a serem repactuadas
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	02/12/2013	31/01/2014	-				0%	A Iniciar	Datas a serem repactuadas
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	03/02/2014	31/03/2014	a definir				0%	A Iniciar	Datas a serem repactuadas
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	3%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
a) O Valor Total do Projeto refere-se apenas ao investimento por parte da Sudene. A SUDAM participa com igual valor.
b) Em 2014 serão desenvolvidos e implantados outros módulos para este Sistema, porém, ainda não é possível estimar prazos e custos.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 49
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Em atendimento a legislação em vigor.		
Projeto:	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação		
Objetivo do projeto:	Elaborar a proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, para elaboração da Posic / PSI, no âmbito desta Autarquia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
				0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/09/2013
Data Atualização:	26/07/2013

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado.
---	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Levantamento da legislação em vigor.	Luiz Carlos Dourado.	10/06/2013	14/06/2013	não se aplica	10/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído			
2	Redação da proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.	Luiz Carlos Dourado.	29/07/2013	10/08/2013	não se aplica	25/07/2013			20%	Em Andamento	Curso de Gestão Integral de Documentos em meio eletrônico (Grupo de Trabalho - Portaria 34/2013) Rio de Janeiro 18 a 21/06/2013.		
3	Revisão e publicação da proposta.	Área de TI.	19/08/2013	23/08/2013	não se aplica				0%	A Iniciar	Reprogramado em função das atribuições na Coordenação de TI - férias dos gestores. Aguardando retorno desses e conclusão do PETI		
4	Encaminhamento da proposta para apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	26/08/2013	-----	não se aplica				0%	A Iniciar			
5	Implementação	Área de TI.	A definir						0%	A Iniciar			
					Valor Previsto:	0,00			Valor realizado:	0,00	24%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	2º Ciclo SUDENE.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 50
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Antônio Otaviano Robalinho de Barros	Gestor da subunidade:	Nivaldo Andrade
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE.		
Projeto:	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	33	90	251.373,39

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 251.373,39
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ 251.373,39
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 251.373,39
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/12/2013
Data Atualização:	02/07/2013

Responsáv(el)éis técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
---	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do projeto	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/08/2012	10/11/2012		15/08/2012	10/11/2012		100%	Concluído		
2	Captação de recursos	Angela Nascimento	11/11/2012	20/02/2013	-	11/11/2012	20/02/2013		100%	Concluído		
3	Contatos com articulistas	Marcos Costa Lima	02/01/2013	31/01/2013	-	02/01/2013	31/01/2013		100%	Concluído		
4	Identificação de recursos no orçamento 2013	Angela Nascimento e Frederico Cavalcanti	20/04/2013	20/04/2013		20/04/2013	20/04/2013		100%	Concluído		
5	Orientação para instrução do processo e abertura de processo	Shielely Câmara, Zizete Nogueira, Frederico Cavalcanti, Brivaldo Soares e Eva Porto	03/05/2013	20/05/2013		03/05/2013	20/05/2013		100%	Concluído		
6	Encaminhamento a DAD	Angela Nascimento	22/05/2013	22/05/2013		22/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído		
7	Emissão de Parecer pela Procuradoria Federal/SUDENE	Romoaldo Goulart	24/05/2013	06/06/2013		06/06/2013	06/06/2013		100%	Concluído		
8	Elaboração de Nota Técnica e Plano de Trabalho	Angela Nascimento/Adonis Oliveira	09/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
9	Encaminhamento a CGC	Angela Nascimento	10/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
10	Parecer da CGC	Zizete Nogueira	10/06/2013	11/06/2013		11/06/2013	11/06/2013		100%	Concluído		
11	Encaminhamento a COCF para informar liberação de limites orçamentários	Angela Nascimento	12/06/2013	12/06/2013		12/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído		
12	Atesto da COCF	Brivaldo Soares	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
13	Encaminhamento à Diretoria de Planejamento para inserção pauta de reunião da Diretoria Colegiada	Angela	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
14	Aprovação do Processo na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	14/06/2013	14/06/2013		14/06/2013	14/06/2013		100%	Concluído		
15	Encaminhamento do Termo de Cooperação à Universidade Federal de Pernambuco	Angela Nascimento	28/06/2013	28/06/2013		28/06/2013	28/06/2013		100%	Concluído		
16	Tramitação na UFPE	Diretoria Convênios	01/07/2013	19/07/2013					0%	Em Andamento		

17	Assinatura do Termo de Cooperação	Reitor e Superintendente	22/07/2013	26/07/2013				0%	A Iniciar		
18	Publicação no DOU	Coordenação Convênios	26/07/2013	29/07/2013				0%	A Iniciar		
19	Encaminhamento de Destaque Orçamentário	COCF	29/07/2013	29/07/2013				0%	A Iniciar		
20	Liberação	COCF	A definir		251.373,39			0%	A Iniciar		
21	Execução	CGAF (Angela Nascimento)	A definir					0%	A Iniciar		
22	Relatório Final	CGAF (Angela Nascimento)	A definir	31/12/2013				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	251.373,39	Valor realizado:	0,00	68%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2013)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + Créditos (a)	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2013	Comentários dos desvios
04	122	2111	2000	A	1	24.025.884,00	24.025.884,00	6.397.021,16	100,00	26,63	-	-	-	-	-	
04	128	2111	2000/PO0001	A	1	500.000,00	500.000,00	126.744,24	100,00	25,35	Servidor capacitado	230	-	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a CRH
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	300.000,00	300.000,00	141.470,93	100,00	47,16	Pessoa beneficiada	263	-	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a CRH
04	365	2111	2010	A	1	12.000,00	12.000,00	4.362,60	100,00	36,36	Criança atendida	15	-	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a CRH
04	331	2111	2011	A	1	97.860,00	97.860,00	38.509,34	100,00	39,35	Servidor beneficiado	71	-	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a CRH
04	306	2111	2012	A	1	648.000,00	648.000,00	335.602,82	100,00	51,79	Servidor beneficiado	197	-	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a CRH
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	25.560,00	25.560,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	192	-	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a CRH
04	122	2111	09HB	A	1	2.399.994,00	2.399.994,00	1.022.530,04	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	17.953.872,00	17.953.872,00	7.328.597,06	100,00	-	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	45.963.170,00	45.963.170,00	15.394.838,19	100,00	-	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	1.001.000,00	1.001.000,00	499.286,21	100,00	49,88	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	1.001.000,00	1.001.000,00	499.286,21	100,00	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	2.462.950,00	2.462.950,00		100,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
19	573	2029	8340	A	1	9.347.859,00	9.347.859,00		100,00	0,00	Rede implantada	7		0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
04	127	2029	8689	A	1	1.280.000,00	1.280.000,00		100,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
19	691	2029	8902	A	1	5.195.000,00	5.195.000,00		100,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
04	128	2029	8917	A	1	900.000,00	900.000,00		100,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
22	691	2029	8918	A	1	1.474.361,00	1.474.361,00		100,00	0,00	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
15	244	2029	20N7	A	1	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
15	244	2029	20N9	A	1	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00	0,00	Organização apoiada	4	0	0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1	740.000,00	740.000,00		100,00	0,00	Avaliação Realizada			#DIV/0!	-	
04	127	2029	20WQ/PO002	A	1	738.860,00	738.860,00		100,00	0,00	Sistema Implementado			#DIV/0!	-	
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	58.640,00	58.640,00		100,00	0,00	Iniciativa Implementada	4			-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
04	127	2029	20WQ	A	1	4.414.000,00	4.414.000,00		100,00	0,00					-	
15	244	2029	7K66/1590	A	1	150.000,00	150.000,00		100,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado				-	Emenda Parlamentar
15	244	2029	7K66/7026	A	1	500.000,00	500.000,00		100,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado				-	Emenda Parlamentar
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	30.461.670,00	30.461.670,00	0,00	100,00	0,00					
06	182	2040	8172	A	-	1.600.000,00	1.600.000,00		100,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
06	182	2040	8424	A	-	600.000,00	600.000,00		100,00	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	Solicitar informação da meta realizada com a Coordenação Responsável
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	0,00					
20	606	2052	4518	A	-	600.000,00	0,00		0,00	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Posição: em 06/06/2013 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada. **79.625.840,00** **15.894.124,40**

ANEXO III
Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA 2012-2015

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assessoria de Gestão Institucional
Monitoramento dos Projetos segundo programas do PPA
2º Ciclo - 2013

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até abr/13 (b)	(b/a) (%)
1	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	2.672.400.000,00	1.615.105.668,00	60,4
2	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	1.959.000.000,00	0,00	0,0
3	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	GDK S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	155.354.519,50	0,00	0,0
4	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	61.728.156,00	61.728.156,00	100,0
5	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	53.576.481,00	0,00	0,0
6	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	59.700.000,00	0,00	0,0
7	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	54.900.000,00	0,00	0,0
8	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	64.439.000,00	0,00	0,0
9	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	59.864.000,00	0,00	0,0
10	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	55.278.000,00	0,00	0,0
11	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	55.273.000,00	0,00	0,0
12	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	64.455.000,00	0,00	0,0

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assessoria de Gestão Institucional
Monitoramento dos Projetos segundo programas do PPA
2º Ciclo - 2013

13	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	33.900.000,00	0,00	0,0
14	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	50.000.000,00	0,00	0,0
15	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	49.690.000,03	0,00	0,0
16	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	46.701.999,96	0,00	0,0
17	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	29.040.000,00	0,00	0,0
18	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	53.959.000,00	0,00	0,0
19	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	99.970.000,00	0,00	0,0
								5.679.229.156,49	1.676.833.824,00	29,5
20	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel - Chapada do Araripe	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Atrasado	126.368,00	74.838,00	59,2
								126.368,00	74.838,00	59,2
21	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Atrasado	2.462.950,00	0,00	0,0
								2.462.950,00	0,00	0,0
22	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudos e pesquisas de oleaginosas típicas do Nordeste, para produção de biodiesel.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	700.000,00	700.000,00	100,0
23	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	857.015,99	274.405,33	32,0
24	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE - 3D	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação.	Atrasado	6.496.600,00	0,00	0,0
								8.053.615,99	974.405,33	12,1
25	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	530.482,50	0,00	0,0
								530.482,50	0,00	0,0
26	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa e o centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	800.000,00	280.000,00	35,0

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assessoria de Gestão Institucional
Monitoramento dos Projetos segundo programas do PPA
2º Ciclo - 2013

27	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	1.794.595,93	732.887,59	40,8
28	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	234.105,49	0,00	0,0
29	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Malha aeroviária regional	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Paralisado	0,00	0,00	#DIV/0!
30	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Em Andamento	9.452.840,00	352.840,00	3,7
								12.281.541,42	1.365.727,59	11,1
31	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Atrasado	694.459,19	419.104,63	60,3
32	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Superação de obstáculos ao desenvolvimento regional (Projeto CAPES)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	A definir	Atrasado	5.000.000,00	0,00	0,0
								5.694.459,19	419.104,63	7,4
TOTAL DO PROGRAMA 2029 DO PPA								5.708.378.573,59	1.679.667.899,55	29,4
33	10	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	228.797,21	0,00	0,0
34	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	350.978,27	0,00	0,0
TOTAL DO PROGRAMA 2040 DO PPA								579.775,48	0,00	0,0
35	35	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	1.354.857,53	0,00	0,0
36	36	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	0,00	0,00	#DIV/0!
37	37	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Concurso Público da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.000.000,00	0,00	0,0
38	38	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.256.756,70	1.381.023,82	61,2
39	39	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.084.970,60	30.000,00	1,4
40	40	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	8.152.494,76	4.238.554,76	52,0
41	41	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.184.685,55	70.000,00	3,2
42	42	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Reforma das instalações das salas de trabalho ocupadas pela SUDENE (7º ao 12º andares)	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	8.640.000,00	140.000,00	1,6
43	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação dos Estacionamentos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	900.000,00	0,00	0,0
44	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	0,00	0,00	#DIV/0!
45	45	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	0,00	0,00	#DIV/0!
46	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Melhoria da infraestrutura de comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	180.000,00	0,00	0,0
47	47	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Virtualização de recursos de informática.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	120.000,00	0,00	0,0
48	48	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	150.000,00	0,00	0,0
49	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	0,00	0,00	#DIV/0!
50	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	251.373,39	0,00	0,0
TOTAL DO PROGRAMA 2111 DO PPA								28.275.138,53	5.859.578,58	20,7
TOTAL GERAL								5.737.233.487,60	1.685.527.478,13	29,4

Posição: 27/06/2013

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício e se referem a movimentações até 31 de maio de 2013.
