



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Indicadores do Monitoramento e Controle
da Programação
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

**2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação
2015**

**Recife
18 de junho de 2015**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do 2º Ciclo de Monitoramento	9
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	12
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	26
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	33
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	45
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos	48
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) com base nas metas definidas pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014	51
8 – Observações e Deliberações em plenária de 18/06/2015	53
9 – Conclusão	54
Anexo I – Quadros do monitoramento	56
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2014	186
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	188
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015	193

Introdução

Dando continuidade ao processo interno de monitoramento, realizou-se no dia 18 de junho de 2015, na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar, às 9h, sob condução da Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI), o segundo ciclo de monitoramento. A reunião contou, além da presença dos Coordenadores-Gerais, Coordenadores e responsáveis pelos projetos, com a presença do Superintendente José Márcio, que abriu os trabalhos, além do Diretor de Administração, Marcos Robalinho. O Diretor de Planejamento, Sérgio Alencar, estava em viagem. O Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos não integrava mais a equipe em razão de sua volta para o Banco do Nordeste, seu órgão de origem. Aliás, esta foi a reunião mais concorrida dos últimos tempos.



Foto 1 – Abertura da reunião do 2º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE no dia 18/06/2015.

Por razões de ordem metodológica, a ênfase na apresentação foi dada a projetos com status de atraso ou que contivesse alguma etapa da execução nessa situação. Contudo, antecedendo à data da reunião todas as unidades e gestores dos diferentes escalões receberam o portfólio, que contou com um total de 68 projetos.

A referência para a atualização dos dados foi 29 de maio, último dia útil, e o prazo para entrega de todas as informações, foi o dia 05 de junho. Aliás, cabe lembrar que esse calendário foi apresentado a todos em dezembro do ano passado. Apesar disso, algumas unidades ainda não conseguiram se adequar aos prazos.

A reunião foi aberta com as boas vindas do Superintendente, que relembrou a importância da presença de todos e das deliberações a serem observadas pelas unidades. Lembrou também, a importância do momento vivido, as restrições orçamentárias, a criatividade que precisa ser desenvolvida, a capacidade de articulação do órgão que precisa ser estimulada, o impacto decorrente das restrições para o cumprimento das agendas de vistoria de pleitos de incentivos e de fiscalizações de projetos do FDNE e convênios, pedindo a compreensão de todos. Na sequência, a palavra foi passada para o Coordenador Geral da CGGI que, auxiliado pela Coordenadora de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CPA/CGGI) iniciou com a apresentação dos resultados alcançados até maio, passando a palavra, na sequência, para os responsáveis pelos Planos Operativos, que centraram suas atenções em projetos que estavam na situação de atraso ou com etapas nessa condição.

A referência na apresentação dos resultados alcançados continuou sendo o plano estratégico e suas diretrizes.



Foto 2 – Coordenador Geral da CGGI iniciando os trabalhos de monitoramento do 2º Ciclo de 2015, da SUDENE.



Foto 3 – Momento em que técnico da Coordenação Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável/DPLAN apresentava plano operativo sob sua responsabilidade durante reunião do 2º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE



Foto 4 – Visão geral da equipe de técnicos e dirigentes na reunião do 2º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE.

A maior quantidade de projetos na condição de atraso continuou concentrada na Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, em consequência da legislação que não estabelece prazo para os bancos operadores emitirem o Certificado de Empreendimento Implantado (CEI) de projetos financiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), apesar da Diretoria Colegiada da SUDENE ter aprovado a Resolução nº 214, de 05 de fevereiro de 2015, disciplinando a concessão do CEI, por que a Resolução trata-se de um conjunto de condicionantes a serem observadas pelo Banco. De qualquer forma, insere mais clareza ao processo pois deixa explícita a responsabilidade do agente operador nesse atraso. Em razão disso, os Planos Operativos passaram a apresentar, desde o 1º ciclo, uma diferenciação dos demais: ficam separadas as etapas nas quais SUDENE e Banco atuam, particularmente as atinentes ao processo de liberação, daquela referente à emissão do CEI, de competência exclusiva do agente operador. E o status considerado para fins de monitoramento passa a ser o mostrado nas etapas com atuação conjunta, muito embora tenha sido mantido no PO o campo para o “resultado geral”.

Os procedimentos metodológicos de verificação da consistência se mantiveram os mesmos do ano anterior, lembrando que projetos que apresentaram etapas na situação de “Atraso”, desde que o prazo geral de execução não esteja vencido na data do “travamento das informações” são considerados “Em Andamento”.

A exemplo do 1º ciclo 2015, foi apropriado do Plano Plurianual do Governo Federal o conceito de “Medida Institucional Normativa (MIN)”, que é aquela que, de acordo com o PPA, contribui tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para a diretriz estratégica na qual se enquadra, além de não demandar recursos orçamentários.

Por sua vez, os referenciais para o enquadramento dos projetos na programação estratégica continuam os mesmos aprovados pela Diretoria Colegiada em sua 132ª reunião, realizada em 27/02/2013:

- Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Objetivo 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva;

Objetivo 1.3 – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;

Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;

Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.

- Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos

Objetivo 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;

Objetivo 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;

Objetivo 2.3 - Promover a sustentabilidade ambiental;

Objetivo 2.4 – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

- Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE

Objetivo 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

Sub-objetivo 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras;

Sub-objetivo 3.1.2 – Modernizar a gestão;

Sub-objetivo 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores;

Objetivo 3.2 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;

Objetivo 3.3 – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Nota:

- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

- Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivo 4.1 - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);

Objetivo 4.2 – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

Notas:

- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.

- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês, sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a

exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

Outrossim, neste relatório foram consideradas as alterações no portfólio de projetos que integram a avaliação de desempenho institucional. Não se trata de alteração da Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014, ou das metas lá estabelecidas, mas tão somente de substituição de projetos que estão vinculados a essas metas. A alteração foi aprovada na 200ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 22 de junho de 2015 com base no §2º, art. 5º do Decreto nº 7.133/2010. Adiante são mostradas as substituições realizadas e suas justificativas.

a)Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP)/DPLAN:

Pedido: substituição do projeto “Prioridades e critérios de aplicação dos recursos de 1,5% calculados sobre o produto do retorno das operações de financiamento concedido pelo FDNE e vinculado ao desenvolvimento científico e tecnológico”, pelo projeto “Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE”.

Motivo: A participação ativa de toda a equipe da CGEP/DPLAN na elaboração do PPA em tempo integral entre os dias 20 de janeiro até o presente, com outras equipes internas, “requereu a alocação de cinco [...] servidores” impossibilitando o início do projeto proposto antes de setembro/2015.

b)Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI)/DAD:

Pedido: substituição do projeto “Sistema de Fundos (módulo de acesso público)”, pelo projeto “Modernização da Infraestrutura da Rede Local (1ª etapa).

Motivo: a meta retirada terá revisão do prazo de execução. Além disso, a substituição está sendo feita em razão do entendimento de que a modernização da infraestrutura da rede local é mais estratégica e fundamental para melhorar a capacidade de atendimento das demandas internas.

c)Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI)/Superintendência:

Pedido: substituição do projeto “realinhamento estratégico” pelo projeto “elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA 2016-2019”.

Motivo: É atribuição da CGGI (inciso VIII, art.10 do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2010) *elaborar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional e com as demais diretorias, proposta para o plano plurianual, para a lei de diretrizes orçamentárias e para a lei orçamentária anual, em relação aos projetos e atividades previstos na área de atuação da SUDENE*”. A CGGI tem uma equipe muito pequena e isso impossibilitou a execução do projeto de realinhamento estratégico no primeiro semestre. Aliás, desde 20 de janeiro (e até 17 de julho - prazo para encerramento da fase de captação quantitativa, segundo o MPO) a CGGI estará trabalhando articulada não só com o MI mas também com o MPO. Nesse período (até 17 de junho) a unidade promoveu e coordenou dezenas de reuniões (internas e por videoconferência), articulou com diferentes ministérios, emitiu centenas de e-mails e negociou viagens sistemáticas para acompanhamento presencial das discussões, impossibilitando assim, o envolvimento em outro projeto.

d) Coordenação Geral de Logística, Administração e Finanças (CGAF)/DAD:

Pedido: substituição do projeto "sistema de monitoramento de despesas administrativas em programas de gerenciamento de custos" pelo projeto "Recuperação do Anexo Nilo Coelho".


Motivo: O fato motivador do projeto inicialmente proposto era acompanhar as despesas nas novas instalações da SUDENE, tal como previsto no final de 2014, porém restrições orçamentárias e a proibição de criação de novos gastos pelo governo federal inviabilizaram tanto a mudança como o desenvolvimento do sistema. Por sua vez registra a CGAF que a recuperação do Anexo Nilo Coelho é de fundamental importância pelos motivos a seguir elencados:

- * nesse Anexo existem dois auditórios com aproximadamente 400 m² cada, denominados Auditório Castelo Branco e Auditório Presidente Médici;
 - * no Auditório Castelo Branco, com capacidade para 112 pessoas sentadas, são realizadas as reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo da Sudene;
 - * no Auditório Presidente Médici, com capacidade para 380 pessoas sentadas, são realizados todos os eventos de interesse institucional que necessitam da presença de grande número de assistentes;
 - * após recente incêndio ocorrido nessa edificação, o Anexo esteve seriamente ameaçado de demolição, tendo sido totalmente recuperada a sua situação estrutural, pois os pilares, vigas e lajes foram adequadamente reforçados no período de março/2013 a fevereiro /2014;
 - * neste Exercício de 2015 foi contratada a empresa Compor Engenharia Ltda., que será responsável pela elaboração de todos os projetos Básicos e Executivos necessários para a reforma integral da edificação sinistrada, tendo a Ordem de Execução dos Serviços sido emitida no último dia 11/06/2015, com prazo total de 150 dias para conclusão desses serviços;
 - * essa empresa já manteve diversos entendimentos com a área técnica da CGAF, no sentido de prover o Anexo Nilo Coelho com a melhor das condições de funcionamento das suas instalações, inclusive com a previsão de que o Auditório Presidente Médici tenha uma disponibilidade multiutilitária, de forma que esta Autarquia possa, dentro em breve, angariar recursos extras com o aluguel desse Auditório, como fazem, por exemplo, a UFPE e a UNICAP.
- E acrescenta a CGAF, "a reutilização do Anexo Nilo Coelho, principalmente com o retorno da realização das reuniões do Conselho Deliberativo em nossas instalações, terá uma repercussão política altamente positiva para a nossa Instituição, trazendo a Sudene de volta às páginas de Política e de Economia dos jornais de grande circulação de nosso País."

As deliberações e encaminhamentos da alta administração constam de capítulo específico deste relatório.

1- Resultados do 2º Ciclo de Monitoramento 2015

O Gráfico 1, adiante, visa mostrar o comportamento dos projetos quanto ao seu andamento entre o 1º e o 2º ciclo de monitoramento.

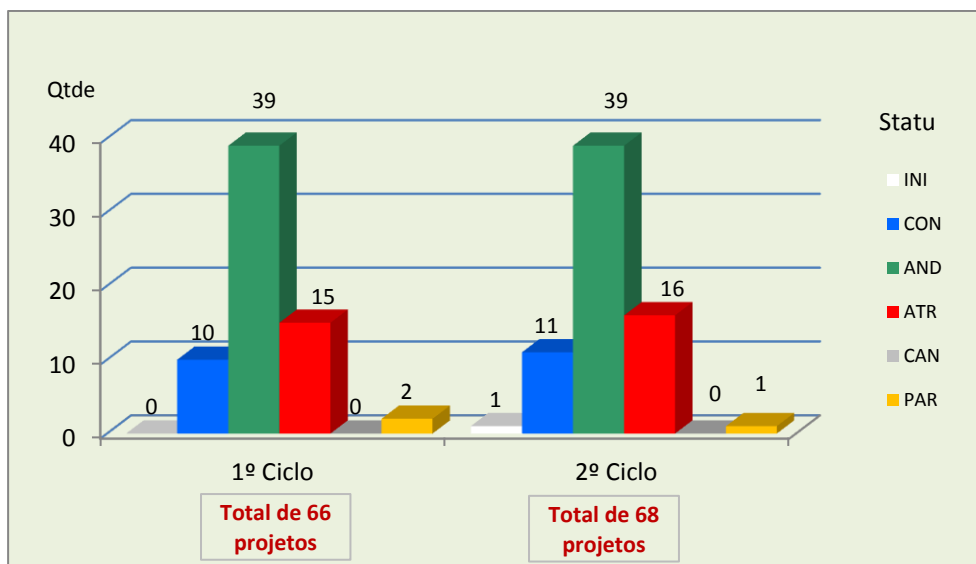

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2015

A Tabela 1 detalha a distribuição dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, os recursos previstos e liberados e o status desses projetos segundo a programação estratégica vigente.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2015

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status ²						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
1	1.1	46	9.295.649,37	5.606.665,32	1	9	22	14	-	-	46
	1.4	2	0,00	0,00	-	1	1	-	-	-	2
	1.5	1	234,11	139,87	-	-	1	-	-	-	1
2	2.3	2	1.366,31	265,24	-	-	2	-	-	-	2
	2.4	2	579,78	518,98	-	-	1	1	-	-	2
3	3.1	5	61,60	6,60	-	-	4	1	-	-	5
	3.2	4	3.565,81	1.358,30	-	-	4	-	-	-	4
	3.3	3	21.890,21	8.711,50	-	-	2	-	-	1	3
	MIN	3	0,00	0,00	-	1	2	-	-	-	3
TOTAL		68	9.323.347,18	5.617.665,81	1	11	39	16	0	1	68

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Convenções:

1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e MIN – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.


Observações:

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 18/06/2015 (2º Ciclo de monitoramento-2015)

O gráfico 2, adiante, foi elaborado com base nos dados da tabela 1.

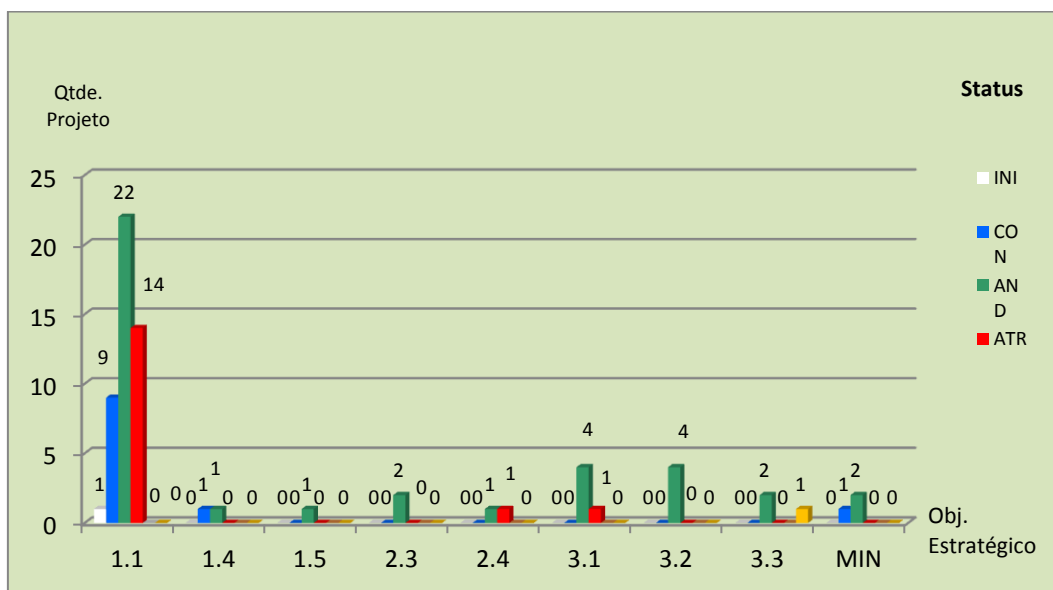

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Nota: As convenções para diretrizes e objetivos estratégicos são as mesmas citadas na Tabela 1.

Gráfico 2 – Situação dos Projetos segundo Objetivos Estratégicos do 2º Ciclo de Monitoramento de 2015

A Tabela 2, por sua vez, detalha a distribuição dos 68 projetos segundo programas e ações do PPA 2012-2015, mostrando ainda, os recursos previstos, liberados e o andamento de cada projeto segundo cada ação do PPA.

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2015

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	28	9.274.269,60	5.596.768,18		8	9	11			28
	4640	2	2.252,99	1.509,74			2				2
	8340	2	2.857,02	2.134,02			2				2
	8689	2	1.366,31	265,24			2				2
	8902	8	13.827,10	4.914,29		1	5	2			8
	8917	2	617,75	107,35			2				2
	8918	1	694,46	694,46				1			1
	20N7	2	1.114,58	427,15			2				2
	7K66	1	250,00	250,00			1				1
Sub-Total		48	9.297.249,79	5.607.070,43	0	9	25	14	0	0	48
2040	8172	2	579,78	518,98			1	1			2
Sub-Total		2	579,78	518,98	0	0	1	1	0	0	2
2111	2000	12	25.517,62	10.076,40			10	1		1	12
Sub-Total		12	25.517,62	10.076,40	0	0	10	1	0	1	12
	MIN	6	0,00	0,00	1	2	3				6
Sub-Total		6	0,00	0,00	1	2	3	0	0	0	6
TOTAL		68	9.323.347,18	5.617.665,81	1	11	39	16	0	1	68

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Posição: 18/06/2015

Convenções:

1- Códigos de Programas e Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8340 -

Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria); Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade); Ações internas - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e quando relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional continuam como internas, e quando destinam-se a fornecer insumo para a melhoria da qualidade da gestão são chamadas de MIN – Medida Institucional Normativa.

2-INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.


Observações:

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 18/06/2015 (2º Ciclo de monitoramento 2015)

O gráfico 3 mostra os desembolsos de recursos segundo objetivos da programação estratégica da SUDENE, contabilizados até o 2º ciclo de monitoramento.

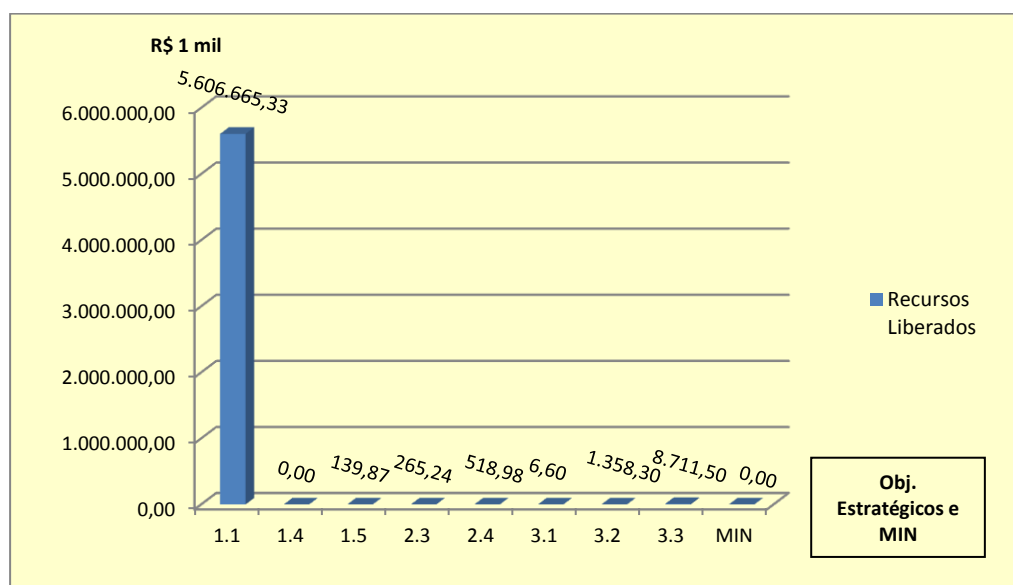

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Convenção:

As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e **MIN** – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

Gráfico 3 – Recursos liberados segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º Ciclo – 2015)


2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{3 \times 100}{3} = 100,00 \%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2015
- f) Comentários: Não foi informado
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	98,6 %	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015

- h) Representação gráfica



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Técnicos}} = \frac{3}{7} = 0,43 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2015

f) Comentários: A partir de julho de 2014 foram incorporados 5 novos técnicos, o que reduziu a média de consultas prévias analisadas por cada técnico. Significa dizer que o resultado menor em relação a anteriores não significa queda de produtividade. Aliás, o numerador da fração revela uma queda acentuada do estoque de consultas prévias no período.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	2,05 análises/técnico	-
Jan a Nov/2012	0,67 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	3,57 análise/técnico	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

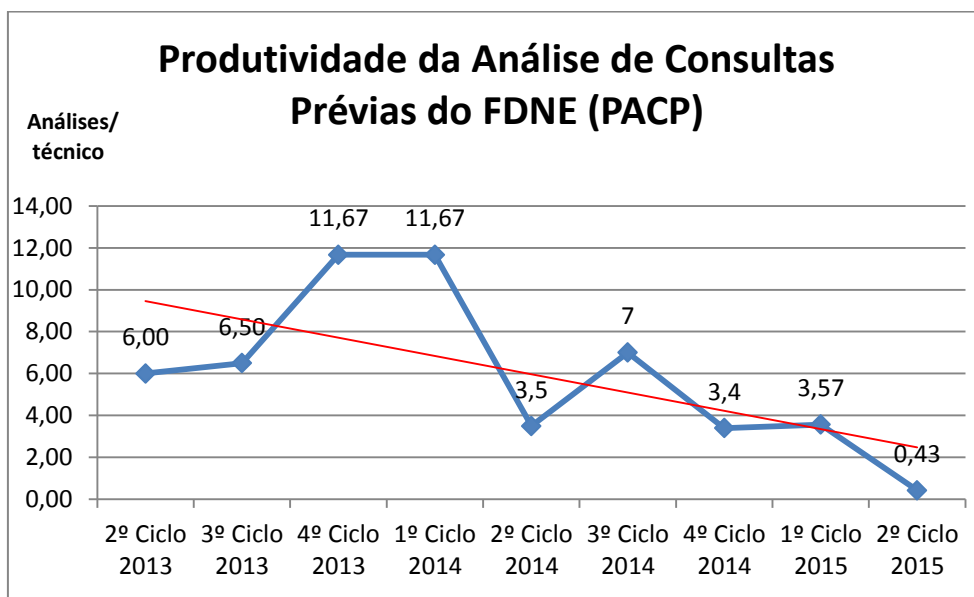

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.3 - Consistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{0 \times 100}{3} = 0\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2015
- f) Comentários: Uma consulta prévia foi apresentada em 04/05/2015, e ainda estava em análise em 31/05/2015, razão pela qual foi desconsiderada no cálculo.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	40,80 %	-
Jan a Nov/2012	100,00 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

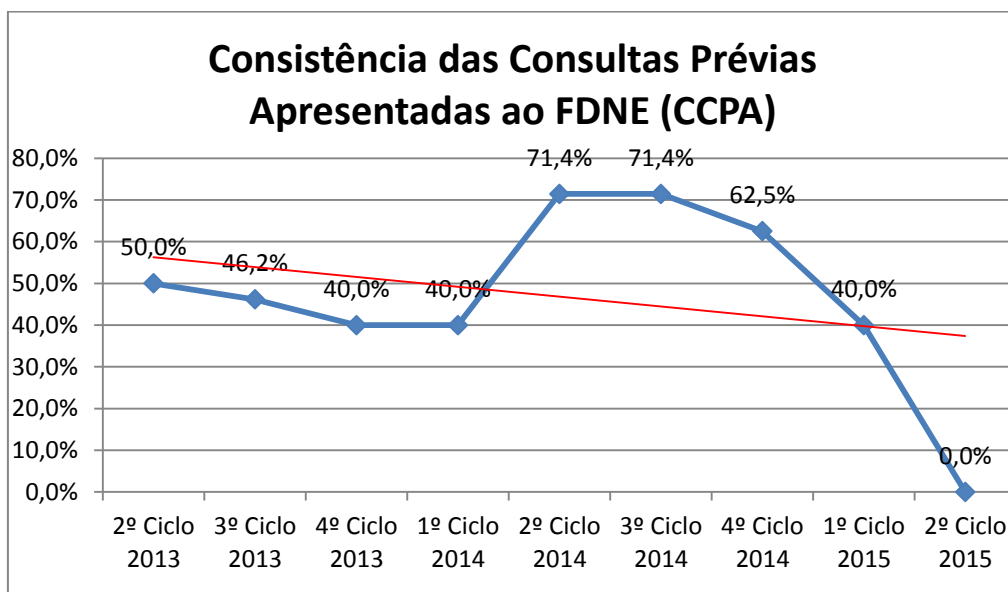

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

Observação: o resultado revela bom aproveitamento na aferição do cumprimento dos padrões regulamentares pelas empresas demandantes do FDNE

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{120 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,50$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))


e) Periodicidade: Jan-mai/2015

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:


Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelas razões já expostas	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelas razões já expostas	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

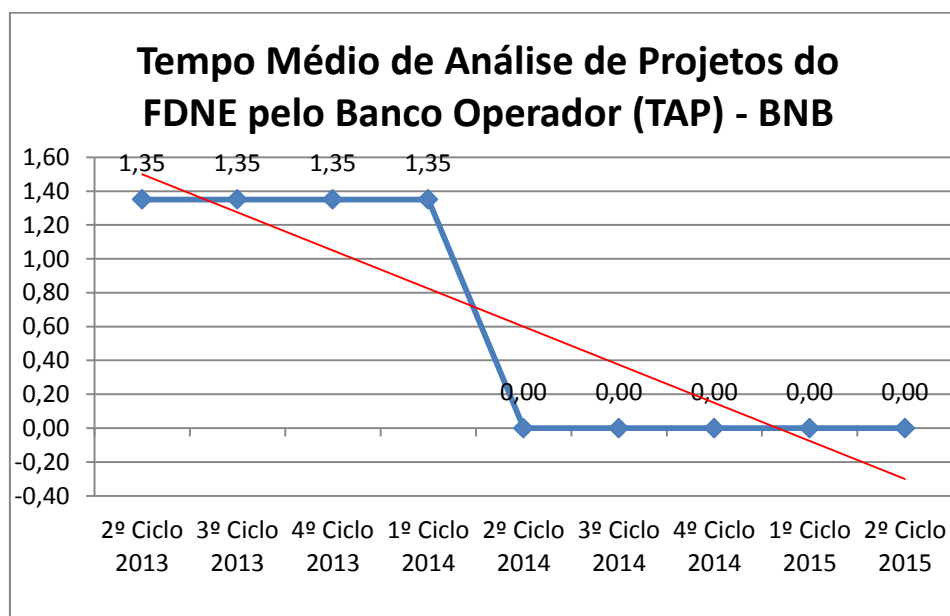


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

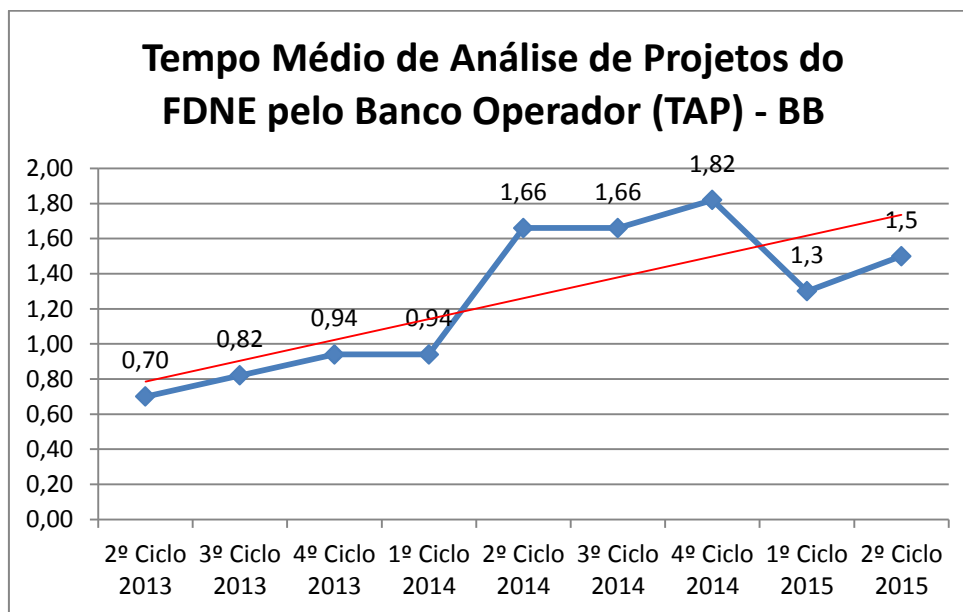

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

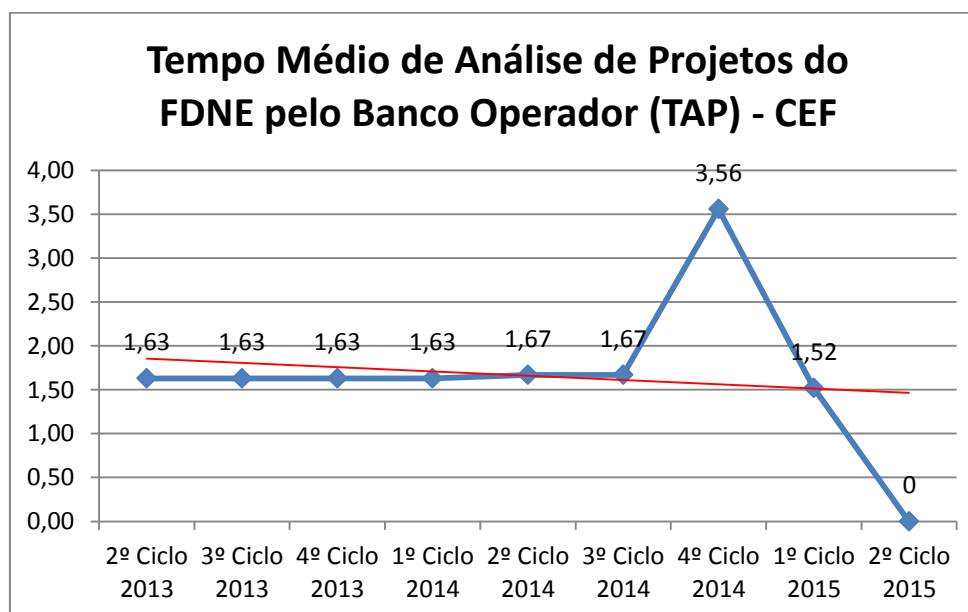

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{2} = 50\%$$


a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2015
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelas razões já expostas	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

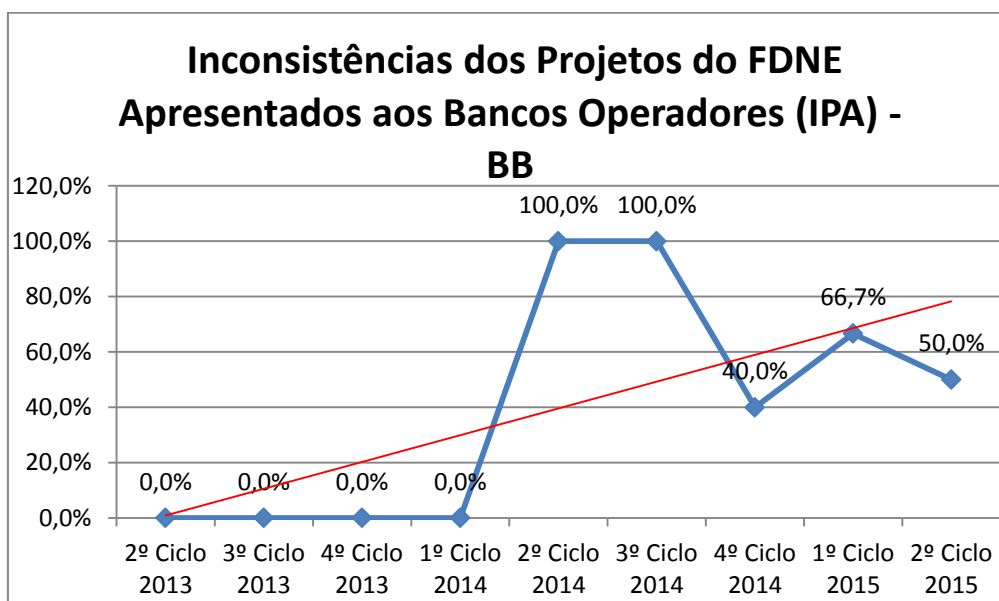

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

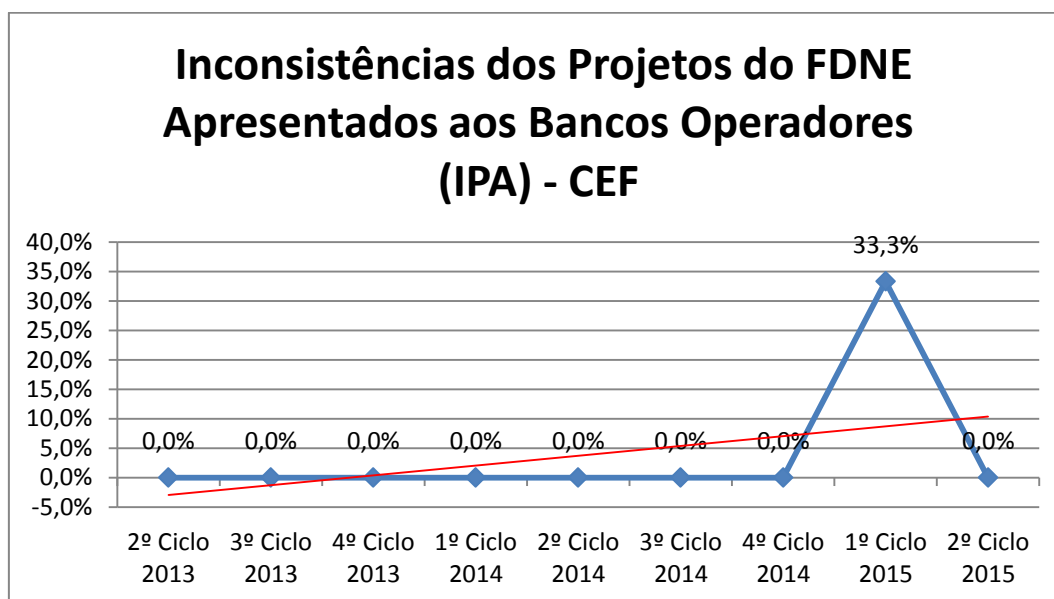


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor empenhado LOA 2015} \times 100}{\text{Dotação LOA 2015}} = \frac{257.145.223,88 \times 100}{2.022.481.635,00} = 12,71\%$$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2015
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	100,0 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

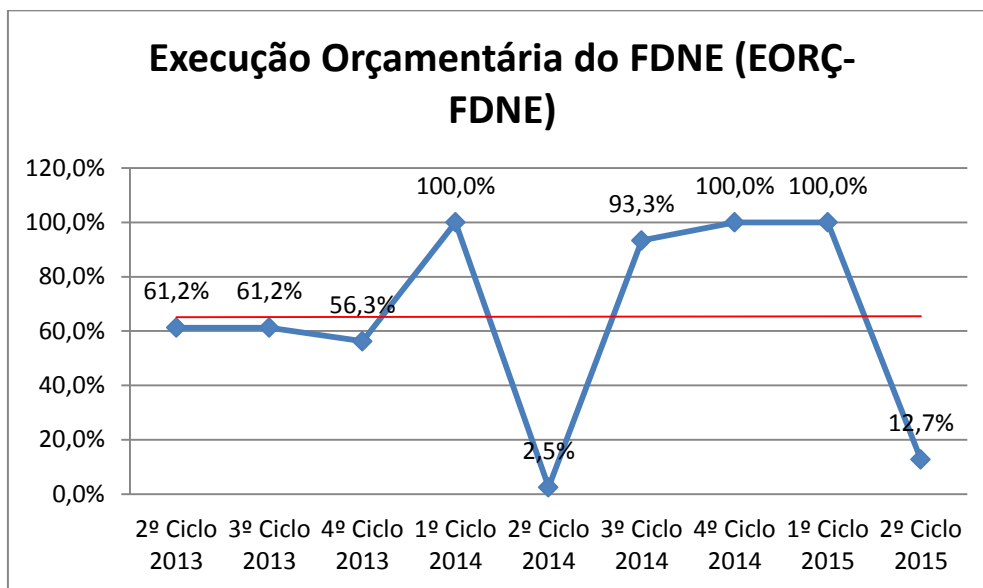

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Total de Recursos Empenhados}} = \frac{6.173.404.612,17 \times 100}{10.231.469.672,63} = 60,34\%$$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos e globais, o volume de liberações do FDNE face às suas disponibilidades. Ou seja, o quanto de recursos foram liberados pelo FDNE desde o início de sua operação em 2007, até a data fixada para esta aferição, comparando-o aos recursos empenhados (inclusos os saldos inscritos em Restos a Pagar) no mesmo período, deduzidos os cancelamentos.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Referência da aferição: mai/2015


f) Comentários: No análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	14,2 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013

Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

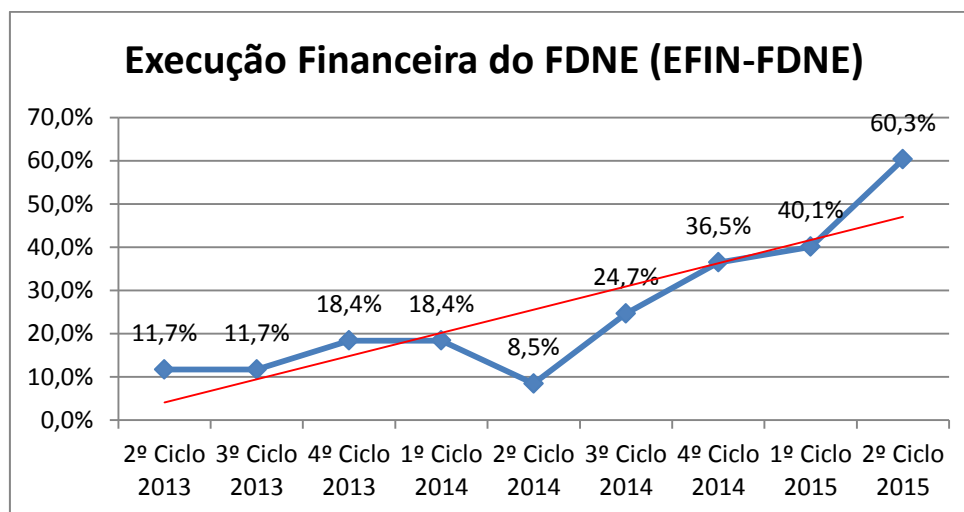

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Observação: Como derivação do cálculo, a Execução Financeira de 2015 contabilizada até o mês da aferição, mostrou:

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Recursos Liberados no Exerc.} \times 100}{\text{Total de Recursos Empenhados no Exerc.}} = \frac{211.509.124,37 \times 100}{257.145.223,88} = 82,25\%$$

Nota: Os montantes empenhados no exercício são norteados pelos valores dos financiamentos aprovados e compreendem o que aconteceu entre janeiro e maio/2015.

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{0}{30} = 0,0$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal)


e) Periodicidade: Jan-mai/2015

f) Comentários O percentual reflete a eficiência da equipe técnica, que utilizou apenas uma fração do tempo máximo legal para tanto. Sugestão de novo nome para o indicador: Indicador de Performance na Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada pelo Bancos Operadores. Não houve aprovação de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	cálculo prejudicado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	cálculo prejudicado	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,63	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

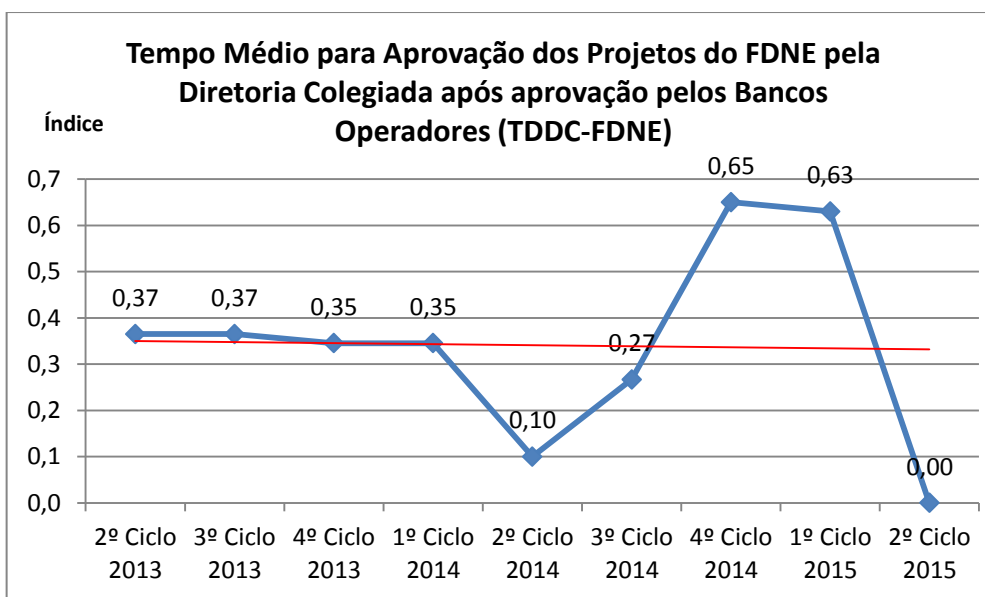

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{0}{0} = 0$ dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 300 dias (igual ou menor que 300 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2015

f) Comentários: Não houve aprovação de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	cálculo prejudicado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	cálculo prejudicado	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

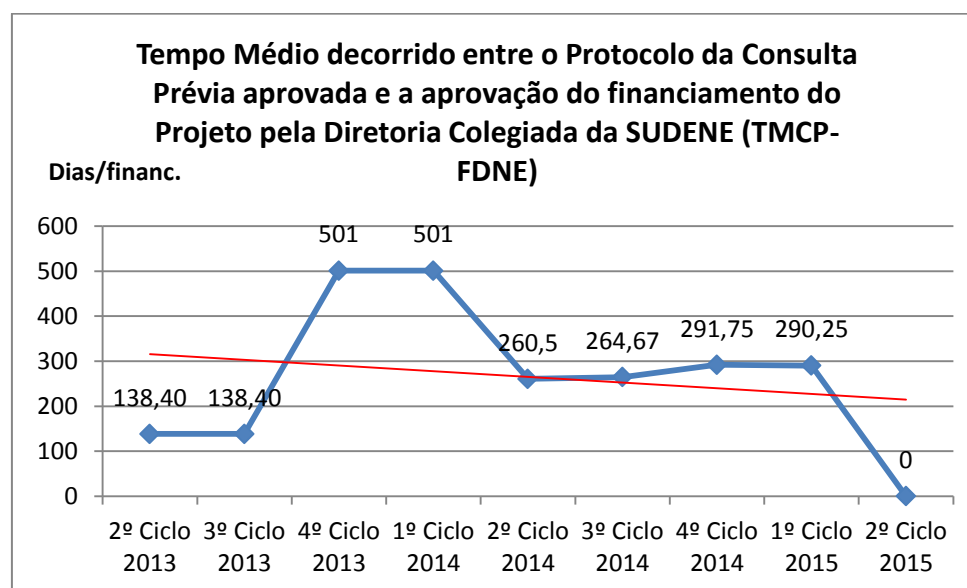

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- **T_m** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{0}{0} = 0,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2015

f) Comentários: Não houve aprovação de financiamento de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	cálculo prejudicado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	cálculo prejudicado	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	1,0	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

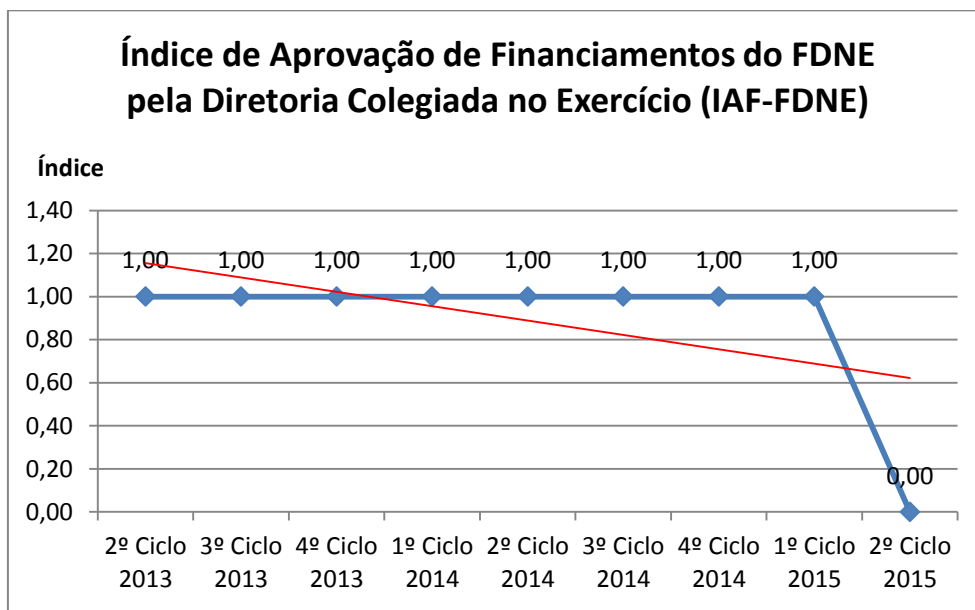

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula:
$$T_1 = \frac{4.297 \text{ dias}}{58 \text{ pleitos}} = 74 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal: Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: jan-mai/2015.
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 31 de maio de 2015, foram vistoriados 58 estabelecimentos dos 84 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o Tempo Médio de Espera atingiu 74 dias. O resultado foi basicamente afetado pelo período de férias uma vez que somente 4 processos dos aprovados no período foram vistoriados entre janeiro e fevereiro. Por sua vez, 2 processos cujo prazo


médio entre a formalização e a vistoria alcançou 146 dias também contribuíram para esse resultado.

Em comparação com igual período de 2014, o atual resultado foi bem mais favorável, uma vez que o Tempo Médio de Espera dos 5 primeiros meses de 2014 foi de 83 dias.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	64,60 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

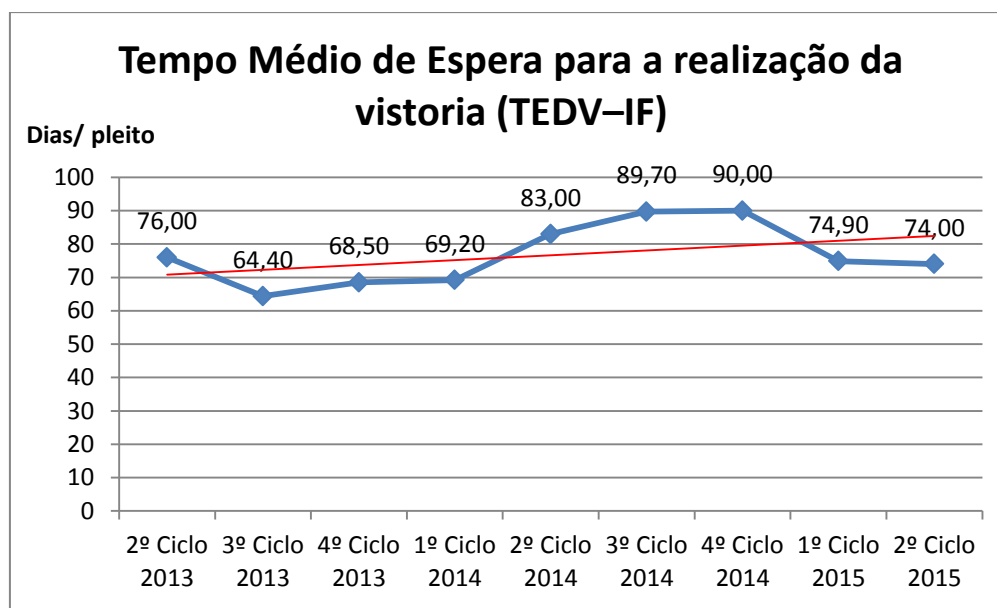

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

$T_1 = \Sigma$ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)


a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0}{144} = 0\%$

- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2015
- f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	2,36 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

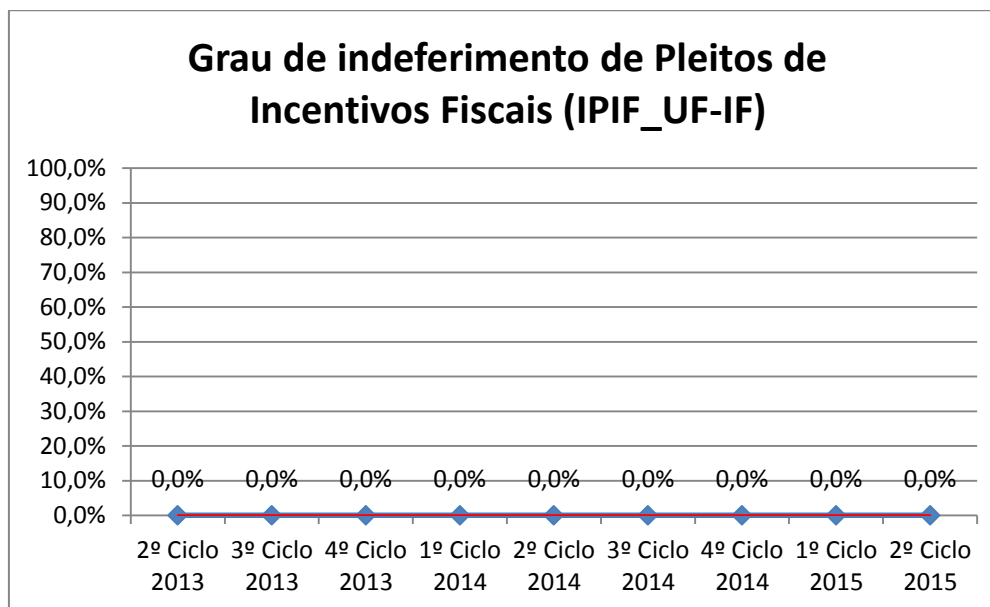

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{n}^\circ \text{ de análises concluídas no período} \times 100}{\text{n}^\circ \text{ de pleitos protocolados no período}} = \frac{109 \times 100}{144} = 75,7 \%$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor


e) Periodicidade: jan-mai/2015

f) Comentários: No período, foram concluídas 109 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 75,7% dos pleitos ingressados.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	77,16 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

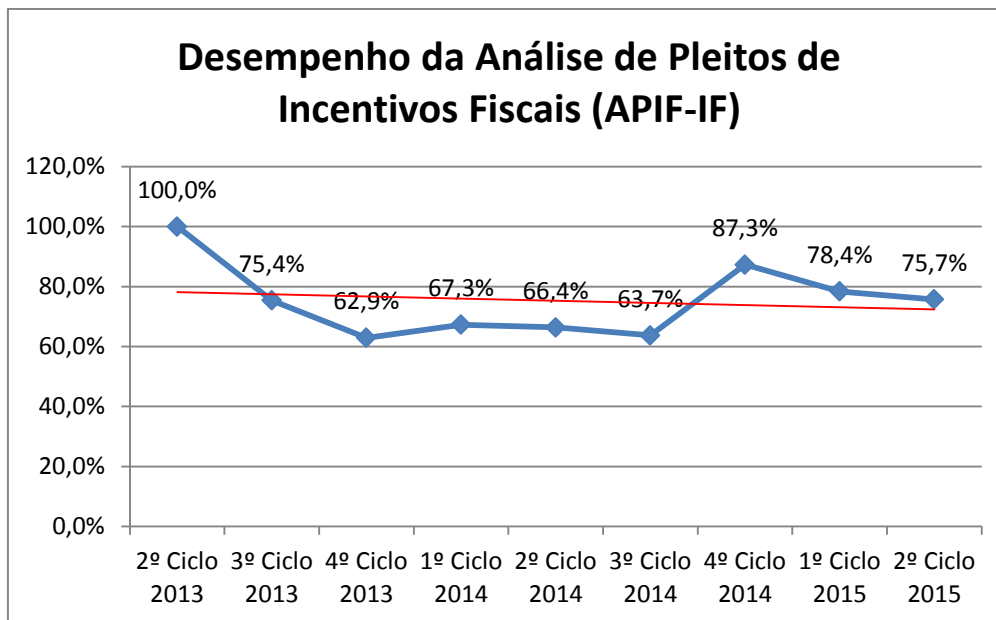

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)


- a) Fórmula: $T1 = \frac{10.544}{N} = 96,7$ dias/pleito
 N 109
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: jan-mai/2015
- f) Comentários: O prazo médio observado, de 96,7 dias decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros cinco meses de 2015 (109). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 113 dias, sendo de 78,2 dias para os processos de isenção do AFRMM e de reinvestimento.
 Em igual período de 2014 o prazo médio observado foi de 113,3 dias

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	53,86 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013

Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

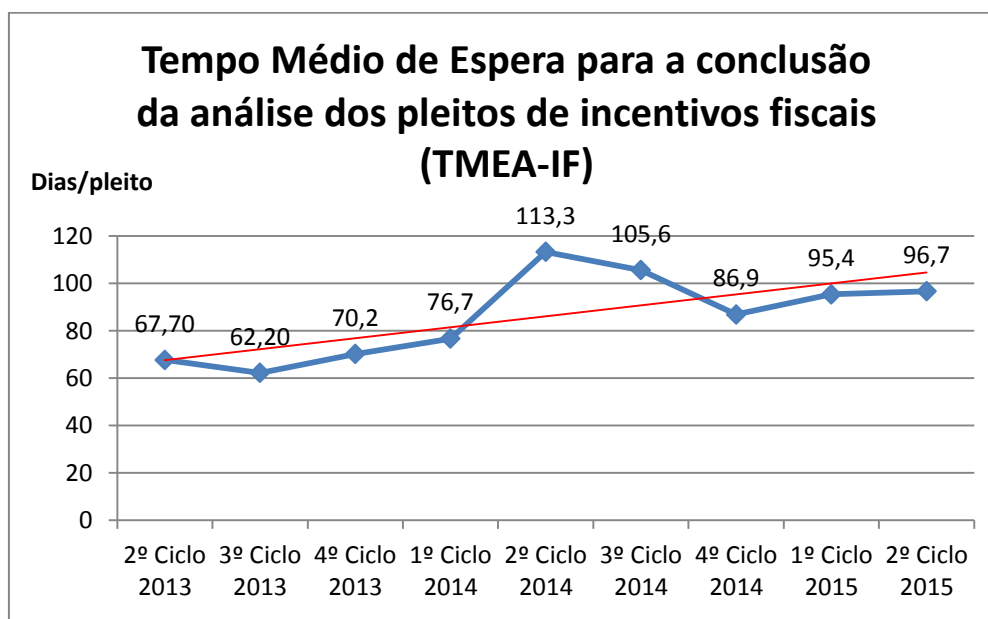

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.


3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{109}{21} = 5,2$ análises/técnico
- Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- Periodicidade: jan-mai/2015
- Comentários: o número observado, de 5,2 análises por técnico, é compatível com o número de técnicos que atualmente compõe a equipe, tendo em vista o ingresso de novos servidores decorrente do último concurso.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,7 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	14,4 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	9,6 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	15 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	21,6 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	29,8 análise/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,5 análise/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	15,1 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

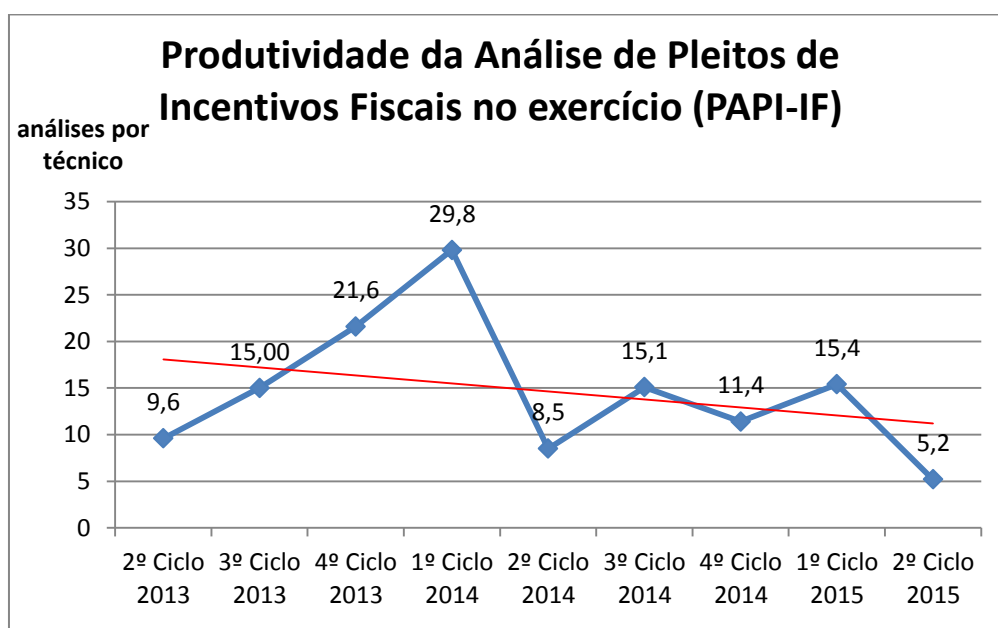

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)


- Fórmula: $\frac{\text{nº de vitorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{58}{10} = 5,8$ vitorias/equipe
- Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)
- Periodicidade: jan-mai/2015

f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 58 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,4 vistorias/equipe	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

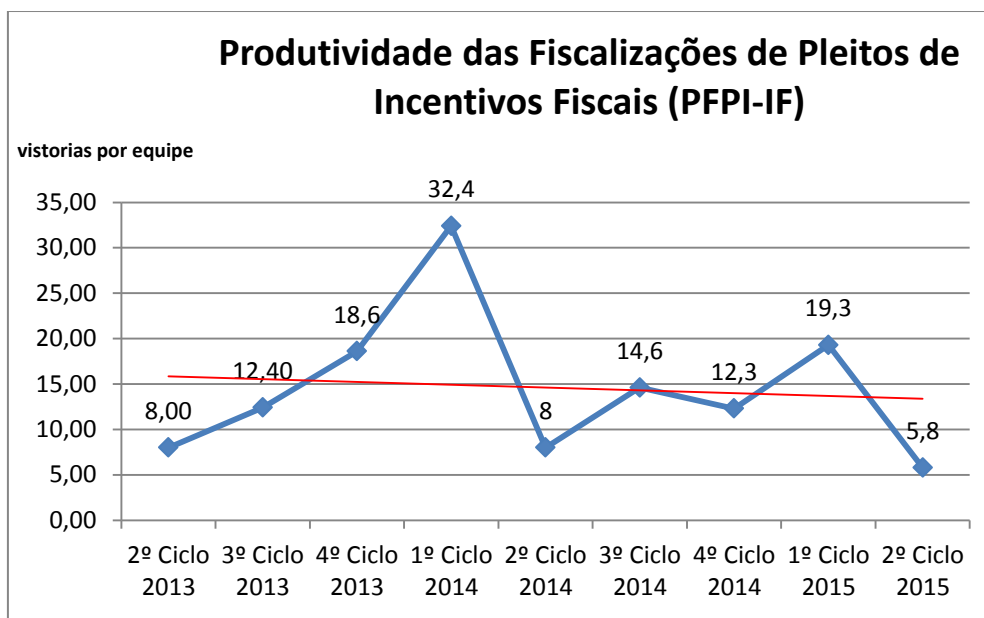

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: jan-mai/2015.

f) Comentários: Não houve pleito de convênio no período de aferição deste ciclo, uma vez que nenhum programa foi disponibilizado para o recebimento de propostas no SICONV neste exercício. Contribuiu para isto o fato de que a LOA foi aprovada somente em 20/04/2015 e que ainda o Decreto Presidencial que apresentava o contingenciamento/cortes de parte do orçamento previsto, data de 22/05/2015, quando houve a confirmação dos recursos disponíveis para serem utilizados no ano em curso, seguindo-se a discussão interna e o planejamento interno para cadastramento dos programas para o recebimento de propostas.

h) Resultados Anteriores:

Dez/2011	100%	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015

g) Representação gráfica:

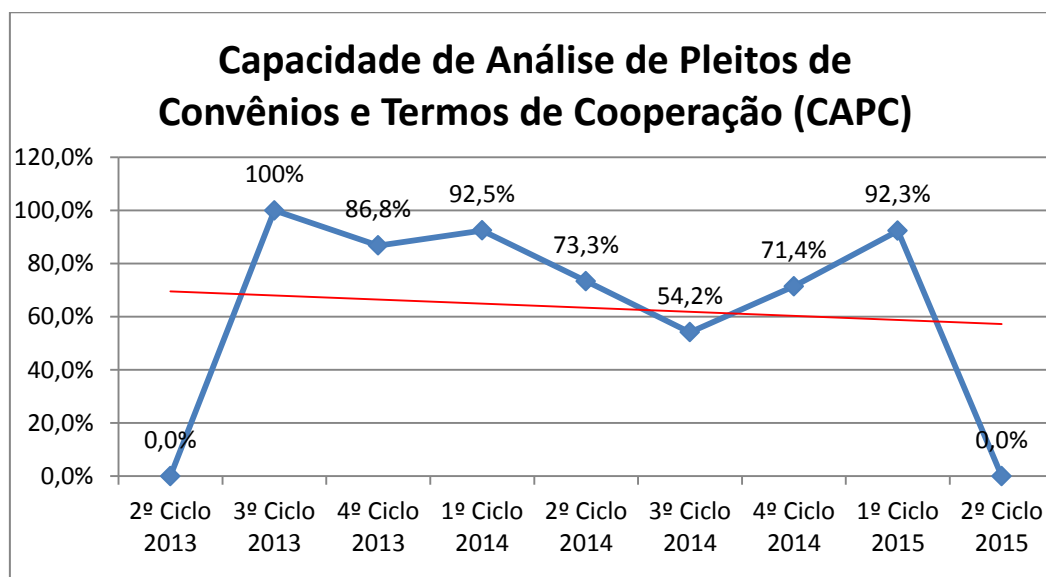

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0 \%$$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período da aferição: jan-mai/2015

f) Comentários: Não houve pleito de convênio no período de aferição deste ciclo, uma vez que nenhum programa foi disponibilizado para o recebimento de propostas no SICONV neste exercício. Contribuiu para isto o fato de que a LOA foi aprovada somente em 20/04/2015 e que ainda o Decreto Presidencial que apresentava o contingenciamento/cortes de parte do orçamento previsto, data de 22/05/2015, quando houve a confirmação dos recursos disponíveis para serem utilizados no ano em curso, seguindo-se a discussão interna e o planejamento interno para cadastramento dos programas para o recebimento de propostas.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	14,6 %	-
Jan a Nov/2012	21,74 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

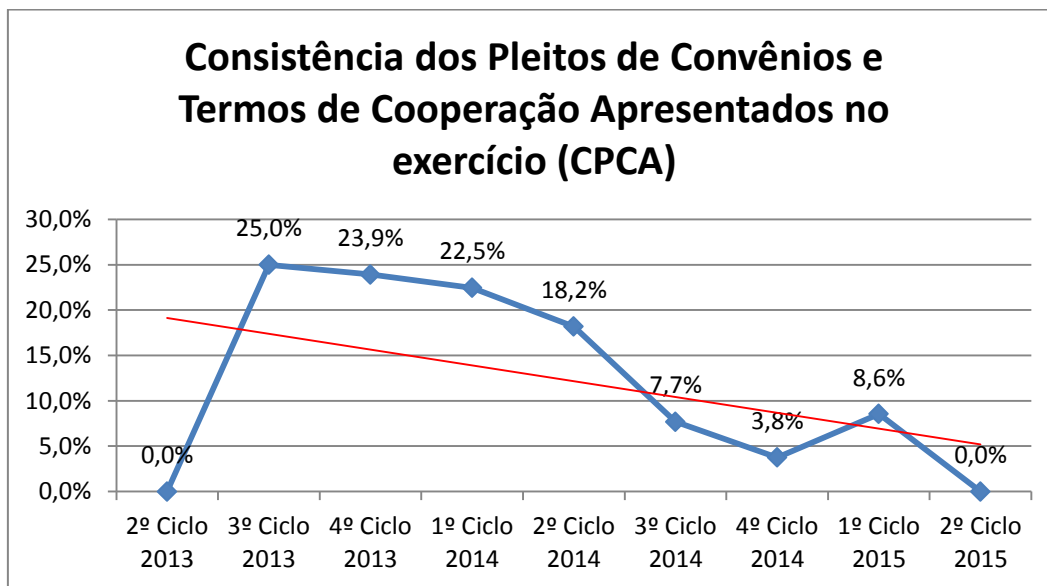

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$$

$$= \frac{0 \times 100}{0} = 0 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: jan-mai/2015

f) Comentários: Não houve pleito de convênio no período de aferição deste ciclo, uma vez que nenhum programa foi disponibilizado para o recebimento de propostas no SICONV neste período. No que se refere aos Termos de Cooperação estão em processo de análise neste período.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,04 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

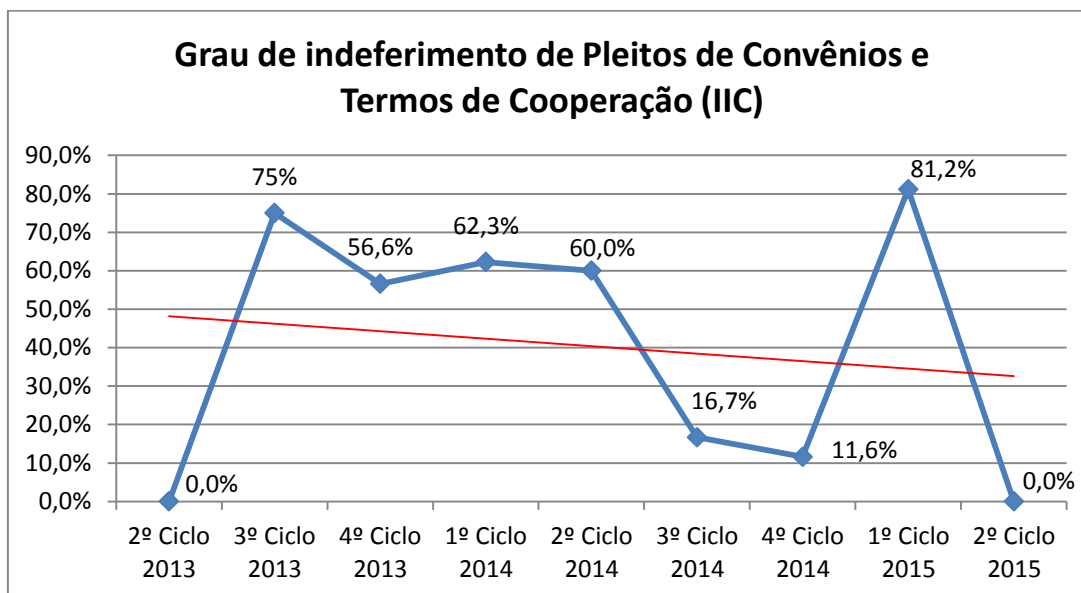

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \frac{10 \times 100}{10} = 100 \%$$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)


e) Período da aferição: jan-mai/2015

f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 10 viagens de acompanhamento da parte física dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não informado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

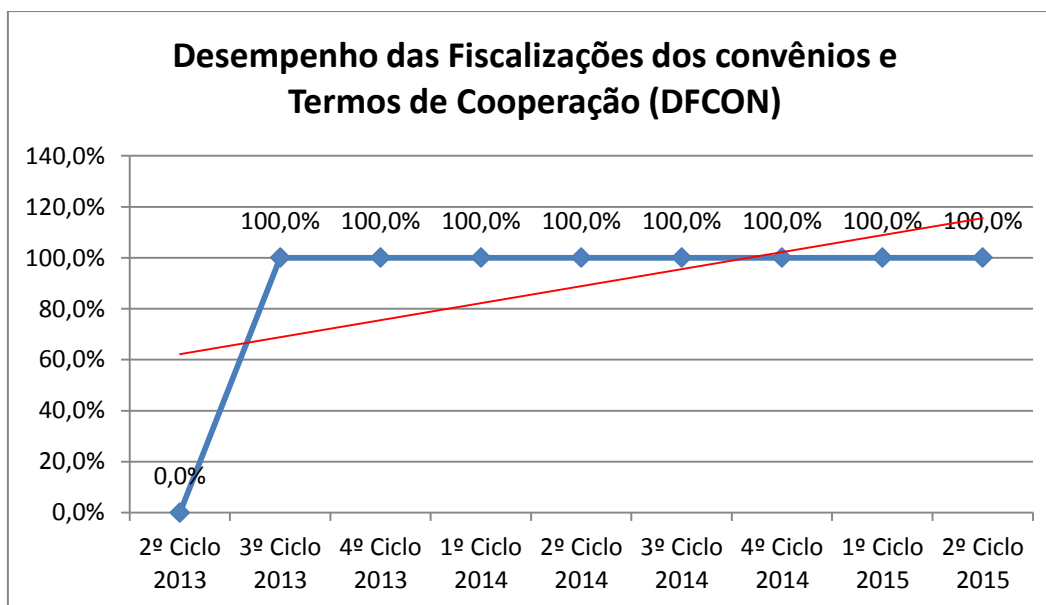

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE JANEIRO A MAIO 2015

CONVÊNIO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar de reunião na EMEPA (Convênio 813986/2014-AL da caprinocultura) e Governo da Paraíba (Convênio 770741/2012 – Capacitação em Defesa Civil)	30.01.2015	João Pessoa PB	Carlos Almiro
Reunião com EMEPA-PB (Discussão sobre Termo de Referência do Convênio nº 813986/2014.	06.02.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki, Victor Uchoa Carlos Almiro, Marcelo de Castro
Reunião sobre o convênio ZEE-Borborema na SEIRHMACT	27.02.2015	João Pessoa PB	Isis Moreira Renato Vaz
Reunião CONDEPE/FIDEM sobre participação da SUDENE na Oficina para o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Bom Conselho	02.03.2015	SUDENE CGDS	Teresa Barbosa, Macira Régia, Vinícius Medeiros, Maria do Socorro, Renato Arruda e Maria Helena
Participar da Oficina de Validação da Caracterização e Diagnóstico Situacional do Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho-PE produto do convênio realizado entre a SUDENE e o CONDEPE/FIDEM nº 769782/2012.	04 a 05.03.2015	Bom Conselho PE	Macira Sotero, Renato Vaz, Vera Lúcia, Maria Helena Socorro Vilar
Reunião com a SEIRHMACT/PB PARA TRATAR DO Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema na Paraíba.	13.03.2015	SUDENE CGDS	Maria Helena, Victor Uchoa, Renato Vaz e Isis Guimarães
Realizar visita de acompanhamento do convênio nº 794987/2013- Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais-PESI/NNE e visita técnica ao CSEM Brasil.	18 a 20.03.2015	Belo Horizonte MG	Maria Helena, Isis Guimarães
Entrevistar alunos que participaram da 1ª etapa de capacitação nos campus de Monteiro e João Pessoa e acompanhar o início das capacitações em 03 campus dos 04 previstos: Monteiro, João Pessoa e Pedra de Fogo, objeto do convênio	24 a 27.03.2015	João Pessoa PB	Macira Régia Givanildo Ramos

59335.000033/2014-24 SUDENE/IFPB			
Participar do Seminário do Agreste Setentrional, onde situa-se a “Bacia Leiteira” onde se encontra o município de Bom Conselho SUDENE/CONDEPE/FIDEM, convênio 59.335.000116/2012-51 – Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência de Bom Conselho “	09 a 10.04.2015	Garanhuns PE	Maria Helena Vera Lúcia Batista
Realizar visita técnica para alinhamento de idéias e orientações a respeito da execução do convênio Construindo com Mulheres 59.335.000533/2014-66	16 a 17.04.15	Maceió AL	Macira Sotero Givanildo Ramos

PROPOSTAS INSERIDAS NO SICONV - JANEIRO A MAIO / 2015

Não houveram propostas inseridas no SICONV entre janeiro e maio de 2015, uma vez que não foi disponibilizado nenhum programa no SICONV neste período.


4.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)_{Conv}

- a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela Unidade}$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.
- c) Responsabilidade da aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-mai/2015
- f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,8 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

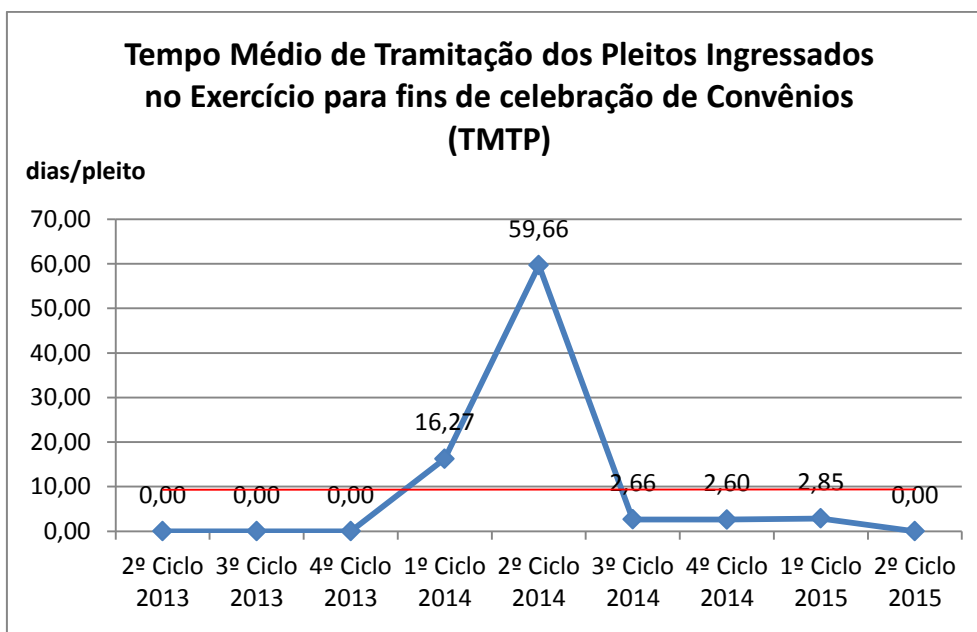

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela Unidade}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): ... dias/pleito (quanto menor melhor)


i) Periodicidade: jan-mai/2015

e) Comentários: **Não informado pela Unidade.**

f) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não existia o indicador	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015

g) Representação gráfica:

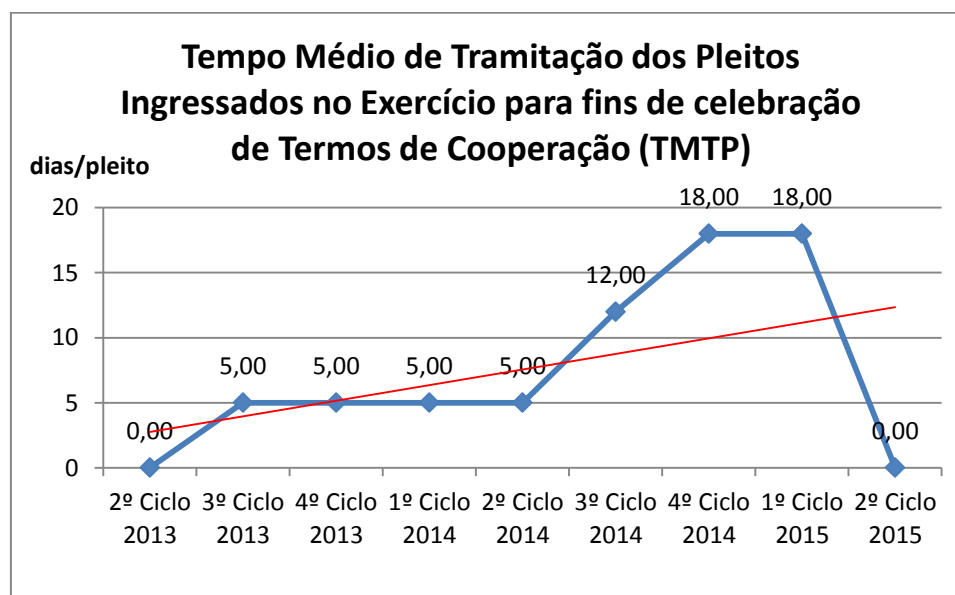

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:


- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

- a) Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{ Final de Convênios "A Aprovar"} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ Inicial de Convênios "A Aprovar"}} = \text{Não informado pela Unidade}$
- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado Ideal (%):% (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-mai/2015
- f) Comentários: **Não informado pela Unidade**
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não foi apurado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

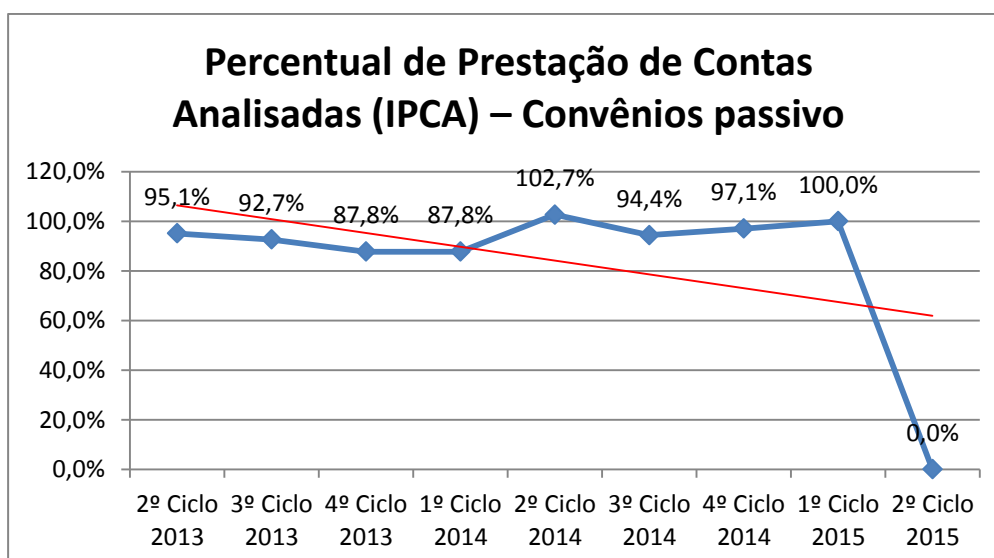

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009

- a) Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{Final de Convênios "A Aprovar"}}{\text{N}^\circ \text{Inicial de Convênios "A Aprovar"}} \times 100 = \text{Não informado pela Unidade}$
- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado Ideal (%): % (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: Não informado pela Unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	92,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	130%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{43 \times 100}{200} = 21,5\%$$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)


e) Período da aferição: jan-mai/2015

f) Comentários: A unidade centrou o plano de capacitação na promoção de eventos *in company*, de forma a contemplar um maior número de servidores e otimizar a aplicação dos recursos. Até o momento, a meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores, foi parcialmente atingida, alcançando 43 (quarenta e três) servidores, representando 21,5%. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 53 (cinquenta e três) inscrições efetivamente realizadas.

g) Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	71,6 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	60%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

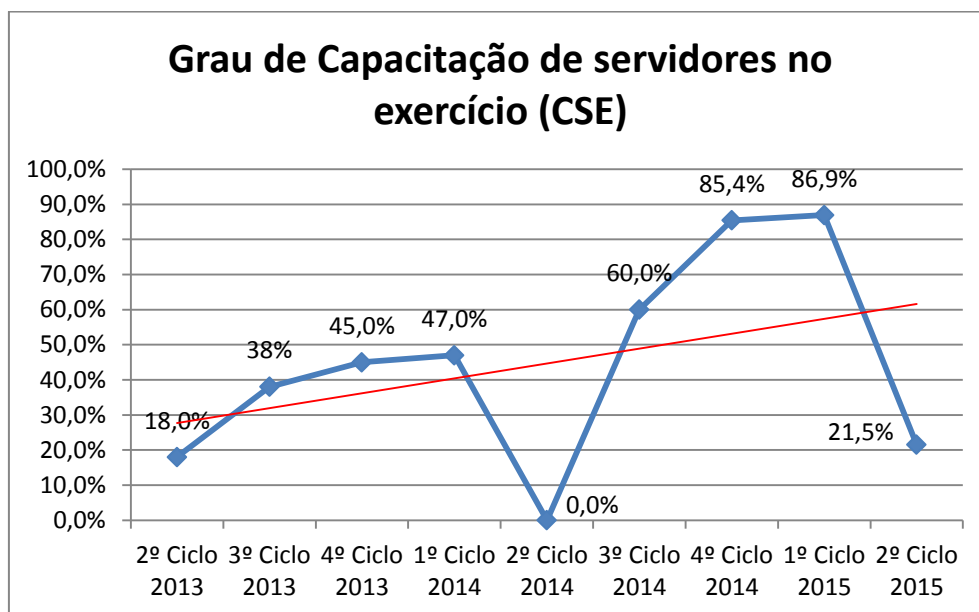

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{31 \times 100}{50} = 62\%$$

b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)


e) Período da aferição: jan-mai/2015

f) Comentários: De janeiro a maio (2015), foram realizados 31 (trinta e um) eventos de capacitação, já ultrapassando 50% da meta prevista de 50 (cinquenta) eventos de capacitação. Se considerarmos o período de out/2014 a maio/2015, período parcial, adotado no cálculo do indicador de avaliação de desempenho institucional, já temos 89 eventos realizados, o que representa 178% da meta prevista para esse indicador em especial.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	66,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	90%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	280%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

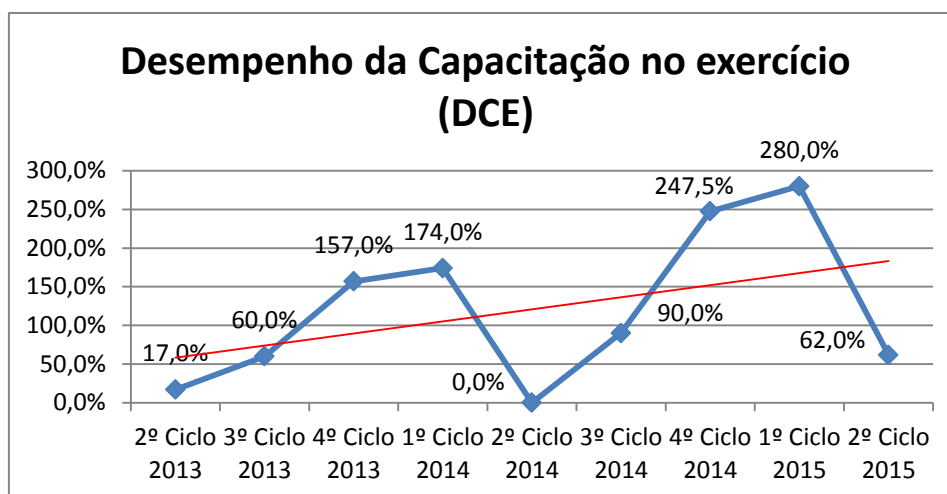

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{153.257,25 \times 100}{600.000,00} = 25,54\%$$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)

e) Periodicidade: jan-mai/2015


f) Comentários: A Sudene arcou com o pagamento de capacitações, até o momento, quer sejam individuais quer sejam de grupos, no valor de R\$ 67.427,50 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte sete reais e cinquenta centavos). Some-se a isso os custos com passagens e diárias no montante de R\$ 85.829,75 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), perfazendo assim, o total de R\$ 153.257,25 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), representando 25,54% do

valor previsto para o investimento em capacitação. Ressalta-se, no entanto, que devido ao contingenciamento de recursos, o orçamento de capacitação está previsto para ser reduzido em 40%, o que resulta numa verba de R\$ 360.000,00. Considerando essa atualização orçamentária, já teria sido investido 42,57% deste valor.

g) Resultados Anteriores (NIC):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	27,8 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	84%	1º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

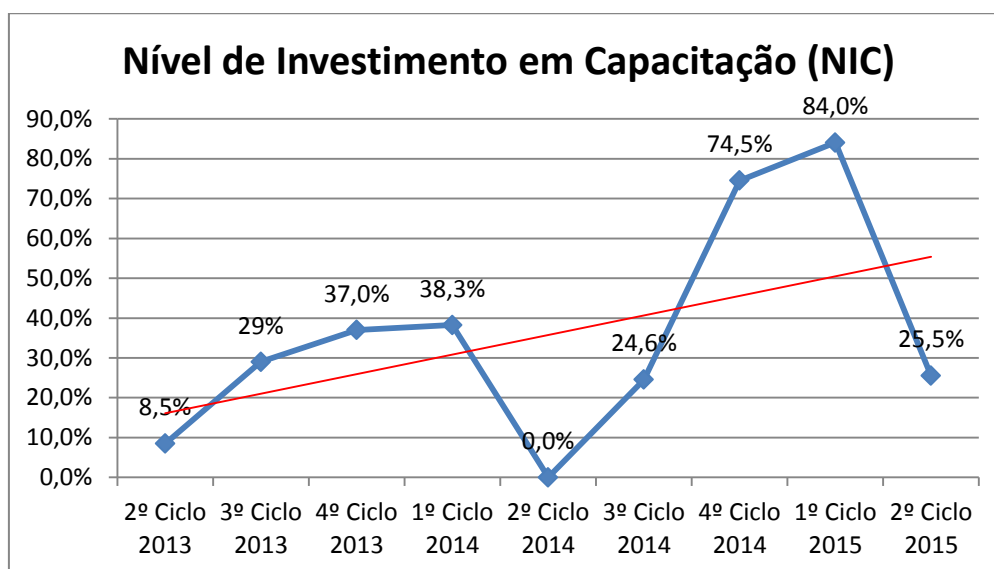

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos


6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{58\% + 89\% + 26,09\%}{3} = 57,70 \%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)
- e) Data da aferição: 20/03/2015
- f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (58%); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (89%); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (26,09%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI. O projeto do sistema de combate a incêndio foi retirado do monitoramento por falta de orçamento (ver deliberação no relatório do ciclo anterior) a pedido do Coordenador Geral da CGAF, Hildo Júnior, e será retomado somente em 2016.
- g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 % (1º e único Ciclo 2012)
 Abr/2013 (4 projetos) = 33,9 % (resultado influenciado pelo detalhamento previsto desses projetos) (1º Ciclo 2013)
 Até mai/2013 = 43,67% (2º Ciclo 2013)
 Até ago/2013 = 61,7% (3º Ciclo 2013)
 Até nov/2013 = 38,55% (4º ciclo 2013)
 Jan a dez/2013 = 41,63% (1º ciclo 2014)
 Jan a mai/2014 = 43,99% (2º ciclo 2014)
 Jan a ago/2014 = 45,64% (3º ciclo 2014)
 Jan a Nov/2014 = 46,8% (4º ciclo 2014)
 Até mar/2015 = 47,57 % (1º ciclo 2015)
- i) Representação gráfica

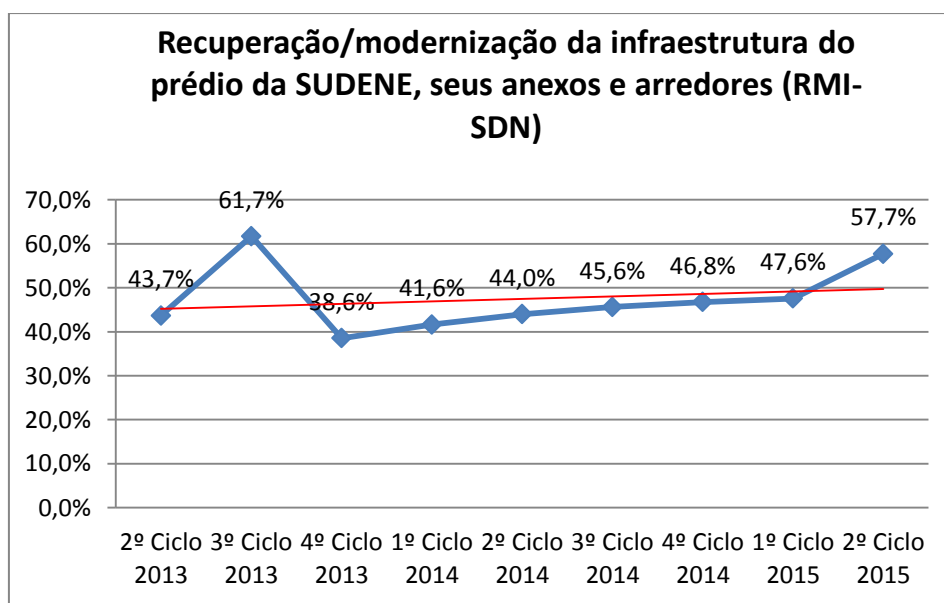

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Observação: No resultado do 2º ciclo 2015 não está incluso o projeto do “sistema de combate a incêndio”.

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é obtido do respectivo Plano Operativo interno.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}} =$

$$\frac{(2.630.114,65+5.981,382,54 +100.000,00) \times 100}{3.185.975,65+8.670.544,86+148.000,00} = 72,6 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, recuperação das fundações do prédio sede, e subestações de energia) da SUDENE. **O projeto do sistema de combate a incêndio foi retirado do monitoramento no ciclo passado por falta de recursos orçamentários**, a pedido do Coordenador Geral da CGAF, Hildo Júnior, e deverá ser retomado em 2016.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 20/mar/2015

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 2.630.114,65 e limite autorizado acumulado=R\$ 3.185.975,65); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 5.981.382,54 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.670.544,86); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 48,5 % (1º Ciclo 2013)

Mai/2013 = 60,4 % (2º ciclo 2013)

Ago/2013 = 42,6 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 73,92 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 53,56% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 67,37% (2º Ciclo 2014)


Jan a ago/2014 = 67,37% (3º ciclo 2014)

Jan a nov/2014 = 68,2% (4º ciclo 2014)

Nota:

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

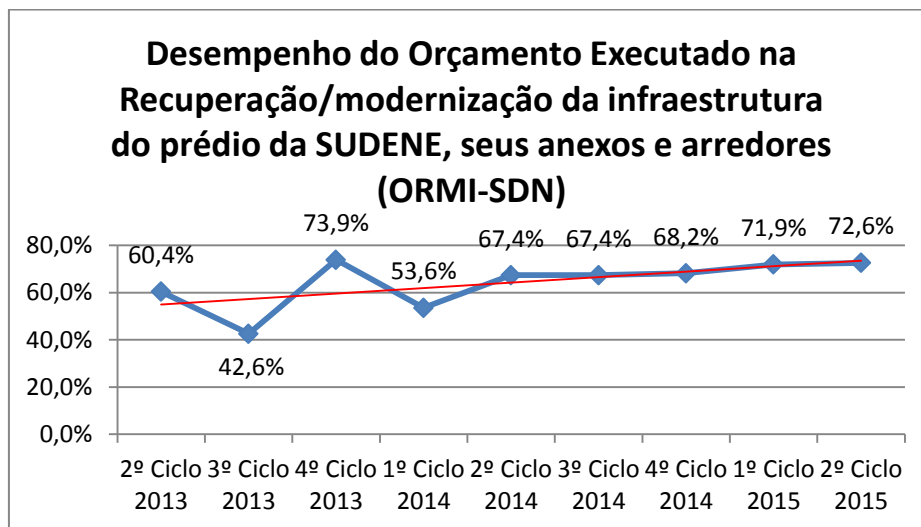

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) com base nas metas definidas pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014 e projetos relacionados

a) Fórmula: Média Aritmética do perc. executado das metas, com base em projetos monitorados =

$$\frac{100\% + 76\% + 14\% + 92,6\% + 0\% + 0\% + 100\% + 0\% + 0\% + 48\% + 70\% + 58\% + 69\%}{13} = 48\%$$

13

Metas de Desempenho Institucional Situação calculada entre out/2014 e mai/2015

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	4572-Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada*	50	100%	80	DAD/CGGP-Auto-explicável. Entre out/14 e mai/15 foram realizadas 89 capacitações
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos aprovados	296	76%	61,08	DFIN/Incent Fiscais -Pleitos aprovados efetivamente pela Diretoria Colegiada. Foram aprovados 226 pleitos.
	0355- Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	R\$ 1.820.000.000	14%	11,30	DFIN/FDNE-Cálculo computado após aprovação do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE. Acréscimos a projetos em execução, desde que aprovados pelo mesmo colegiado, poderão ser computados no cálculo da meta física. Até maio os financiamentos aprovados somaram R\$ 257.145.223,88.

Continua

D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.1-Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Relatórios elaborados	50%	92,6%	74,08	DPLAN/CGEP - (1) - Diretrizes para regionalização da política industrial-PO 23. (2) - Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE. (Avaliação UAB) –PO 27 - (execução de 50 % das etapas, obtido da média aritmética dos projetos).
		Plano elaborado	1	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS-Elaboração de plano de fomento à capacitação de gestão de projetos de desenvolvimento sub-regional.
		Eventos realizados	2	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS - Organização de eventos de difusão de conhecimentos sobre as potencialidades da região (Fórum SUDENE de energia e Seminário SUDENE APLs no semiárido)
		Projeto apoiado	2	100 %	80	DPLAN/CGDS - Apoio à implementação de projetos para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, com prioridade para o semiárido. Foram celebrados os projetos de apoio à caprinocultura no Ceará e na Paraíba. São os POs 11 e 12.
		Oficina realizada	1	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS-Promoção de evento de articulação de parceiros do desenvolvimento local com atuação na região com vistas ao diagnóstico e identificação de demandas de fortalecimento institucional.
		Fórum realizado	2	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS-Organização de fóruns do meio ambiente com objetivo de troca de experiência de programas e projetos voltados a conservação, preservação e recuperação do meio ambiente e uso sustentável.
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	3	48%	38	DAD/CGGP-(1) Projeto de Desenvolvimento de lideranças-PO 59; (2) Projeto de gestão por competências-PO 60; (3) Projeto "Investindo nos Sonhos"-PO 61.
		Projeto implementado	2	70%	56	CGGI - (1) Mapeamento de processos-PO 57 ou outro; (2) Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA-PO 58.;
		Projeto elaborado	1	58%	46,40	DAD/CGAF-Recuperação do Anexo Nilo Coelho
		Sistema disponibilizado	2	69%	55,2	DAD/CGTI-(1) Sistema de Fundos (módulo de projeto) e (2) Modernização da Infraestrutura da Rede Local
MÉDIA ARITMÉTICA				48%	38,40	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

Observações:

* Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.


Notas:

a) Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada.

b) Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional.

c) O presente cálculo refere-se ao 6º Ciclo de avaliação GDPGE e 3º Ciclo de avaliação GDACE, cuja contagem começou em 01 de outubro de 2014 e irá até 30 de setembro de 2015 conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.

b) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional
Período de apuração: out/2014 a maio/2015.

8 – Observações e Deliberações em plenária de 18/06/2015

As deliberações ou encaminhamentos foram postas na ordem de seu surgimento na reunião do dia 18/jun/15, daí o sequenciamento das declarações vinculadas a POs.

- PO 06 – De acordo com a Coordenadora Maria Helena, da Coordenação Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS), da DPLAN, o projeto do Plano Regional de Energia para estruturação de um sistema de informações energéticas trata-se de um acordo de cooperação técnica envolvendo, além da SUDENE, o Centro de Energia Renovável da Universidade Federal de Pernambuco e o Ministério da Integração Nacional e encontra-se em análise na Secretaria Executiva daquele Ministério em atendimento a orientação da Procuradoria da SUDENE, o que deverá gerar revisão das datas previstas no PO;
- PO 07 – A servidora Macira Sotero explicou que por conta do decreto de execução orçamentária 2015, o pagamento de restos a pagar ficou prejudicado, não sendo possível o pagamento de instrutores do projeto. Segundo a técnica, os institutos federais também tiveram problemas para a execução dos recursos;
- PO 08 – foi prorrogado até 28/07. A coordenadora Maria Helena explanou a necessidade de visitas para acompanhamento, solicitando assim liberação e autorização para diárias e passagens;
- Superintendente José Márcio informou que os pedidos de diárias e passagens serão encaminhados ao Ministério da Integração, para que tenham ciência da real necessidade da SUDENE;
- PO 19 – O servidor Marcelo Viana comentou que foi encaminhado pedido de prorrogação pelo Governo da Paraíba, mas devido às dificuldades, e pelo prazo do Siconv, o convênio já está encerrado e será solicitado pela Sudene o encerramento;
- O coordenador Geral Frederico Cavalcanti sugeriu a separação da parte administrativa do projeto, finalizando quando a execução física estiver completa;
- O coordenador Geral Manoel Barreiros lembrou as medidas já adotadas nesse sentido, e que houve a retirada da etapa “parecer financeiro” dos POs que envolvem convênios, como foi o caso da CGDS.
- PO 22 – O relatório do Projeto já foi feito e encaminhado à Diretoria Colegiada. Frederico Cavalcanti sugeriu que os “produtos” da CGEP, que precisem de validação, sejam apresentados em reunião da Diretoria Colegiada, por insuficiência de quórum em reuniões marcadas para tal;
- PO 23 – Houve alteração em etapas do projeto como uma estratégia para eliminação de gastos com diárias e passagens do MI;

- Superintendente opinou que deve manter plano A e plano B enquanto aguardam a decisão do MI sobre diárias e passagens;
- PO 27 – O projeto está atrasado devido ao retardo ocorrido no envio dos dados da Capes/MEC. Esses dados já foram recebidos e serão analisados.
- Manoel Barreiros sugeriu que as datas dos projetos internos sejam ajustadas ouvidos os gestores de cada Diretoria respectiva;
- PO 28 - A Coordenadora Geral Sabrina Oliveira falou que, em relação à empresa Transnordestina Logística, o projeto está com as liberações de recursos atrasadas em virtude de pendências da empresa para comprovar os recursos recebidos, o que está impossibilitando novas liberações;
- PO 29- O projeto da Fiat já está com o pedido da quinta etapa em análise para encaminhamento à Diretoria Colegiada;
- PO 31 – Atraso se deu devido à migração do FNE financiadora para o “novo” FDNE. Aguardando contrato ser assinado;
- Frederico Cavalcanti e Vera Assunção sugerem elaboração de um manual onde contenha interpretação da legislação voltada para a visão da SUDENE, seria o “Manual de Convênios”;
- O Coordenador Geral da CGGI, Manoel Barreiros, informou que a unidade há dois anos vinha trabalhando a sua elaboração, contudo o seu andamento foi interrompido pela negativa da então titular da Coordenação de Gestão de Convênios, mas que o trabalho será retomado, e achou oportuna a sugestão nesse momento;
- PO 63 – O coordenador José Wilson explicou que o projeto está paralisado em virtude da falta de condições técnicas para recuperação física de pilares que são próximos a subestação elétrica. A área jurídica e a empresa estão discutindo uma solução para a realização total da obra, assim, possivelmente o contrato será prorrogado;
- O Superintendente enfatizou a preocupação com o andamento das obras, sugerindo que sejam indicados os nomes dos responsáveis pelos problemas e atrasos.
- PO 64 – Ficou acordado que será encaminhado ao Ministério da Integração ofício solicitando autorização para a realização da obra restante. Serão também convocados os demais integrantes do condomínio para o estabelecimento de compromissos.
- O Superintendente comentou que devem ser compartilhados com os demais condôminos os custos de todas as obras, como as da recuperação das fundações, subestações e outras relacionadas. Para isso, deve ser promovida sensibilização sobre a questão.
- Programa Água para todos – A pedido do Superintendente o servidor Edson Laranjeiras e o Chefe de Gabinete, Clésio Oliveira, informaram que 102 municípios já haviam sido habilitados/contemplados com o projeto sendo 50 do Piauí, 41 da Paraíba e 11 de Pernambuco.

9 – Conclusão

Comparativamente ao ciclo anterior, praticamente não houve alteração de status entre os planos operativos no que tange às situações de atraso, ou paralisação. Neste ciclo, o projeto do “Sistema de Combate a Incêndios” foi retirado do portfólio a pedido da Diretoria de Administração devido às restrições orçamentárias da administração pública federal para este ano, devendo ser retomado somente em 2016.

Ainda sobre restrições, vários projetos que dependem do orçamento de 2015 foram afetados, particularmente os afetos à diretoria citada, relacionados à recuperação da infraestrutura predial (recuperação das fundações, recuperação do anexo Nilo Coelho, recuperação das subestações). Outros foram postergados, como o inicialmente citado. Outros tiveram sua estratégia de execução alterada para depender menos de diárias e passagens, como alguns da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação/DPLAN. Sobre as atividades cujos procedimentos dependem de vistoria, como a concessão de incentivos e benefícios fiscais, convênios, auditoria de projetos do FDNE, que de acordo com a nossa Coordenação de Orçamento, já extrapolaram o limite para o exercício, essas vistorias ficam a depender de autorização do MI, que aliás, poderá vir a negar tais solicitações.

Aliás, causou surpresa o tardio anúncio do Ministério da Integração (maio/2015) sobre a brutal redução, para 2015, do limite para diárias, passagens e despesas com locomoção. Enquanto em 2014 os gastos somaram R\$ 1.218,15 mil, para este ano os gastos foram limitados a R\$ 476 mil, conforme a Portaria MI n.º 463, de 30/12/2014. Ocorre que, apesar das inúmeras correspondências eletrônicas enviadas pela SUDENE àquele Ministério entre janeiro e maio deste ano pedindo manifestação sobre o limite a ser fixado, a exemplo do ofício n.º 180/2015/GAB/SUDENE, de 05/05/2015, comunicando a necessidade anual da Autarquia, essa informação só veio ao conhecimento no dia 28 de maio, desconhecimento que impactou no monitoramento das despesas, que no início de junho somavam aproximadamente R\$ 570 mil.

Outro efeito dessas restrições poderá vir a ser a indesejada revisão dos prazos previstos na execução de diversos projetos retratados pelos planos operativos, e indesejado por que já foi objeto de observação da Controladoria Regional da União em Pernambuco, naturalmente por outras razões, a exemplo daqueles que se utilizam do Programa 2040 – Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, do PPA.

Considerando-se os recursos de “Restos a Pagar” de exercícios anteriores e do exercício orçamentário vigente, observa-se representativa concentração na diretriz 1- Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, muito em razão dos projetos do FDNE. Por outro lado, mostra-se convergente com a finalidade da SUDENE de *promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional*, mas não o suficiente para o cumprimento da missão da qual foi imbuída: *articular e fomentar a cooperação das forças sociais representativas para promover o desenvolvimento includente e sustentável do Nordeste, a preservação cultural e a integração competitiva da base econômica da região nos mercados nacional e internacional*.

Não se pode ignorar que tal missão incorpora a necessidade de articulação, negociação e mobilização, condições novamente prejudicadas pelas limitações que, independentemente da vontade institucional, a cada ano se renovam e se mostram, pois quando não se originam de motivações orçamentárias como a atual, se originam de resistências interinstitucionais em nossa esfera de governança.

De todo modo, a execução financeira detalhada nos quadros deste relatório, constantes do item 1, segundo objetivos estratégicos e mesmo segundo a programação do PPA, se mostra alinhada com o planejamento estratégico e a missão institucional.

Finalmente, um último aspecto a considerar é a necessidade de se promover a melhoria de alguns indicadores para convênios e gestão de pessoas. As unidades já haviam sido contactadas no final de 2013 e novamente em 2014, mas os avanços foram insignificantes. Pretende-se, este ano a substituição de alguns para um melhor acompanhamento do desempenho delas.

O quadro a seguir mostra a agenda de momentos até o final do ano, para a organização e remessa das informações à CGGI, coordenadora do monitoramento.

**Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos
de Monitoramento da SUDENE no Exercício de 2015
(Programação do 2º Semestre)**

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
3º	28/08/15	04/09/15	25/09/15
4º	27/11/15	04/12/15	17/12/15

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 01 (ex PO 02)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 234.105,49	R\$ 246.426,82

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 139.865,15	R\$ 7.361,32	mai/12	R\$ 147.226,47	Pago até o ano anterior	R\$ 139.865,15
R\$ 94.240,34	R\$ 4.960,01	jun/12	R\$ 99.200,35	A realizar no exercício	R\$ 94.240,34
R\$ 234.105,49	R\$ 12.321,33	-	R\$ 246.426,82	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 94.240,34
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 139.865,15

Previsão de Conclusão:	16/06/2015	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012) Vigência: 18/12/12 a 16/06/2015
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2012	02/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								50,0%	Atrasado		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	a definir		1/12/2013			50%	Atrasado		
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social (R\$ 42.879,89)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/1/2014		1/12/2013	14/3/2014		100%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100%	Concluído		
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	30/9/2014		14/3/2014	5/3/2015		100%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao conveniente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		04/03/2015	5/3/2015		100%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	

9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	a definir	a definir	R\$ 94.240,34			0%	A Iniciar	Relatórios de execução ainda não inseridos no SICONV	Enviou-se pedido de esclarecimento para a convenente solicitando que a mesma insira os relatórios de execução no SICONV, somente após tal procedimento pode-se tomar as providências para a liberação da segunda parcela.
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Area de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	17/06/2015	17/09/2015				0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
					Valor Previsto:	R\$ 234.105,49	Valor realizado:	R\$ 139.865,15	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

2º Ciclo - 2015.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEPE/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Convenente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. O convenente entrou com solicitação de prorrogação da vigência do convênio no dia 29/05/2015. Espera-se pela inserção dos relatórios de execução no SICONV.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, conseqüentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 530.482,50	R\$ 589.425,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 265.241,25	R\$ 58.942,50	DEZ/2012	R\$ 324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
R\$ 265.241,25	--	MAIO/2013	R\$ 265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 530.482,50	R\$ 58.942,50	-	R\$ 589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Previsão de Conclusão:	31/08/2015	770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

Metas/ Etapas	Responsável	Previsto Início	Previsto Fim	Valor	Realizado Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1 Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
1.1 Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
1.2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
1.3 Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
2 Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
3 Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
4 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
5 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)								32,6%	Em Andamento		
Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100%	Concluído		
6 Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado	Não informado	--	65%	Em Andamento	Foi informado pela Conveniente que devido a problemas com a empresa contratada para a realização dos Encontros (Etapa 1/ Meta 1) houve um destrato com a mesma, paralisando a execução projeto. No momento, encontram-se em procedimentos para a contratação de uma outra organização para dar continuidade a esta Etapa do projeto. Além disso, continuam as providências para a contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1.	
7 META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	08/12/2014	31/08/2015	R\$ 356.560,00	08/12/2014	--	--	27%	Paralisado	Execução paralisada devido a problemas com a empresa contratada para a realização dos Encontros (Etapa 1/ Meta 1), havendo um destrato com a mesma, paralisando a execução projeto.	Segundo informações fornecidas pela Conveniente, no momento, estão sendo realizados procedimentos para a contratação de uma outra organização para dar continuidade a esta Etapa da Meta 1 deste projeto.
7.1 META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano	SEMAS/PE	08/12/2014	30/06/2015	R\$ 146.400,00	08/12/2014	--	--	36%	Paralisado	Foi iniciada, em 08/12/2014, a execução dos Encontros, tendo sido realizados neste período 22 eventos dos 61 previstos.	

**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/06/2015	30/06/2015	R\$ 265.241,25	--	--	--	0%	A Iniciar	
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	01/07/2015	16/08/2015	R\$ 176.960,00	--	--	--	0%	A Iniciar	
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	17/08/2015	31/08/2015	R\$ 33.200,00	--	--	--	0%	A Iniciar	
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2015	31/08/2015	R\$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	25%	Em Andamento	
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2015	31/08/2015	R\$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	50%	Em Andamento	
8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/07/2015	31/08/2015	R\$ 50.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar	
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/10/2015	28/01/2016	--	--	--	--	0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
					Valor Previsto:	R\$ 0,00	Valor realizado:	R\$ 265.241,25	52,6%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

2º ciclo 2015

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015).

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 03 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almira Moreira Pinto
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.		
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 4	30	R\$ 694.459,19	R\$ 771.621,32

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 419.104,63	R\$ 77.162,13	dez/12	R\$ 496.266,76	Pago até o ano anterior	R\$ 556.781,91
R\$ 137.677,28	--	jan/13	R\$ 137.677,28	A realizar no exercício	R\$ 137.677,28
R\$ 137.677,28	--	abr/13	R\$ 137.677,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 694.459,19	R\$ 77.162,13	-	R\$ 771.621,32	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 137.677,28
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 694.459,19

Previsão de Conclusão:	30/12/2014	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Marcelo de Castro Viana, Victor Uchôa Ferreira da Silva e Marcelo Saiki Braga - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo
--	---

PO 03 - PE														
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							20,0%	Concluído				
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído				
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100%	Concluído				
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não Informado	10/05/2012		Não Informado	10/05/2012		100%	Concluído				
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100%	Concluído				
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100%	Concluído				
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100%	Concluído				
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100%	Concluído				
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído				
8	Realização de processo licitatório para contratação de Liberação da 1ª parcela	SARA/PE SUDENE	18/06/2013 01/10/2012	02/07/2013 Não Informado		23/07/2013 23/11/2012	28/08/2013 12/12/2012		100% 100%	Concluído Concluído				
9	Realizar 40 cursos de capacitação em	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		25/11/2013	15/09/2014		100%	Concluído				
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		13/01/2014			100%	Concluído				
	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	Não Informado		28/01/2014	06/02/2014		100%	Concluído	()			
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	R\$ 137.677,28	09/04/2014	19/05/2014	R\$ 137.677,28	100%	Concluído				
11	Adquirir 540 colméias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído				
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014			07/08/2014	22/08/2014		100%	Concluído	(**)			
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/11/2014	R\$ 137.677,28	16/01/2015	25/02/2015	R\$ 137.677,28	100%	Concluído				
13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído				
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar				
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	30/06/2015	30/09/2015					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios . Aguardando a Prestação de Contas Final para emissão do Laudo Técnico.	Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.		
Valor Previsto:					R\$ 694.459,19	Valor realizado:					R\$ 694.459,19	80,0%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:
Em 16/06/2014 foi assinado o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 30/12/2014

(*) A viagem de supervisão foi realizada no período de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto

(**) A viagem de supervisão foi realizada no período de 07 a 08/08/2014 e 20 a 22/08/2014, na área de atuação do Projeto

2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 100	3330.41	30	R\$ 1.794.595,93	R\$ 2.000.000,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 1.794.595,93
R\$ 732.887,59	R\$ 79.238,97	nov/12	R\$ 812.126,56	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 527.102,12	R\$ 67.204,78	nov/13	R\$ 594.306,90	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 534.606,22	R\$ 58.960,32	dez/13	R\$ 593.566,54	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.794.595,93	R\$ 205.404,07	-	R\$ 2.000.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.794.595,93

Previsão de Conclusão:	28/05/2014	CONVÊNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel de Sá Jardim Neto - SUDENE / Gustavo Nogueira e Luiz Carlos Soares - SEPLAG-PB
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor (SUDENE)	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012			100%	Concluído	
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012			100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012			100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012			100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012			100%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	14/12/2012	18/12/2012		14/12/2012	18/12/2012			100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	02/01/2013		18/12/2012	02/01/2013			100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									60,0%		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	R\$ 732.887,59	01/11/2012	30/11/2012	R\$ 732.887,59	100%	100%	Concluído	O convênio foi prorrogado "de ofício" após a data de referência do PO para 28/05/14.
8	Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/2013	25/07/2013			100%	Concluído	Edital da licitação (nº 001/2013) registrado na CGE-Controladoria Geral do Estado, sob nº 13-00476-0 e publicado em 23/04/2013, nos jornais de grande circulação e diários oficiais. Contrato com a empresa vencedora assinado em 25/07/13, mas só registrado no SICONV após formalização do 2º Termo Aditivo.
9	Meta I: Estruturação do Plano Estratégico da	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013			100%	Concluído	
9.1	Diagnóstico das cadeias produtivas paraibanas	SEPLAG/PB	01/08/2013	27/09/2013		01/08/2013	12/11/2013			100%	Concluído	
9.2	Diagnóstico da infra-estrutura da logística do transporte	SEPLAG/PB	01/08/2013	11/10/2013		01/08/2013	12/11/2013			100%	Concluído	
9.3	Priorização dos Projetos Estratégicos Micrologísticos	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	12/11/2013			100%	Concluído	
9.4	Relatório Intermediário do Plano de Micrologística do	SEPLAG/PB	01/08/2013	08/11/2013		01/08/2013	12/11/2013			100%	Concluído	
	Liberação da 2ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2013	30/11/2013	R\$ 527.102,12	25/11/2013	02/12/2013	R\$ 527.102,12	100%	100%	Concluído	
9.5	Relatório Final do Plano de Micrologística do Transporte	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013			100%	Concluído	
10	Meta II: Plano Estratégico de Desenvolvimento	SEPLAG/PB	30/08/2013	28/01/2014		30/08/2013	11/02/2014			100%	Concluído	
10.1	Avaliação do Potencial Econômico das Cadeias	SEPLAG/PB	30/08/2013	18/10/2013		30/08/2013	19/11/2013			100%	Concluído	
10.2	Estudo de Mercado dos Produtos Priorizados	SEPLAG/PB	13/09/2013	08/11/2013		13/09/2013	19/11/2013			100%	Concluído	
10.3	Priorização dos cinco Produtos-Chaves	SEPLAG/PB	01/11/2013	22/11/2013		01/11/2013	19/11/2013			100%	Concluído	
10.4	Elaboração de um Plano de Implementação	SEPLAG/PB	22/11/2013	06/12/2013		22/11/2013	11/02/2014			100%	Concluído	

10.5	Relatório Intermediário do Plano de Desenvolvimento	SEPLAG/PB	01/08/2013	22/11/2013		01/08/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
10.6	Relatório Final do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	11/02/2014		100%	Concluído	
11	Meta III: Plano Estratégico de Energia do Estado da	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
11.1	Avaliação da Situação Atual do Suprimento e	SEPLAG/PB	13/09/2013	25/10/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
11.2	Avaliação das necessidades energéticas da Paraíba	SEPLAG/PB	11/10/2013	08/11/2013		11/10/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
11.3	Avaliação dos "gaps" e priorização dos investimentos	SEPLAG/PB	25/10/2013	22/11/2013		25/10/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
11.4	Realização de 2ª visita técnica de acompanhamento	CGDS/SEPLAG	12/12/2013	12/12/2013		12/12/2013	12/12/2013		100%	Concluído	
11.5	Relatório Intermediário de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	22/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído	
	Liberação da 3ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2013	31/12/2013	R\$ 534.606,22	19/12/2013	30/12/2013	R\$ 534.606,22	100%	Concluído	
11.6	Relatório Final de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12	Meta IV: Plano Estratégico de Telecomunicações e	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
12.1	Verificar estado atual de TIC do Estado da Paraíba e	SEPLAG/PB	27/09/2013	18/10/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.2	Identificar prioridades e demandas do plano de	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.3	Explicitar lacunas entre necessidades projetadas e	SEPLAG/PB	11/10/2013	15/11/2013		11/10/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.4	Identificar alavancas que superem potenciais barreiras	SEPLAG/PB	08/11/2013	22/11/2013		08/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.5	Desenvolver e priorizar iniciativas para atender à	SEPLAG/PB	15/11/2013	29/11/2013		15/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.6	Consolidar o Plano de TIC.	SEPLAG/PB	22/11/2013	20/12/2013		22/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.7	Relatório Intermediário do Plano de Telecomunicações	SEPLAG/PB	27/09/2013	20/12/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
12.8	Relatório Final do Plano de Telecomunicações e de	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13	Meta V: Plano Estratégico de Capacitação do Capital	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído	
13.1	Mapear a demanda de recursos humanos, por tipo de	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.2	Projetara atual oferta de mão-de-obra no estado.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.3	Definir ajustes na oferta de capacitação de mão-de-obra	SEPLAG/PB	29/11/2013	13/12/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.4	Dimensionar investimentos necessários para formação	SEPLAG/PB	13/12/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.5	Consolidar o Plano de Capacitação do Capital Humano	SEPLAG/PB	20/12/2013	28/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.6	Relatório Intermediário do Plano de Capacitação do	SEPLAG/PB	25/10/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído	
13.7	Relatório Final do Plano de Capacitação do Capital	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído	
14	Relatório Final consolidado do Plano de	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/04/2014		01/08/2013	18/02/2014		100%	Concluído	
15	Finalização do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	18/02/2014	28/05/2014		18/02/2014	28/05/2014		100%	Concluído	A SEPLAG formalizará solicitação de utilização dos recursos oriundos dos rendimentos de aplicação a serem aplicados em atividades de desdobramento do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									20,0%	Concluído	
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	01/08/2014	01/10/2014		11/08/2014	29/05/2015		100%	Concluído	*Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
Valor Previsto:					R\$ 1.794.595,93	Valor realizado:		R\$ 1.794.595,93	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba (CNPJ: 08761124000100)

Observações:

2º Termo Aditivo foi solicitado pelo convenente por meio do SICONV em 12/08/13, sendo publicado em 01/11/13.

Em 18/02/2014 a equipe técnica participou de um Seminário em João Pessoa/PB com o Governador do Estado, Secretário de Planejamento e Gestão, Gestores e Técnicos do Governo do Estado, Universidades Federal e Estadual, Parlamentares etc, onde foram apresentados o Plano Estratégico da Paraíba, relativo aos resultados

1º Ciclo 2015 - Repactuada a etapa 16

2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 825.379,68

Cronograma de Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 280.000,00	R\$ 8.400,00		R\$ 288.400,00
R\$ 260.000,00	R\$ 8.400,00		R\$ 268.400,00
R\$ 260.000,00	R\$ 8.579,68		R\$ 268.400,00
R\$ 800.000,00	R\$ 25.379,68		R\$ 825.379,68

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	540.000,00
A realizar no exercício	R\$	260.000,00
Orçamento Autorizado no exercício	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	260.000,00
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	800.000,00

Previsão de Conclusão:	10/03/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE (28/08/2014) - Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.
--	--

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1 Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2012	13/06/2012		13/06/2012	13/06/2012		100%	Concluído		
2 Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/06/2012	16/06/2012		15/06/2012	16/06/2012		100%	Concluído		
3 Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	20/06/2012	21/06/2012		20/06/2012	21/06/2012		100%	Concluído		
4 Emissão de Parecer	CGDS/SUDENE	21/06/2012	28/06/2012		22/06/2012	28/06/2012		100%	Concluído		
5 Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	28/06/2012	23/08/2012		29/06/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
6 Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
7 Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	24/08/2012	24/08/2012		24/08/2012	24/08/2012		100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)								60%	Concluído		
8 Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2012	01/09/2012	R\$ 280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	R\$ 280.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 1ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi providenciada a Prorrogação de ofício pela SUDENE, por mais 36 dias, alterando a data de conclusão para 31/03/2014
9 Meta 1	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013		100%	Concluído	Houve atraso devido recurso judicial contra procedimento licitatório	O tribunal proferiu sentença favorável ao município. O processo licitatório foi concluído e homologado o licitante vencedor.
9.1 Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
9.2 Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apiloado.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
9.3 Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para execução das fundações.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/08/2013	30/09/2013		100%	Concluído		
9.4 Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/06/2013	03/07/2013		27/03/2013	30/03/2013		100%	Concluído		
10 Meta 2	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	28/02/2014		01/09/2013	30/09/2014		100%	Concluído		
10.1 Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2013	30/09/2013	R\$ 260.000,00	14/11/2013	14/11/2013	R\$ 260.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 2ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Solicitada prorrogação de ofício, por mais 73 dias, alterando a data de conclusão para 12/06/2014
10.2 Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	01/08/2013		01/09/2013	28/02/2014		100%	Concluído		
10.3 Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	09/12/2013	30/09/2014		01/12/2013	30/09/2014		100%	Concluído		
10.4 Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/09/2013	02/10/2013		05/12/2013	08/12/2013		100%	Concluído		

10.5	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	27/12/2013	27/12/2013	R\$ 260.000,00	06/04/2014	06/04/2014	R\$ 260.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 3ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi solicitado termo aditivo ao convênio pelo convenente, por mais 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014
10.6	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/02/2014	17/02/2014		10/04/2014	17/04/2014		100%	Concluído		
11	Meta 3		01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100%	Concluído		
11.1	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										Atrasado		
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	10/01/2015	10/03/2015					0%	Atrasado	Até o presente momento, não foi enviada pelo município de Ruy Barbosa/RN a Prestação de Contas, sob o aspecto físico.	O convênio já foi tecnicamente avaliado e já dispomos dos elementos necessários para a emissão do Laudo Técnico, entretanto este ainda não foi elaborado em virtude do não envio da Prestação de Contas.
Valor Previsto:					R\$ 800.000,00	Valor realizado:		R\$ 800.000,00	80%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Ruy Barbosa/RN

Observações:

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada na OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12
- Informações referentes à data de 19/04/2013:
- (2) Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Este atraso inicial repercutiu em todo o processo, gerando retardo nas demais etapas.
- (3) Foi concluído o processo licitatório e homologada a empresa vencedora da licitação. Conforme informação do engenheiro civil responsável pelos projetos e acompanhamento de fiscalização da obra de construção da ponte de concreto armado no município de Ruy Barbosa/RN, a empresa vencedora já está instalada no canteiro de obras para iniciar os serviços preliminares de construção da ponte. Estas informações estão atualizadas até 31/05/2013.
- Informações referentes à data de 29/11/2013:
- (4) 4º ciclo 2013: alterações na etapa 1 da meta 2
- (5) 1º ciclo 2014: Falta liberar a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, prevista para fevereiro/2014. Foi concluído a concretagem de pilares, longarinas e transversinas que compõem a estrutura de sustentação da ponte, restando a laje de concreto armado de piso, guarda-rodas e muro de proteção nas laterais da ponte. Foi concluído o muro de arrimo de proteção, constituindo-se de alvenaria de pedra argamassada, marroada, rejuntada com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4
- (6) 2º ciclo 2014: foi liberada a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, em 06/04/2014.
- (7) 3º ciclo 2014: Foi realizada uma vistoria de fiscalização em 10.04.2014; Foi concretada a laje de piso da ponte em concreto armado com concreto fck = 45 Mpa e espessura de 30 cm, de acordo com o projeto estrutural. Foi aproado no SICONV o termo aditivo de 120 dias, alterando a data de conclusão para 2/10/2014.
- (8) O convenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em três parcelas, como segue: 1ª parcela: Out/2012 - 2ª parcela: Set/2013 - 3ª parcela: Abr/2014
- (9) Em 28/08/2014, o EngºCivil Givanildo Ramos de Souza foi incorporado ao processo como responsável técnico auxiliar.
- (10) Em 11/12/2014, o convenente solicitou prorrogação de ofício está prevista uma visita técnica para recebimento da obra e emissão de laudo técnico.
- (11) Em 01/10/2014 foi aprovado termo aditivo de 90 dias, alterando a data de término do convênio para 10/01/2015.
- (12) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.			
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas			
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	R\$ 9.452.840,00	R\$ 9.452.840,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.352.840,00
A realizar no exercício	R\$ 3.100.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 3.100.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.352.840,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT.	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2013 ano base 2012(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais; Participação em Oficina de Trabalho "Balanços Energéticos Estaduais" na EPE em 27 e 28/11/2013	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	30/04/2015	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60%	Atrasado	SUDENE e GT de Planejamento Energético.	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais maio/2014. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético. Aguardando agendamento de uma reunião com a EPE para dar prosseguimento.
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	30/04/2015		19/06/2013			90%	Paralisado	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região	Redefinindo orçamento para 2015/2016. ACT assinado pela SUDENE, UFPE e aguardando assinatura do MI
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnicas para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014			70%	Em Andamento	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.
			Valor Previsto:	R\$ 4.452.840,00	Valor realizado:			R\$ 1.352.840,00	90,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs. 2º Ciclo 2015- Repactuada Etapa 7

Os recursos previstos nas Etapas 5, 6 e 7, são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.			
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada			
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 1.183.120,40
IFPB	Sudene	1ª parc. Maio	R\$ 714.000,40	A realizar no exercício	R\$ -
IFPB	Sudene	2ª parc. Agosto	R\$ 469.120,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
			R\$ 1.183.120,40	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.183.120,40

Previsão de Conclusão:	22/08/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Edson Fernando Laranjeiras, Givanildo Ramos, Macira Sotero e Vinícius Medeiros (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Prof.ª Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Paulo Ditarso (IFPB).

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014	100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014	100%	Concluído		
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014	100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014	100%	Concluído		
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014	100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							46,8%	Em Andamento		
	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R\$ 1.183.120,40	100%	Concluído	
8	Capacitação de 640 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	01/03/2015		27/05/2014		84%	Atrasado	Até o presente momento, foram capacitadas 240 alunas das 640 previstas. Em virtude do Decreto nº 8.407/15, os recursos financeiros foram bloqueados, o que acarretou atrasos na execução das capacitações.	Recursos Financeiros desbloqueados. Foi solicitado Aditivo de Prazo, pelo IFPB, alterando a data de conclusão do projeto para 22/08/2015
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013		100%	Concluído		
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013		100%	Concluído		
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014		100%	Concluído		
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		29/10/2013		100%	Concluído		
8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013				100%	Concluído		
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel,	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	23/03/2015	100%	Concluído		

8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico; Curso de Pintura de Obras; Curso Auxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	01/12/2014	01/04/2014		60%	Atrasado	Em virtude do Decreto nº 8.407/15, que dispõe sobre regulamentação das despesas inscritas em restos a pagar não processados até o exercício de 2014, houve o bloqueio dos recursos financeiros, acarretando atrasos nas ações.	Os cursos nos Campi João Pessoa e Pedra de Fogo iniciaram-se no dia 09/04/2015; no Campus Monteiro iniciaram-se no dia 27/04/2015; no Campus Cajazeiras iniciaram-se no dia 23/03/2015.
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	01/03/2015	01/11/2014		10%	Atrasado	O IFPB não estimou adequadamente as condições de absorção das alunas no mercado de trabalho.	Negociação com os sindicatos da construção civil (SINDUSCON) e SINE.
9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/04/2014	22/08/2015	24/11/2014		50%	Em Andamento		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	22/06/2015	22/08/2015			0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	R\$ 1.183.120,40	Valor realizado:	R\$ 1.183.120,40	66,8%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

IFPB

Observações:

(1) O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível concluí-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.

(2) Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.

(3) A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.

(4) O encerramento do TED estava previsto para 22/05/2015, todavia devido a entraves observados na execução das ações e do decreto nº 8.407/15, foi enviado pelo IFPB o Ofício Nº 10/2015 - PROEXT/IFPB, de 27/05/2015, solicitando Aditivo de Prazo para 22/08/2015, sendo acatado pela SUDENE e publicado no DOU de 27/05/2015.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 08 (Ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$)
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	fev/2014	R\$ 281.295,52	Pago até o ano anterior	R\$ 255.723,17
R\$ 230.151,48		junho/2015	R\$ 230.151,48	A realizar no exercício	R\$ 230.151,48
485.874,65	25.572,35	-	511.447,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 230.151,48
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 255.723,17

Previsão de Conclusão:	30/12/2014	CONVÊNIO Nº 794997/2013
Data Atualização:	29/05/2015	Vigência: 31/12/13 a 30/12/14

Responsáv(e)l(e)is técnico(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Tiago Cançado Diniz - IDENE
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		33,8%	Em Andamento		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído		
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			81%	Em Andamento	O convênio teve sua vigência prorrogada por meio do 3º Termo Aditivo para execução até 28/07/2015	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído		
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	27/05/2015			50%	Em Andamento	Solicitada a liberação da 2ª parcela	
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído		

8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015					0%	Em Andamento	Aguardando liberação da 2ª parcela
9	Evento de Divulgação	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015					0%	Em Andamento	Aguardando liberação da 2ª parcela
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir					0%	A Iniciar	
ENCERRAMENTO (Peso 20 %)									0,0%	A Iniciar	
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE							0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
			Valor Previsto:	R\$ 485.874,65	Valor realizado:	R\$ 255.723,17	53,8%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

1º Ciclo 2015 – Atualização da etapa 8.3. Em razão da mudança de governo do estado e consequentemente na direção da SEDINOR/IDENE, foi provocado um atraso. Deste modo, foi solicitada a prorrogação de vigência de 30/03/2015 pra 30/07/2015, no sentido de não prejudicar a execução do projeto.

2º ciclo 2015 - Repactuadas as etapas 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 9

Fonte: CGDS/Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almir Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.	
Problema (causa):	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	Objetivo do projeto: Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por	

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 207.542,62	R\$ 218.465,90

Cronograma de Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 107.354,71	R\$ 5.650,24	FEV/2014	R\$ 113.004,95
R\$ 100.187,91	R\$ 5.273,04	JUN/2014	R\$ 105.460,95
R\$ 207.542,62	R\$ 10.923,28	-	R\$ 218.465,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	107.354,71
A realizar no exercício RAP	R\$	100.187,91
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	100.187,91
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	107.354,71

Previsão de Conclusão:	01/11/2015	CONVENIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONS 042454/2013)
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Ferreira da Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONS)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								10,3%	Em Andamento		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	(a partir de 27/10/2014)		R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100%	Concluído		
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada		01/09/2014	--	--	20%	Em Andamento		
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	Será repactuada	Será repactuada	R\$ 100.187,91	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	Será repactuada	Será repactuada	--	--	--	--	0%	A Iniciar		

No sentido das providências necessárias, realizamos solicitação de esclarecimento nº 1/2015, de 27/03/2015, na qual tratamos dos devidos ajustes no plano de trabalho, e solicitamos informar a respeito das providências inerentes a realização do TR/processo licitatório e efetivo início das atividades. Em 06/04/2015 o conveniente enviou resposta, prorrogando de ofício da vigência do plano de trabalho, e informando: inserção do TR em 1º/04/2015; que foram solicitadas cotações para dar início à abertura do Processo Licitatório; e pedido de abertura do sistema para Ajustes do plano de trabalho. Em 07/04/2015 procedemos autorização e abertura do sistema para Ajustes. Verificando ausência de procedimentos, em 21/05/2015, realizamos nova solicitação de esclarecimento, nº 2/2015, reiterando pedido de atualização e adequação do plano de trabalho, para andamento da execução do projeto, permitindo à Conveniente uma registrando que o sistema foi aberto encontrando-se aguardando ajustes. * Ressaltamos que até a data limite deste monitoramento a situação verificada é de "Envio de Resposta Pendente". **Registre-se, ainda, recebimento do OF. CONDEPE/FIDEM Nº 024/2015-DEAG, de 28/05/2015, informando substituições dos coordenadores técnicos do Convênio: Maria das Graças de Albuquerque Tavares e Cláudia Maria Carneiro Leal Paes Barreto, substituindo Danielli Silva, cuja informação para providências encontra-se na Unidade de Convênios.

14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)												
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 207.542,62	Valor realizado:			R\$ 107.354,71	30,3%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efeito início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, conseqüentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a conseqüente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida ,em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investime	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 359.682,64	R\$ 378.613,30

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 221.267,56	R\$ 11.645,66	jun/14	R\$ 232.913,22	R\$	221.267,56
R\$ 138.415,08	R\$ 7.285,00	dez/14	R\$ 145.700,08	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08
R\$ 359.682,64	R\$ 18.930,66		R\$ 378.613,30	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 138.415,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)
Vigência: **31/12/2015**

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								46,7%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não informado	Não informado		11/06/2014	Não informado		100%	Concluído	Aguardando inserção da Ata de Licitação no SICONS, para atualização da data.	
9	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	30/12/2014					11%	Atrasado		
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social (R\$ 45.973,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	03/03/2014					0%	Atrasado		
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 186.939,54)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/03/2014	06/06/2014					0%	Atrasado		
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	

9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2014	30/12/2014	R\$ 138.415,08			0%	Atrasado		
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas (R\$ 67.618,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	07/06/2014	07/09/2014				0%	Atrasado		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano (R\$ 78.081,40)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	08/09/2014	03/12/2014				0%	Atrasado		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
					Valor Previsto:	R\$ 359.682,64	Valor realizado:	R\$ 221.267,56	66,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

2º ciclo 2015. Repactuada a atividade 8. O processo licitatório foi concluído.

Em razão da mudança na direção da Agência, está ocorrendo algumas mudanças nas equipes técnicas de acompanhamento, ocasionando eventuais atrasos.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraíba, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraíba		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Cronograma de Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 206.151,42	R\$ 18.140,00	dez/14	R\$ 224.291,42
R\$ 137.434,28	R\$ 0,00	mai/15	R\$ 137.434,28
R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00		R\$ 361.725,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício RAP	R\$ 343.585,70
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 206.151,42
Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Convênio Nº 813986/2014



Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Victor Uchôa Ferreira da Silva/ Marcelo Saiki Braga /Marcélo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
--	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
INICIAÇÃO (Peso 20%)														
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado	-	Não informado	Não informado	-	100%	Concluído				
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído				
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído				
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído				
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído				
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Não informado	23/12/2014	-	Não informado	23/12/2014	-	100%	Concluído				
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).			
EXECUÇÃO (Peso 60%)														
8	Fiscalização	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
9	Liberação	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convete solicitou ajustes no cronograma de desembolso	Autorizada alteração no cronograma de desembolso		
10	Fiscalização	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
11	Liberação	CGDS/SUDENE	01/09/2015	30/09/2015	R\$ 137.434,28			R\$ 0,00	0%	A Iniciar	O convete solicitou ajustes no cronograma de desembolso	Autorizada alteração no cronograma de desembolso		
12	Fiscalização	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
ENCERRAMENTO (Peso 20%)														
13	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
Valor Previsto:					R\$ 343.585,70	Valor realizado:					R\$ 206.151,42	32,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
Observações:
2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 771.000,00	R\$ 989.777,00



Cronograma de Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 221.000,00	R\$ 57.777,00	nov/14	R\$ 278.777,00
R\$ 550.000,00	R\$ 161.000,00	mar/15	R\$ 711.000,00
R\$ 771.000,00	R\$ 218.777,00		R\$ 989.777,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício RAP	R\$ 771.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 221.000,00
Saldo a liberar	R\$ 550.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 221.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2015	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsáv(él)is técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira
--	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
INICIAÇÃO (Peso 20%)										20,0%				
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100%	Concluído				
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100%	Concluído				
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	28/02/2014	24/09/2014		28/02/2014	24/09/2014		100%	Concluído				
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	24/09/2014	04/11/2014		24/09/2014	04/11/2014		100%	Concluído				
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	04/11/2014	25/11/2014		04/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído				
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Não informado	31/12/2014		Não informado	31/12/2014		100%	Concluído				
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015		31/12/2014	08/01/2015		100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015 é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).			
EXECUÇÃO (Peso 60%)										12,0%				
8	Fiscalização	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar				
9	Liberação	CGDS/SUDENE	10/04/2015	22/04/2015	R\$ 221.000,00	10/04/2015	22/04/2015	R\$ 221.000,00	100,0%	Concluído				
10	Fiscalização	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar				
11	Liberação	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	R\$ 550.000,00				0,0%	A Iniciar				
12	Fiscalização	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar				
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%				
13	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar				
Valor Previsto:					R\$ 771.000,00	Valor realizado:					R\$ 221.000,00	32,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Observações:	2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos,	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Alencar		
Problema (causa):	Atender ao desafio de moldar o perfil do agente público na concepção moderna da nova gestão pública ou gestão pública gerencial, com o desafio de incluir características que atendam a objetivos e missão institucionais, convergindo com os interesses da sociedade.		
Projeto:	CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICO-GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 10 MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO PARAIBANO		
Objetivo do projeto:	Capacitar e qualificar os servidores de 10 municípios do semiárido paraibano, visando o aprimoramento e o desenvolvimento de suas competências nas áreas técnico-gerenciais, administrativo-organizacionais, financeiro-fiscais, elaboração de projetos e captação de recursos com vistas à melhoria da capacidade de gestão pública local.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	410.203,62	R\$ 437.000,00

Previsão de Conclusão:	30/12/15	Convênio N° 813604/2014 (Proposta: 052390/2014)
Data Atualização:	29/05/2015	

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 212.141,92	R\$ 13.858,08	dez/14	R\$ 226.000,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 410.203,62
R\$ 198.061,70	R\$ 12.938,30	jun/15	R\$ 211.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 410.203,62	R\$ 26.796,38		R\$ 437.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 410.203,62
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Maria do Socorro Vilar, Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção.
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%	Concluído	
1	Lançamento/divulgação do Programa	CGDS/SUDENE			R\$ -		06/08/2015	R\$ -		100%	Concluído	
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	30/10/2014	06/11/14	R\$ -	30/10/2014	06/11/2014	R\$ -		100%	Concluído	
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	04/11/2014	19/12/14	R\$ -	04/11/2014	19/12/2014	R\$ -		100%	Concluído	
4	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	20/12/2014	30/12/14	R\$ -	20/12/2014	31/12/2014	R\$ -		100%	Concluído	
5	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		31/12/2014	R\$ -		100%	Concluído	
6	Publicação do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		08/01/2015	R\$ -		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									0,0%	A Iniciar	
7	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	Aguardando Repactuação	Aguardando Repactuação	R\$ 212.141,92			R\$ -		0%	A Iniciar	Dentro dos prazos legais, foram feitas análises dos Termos de Referências, os quais foram aprovados no dia 28 de abril. Foi solicitado à conveniente no dia 21/05 que realizasse os ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, bem como o depósito da contrapartida, sendo este último atendido no dia 29/05.
8	Meta 1: Realizar 4 Capacitações em Gestão Financeira	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	Aguardando Repactuação	Aguardando Repactuação	R\$ 167.250,00			R\$ -		0%	A Iniciar	A concedente está aguardando o pedido de autorização pela conveniente para atualização do Plano de Trabalho e Cronograma de
8.1	Etapa 1: Sensibilização e Mobilização/Procedimentos Licitatórios e Contratuais	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	Aguardando Repactuação	Aguardando Repactuação	R\$ 500,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
8.2	Etapa 2: Realizar 2 Cursos sobre E-social e Administração Pública	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	Aguardando Repactuação	Aguardando Repactuação	R\$ 69.500,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
8.3	Etapa 3: Realizar 1 Curso sobre GFIP-SEFIP	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	Aguardando Repactuação	Aguardando Repactuação	R\$ 69.500,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
8.4	Etapa 4: Realizar 1 Curso sobre Execução Orçamentária e Financeira na Administração Pública	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	Aguardando Repactuação	Aguardando Repactuação	R\$ 69.500,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
9	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -		0%	A Iniciar	
10	**Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 198.061,70			R\$ -		0%	A Iniciar	
11	Meta 2: Realizar 1 Capacitação em Patrimônio Público	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	30/05/2015	R\$ 32.250,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
11.1	Etapa 1: Realizar 1 Curso sobre Gestão do Patrimônio Público	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	30/05/2015	R\$ 32.250,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
12	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -		0%	A Iniciar	
13	Meta 3: Realizar 1 Capacitação em Gestão de Projetos	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	15/06/2015	R\$ 26.500,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
13.1	Etapa 1: 1 Curso sobre SICONV – Da Celebração à Prestação de Contas. (Elaboração de Projetos para Captação de	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	15/06/2015	R\$ 26.500,00			R\$ -		0%	A Iniciar	
14	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -		0%	A Iniciar	
15	Meta 4: Realizar 6 Capacitações em Compras Governamentais	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	30/11/2015	R\$ 211.000,00			R\$ -		0%	A Iniciar	

15.1	Etapa 1: 1 Curso sobre Licitações Públicas	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	14/07/2015	R\$ 34.750,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.2	Etapa 2: 1 Curso sobre Elaboração de Edital e Termo de Referência	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/07/2015	30/07/2015	R\$ 34.750,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.3	Etapa 3: 1 Curso sobre Pregão Presencial e Eletrônico	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/08/2015	30/08/2015	R\$ 37.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.4	Etapa 4: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/09/2015	30/09/2015	R\$ 34.750,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.5	Etapa 5: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/10/2015	30/10/2015	R\$ 32.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.6	Etapa 6: 1 Curso sobre Contratos Administrativos (Gestão e Fiscalização)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/11/2015	30/11/2015	R\$ 37.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
16	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
Valor Previsto:					R\$ 410.203,62	Valor realizado:			R\$ 0,00	20,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Administração

Observações:

2º Ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 14
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 420.540,15

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	A realizar no exercício	R\$ 400.000,00
R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 200.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 200.000,00

Previsão de Conclusão:	09/11/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							20%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 10.000,00	02/02/2015	02/02/2015	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído	
10	Meta 1		29/05/2015	18/09/2015	R\$ 205.027,43	29/05/2015		1%	Em Andamento	Não foi previsto, no projeto do conveniente, o uso de todo recurso disponível para a execução da meta 1, restando o valor de R\$ 4.972,57	Valor restante repassado para cumprimento da meta 2
10.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Jardim de Piranhas	29/05/2015	08/06/2015	R\$ 935,31	29/05/2015		5%	Em Andamento		
10.2	Demolições	Município de Jardim de Piranhas	31/05/2015	10/06/2015	R\$ 18.661,72			0%	A Iniciar		
10.3	Movimento de Terra	Município de Jardim de Piranhas	11/06/2015	21/06/2015	R\$ 232,37			0%	A Iniciar		
10.4	Fundações	Município de Jardim de Piranhas	16/06/2015	06/07/2015	R\$ 10.937,59			0%	A Iniciar		
10.5	Estrutura	Município de Jardim de Piranhas	11/07/2015	31/07/2015	R\$ 50.949,17			0%	A Iniciar		

10.6	Paredes e Painéis	Município de Jardim de Piranhas	05/08/2015	15/08/2015	R\$ 22.822,52			0%	A Iniciar		
10.7	Cobertura	Município de Jardim de Piranhas	05/08/2015	20/08/2015	R\$ 36.425,31			0%	A Iniciar		
10.8	Revestimento	Município de Jardim de Piranhas	25/08/2015	06/09/2015	R\$ 45.814,51			0%	A Iniciar		
10.9	Esquadrias e Ferragens - 32%	Município de Jardim de Piranhas	15/08/2015	25/08/2015	R\$ 18.248,93			0%	A Iniciar		
10.10	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	07/09/2015	12/09/2015				0%	A Iniciar		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Jardim de Piranhas	26/08/2015	31/08/2015	R\$ 10.540,15			0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	COFC /CGAF / DAD	13/09/2015	18/09/2015	R\$ 200.000,00			0%	A Iniciar		
13	Meta 2		19/09/2015	24/09/2015	R\$ 215.512,72			0%	A Iniciar	Foi previsto, no projeto do conveniente, o uso de menos recurso da meta 2, o valor de R\$ 4.972,57, em virtude de não utilização na meta 1	
13.1	Esquadrias e Ferragens - 68%	Município de Jardim de Piranhas	19/09/2015	04/10/2015	R\$ 38.778,99			0%	A Iniciar		
13.2	Instalações Hidrosanitárias	Município de Jardim de Piranhas	24/09/2015	14/10/2015	R\$ 15.680,90			0%	A Iniciar		
13.3	Instalações elétricas	Município de Jardim de Piranhas	29/09/2015	14/10/2015	R\$ 20.630,80			0%	A Iniciar		
13.4	Instalação de Granito/Mármore	Município de Jardim de Piranhas	15/10/2015	30/10/2015	R\$ 17.608,64			0%	A Iniciar		
13.5	Instalações contra incêndio	Município de Jardim de Piranhas	19/10/2015	29/10/2015	R\$ 2.102,99			0%	A Iniciar		
13.6	Piso	Município de Jardim de Piranhas	24/09/2015	19/10/2015	R\$ 77.762,05			0%	A Iniciar		
13.7	Pintura	Município de Jardim de Piranhas	24/09/2015	14/10/2015	R\$ 40.661,95			0%	A Iniciar		
13.8	Diversos	Município de Jardim de Piranhas	30/10/2015	09/11/2015	R\$ 2.286,40			0%	A Iniciar		
13.9	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/11/2015	25/11/2015				0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)			24/01/2016	23/02/2016				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	24/01/2016	23/02/2016				0%	A Iniciar		
					R\$ 420.540,15	Valor realizado:	R\$ 200.000,00	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Jardim de Piranhas/RN

Observações:

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014
- (2) O convenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015
- (3) A liberação da 1ª parcela ainda não foi efetuada, visto que a SUDENE ainda não recebeu a verba destinada para este fim.
- (4) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.
- (5) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (6) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.

2º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 310.000,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	-
R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Valor Empenhado no Exercício	-
				Valor liberado no Exercício	R\$ 150.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 150.000,00

Previsão de Conclusão:	22/10/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014		04/04/2014	04/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		06/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014		18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		18/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014		26/08/2014	04/12/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014		05/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015		08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								20%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 5.000,00	04/02/2015	04/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10	Meta 1		29/05/2015	16/08/2015	R\$ 155.000,00	29/05/2015			0%	A Iniciar		
10.1	Serviços preliminares - 100%	Município de Messias Targino/RN	29/05/2015	08/06/2015	R\$ 18.399,26	29/05/2015			0%	A Iniciar	O Município ainda não iniciou a obra em virtude de reuniões com moradores do entorno do mercado para acerto das medidas a serem tomadas	Em contato com o município de Messias Targino, ficou acertado que as obras se iniciariam a partir do dia 16/06/2015.
10.2	Trabalhos em terra - 100%	Município de Messias Targino/RN	09/06/2015	24/06/2015	R\$ 656,27				0%	A Iniciar		
10.3	Fundações e Estruturas - 100%	Município de Messias Targino/RN	25/06/2015	15/07/2015	R\$ 30.872,07				0%	A Iniciar		
10.4	Alvenaria - 100%	Município de Messias Targino/RN	16/07/2015	31/07/2015	R\$ 14.584,98				0%	A Iniciar		
10.5	Cobertura - 100%	Município de Messias Targino/RN	20/07/2015	04/08/2015	R\$ 5.927,69				0%	A Iniciar		
10.8	Esquadrias - 39,49%	Município de Messias Targino/RN	25/07/2015	04/08/2015	R\$ 12.000,00				0%	A Iniciar		
10.9	Instalações Hidrosanitárias - 26,03%	Município de Messias Targino/RN	20/07/2015	04/08/2015	R\$ 4.000,00				0%	A Iniciar		

10.10	Instalações elétricas - 34,68%	Município de Messias Targino/RN	20/07/2015	01/08/2015	R\$ 4.000,00			0%	A Iniciar	
10.11	Revestimentos - 56,72%	Município de Messias Targino/RN	01/08/2015	06/08/2015	R\$ 17.059,73			0%	A Iniciar	
10.12	Piso - 37,77%	Município de Messias Targino/RN	01/08/2015	06/08/2015	R\$ 35.000,00			0%	A Iniciar	
10.13	Calçada Externa - 42,45%	Município de Messias Targino/RN	27/07/2015	06/08/2015	R\$ 12.500,00			0%	A Iniciar	
10.11	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	07/08/2015	16/08/2015	R\$ 42.233,00			0%	A Iniciar	
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Messias Targino/RN	17/08/2015	22/08/2015	R\$ 5.000,00			0%	A Iniciar	
12	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2015	06/09/2015	R\$ 150.000,00			0%	A Iniciar	
13	Meta 2		07/09/2015	28/10/2015	R\$ 155.000,00			0%	A Iniciar	
13.1	Esquadrias - 60,51%	Município de Messias Targino/RN	07/09/2015	17/09/2015	R\$ 18.390,90			0%	A Iniciar	
13.2	Instalações Hidrosanitárias - 73,97%	Município de Messias Targino/RN	18/09/2015	03/10/2015	R\$ 11.369,39			0%	A Iniciar	
13.3	Instalações elétricas - 65,32%	Município de Messias Targino/RN	20/09/2015	30/09/2015	R\$ 7.531,96			0%	A Iniciar	
13.4	Revestimentos - 43,28%	Município de Messias Targino/RN	15/09/2015	25/09/2015	R\$ 13.017,07			0%	A Iniciar	
13.5	Piso - 62,23%	Município de Messias Targino/RN	15/09/2015	30/09/2015	R\$ 57.670,96			0%	A Iniciar	
13.6	Pintura - 100%	Município de Messias Targino/RN	26/09/2015	06/10/2015	R\$ 26.706,86			0%	A Iniciar	
13.7	Calçada Externa - 57,55%	Município de Messias Targino/RN	20/09/2015	05/10/2015	R\$ 16.943,86			0%	A Iniciar	
13.8	Diversos - 100%	Município de Messias Targino/RN	06/10/2015	22/10/2015	R\$ 3.369,00			0%	A Iniciar	
13.9	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório final	CGDS	23/10/2015	28/10/2015				0%	A Iniciar	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/12/2015	26/01/2016				0%	A Iniciar	
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/12/2015	26/01/2016				0%	A Iniciar	
Valor Previsto:					R\$ 310.000,00	Valor realizado:	R\$ 150.000,00	40%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Município de Messias Targino/RN

Observações:

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014
- (2) O convenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015
- (3) A liberação da 1ª parcela ainda não foi efetuada, visto que a SUDENE ainda não recebeu a verba destinada para este fim.
- (4) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.
- (5) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (6) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.

2º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .			
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio n° 813665/2014			
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL (R\$)		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	A realizar no exercício (2014)	R\$ 1.069.868,00
371.625,00		jun/15	371.625,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
371.625,00		set/15	371.625,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
TOTAL			1.090.800,00	Valor liberado no Exercício	R\$ 326.618,00
				Saldo a liberar	R\$ 743.250,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 326.618,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Givanildo Ramos, Macira Sotero e Vinicius Medeiros (SUDENE/CGDS)
	Convenente	Vanessa Tenório Beltrão Barbirato (coordenadora), Adrianny Cristiny De Lima Silva (técnica)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%		
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									12,9%		
8	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	R\$ 20.932,00	23/03/2015	23/03/2015	R\$ 20.932,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 326.618,00	100%	Concluído		
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído		
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-				15%	Em Andamento		
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-				30%	Em Andamento		
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 41.750,00				10%	Em Andamento		
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	01/04/2015	31/05/2015	-				10%	Em Andamento		

15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00			0%	A Iniciar	Em virtude de solicitação de Ajuste no Plano de Trabalho para a inclusão de mais um curso e da responsabilização da entidade contratada de elaborar o material didático, houve atraso no andamento da licitação, acarretando atraso na aquisição de insumos.	Ajuste do Plano de Trabalho aprovado e iniciadas alterações. Andamento do projeto retomado.
16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-			0%	A Iniciar	Em virtude de solicitação de Ajuste no Plano de Trabalho para a inclusão de mais um curso e da responsabilização da entidade contratada de elaborar o material didático, houve atraso na contratação da entidade que efetuará os cursos e o material didático.	Ajuste do Plano de Trabalho aprovado e iniciadas alterações. Andamento do projeto retomado.
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-			0%	A Iniciar		
18	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	15/06/2015	R\$ 371.625,00			0%	A Iniciar		
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2015	R\$ 371.625,00			0%	A Iniciar		
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	05/09/2015	-			0%	A Iniciar		
21	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2015	R\$ 371.625,00			0%	A Iniciar		
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2015	R\$ 371.625,00			0%	A Iniciar		
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2015	-			0%	A Iniciar		
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2015	-			0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/02/2016	31/05/2016	-			0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ 1.090.800,00	Valor realizado:	R\$ 326.618,00	32,9%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

Observações:

(1) Foi solicitado Ajuste no Plano de Trabalho no dia 30/04/2015, que ainda está em andamento.

2º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 17
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.		
Projeto:	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	3330.41 e 4430.42	30	R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75

Cronograma de Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	JUN/2015	R\$ 499.949,49
R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	SET/2015	R\$ 428.743,26
R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	-	R\$ 928.692,75

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício RAP	R\$ 835.823,47
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 835.823,47
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Conveniente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)									0,0%		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/06/2015	30/06/2015	R\$ 458.149,49	--	--	R\$ 0,00	0%	A Iniciar	A Conveniente atendeu à cláusula condicionante, procedeu ajustes no Plano de Trabalho readequando as datas para a execução. Entretanto, ainda não realizou o depósito de sua contrapartida, requisito para a liberação da primeira parcela.	
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
8	Consolidação do Projeto	SEIRHMACT / PB	01/06/2015	30/06/2015	R\$ 41.304,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	Elaboração de Diagnóstico	SEIRHMACT / PB	01/07/2015	30/09/2015	R\$ 458.645,49	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	01/07/2015	31/08/2015	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	01/07/2015	31/08/2015	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	02/07/2015	31/08/2015	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	30/09/2015	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	02/08/2015	30/09/2015	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/09/2015	30/09/2015	R\$ 377.673,98	--	--	R\$ 0,00	0%	A Iniciar	Após o atendimento da cláusula condicionante, as datas do Plano de Trabalho foram ajustadas tendo em vista a	
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	30/11/2015	R\$ 294.170,50	--	--	--	0%	A Iniciar		

12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	02/08/2015	30/09/2015	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	A Iniciar	liberação da primeira parcela de recursos.	
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	30/09/2015	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	31/10/2015	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	30/11/2015	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	30/11/2015	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	30/12/2015	R\$ 89.649,88	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	30/12/2015	R\$ 44.922,88	--	--	--	0%	A Iniciar		
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/02/2016	29/05/2016					0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
Valor Previsto:					R\$ 835.823,47	Valor realizado:			R\$ 0,00	20,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 18
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar.
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos		
Projeto:	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN		
Objetivo do projeto:	Adquirir frota de equipamentos agrícolas (plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		GND 3	30	R\$ 250.000,00	R\$ 266.400,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	Pago até o ano anterior	R\$ 250.000,00
				A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00	-	R\$ 266.400,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	05/06/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Agrimon Marcos Brasileiro Lima/SUDENE - Marcelo Viana/SUDENE
--	--

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1 Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
2 Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
3 Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-		100%	Concluído		
4 Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014		100%	Concluído		
5 Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014		100%	Concluído		
6 Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7 Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014		100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)								60%	Concluído		
8 Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	31/01/2014	31/01/2014		100%	Concluído		
9 Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
10 Meta 1		31/12/2013	05/06/2015	R\$ 266.400,00				100%	Concluído		
10.1 Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 196.000,00				100%	Concluído		
10.2 Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 34.400,00				100%	Concluído		
10.3 Grade aradora(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 36.000,00				100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)		04/08/2015	03/09/2015					0%	A Iniciar		
Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS	05/06/2015	04/08/2015					0%	A Iniciar		
11 Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de	CGDS/SUDENE	04/08/2015	03/09/2015					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	80,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:	Currais/RN
Observações:	(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013; (2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
	2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 19
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	R\$ 228.797,21	R\$ 254.219,12

Previsão de Conclusão:	31/05/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	29/05/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL			
R\$ 167.999,61	R\$ 25.421,91	dez/12	R\$ 193.421,52	Pago até o ano anterior	R\$	167.999,61
R\$ 60.797,60	--	fev/13	R\$ 60.797,60	A realizar no exercício	R\$	60.797,60
R\$ 228.797,21	R\$ 25.421,91	-	R\$ 254.219,12	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
				Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
				Valor liberado no Exercício	R\$	-
				Saldo a liberar	R\$	60.797,60
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
				Total Liberado até o exercício	R\$	167.999,61

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcelo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		20,0%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12		100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
									21,4%	Em Andamento	Com a reforma administrativa implantada pelo governo no Estado, as ações de Defesa Civil passaram a ser executadas pela Secretaria de Estado de Governo, em substituição à Secretaria de Infraestrutura, responsável pela execução do Projeto. Desta forma, houve a necessidade da transferência dos recursos financeiros a nova Secretaria, assim como, os projetos em andamento no Estado.
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	100%	Concluído	
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50%	Atrasado	Foi encaminhado ofício Nº 186/2015/GAB/SUDENE em 15/05/2015, dando um prazo para que sejam tomadas as providências para o término das licitações.
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100%	Concluído	
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa)	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0%	Atrasado	
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R\$ 60.797,60				0%	Atrasado	
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14					0%	Atrasado	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)											
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	31/10/15					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
				Valor Previsto:	R\$ 228.797,21	Valor realizado:	R\$ 167.999,61	41,4%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objetivo do projeto:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	R\$ 350.978,27	R\$ 370.465,27

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 186.696,80	R\$ 19.487,00	dez/12	R\$ 206.183,80	Pago até o ano anterior	R\$ 350.978,27
R\$ 164.281,47	--	fev/13	R\$ 164.281,47	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 350.978,27	R\$ 19.487,00		R\$ 370.465,27	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 350.978,27

Previsão de Conclusão:	28/12/2014	Convênio Nº 7703355/2012 (Proposta SICONV Nº 015048/2012)
Data Atualização:	29/05/2015	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/Macira Régia Sotero e Marcelo de Castro Viana - CBMCE/ Aluízio Souza Freitas
---	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		20,0%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	R\$ 186.696,80	29/11/2013	29/11/2013	R\$ 186.696,80	100%	Concluído		
9	Processo Licitatório	GOV/CE	28/12/2012	30/12/2013		25/07/14	19.08.2014		100%	Concluído	Processo concluído.	
10	Meta 1: Aquisição 13 notebooks	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013			100%	Cancelado	Licitação concluída. Todavia como a empresa não pode entregar o equipamento até final de dezembro e o convênio se encerrou em 28/12/2014 a meta não pode ser realizada. Valores orçamentários e financeiros deverão ser devolvidos na prestação de contas.	
11	Meta 2: Aquisição 08 projetores multimídia	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013	13/12/2013		100%	Concluído		
12	Meta 3: Aquisição 14 câmeras fotográficas integradas com GPS	GOV/CE	28/12/2012	13/12/2013		25/07/2014			100%	Cancelado	Licitação concluída. Todavia como a empresa não pode entregar o equipamento até final de dezembro e o convênio se encerrou em 28/12/2014 a meta não pode ser realizada. Valores orçamentários e financeiros a devolvidos na prestação de contas.	
13	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	28/12/2012	13/12/2013		20/10/2014	22/10/2014		100%	Concluído		
14	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	28/12/2012	27/09/2014	R\$ 164.281,47		28/11/2014	R\$ 164.281,47	100%	Concluído		
15	Meta 4: Realização 14 cursos de capacitação de	GOV/CE	25.08.2014	05/12/2014		25.08.2014	05/12/2014		100%	Concluído		
16	Meta 5: Realização um Fórum Internacional Sobre	GOV/CE	19/11/2014	22/11/2014		10/12/2014	13/12/2014		100%	Concluído		
17	Visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015		25/02/2015	26/02/2015		100,0%	Concluído	Realizado de 25 a 26/02/2015.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	Atrasado		

18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGC/DAD/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015				0,0%	Atrasado	Parecer técnico com laudo final foi realizado mas só pode ser inserido no Siconv após o laudo financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios. O conveniente está atrasado na 'Prestação de Contas' porque houve 'erro' operacional detectado no Siconv com a conta bancária.	
					Valor Previsto:	R\$ 350.978,27	Valor realizado:	R\$ 350.978,27	80,0%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Observações:

A prestação de contas de acordo com a Portaria 507/2011 seria até 28/02/2015 e a análise técnica e financeira até 28/05/2015, por isso ainda consta a situação 'em andamento'.

2º Ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Descentralização	857.015,99	965.632,35

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		R\$
				Pago até o ano anterior	857.015,99
274.405,33	108.616,36	Maior/2013	383.021,69	A realizar no exercício (RAP 2012)	-
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	-
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Valor Empenhado no Exercício	-
				Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	857.015,99

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santana Alves

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	Providenciado
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Licitações realizadas (90%)
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	Vistoria realizada	
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada	Liberado em 16/12/2014
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014		100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada	Prorrogado para 31/07/2015

9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2014					0%	Cancelado	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	SEDETEC/SE irá enviar o Relatório atualizado até 29/05/2015, será avaliada a necessidade de se fazer uma visita anterior a prestação de contas, mas de acordo com informações colhidas no SICONV, o convênio está em conformidade.
10	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	01/08/2015	30/10/2015					0%	A Iniciar		
11	Realização de visita técnica para parecer, se houve incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	11/2015	11/2015					0%	A Iniciar		
12	Emissão de Laudo Técnico	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	11/2015	11/2015					0%	A Iniciar		
13	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	01/12/2015	01/12/2015					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	857.015,99	Valor realizado:	857.015,99	62%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 22 (PO 20)
Objetivo estratégico:	-	Ano:	2014
Sub-objetivo:	-	Medida Institucional Normativa	
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de marcos de avaliação aplicados em planos, programas ou projetos, que sirvam como referência para replicagem.		
Projeto:	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Propor parâmetros, marcos legais ou indicadores a partir da avaliação de um projeto piloto na área de atuação da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	19/12/2014
Data Atualização:	19/06/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel
---	-----------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Relatório de seleção do projeto a ser avaliado, com justificativas	Ludmilla Calado	26/09/2014	13/10/2014		26/09/2014	13/10/2014		100%	Concluído				
2	Adaptação da metodologia de avaliação ao projeto avaliado	Ludmilla Calado	14/10/2014	18/11/2014		14/10/2014	18/11/2014		100%	Concluído				
3	Avaliação do projeto com base na metodologia aprovada	Ludmilla Calado	19/11/2014	12/12/2014		19/11/2014	02/12/14		100%	Concluído				
4	Relatório final de avaliação contendo metodologia proposta, resultados obtidos, recomendações e próximos passos	Ludmilla Calado	15/12/2014	18/12/2014		02/12/14	10/03/15		100%	Concluído				
5	Validar relatório e entrega final	Frederico/Lautemyr	19/12/2014	19/12/2014		10/03/15	19/06/15		100%	Concluído	Apresentação do resultado da avaliação realizada em 27/05/2015. Relatório final compilado e validado.			
Valor Previsto:					R\$ -	Valor realizado:					R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:
Esta avaliação será um piloto da metodologia que está sendo desenvolvida. Não será entregue ao TCU. Equipe constituída para execução do projeto: Jéssica Rivas, Marina Rogério.
2º ciclo 2015
Nota: Este projeto foi considerado como medida institucional normativa por que trata-se de insumo para melhoria da ação governamental. Um conceito tomado do PPA para monitoramento de projetos dessa natureza.
Observações: O atraso se deve: 1 - Novas instruções do Coordenador-Geral no sentido de confeccionar indicadores, mesmo sem a linha de base.
2 - Estabelecer novas datas para a apresentação, com adiamentos provocados por força maior. Sendo feita a apresentação, com a presença de técnico da SARA/IPA em 27/05/2015.
3 - Acrescentar as sugestões da apresentação do dia 27/05/2015 no relatório final até o dia 10/06/2015.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido.			Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social		
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de Diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais conforme estabelece o inciso II, art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014.				
Projeto:	Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal				
Objetivo do projeto:	Promover a Diferenciação Regional da Política Industrial				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/08/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
--	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Produto 1 - Análise das Últimas Três Políticas Industriais	Miguel Vieira	09/03/2015	09/04/2015		09/03/2015	09/04/2015	100%	Concluído		
1.1	Análise da PITCE	José Luis	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	25/03/2015	100%	Concluído		
1.2	Análise da PDP	Marcus Vinícius	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	09/04/2015	100%	Concluído		
1.3	Análise do PBM	Miguel Vieira	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	02/04/2015	100%	Concluído		
1.4	Relatório Produto 1	Miguel Vieira, com o apoio de José Luis e Marcus Vinícius	30/03/2015	09/04/2015		06/04/2015	09/04/2015	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Análise de Indicadores Industriais	José Luis	10/04/2015	01/06/2015		10/04/2015		79%	Em Andamento		
2.1	Obtenção dos Dados	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	10/04/2015	19/05/2015		10/04/2015	12/05/2015	100%	Concluído		
2.2	Relatório Produto 2	José Luis, com o apoio de Marcus Vinícius e Miguel Vieira	20/05/2015	01/06/2015		13/05/2015		30%	Em Andamento		
3	Produto 3 - Gargalos e Potencialidades do Nordeste por Estado	Marcus Vinícius	02/06/2015	03/08/2015		10/04/2015		6%	Em Andamento		
3.1	Levantamento das Potencialidades por Estado	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	02/06/2015	21/07/2015		10/04/2015		10%	Em Andamento	Atividade antecipada oportunizada em razão de articulação com os governos da Bahia e Pernambuco.	
3.2	Relatórios parciais, por Estado	Marcus Vinícius, com o apoio de José Luis e Miguel Vieira	02/06/2015	21/07/2015		05/05/2015		1%	Em Andamento	Em andamento os relatórios referentes aos Estados de PE e BA.	
3.3	Relatório Final do Produto 3	Marcus Vinícius, com o apoio de José Luis e Miguel Vieira	22/07/2015	03/08/2015				0%	A Iniciar		
4	Produto 4 - Diretrizes Regionalizadas	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	04/08/2015	28/08/2015				0%	A Iniciar		
4.1	Consolidação dos Três Produtos Anteriores	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	04/08/2015	10/08/2015				0%	A Iniciar		
4.2	Apontamento das Diretrizes Para Regionalização	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	11/08/2015	17/08/2015				0%	A Iniciar		
4.3	Relatório Produto 4	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	18/08/2015	28/08/2015				0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	46,3%	Em Andamento	Status do Projeto
--	-----------------	-----	---	------------------	-----	---	-------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Responsável Produto 1 - Miguel Vieira; Responsável Produto 2 - José Luis; Responsável Produto 3 - Marcus Vinícius; Responsáveis Produto 4 - José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira.

Inclusão de uma atividade do produto 3 em função de maior compreensão do produto via desmembramento de atividade

2º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 24
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE		
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	R\$	
1.277.000,00	0,00	Novembro/2014	1.277.000,00	R\$	1.277.000,00
723.000,00	0,00	Março/2015	723.000,00	R\$	723.000,00
2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00	R\$	-
				R\$	-
				R\$	723.000,00
				R\$	-
				R\$	1.277.000,00

Previsão de Conclusão:	17/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014		13/08/2014	13/08/2014		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014		12/11/2014	12/11/2014		100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014		17/11/2014	17/11/2014		100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015		27/02/2015	27/02/2015		100%	Concluído		
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	723.000,00	10/03/2015			80%	Atrasado	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2a parcela. Liberação autorizada em 23/03/2015, mas aguardando limite financeiro.	
7	Solicitação de Termo aditivo financeiro	UFPE (Cláudia Sampaio)	27/05/2015	27/05/2015		27/05/2015	27/05/2015		100%	Concluído	Foi solicitado um aditivo no valor de R\$252.045,00	
8	Paracer técnico referente ao termo aditivo financeiro	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	27/05/2015	29/05/2015		27/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído	Processo está com a Coordenadora para validação/aprovação do Parecer.	
9	Trâmite burocráticos	Convênios e Procuradoria	01/06/2015	30/06/2015					0%	A Iniciar		
10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	25/11/2015	25/11/2015					0%	A Iniciar		
11	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	03/12/2015	03/12/2015					0%	A Iniciar		
12	Apresentação da prestação de contas	UFPE (Cláudia Sampaio)	10/12/2015	10/12/2015					0%	A Iniciar		
13	Realização de visita técnica para parecer, se houver incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	17/12/2015	17/12/2015					0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	2.000.000,00	Valor realizado:	1.277.000,00	60%	Em Andamento	Status do Projeto
--	------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
2º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 25
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	-	
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	-	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Insuficiência de dados, informações e/ou indicadores oferecidos pelos órgãos nacionais de estatística sobre o ambiente e a área de atuação da SUDENE, sugerindo a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a realidade do Nordeste.			
Projeto:	Diagnóstico do NE, elaboração de cenários e proposição de objetivos e metas para o PPA. Cumprir o que determina o art. 4º, inciso VII da Lei Complementar nº 125/2007, que estabelece ser de competência da SUDENE [...], em articulação com o Ministério da Integração Nacional, assessorar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por ocasião da elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento geral da União, em relação aos projetos e atividades previstas para sua área de atuação. Para tal, foi criado um Grupo de Trabalho para produzir um diagnóstico e propor objetivos para o PPA. Oferecer subsídio técnico para regionalização do PPA.			
Objetivo do projeto:	regionalização do PPA.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	26/04/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
---	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor						
1	Elaboração da Metodologia	DPLAN/CGEP (Frederico e Joyce) e CGGI (Manoel Barreiros)	11/02/15	03/03/15		11/02/15	03/03/15		100%	Concluído				
2	Elaboração panorama e metas para os dois primeiros Eixos em Grupos de Trabalho e propor objetivos (Educação e Competitividade)	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	04/03/15	24/03/15		04/03/15	31/03/15		100%	Concluído	Devido a restrição de pessoal, foram elaborados somente o panorama e a proposição de metas para os dois primeiros eixos			
3	Elaboração de panorama e metas para os dois Eixos seguintes em Grupos de Trabalho e propor objetivos (Convivência com o Semiárido; Sustentabilidade Sócioambiental e Cultura)	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	25/03/15	08/04/15					0%	Cancelado	Para o eixo de infraestrutura, foi tomado como base informativa o documento Nordeste competitivo, mas sem análise própria da SUDENE. A servidora Tássia da CGEP DPLAN, preparou documento sobre Panorama da Energia do Nordeste, mas não houve discussão com os membros do GT. Outros documentos informativos foram preparados, mas fora da estrutura do GT.			
4	Elaboração de panorama e metas para os dois Eixos seguintes em Grupos de Trabalho e propor objetivos (Gestão Pública (com enfoque para estados e municípios como agentes de desenvolvimento); Infraestrutura Urbana, Energia e Comunicações)	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	09/04/15	17/04/15					0%	Cancelado				
5	Elaboração de dossiê com todos os panoramas, metas e cenários que subsidiem os objetivos propostos e a síntese dos objetivos	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	20/04/15	26/04/15		20/04/2015	26/04/2015		100%	Concluído				
Valor Previsto:					R\$ -	Valor realizado:					R\$ -	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	Técnico responsável pelo produto: Joyce Queiroz. Integrantes CGEP do projeto: Tássia Germano, Marina Barbosa, Caique Melo (estagiário), Robson Brandão e Ludmilla Calado

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 26
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões
Finalidade da ação:		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Desatualização dos critérios e das prioridades adotadas na aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em P&D e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5%, calculados sobre o produto do retorno das operações financeiras concedidos pelo FDNE conforme estabelecido pela alínea "d", inciso XIII, art. 4º do Decreto nº 8276/14.		
Projeto:	Critérios e Prioridades para aplicação dos Recursos oriundos do 1,5% do retorno das operações do FDNE.		
Objetivo do projeto:	Melhorar seletividade no custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e inovação com base em critérios objetivos para aplicação de 1,5% oriundo do retorno das operações de financiamento concedido pelo FDNE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
---	-------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Estudos dos critérios anteriormente definidos	Albertina	01/10/2015	08/10/2015	-			-	0%	A Iniciar		
1.1	Leitura do relatório resultante do Estudo VIII da Coordenação de Estudos e Pesquisas	Albertina	01/10/2015	06/10/2015	-			-	0%	A Iniciar		
1.2	Identificação dos projetos que utilizam recursos do 1,5% (usar como apoio Estudo VIII citado acima)	Albertina	07/10/2015	08/10/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2	Produto 2 - Levantamento dos critérios utilizados por outras instituições executoras de fundos de C&T	Albertina	09/10/2015	04/11/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2.1	Identificar instituições que executam fundos de C&T (CNPq, Finep...)	Albertina	09/10/2015	14/10/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2.2	Contactar tais instituições (Faz-se necessária a coordenação de articulação)	Albertina	15/10/2015	23/10/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2.3	Contactar o CETENE para alinhar os critérios	Albertina	26/10/2015	04/11/2015	-			-	0%	A Iniciar		
3	Produto 3 - Definição dos critérios de aplicação do 1,5%	Albertina	05/11/2015	18/11/2015	-			-	0%	A Iniciar		
3.1	Reunião interna para discussão do que foi levantado e definição dos critérios	Albertina	05/11/2015	11/11/2015	-			-	0%	A Iniciar		
3.2	Redigir relatório parcial com os critérios definidos	Albertina	12/11/2015	18/11/2015	-			-	0%	A Iniciar		
4	Produto 4 - Definição das prioridades de aplicação do 1,5%	Albertina	19/11/2015	04/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
4.1	Oficina para discussão de prioridades para aplicação dos recursos	Albertina	19/11/2015	27/11/2015	-			-	0%	A Iniciar		
4.2	Redigir relatório parcial com as prioridades definidas	Albertina	30/11/2015	04/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
5	Produto 5 - Apresentação Interna	Albertina	07/12/2015	07/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
5.1	Reunião para apresentação interna dos critérios e aplicações eleitos pela equipe	Albertina	07/12/2015	07/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6	Produto 6 - Relatório Final	Albertina	09/12/2015	22/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6.1	Elaboração do relatório final	Albertina	09/12/2015	14/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6.2	Validação do relatório	Albertina	15/12/2015	16/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6.3	Possíveis correções e entrega do relatório final	Albertina	17/12/2015	22/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	0,0%	A Iniciar	Status do Projeto
--	-----------------	-----	---	------------------	-----	---	------	-----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

Responsável Produto

2º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 27
Objetivo estratégico:	-			Ano:	2015
Sub-objetivo:	-			Medida Institucional Normativa	
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14				
Projeto:	Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE				
Objetivo do projeto:	Avaliar um programa de âmbito nacional, com relação à área de atuação da SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2014
Data Atualização:	29/05/2015



Após a Entrega da metodologia geral ao TCU, foram feitos ajustes pelo em que se concluiu que o programa ser avaliado seria a Universidade Aberta do Brasil, no âmbito da INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, por questões de foco do governo federal, disponibilidade de dados e suas externalidades.

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel
--	-----------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Valor	Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim		Início	Fim	Valor				
1	Pesquisa e leitura sobre referenciais bibliográficos acerca do Sistema Universidade Aberta do Brasil	Gabriela Lins	02/03/2015	24/04/2015		02/03/2015	24/04/2015		100%	Concluído		
2	Realização da avaliação orçamentária/legal	Gabriela Lins	24/04/2015	06/05/2015		24/04/2015			0%	Atrasado	Aguardando dados orçamentários/financeiros que serão enviados pela Capes. O atraso ocorreu por mudanças de presidência da Capes e também pelos dados não se encontrarem consolidados	Caso não haja recebimento dos dados até o final de junho, serão modificados os indicadores relacionados a este item e utilizadas as informações disponíveis dos Relatórios de Gestão da Capes.
3	Coleta de dados específicos para a avaliação operacional/técnica	Gabriela Lins	07/05/2015	11/05/2015		07/05/2015	11/05/2015		100%	Concluído		
4	Análise dos Dados Específicos, com elaboração de gráficos, mapas e avaliação baseada em indicadores.	Gabriela Lins	12/05/2015	19/06/2015		12/05/2015			50%	Em Andamento		
5	Elaboração do Relatório de Avaliação	Gabriela Lins	22/06/2015	03/07/2015		24/04/2015			40%	Em Andamento	O relatório começou a ser elaborado antes do previsto, sendo inseridas as informações que estão consolidadas.	
6	Aprovação final da Metodologia pelo gestor	Frederico/Lautemyr	06/07/2015	30/09/2015					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -	48,3%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
A data acordada com o TCU para entrega do Relatório de Avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE é Dez-2015.
Plano de Trabalho para avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE será incluído como PO de monitoramento em 2015. Equipe constituída para execução do projeto: Emmanuel Albuquerque, Gabriela Lins, Jéssica Rivas, Ludmilla Calado.
2º ciclo 2015
Observações: 1 - Dificuldade de obtenção de dados por parte da CAPES.
2 - Como não foi possível finalizar o item 4, o item 5 foi iniciado antes do prazo previsto.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA			
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Em Andamento		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto					Valor Previsto:	3.876.491.700,00		3.065.105.668,00	77,78%	Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------	------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
2º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).											
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.											
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.											
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.											
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.											
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.											
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.											
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.											
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.											
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Fiat Automóveis Ltda.			
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.180.925.388,15
A realizar no exercício	R\$ 778.074.611,85
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 132.000.000,00
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 646.074.611,85
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.312.925.388,15

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	31/05/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	140.000.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	110.000.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	126.942.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	269.132.611,85	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	15/12/15	1.959.000.000,00	24/10/13	-	1.312.925.388,15	50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Em Andamento		

14	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
15	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.312.925.388,15	60,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.

Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.

Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.

Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Obs.6 **A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador.**

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 30 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

Previsão de Conclusão:	01/03/2010	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado	-	-	0,0%	Em Andamento	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibilização da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00 50%	Em Andamento

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR			
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.376.481,00	89.294.135,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 53.376.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.376.481,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/08/2014	A ser repactuada
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	Conforme ofício nº 0270/2014 - Dfin/Sudene, de 25.2.2014, encaminhado ao BNB solicitado aditamento ao contrato ou novo contrato.
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/04/14	01/05/14	42.477.417,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012.	Aprovada a migração pela Sudene/BNB. Aditivo ao Contrato de Ag. Operador assinado. Falta o aditivo ao contrato de financiamento. Previsão de liberação será repactuada.

6	Liberação 2	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/06/14	01/07/14	10.899.064,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012.	Aprovada a migração pela Sudene/BNB. Aditivo ao Contrato de Ag. Operador assinado. Falta o aditivo ao contrato de financiamento. Previsão de liberação será repactuada.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/04/14	01/07/14	53.376.481,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									50%	Atrasado		
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		53.376.481,00	Valor realizado:		0,00	50,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
- Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
- Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
- Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
- Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
- Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
- Obs9: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
- Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.723.785,57
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 16.976.214,43
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	--------------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
- Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.635.943,87
A realizar no exercício	R\$ 1.264.056,13
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87

Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para implantação do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	-	53.635.943,87	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	54.900.000,00	Valor realizado:	53.635.943,87	70,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísia I Geração e Comercialização de Energia Ltda			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberção 1		01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberção2		01/07/14	31/07/14	496.137,41	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.439.000,00	15/05/13	-	63.942.862,59	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	64.439.000,00	Valor realizado:	63.942.862,59	70,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faísca II Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emilian o	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberção 1		01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberção 2		01/07/14	31/07/14	428.678,72	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	59.864.000,00	15/05/13	-	59.435.321,28	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	59.864.000,00	Valor realizado:	59.435.321,28	70,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 36 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísca III Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$	429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	54.848.909,88

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	429.090,12	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado			-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		55.278.000,00	Valor realizado:		54.848.909,88	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

- 2º Ciclo 2015**
- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 37 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	1.056.552,40	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		54.216.447,60	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 57.321.606,84
Saldo a liberar	R\$ 7.133.393,16
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 57.321.606,84

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012. Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	-	57.321.606,84	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	64.455.000,00	Valor realizado:	57.321.606,84	70,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 39 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	26/12/13	24/01/14	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		33.900.000,00	Valor realizado:		33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 46.786.085,39
A realizar no exercício	R\$ 3.213.914,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 3.213.914,61
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 46.786.085,39

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	-	46.786.085,39	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		46.786.085,39	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 41 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J.Emerson/ A.F. Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Em Andamento		

9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	0,00	0%	Em Andamento
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	49.690.000,03	Valor realizado:	49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 42 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	46.701.999,96	85.684.069,03

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 34.986.862,96
A realizar no exercício	R\$ 11.715.137,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 11.715.137,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 34.986.862,96

Previsão de Conclusão:	01/04/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	11.715.137,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	46.701.999,96	15/05/13	-	34.986.862,96	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	------	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	46.701.999,96	Valor realizado:	34.986.862,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- 2º Ciclo 2015**
- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
---	---------------	-----------	---------------	---------------	--	---	---	--	-------	--------------	--	--

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:							
Observações:							
2º Ciclo 2015							
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.							
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.							
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.							
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012. Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012. Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Em Andamento		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	0,00	0%	Em Andamento

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	53.959.000,00	Valor realizado:	53.959.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 45 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ 3.562.805,04
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	0,00
Saldo a liberar	R\$ 3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Claudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	99.970.000,00	22/05/13	-	96.407.194,96	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	99.970.000,00	Valor realizado:	96.407.194,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 46 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	30/07/2015
Data Atualização:	31/05/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 197.811.049,39
A realizar no exercício	R\$ 105.188.950,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 105.188.950,61
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 197.811.049,39

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,00	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	48.707.006,00	13/05/15	-	-	50,00%	Em Andamento	Em análise pela área técnica da SUDENE	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	22.281.666,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/15	31/01/15	18.954.422,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	15.245.856,75	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	01/05/15	303.000.000,00	19/04/13	-	197.811.049,39	50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		303.000.000,00	Valor realizado:		197.811.049,39	54,17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2015	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 47 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Aratu Empreendimentos Ltda				
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 86.845.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 270.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	31/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/13	30/12/13	13.852.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	0,00	6%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	270.582.240,00	Valor realizado:	0,00	18,18%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
2º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 48 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.			
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 13.862.197,00
A realizar no exercício	R\$ 9.992.845,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 9.992.845,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 13.862.197,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2014
Data Atualização:	31/05/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Fisico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/09/14	30/11/14	9.992.845,00	09/03/15	-	-	0,00%	Atrasado		Solução de pendências da Proposta de liberação em andamento.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	30/11/14	23.855.042,00	20/06/13	-	13.862.197,00	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		23.855.042,00	Valor realizado:		13.862.197,00	62,50%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Deten Química S.A.			
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	30/01/2016
Data Atualização:	31/05/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$	15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	15.447.600,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14	-	10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	30/12/15	31.256.000,00	10/09/13	-	15.447.600,00	29%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									64%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	15.447.600,00	41,67%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.			
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14	-	27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	Em Andamento		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.867.350,00	Valor realizado:	61.867.350,00	66,67%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Cone Multicenter Ltda				
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 161.068.054,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/03/2017
Data Atualização:	31/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	191.238.424,00	Valor realizado:	0,00	28,57%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	----------------	------------------	------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S.A.				
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

Previsão de Conclusão:	30/11/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/05/2015	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:	50.000.000,00	Valor realizado:	50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.075.935.159,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	31/05/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/13	06/07/14	0,00	19/12/12	27/06/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Em Andamento	Minuta de contrato enviada ao Banco.	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.	Contrato CEF/Empresa em fase de formalização. Prazo prorrogado.
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-		0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/06/14	31/07/17	1.075.935.159,00	16/05/14	-	0,00	6%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	1.075.935.159,00	Valor realizado:	0,00	26,92%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)			
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 70.152.822,60
A realizar no exercício	R\$ 288.555.369,17
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 345.429.739,92
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 70.152.822,60

Previsão de Conclusão:	01/06/16
Data Atualização:	31/05/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Cosulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14	-	21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	114.555.923,52	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	57.163.904,46	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/14	31/12/14	54.743.293,10	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/06/15	01/07/15	75.370.699,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	56.874.370,75	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/06/16	01/07/16	56.874.370,75	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	01/07/16	415.582.562,52	21/02/14	-	70.152.822,60	28,57%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									64,29%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 70.152.822,60	41,67%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros Institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs3: A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Cone S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de plataforma de serviços de logística			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 123.186.471,03
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 123.186.471,03
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 123.186.471,03
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/02/16
Data Atualização:	31/05/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			12/12/13	02/05/14	0,00	12/12/13	12/11/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	17/01/15	-	18/11/14	Não informado	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			18/11/14	02/03/16	123.186.471,03	18/11/14	-	0,00	11,11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									55,56%	Em Andamento		

13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 123.186.471,03	Valor realizado:	R\$ -	28,57%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 56 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão				
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional		
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros		
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.				
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.				
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	R\$ -

Previsão de Conclusão:	15/04/2015
Data Atualização:	05/06/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/06/14	04/07/14		30/06/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Todo o andamento das providências para a construção do RI teve por começo a publicação do novo Decreto de estrutura regimental da SUDENE.	O Decreto nº 8.276 foi assinado em 27/06/14 e publicado no DOU de 30/06/14, Seção 1, pág. 5..
2	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	03/07/14	04/07/14		03/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
3	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/07/14	22/07/14		07/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
4	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/07/14	23/07/14		28/07/14	22/08/14		100,00%	Concluído		
5	Elaboração da Portaria que aprova as Siglas da Sudene. Abertura de processo, envio à Procuradoria, Assinatura do Superintendente.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/09/14	09/09/14		01/09/14	09/09/14		100,00%	Concluído	Só foi possível elaborar as siglas quando as unidades retornaram com as competências analisadas e os nomes correspondentes.	
6	Apresentação das siglas para conhecimento à Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/09/14	19/09/14		11/09/14	11/09/14		100,00%	Concluído	Em função de algumas observações que surgiram na reunião houve a necessidade de alguns ajustes	
7	Retorno das competências pelas unidades para apresentação dos resultados e novos ajustes	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/09/14	26/09/14		15/09/14	03/10/14		100,00%	Concluído		

8	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio à unidade para análise final	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	29/09/14	24/10/14		06/10/14	24/10/14		100,00%	Concluído	
9	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	24/10/14	31/10/14		29/10/14	14/11/14		100,00%	Concluído	
10	Encaminhamento à PRD para apreciação dos aspectos jurídicos da proposta (inclui apreciações preliminares e ajustes)	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	19/11/14	15/12/14		19/11/14	15/12/14		100,00%	Concluído	O prazo previsto desta etapa incluiu uma apreciação preliminar da PRD, que foi seguida por sugestões de ajustes e o envio para apreciação da versão final no dia 15/12/14.
11	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/12/14	29/12/14		27/02/15	27/02/15		100,00%	Concluído	Aguardando agenda da Diretoria colegiada. Em reunião realizada dia 25/03/15, a Diretoria pediu que as unidades internas apresentassem, no prazo de 48 horas, sugestões à proposta de RI que ainda percebam como necessárias.
12	Reunião prévia de esclarecimento e alinhamento de posições com os Diretores de Administração, de Fundos e Incentivos, e de Planejamento	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	25/03/15	25/03/15		29/04/15	29/04/15		100,00%	Concluído	Essa reunião objetivou o encontro de soluções para a implantação da Coordenação de Gestão de Convênios e TCE, para a retomada do cargo da coordenação da CGGI e para a troca de cargo DAS 102-3 por 101.3, da unidade de Suprimentos para a Coordenação de Gestão de Convênios e TCE. A CGGI preparou nota técnica com data de 12/05/15 para subsidiar decisão do Superintendente sobre o assunto.
13	Aprovação pela DC, publicação no DOU e/ou Boletim interno.	Samuel (SAD/GAB)	01/03/15	29/05/15					0,00%	Atrasado	Continuamos a aguardar uma decisão da DC para o fechamento completo do RI.
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:				92,31%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Observações:

2º Ciclo 2015

O prazo de conclusão foi reajustado para 15/04/2015 em função de agenda da Diretoria colegiada.

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 57 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.		
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável :	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.		
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	1	90	0,00	0,00



Previsão de Conclusão:	08/11/2015
Data Atualização:	05/06/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca e Manoel Barreiros
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído		
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE, para nivelamento de conceitos e apresentação detalhada dos avanços do MI e da proposta de plano de trabalho da SUDENE, para construção de seu EP.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).	
3	Reunião com unidades internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.	
4	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explicação sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14	-	11/09/14	11/09/14	-	100%	Concluído		
5	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14	-	11/09/14	18/09/14	-	100%	Concluído		
6	Projeto piloto (mapeamento dos principais processos da CGGI)	Carmen Fonseca e Vinicius Vieira (CGGI/SUDENE)	11/08/14	10/04/15	-	11/08/14		-	30%	Atrasado	Datas repactuadas de acordo com realinhamento da unidade	
7	Seleção da área a ser mapeada	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-	26/03/15	26/03/15	-	100%	Concluído		

8	Definição da Metodologia	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	12/06/15	12/06/15	-	12/06/15	12/06/15	-	100%	Concluído		
9	Ajuste/revisão a minuta de portaria	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	10/06/15	18/06/15		10/06/15			50%	Em Andamento		
10	Formalização do Grupo de Trabalho (assinatura da portaria)	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	15/06/15	16/06/15	-			-	0%	A Iniciar		
11	Revisão do projeto de GESTÃO DE PROCESSOS e elaboração versão final com base na metodologia escolhida.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	12/06/15		-	20%	Em Andamento		
12	Preparar Material a ser distribuído aos interlocutores	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	12/06/15		-	10%	Em Andamento		
13	Início dos trabalhos e mapeamento na área de Convênios	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	17/06/15	31/08/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
14	Preparar apresentação ao grupo de interlocutores;	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/09/15	04/09/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
15	Reunião com os interlocutores de cada área; solicitar leitura do material.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	08/09/15	08/09/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
16	Reunir grupo - interlocutores e explicar o trabalho	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	09/09/15	09/09/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
17	Preparar Treinamento do grupo de interlocutores - indicados pelas unidades (In Company)	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	14/09/15	17/09/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
18	Treinar Grupo – com o objetivo de iniciar o trabalho em cada unidade	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	22/09/15	25/09/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
19	Reunir Diretoria Colegiada para informar o andamento dos trabalhos	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	29/09/15	29/09/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
20	Iniciar replicagem para outras unidades conforme posição da Diretoria Colegiada.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	02/10/15	02/10/15	-			-	0%	A Iniciar		Datas previstas ajustadas.
					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	41%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2015

Obs. 1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3-Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 58
Objetivo estratégico:	-			Ano:	2015
Sub-Objetivo:	-			Medida Institucional Normativa	
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente Eficaz e Efetiva.		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.		
Objetivo da ação:	Elaboração do novo PPA 2016-2019				
Diretoria responsável:	-	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Gestão Institucional		
Superintendente:	José Márcio de Medeiros Maia	Gestor da subunidade:	Manoel Barreiros		
Problema (causa):	Risco de desarticulação interna, desperdício e organização assistemática das discussões e elaboração da proposta da SUDENE para o novo Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2016-2019.				
Projeto:	Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA.				
Objetivo do projeto:	Elaborar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional e com as demais diretorias, propostas para o plano plurianual, para a lei de diretrizes orçamentárias e para a lei orçamentária anual, em relação aos projetos e atividades previstos na área de atuação da SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-



Previsão de Conclusão:	17/07/15
Data Atualização:	05/06/15

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE)
--	--------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Comunicação à Diretoria Colegiada da SUDENE, do início dos trabalhos internos para a elaboração do novo PPA.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	29/12/14	21/01/15		29/12/14	21/01/15		100%	Concluído	Na reunião nº 185 (29/12/14) a CGGI comunicou o início dos trabalhos para janeiro/15, e na reunião nº 186 (21/01/15) a CGGI pediu a colaboração da alta administração para apoiar tanto nas articulações políticas que se fizessem necessárias, como institucionais, com os diferentes ministérios de nosso interesse, particularmente o MI. O Superintendente José Márcio e os diretores presentes hipotecaram total apoio.	
2	Articulação com o Ministério da Integração Nacional pedindo a agenda de discussão para o novo PPA, os objetivos para o novo período e a metodologia prevista.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	03/02/15	05/02/15		20/01/15	20/01/15		100%	Concluído	A articulação, feita por e-mail de 20/03, dirigido à CGPM/SECEX/MI objetivou também, provocar o MI a se mexer para iniciar articulação com a SPI/MPO e inserir a SUDENE nas discussões.	
3	Reunião interna para disseminação das primeiras orientações da SPI/MPO	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	04/02/15	04/02/15		21/01/15	21/01/15		100%	Concluído	A CGGI estava vislumbrando risco de desarticulação interna, falta de foco e de metodologia.	A CGGI sugeriu a formação de um grupo interno de trabalho e comunicou, com base na informação recebida, os possíveis momentos nos quais seriam recebidas as prioridades do governo federal, oportunidade na qual a SPI disponibilizará o manual para a elaboração do novo PPA, e mais, comunicará as prioridades elegidas, a agenda de temas setoriais e o cronograma de encaminhamentos oficiais.
4	Identificação de ponto de contato na SPI/MPO para intercâmbio de informações.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	04/02/15	04/02/15		23/01/15	23/01/15		100%	Concluído	O MI não estava demonstrando clareza, eficiência e eficácia nas informações que transmitia.	A identificação do contato (Marcos Silva - Coordenador do Departamento de Gestão do Ciclo de Planejamento da SPI/MPO, fone (61) 2020.4119) objetivou facilitar e agilizar a troca de informações haja vista que o MI não estava demonstrando clareza, eficiência e eficácia nas informações que transmitia.
5	Reuniões internas, preparatórias, para as discussões do programa 2040 - Gestão de Riscos, em Brasília, levantamento de documentação de suporte, legislação, artigos acadêmicos sobre sucessos e insucessos de políticas públicas..	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	04/02/15	05/02/15		28/01/15	30/01/15		100%	Concluído	Foi escolhido o Prog. 2040 - Gestão de Riscos para aplicação da metodologia, que constou de revisão de objetivos, metas e iniciativas do PPA 2012-2015. Foram realizadas reuniões internas nos dias 28 e 30/01.	A CGGI, em 23/01/15 pediu que todas as unidades finalísticas definissem representantes para a reunião presencial. A informação da CGDS e CGEP/DPLAN foi recebida pela CGGI na mesma data.

6	Reunião presencial para discussão de metodologia de elaboração do novo PPA sobre projeto piloto a ser escolhido.	SPI/MPO	05/02/15	05/02/15		03/02/15	03/02/15		100%	Concluído	A reunião foi presencial, realizada na ENAP/Brasília e servirá para orientar a preparação interna para quando chegar o momento das discussões da agenda oficial.	
7	Reuniões internas para avaliação de resultados da oficina do Prog. 2040, dia 03/02/15 em Brasília, desdobramentos do trabalho, integração das equipes, definição do modelo metodológico, testes, refinamentos de metodologia, transmissão de orientações advindas da SPI (resultados da reunião com secretários de ministérios dia 19/03) .	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros), CGEP/DPLAN (Frederico Cavalcanti), CGDS/DPLAN (Carlos Almiro)	06/02/15	31/03/15		04/02/15	25/03/15		100%	Concluído	Foram realizadas reuniões nos dias 04, 06, 11, 12, 13, 19, 25 e 26/fev, 02, 03, 19, 25/mar para discutir resultados do Prog. 2040, a agenda de trabalhos subsequentes, conteúdo metodológico, formação de equipes internas de discussão temática e apresentação de resultados.	As reuniões dos dias 25/02 e 03/03 objetivaram alinhar com o Chefe de Gabinete, Clésio Oliveira, e com o Diretor da DPLAN, Sérgio Alencar, o andamento dos trabalhos e os resultados já alcançados.
8	Expedição de comunicação aos Ministérios setoriais, ao MI e ao MPO sobre pedido de inserção da SUDENE nas discussões das oficinas temáticas do novo PPA.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	25/03/15	31/03/15		24/03/15	24/03/15		100%	Concluído	Encaminhado e-mail à CGPM/MI cobrando agenda oficial de oficinas do PPA e expedidos ofícios, assinados pelo Sr. Superintendente, com data de 24/03/15, aos Ministérios dos Transportes; Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação; Cultura; Educação, Secretaria de Portos; Cidades; Relações Exteriores; Minas e Energia; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Planejamento e Turismo.	
9	Videoconferência do MI sobre o Prog. 2040-Gestão de Riscos.	CGPM/SECEX/MI	26/03/15	26/03/15		26/03/15	26/03/15		100%	Concluído	Busca, pelo MI, de sugestões junto a vinculadas para ajustes de objetivos, metas e iniciativas do Prog. 2040 - Gestão de Riscos.	
10	Encaminhamento da agenda de oficinas temáticas e pedido de relação de técnicos para as oficinas temáticas	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	27/03/15	31/03/15		01/04/15	01/04/15		100%	Concluído	Encaminhamento as unidades finalísticas (CGEP e CGDS/DPLAN) da relação de oficinas enviadas pela SPI/MPO e pela CGPM/MI, que terão participação da SUDENE e pedido da CGPM para indicação de técnicos da SUDENE que participarão de reuniões preliminares de orientação para a elaboração do novo PPA 2016-2019. CGEP e CGDS apresentaram suas indicações de oficinas de interesse por e-mail dos dias 01 e 02/04 respectivamente.	Adicionalmente, como reforço, a SUDENE enviou ao Secretário da SPI, o of. 172/2015/GAB, de 06/04, com as indicações das oficinas de interesse da Autarquia.
11	Reunião com o Diretor da DPLAN para apresentação, pela CGDS e CGEP, da proposta da SUDENE para o Prog. 2029.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros) e DPLAN (Diretor Sérgio Alencar)	13/04/15	13/04/15		13/04/15	13/04/15		100%	Concluído	Além da proposta da SUDENE, também foram discutidas as justificativas sugeridas por Amarildo Baesso (Diretor de Programas do MI) para participação da SUDENE nas oficinas e pedido de relação de técnicos para essas oficinas oficiais.	
12	Videoconferência do MI com as vinculadas, preparatória para as oficinas do PPA.	CGPM/SECEX/MI	16/04/15	16/04/15		16/04/15	16/04/15		100%	Concluído	A reunião objetivou democratizar as orientações da SPI/MPO e informar sobre ajuste de datas das oficinas temáticas.	
13	Projeção de gastos com diárias e passagens para participação da SUDENE nas oficinas do PPA.	CGGI/SUDENE, CGEP e CGDS/DPLAN	17/04/15	17/04/15		17/04/15	17/04/15		100%	Concluído	A CGGI pediu a todas as unidades finalísticas e DFIN/CGDF que, com base em suas indicações de pessoal e temas de interesse, apresentasse a projeção de gastos com diárias e passagens. Na mesma data (17/04) a CGGI recebeu as respostas das unidades.	
14	Videoconferência da SUDENE, para discussão com as vinculadas SUDECO e SUDAM, das propostas da Autarquia para o novo PPA (Autorizada pelo Superintendente).	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	20/04/15	20/04/15		20/04/15	20/04/15		100%	Concluído	A reunião objetiva intercâmbio de propostas, conciliação de pontos de interesse, defesa conjunta de objetivos e definição de estratégia de abordagem para as oficinas temáticas.. A SUDECO não pode participar por que não conseguiu as instalações do MI, mas mesmo assim, foi inserida na agenda de intercâmbio.	Para facilitar o trânsito de dados entre a SUDENE e a SUDAM a CGGI, a CGEP e a CGDS/DPLAN intercambiaram seus contatos.

15	Participação da SUDENE nas discussões das oficinas temáticas do PPA 2016-2019 (1ª Rodada).	CGEP/DPLAN, CGDS/DPLAN e CGDF/DFIN(equipes)	22/04/15	15/05/15	22/04/15	15/05/15	100%	Concluído	Oficinas escolhidas para apresentação de propostas de objetivos, metas e iniciativas: desenvolvimento regional; transporte terrestre; saneamento; pesca e aquicultura; mobilidade urbana; agricultura familiar; aviação civil; educação; agropecuária sustentável; petróleo, gás e combustível; energia elétrica; conservação e uso sustentável da biodiversidade; ciência, tecnologia e inovação; desenvolvimento da indústria, comércio e serviços; mudanças climáticas. A oficina que apresentou os piores resultados foi a do Prog. 2029 onde o MI concentra suas ações.	Em todas as oficinas da 1ª rodada a SUDENE apresentou propostas.
16	Videoconferência extraordinária do MI com as vinculadas sobre o programa 2029.	CGPM/SECEX/MI	24/04/15	24/04/15	24/04/15	24/04/15	100%	Concluído	A reunião objetivou consilidar posição sobre o programa 2029 em razão do insucesso da reunião de 19/05, em Brasília, com posições técnicas conflituosas entre MI, MDA e MMA.	
17	Reunião interna, pela manhã, para busca de convergência com os objetivos do Programa 2029 no novo PPA	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	27/04/15	27/04/15	27/04/15	27/04/15	100%	Concluído	A reunião objetivou discutir pontos da proposta da reunião do dia 24/04 (videoconferência do MI), que trouxeram prejuízos para a atuação da SUDENE e buscar posição interna como preparação para a reunião da videoconferência, novamente com o MI, na tarde de 27/04.	
18	Videoconferência do MI e vinculadas, à tarde, sobre as propostas para o Programa 2029 discutidas na videoconferência do dia 24/04.	CGPM/SECEX/MI	27/04/15	27/04/15	27/04/15	27/04/15	100%	Concluído	A reunião objetivou superar pontos de dúvida e conflitos de objetivos contidos nas proposta da SDR/MI e vinculadas, particularmente a SUDENE, sempre mais proativa que as demais.	
19	Participação da SUDENE nas discussões das oficinas temáticas do PPA 2016-2019 (2ª Rodada).	CGEP/DPLAN, CGDS/DPLAN e CGDF/DFIN(equipes)	04/05/15	28/05/15	04/05/15	28/05/15	100%	Concluído	Oficinas escolhidas para discussão dos resultados da avaliação da SPI/MPO: desenvolvimento regional; transporte terrestre; saneamento; micro e pequena empresa; pesca e aquicultura; educação; energia elétrica; ciência, tecnologia e inovação; desenvolvimento da indústria, comércio e serviços; mudanças climáticas. A oficina que apresentou os piores resultados foi a do Prog. 2029 onde o MI concentra suas ações.	Em função de problemas de conciliação entre MI, MDA e MMA houve oficina extra do Prog. 2029, dia 28/05.
20	Reunião interna.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	06/05/15	06/05/15	06/05/15	06/05/15	100%	Concluído	Avaliação dos avanços/resultados alcançados nas oficinas de elaboração do novo PPA e seleção das oficinas da segunda rodada.	Oficinas escolhidas para discussão dos resultados da avaliação da SPI/MPO (número menor): pesca e aquicultura; educação; desenvolvimento regional; transporte terrestre; saneamento; micro e pequenas empresas; energia elétrica; ciência, tecnologia e inovação; desenvolvimento da indústria, comércio e turismo; conservação e uso sustentável da biodiversidade; petróleo, gás e combustível; e mudanças climáticas.
21	Videoconferência da SUDENE (Autorizada pelo Superintendente) com as vinculadas SUDECO e SUDAM.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	07/05/15	07/05/15	07/05/15	07/05/15	100%	Concluído	A reunião objetivou avaliação conjunta e o compartilhamento de posições a respeito dos resultados das oficinas do PPA 2016-2019.	Os resultados demonstraram divergências entre equipes do MI com repercussão nas ações das vinculadas, além de monopolização das discussões pelo MI, ignorando posições das mesmas. A SUDECO não pode participar por que não conseguiu apoio do MI. A reunião se revelou de extrema importância para a SUDAM.
22	Captação para a PLOA 2016	CGPM/SECEX/MI (Katten Eutáquio)	08/05/15	22/05/15	08/05/15	01/06/15	100%	Concluído	Orientação originada da CGPM/SECEX/MI. A CGPM informou por meio de e-mail de 08/05/15 que tanto as informações para a PLOA 2016 qto. Para admissão de atributos para o novo PPA serão inseridos no SIOP por ela.	
23	Reunião convocada pela CGEP/DPLAN para discutir questões para o Prog. 2029, preparatória para a 2ª reunião (1ª rodada ainda) na ENAP, dia 15/05.	CGGI/SUDENE e CGEP/DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/05/15	13/05/15	13/05/05	13/05/15	100%	Concluído	Objetivo: fechamento de redação da proposta da SUDENE para objetivoe, metas e iniciativas.	
24	Reunião interna para discutir resultados e posição alcançada na formulação de objetivos, metas e iniciativas para o prog. 2029.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	25/05/15	25/05/15	25/05/15	25/05/15	100%	Concluído	A reunião é preparatória para a reunião extra, na ENAP, dia 28/05.	A reunião revelou que vem ocorrendo mudanças de posição entre o que a SUDENE envia para o MI e a SPI, e o que aparece nas discussões das oficinas, sem aviso prévio. A reunião objetivou corrigir essa questão.

25	Videconferência, a pedido da SUDENE, com o MI e demais vinculadas.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	26/05/15	26/05/15		26/05/15	26/05/15		100%	Concluído	A reunião contou com a participação da SPI/MPO, a SDR/MI, Amarildo Baesso (responsável pela consolidação das propostas), as vinculadas e a CGPM. A reunião revelou a resistência da SPI/MPO e do MI em acatar as propostas da SUDENE. A percepção geral foi de que os resultados trouxeram prejuízos para a atuação da SUDENE no cumprimento de seus objetivos regimentais.	Alinhar posições sobre o prog. 2029, que ainda aparecem discordantes e sem justificativas do MI para as supressões aplicadas sem aviso, preparatória para a reunião do prog. 2029, na ENAP, dia 28/05.
26	Captação quantitativa para o PPA 2016-2019	SPI/MPO	29/06/15	17/07/15					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	96,2%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

CGDS e CGEP/DPLAN; COC/CGAF/DAD; CGGP e CGIF/DFIN, SPI/MPO e CGPM/SECEX/MI. Ademais do MMA;MDIC; MME; MCT&I; SUDAM e SUDECO.

Observações:

2º Ciclo 2015



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA		
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL		
Responsável:	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO		
Problema (causa):	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe				
Projeto:	DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS				
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		26.600,00



Previsão de Conclusão:	27/11/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	1.600,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	25.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$	1.600,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14	0,00	17/11/14	28/11/14	0,00	100%	Concluído		
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído		
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14	0,00	11/12/14	11/12/14	0,00	100%	Concluído		
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15	0,00	03/02/15	31/03/15	0	100%	Concluído		
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15	0,00	01/04/15	30/04/15	0	100%	Concluído		
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/06/15	25.000,00	04/05/15		0	30%	Em andamento	Aguardando propostas para análise e seleção - Data repactuada	Encaminhamento de solicitação de propostas
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/07/15	10/07/15	0,00			0	0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	13/07/15	31/07/15	0,00			0	0%	A Iniciar		
9	Elaboração de Projetos Desenvolvimento de coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	03/08/15	14/08/15	0,00			0	0%	A Iniciar		
10	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	17/08/15	30/10/15	0,00			0	0%	A Iniciar		
11	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	09/11/15	27/11/15	0,00			0	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					26.600,00	Valor realizado:			1.600,00	48%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 60 (ex PO 57)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2015
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA		
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e getão de seus programas frinalísticos				
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO,ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL		
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO		
Problema (causa):	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.				
Projeto:	Gestão por Competências				
Objetivo do projeto:	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.000,00



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/10/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14	0,00	24/11/14	12/12/14		100%	Concluído		
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15	0,00	19/01/15	30/01/15		100%	Concluído		
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15	0,00	02/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/07/15	25.000,00	01/04/15			30%	Em Andamento	Quantitativo insuficiente de propostas para análise - Repactuação de datas	Encaminhamento de solicitação de propostas
5	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	20/07/15	24/07/15	0,00				0%	A Iniciar		
6	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	27/07/15	21/08/15	0,00				0%	A Iniciar		
7	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	24/08/15	25/09/15	0,00				0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	28/09/15	09/10/15	0,00				0%	A Iniciar		
9	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	19/10/15	30/10/15	0,00				0%	A Iniciar		
10	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	03/11/15	30/11/15	0,00				0%	A Iniciar		

	Valor Previsto: 25.000,00	Valor realizado: 0,00	33%	Em Andamento	Status do Projeto
--	----------------------------------	------------------------------	-----	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	PROMOVER A EXCELÊNCIA TÉCNICA E A QUALIDADE DA GESTÃO DA SUDENE	Número do Projeto: PO 61 (ex PO 58)	
Objetivo estratégico:	MODERNIZAR A GESTÃO E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E A CAPACITAÇÃO POR COMPETÊNCIAS	Ano 2015	
Sub-objetivo:	VALORIZAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES		
Programa:	2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e Gestão de seus programas finalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral		
Projeto:	Investindo nos Sonhos		
Objetivo do projeto:	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laborativa.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		10.000,00



Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 10.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 5.000,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 5.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 5.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ 5.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14	0	06/10/14	10/10/14	0	100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14	0	17/10/14	17/10/14	0	100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14	0	19/11/14	05/12/14	0	100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicossociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15	0	20/01/15	31/03/15	0	100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15	0,00	01/04/15	10/04/15	0	100%	Concluído		
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15	0,00	13/04/15		0	50%	Em Andamento	Datas Repactuadas	
7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído		
8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15	0,00	08/06/15		0	30%	Em Andamento		

9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00				0%	A Iniciar		
10	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - segunda turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/09/15	17/11/15	2.500,00				0%	A Iniciar		
10	Elaboração do Projeto de Vida e homenagem aos servidores aposentados.	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	18/11/15	24/11/15	0,00				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	10.000,00	Valor realizado:	5.000,00	62%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 62 (ex PO 59)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior		
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho				
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho				
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	2.630.114,65
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$	555.861,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	241.454,70
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar no Exercício	R\$	241.454,70
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total liberado até o exercício	R\$	2.630.114,65

Previsão de Conclusão:	28/04/2016
Data Atualização:	03/06/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
---	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	
5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	

6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	0,00	20/01/14	13/04/15	0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compor Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R\$ 241.454,70.
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14	05/12/14		100%	Concluído	A Nota de Empenho, no valor global de R\$ 555.861,00, foi realizada em 05/12/2014, aguardando autorização superior para fabricação das poltronas.
8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/10/15	345.000,00				0%	A Iniciar	Foi celebrado em 07/05/2015 o Contrato Sudene nº 02/2015, estando no aguardo da emissão da Ordem de Execução dos Serviços.
9	Licitação da obra de ambientação final	Eneida (SUDENE/CPL)	27/07/15	27/10/15	0,00				0%	A Iniciar	
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	28/10/15	28/04/16	3.300.000,00				0%	A Iniciar	
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compor Engenharia e Automação Ltda.	28/10/15	28/04/16	0,00				0%	A Iniciar	
12	Entrega da obra			28/04/16					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		7.553.642,89	Valor realizado:		2.630.114,65	58%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 63 (ex PO 61)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho		Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior	
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.				
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 5.191.716,42
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ 3.478.828,44
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exerc. (LOA 2015+RAP 2014)	R\$ 789.666,12
Saldo a liberar no Exercício	R\$ 2.689.162,32
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 5.981.382,54

Previsão de Conclusão:	22/07/2015
Data Atualização:	03/06/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/07/15	5.745.805,68	22/10/12		3.056.643,36	85%	Em Andamento	Encontra-se em execução os serviços de reforma do lay-out do subsolo, estando paralisados os serviços de recuperação das fundações e a construção da rampa, que serão retomados após a celebração do 5º Termo Aditivo.	A Comissão de Fiscalização e a Contratada estão concluindo os entendimentos quanto aos quantitativos e custos unitários que comporão o 5º Termo Aditivo.
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	22/07/15	0,00	22/10/12			85%	Em Andamento	A Comissão de Fiscalização foi modificada através da Portaria nº 153/2014, sendo composta pelos engenheiros civis Wilson Galdino e José Villeneuve e pelos engenheiros eletricitistas Diego Vêras e Thiago Teles; a arquiteta Rebeca Ramalho solicitou demissão da Sudene.	
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/07/15	0,00				0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	9.673.041,23	Valor realizado:	5.981.382,54	89%	Em Andamento	Status do Projeto	

O valor realizado é a soma do valor pago até o ano anterior (R\$ 5.191.716,42) com o valor liberado no Exercício (R\$ 789.666,12), através da fórmula: O25=O18+O22.

Parceiros institucionais:	
Observações:	2º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 64 (ex PO 62)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior		
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.				
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	4.663.522,50	4.663.522,50

Previsão de Conclusão:	10/12/2015
Data Atualização:	03/06/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino, Diego Véras Emerenciano e Thiago Teles da Silva
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	100.000,00
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$	48.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar no Exercício	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total liberado até o exercício	R\$	100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.	A Área de Engenharia encaminhou Memorando à CGAF, em 20/03/2015, solicitando a contratação dos serviços de modernização das subestações elétricas.
7	Relançamento da Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15			0%	Paralisado	A CPL devolveu o processo para a Área de Engenharia, em 15/04/2015, informando que seja aguardada a decisão final sobre que órgão condominial irá realizar esta licitação.	
8	Execução da Obra	A definir	10/08/15	10/12/15	4.503.522,50				0%	A Iniciar		

9	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Véras e empresa de consultoria	10/08/15	10/12/15	60.000,00				0%	A Iniciar		
10	Entrega da obra			10/12/15					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		4.663.522,50	Valor realizado:		100.000,00	26,09%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 65 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Gabinete	Subunidade responsável:	Chefia do Gabinete	
Diretor:	Clésio Oliveira	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO	
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.			
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000			
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL entre 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	484.650,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 484.650,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 484.650,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	29/05/2015

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
--	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00) (642 docs./10.413 imagens)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		

13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaide Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL
15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014	30/06/2014		100%	Concluído	
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros9organização); Realização igual a R\$ 100.00,00
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R\$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/2014	31/08/2014		02/06/2014	28/08/2014		100%	Concluído	
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)	Severino Silva	02/06/2014	30/11/2014		02/12/2014	31/01/2015		100%	Concluído	
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)	Pessoa Jurídica	02/06/2014	30/11/2014						Cancelado	Atividade não executada.
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)	Arabera Tradução Técnicas	02/06/2014	30/11/2014		10/10/2014	30/11/2014		100%	Concluído	
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/2014	15/08/2014		11/08/2014	15/08/2014		100%	Concluído	
23	Finalização (Relatório)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	28/02/2015	30/06/2015					0%	A Iniciar	O relatório final é enviado pela UFPE.
			Valor Previsto:		484.650,00	Valor realizado:		484.650,00	95%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:
2º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 66
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.		Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
Diretoria responsável:	Gabinete	Subunidade responsável:	Chefia do Gabinete	
Diretor:	Clésio Oliveira	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO	
Problema (causa):	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)			
Projeto:	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000			
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	565.700,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 565.700,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 565.700,00

Previsão de Conclusão:	31/07/2016
Data Atualização:	29/05/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
---	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído	Portaria nº 046 de 13/05/2015, pela o qual o Chefe de Gabinete passa a ser o coordenador institucional do Projeto	
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májury Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R\$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	30/05/2016		30/04/2015			20%	Em andamento		
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R\$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májury Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			90%	Em andamento		
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassete e 200 fitas de vídeo (R\$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015					0%	A Iniciar		
9	Pesquisa em jornais (R\$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philipe Pedro, Sergio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			10%	Em andamento		
10	Produção de Artigos (R\$ 24.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			10%	Em andamento		
11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R\$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			10%	Em andamento		
12	Coleta de depoimento na elaboração de documentário (R\$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/07/2015	31/01/2015					0%	A Iniciar		
13	Alimentação e monitoramento do site (R\$ 7.800,00)	Fabricao Silva	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			10%	Em andamento		

14	Produção de Artigos (R\$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	30/09/2015		01/06/2015			5%	Em andamento	
15	Revisão, normatização e diagramação (R\$ 6.000,00)	Não selecionado	01/10/2015	31/12/2015					0%	A Iniciar	
16	Transcrição de depoimentos (R\$ 10.000,00)	Não selecionado	01/08/2015	29/02/2015					0%	A Iniciar	
17	Publicação do livro (R\$ 20.000,00)	Não selecionado	02/01/2016	30/04/2015					0%	A Iniciar	
18	Preservação analógica do acervo textual (R\$ 20.000,00)	Não selecionado	01/07/2015	29/02/2016					0%	A Iniciar	
19	Realização de Ciclos de Debates (R\$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	30/04/2016		01/06/2015			5%	Em Andamento	
20	Assistência administrativa (R\$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016					0%	A Iniciar	
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R\$ 16.000,00)	M2S	01/07/2015	31/05/2016					0%	A Iniciar	
22	Assessoria de comunicação (R\$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016					10%	Em Andamento	
			Valor Previsto:		565.700,00	Valor realizado:		565.700,00	27%	Em Andamento	Status do Projeto

Parcelas institucionais:

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

2º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 67 (ex PO 65)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI.		
Projeto:	Modernização da Infraestrutura da Rede Local		
Objetivo do projeto:	Melhoria da Infraestrutura de TI.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	Rec. Próprios	44	90	1.901.595,61



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 1.901.595,61
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.065.604,20
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.065.604,20
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 835.991,41
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/11/2015
Data Atualização:	11/06/2015

Responsáv(e)l(e)is técnico(s) pelo Projeto	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.	01/10/14	28/11/14	-	22/09/14	13/11/14	100%	Concluído			
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/12/14	29/08/14	-	14/11/14	Não informado	100%	Concluído			
3	Contratação da 1a etapa	Setor de Licitação	11/06/15	30/06/15	-	11/06/15	-	10%	Em Andamento			
4	Realização do serviço da 1a. etapa.	Fornecedor	01/07/15	30/09/15	1.065.604,20	-	-	0%	A Iniciar			
5	Contratação da 2a etapa	Setor de Licitação	03/08/15	31/08/15	-	-	-	0%	A Iniciar			
6	Realização do serviço da 2a. etapa.	Fornecedor	01/09/15	30/11/15	835.991,41	-	-	0%	A Iniciar			
Valor Previsto:					1.901.595,61	Valor realizado:			0,00	61%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2015
Considerando as restrições orçamentárias, a etapa de contratação foi dividida em duas, assim como a etapa de realização.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 68 (ex PO 66)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88



Previsão de Conclusão:	30/12/2015
Data Atualização:	11/06/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 272.909,00
A realizar no exercício	R\$ 340.953,88
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 35.043,28
Saldo a liberar	R\$ 305.910,60
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 307.952,28

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	01/04/15	30/10/15	35.043,28	06/04/15		35.043,28	5%	Em Andamento		
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	02/11/15	30/12/15	305.910,60				0%	A Iniciar	Recursos da SUDENE	
			Valor Previsto:		613.862,88	Valor realizado:		307.952,28	76%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Ministério da Integração Nacional e SUDAM

Observações:
2º Ciclo 2015
Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento e implantação do sistema. Os recursos para manutenção correrão à conta de orçamentos ainda a serem definidos, após a implantação do sistema.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	ORÇAMENTO APROVADO	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes	
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	26.198.061,00	15.678.836,00	4.104.113,27	59,85	26,18	-	-	-	-	-		
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	600.000,00	400.000,00	181.308,20	66,67	45,33	Servidor capacitado	199		0,00			
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	131.488,59	100,00	22,83	Pessoa beneficiada	228		0,00			
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00			
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	31.680,00	31.680,00	3.907,20	100,00	12,33	Criança atendida	50		0,00			
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	50.698,30	100,00	21,12	Servidor beneficiado	51		0,00			
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.075.416,00	1.075.416,00	432.663,04	100,00	40,23	Servidor beneficiado	184		0,00			
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	21.204,00	21.204,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado						
04	122	2111	09HB	A	1	3.748.455,00	3.748.455,00	1.423.658,82	100,00	-	-	-	-	-	-		
04	122	2111	20TP	A	1	25.750.455,00	25.750.455,00	10.755.709,52	100,00	-	-	-	-	-	-		
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	58.297.371,00	47.578.146,00	17.083.546,94	81,61	35,91	-	-	-	-		
09	272	0089	0181	OP	1	2.138.123,00	2.138.123,00	805.202,29	100,00	37,66	-	-	-	-	-		
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	2.138.123,00	2.138.123,00	805.202,29	100,00	37,66	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	1.100.000,00	800.000,00	0,00	72,73	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00			
19	573	2029	8340	A	1	1.211.233,00	253.000,00	0,00	20,89	0,00	Rede implantada	7		0,00			
04	127	2029	8689	A	1	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00			
19	691	2029	8902/0020	A	1	1.000.000,00	541.010,00	0,00	54,10	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00			
04	128	2029	8917/0020	A	1	532.475,00	532.475,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00			
04	128	2029	8917/7002	A	1	900.000,00		0,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada						
04	128	2029	8917/7004	A	1	100.000,00		0,00	não inf.	não inf.	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00			
15	244	2029	20N7	A	1	1.000.000,00	600.000,00	0,00	60,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00			
15	244	2029	20N9	A	1			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Organização apoiada	4	0	0,00			
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1			0,00	#DIV/0!	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-		
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	2.964.293,00	1.612.316,00	565.700,00	54,39	35,09	Plano Elaborado			não inf.			
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa Implementada	4					
15	244	2029	7K66/71243	A	1	800.000,00		0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado						
15	244	2029	7K66/71243	A	1	262.300,00		0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado						
15	244	2029	7K66/71244	A	1	800.000,00		0,00	0,00								
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	11.535.301,00	5.203.801,00	565.700,00	45,11	10,87						
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-		
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-		
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-		

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 10/06/2015 - SIAFI

2º Ciclo 2015 - Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III
Projetos tabulados segundo Diretrizes
e Objetivos Estratégicos da SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Atrasado	R\$ 694.459,19	R\$ 694.459,19	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 1.352.840,00	14%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 255.723,17	53%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
10	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 221.000,00	29%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estratégico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 410.203,62	R\$ 0,00	0%
12	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
13	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
14	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
15	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
16	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
17	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.277.000,00	64%
18	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

19	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
20	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.312.925.388,15	67%
21	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
22	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.376.481,00	R\$ 0,00	0%
23	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
24	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
25	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
26	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
27	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
28	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
29	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 57.321.606,84	89%
30	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
31	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
32	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
33	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%
34	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatéc Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%

35	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
36	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
37	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 197.811.049,39	65%
38	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
39	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 13.862.197,00	58%
40	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
41	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
42	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
43	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
44	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suaepe S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
45	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlantico Saneamento S/A)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 70.152.822,60	17%
46	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo 1.1								9.295.649.374,28	5.606.665.326,05	60%
47	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
48	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Diagnostico do NE, elaboração de cenários e proposição de objetivos para o PPA	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo 1.4								0,00	0,00	0%
49	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
Total do Objetivo 1.5								234.105,49	139.865,15	60%
TOTAL DA DIRETRIZ 1								9.295.883.479,77	5.606.805.191,20	60%
50	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
51	17	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 835.823,47	R\$ 0,00	0%

Total do Objetivo 2.3							1.366.305,97	265.241,25	19%	
52	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
53	20	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 350.978,27	R\$ 350.978,27	100%
Total do Objetivo 2.4							579.775,48	518.977,88	90%	
TOTAL DA DIRETRIZ 2							1.946.081,45	784.219,13	40%	
54	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 26.600,00	R\$ 1.600,00	6%
57	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	-
58	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	50%
Total do Objetivo 3.1							61.600,00	6.600,00	11%	
59	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
60	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
61	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 1.901.595,61	R\$ 0,00	-
62	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 307.952,28	50%
Total do Objetivo 3.2							3.565.808,49	1.358.302,28	38%	
63	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 2.630.114,65	35%
64	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 9.673.041,23	R\$ 5.981.382,54	62%
65	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 4.663.522,50	R\$ 100.000,00	2%
Total do Objetivo 3.3							21.890.206,62	8.711.497,19	40%	
66	22	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
67	27	3. Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
68	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	-	-	-
Total da Medida Institucional Normativa							0,00	0,00	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 3							25.517.615,11	10.076.399,47	39%	
TOTAL GERAL							9.323.347.176,33	5.617.665.809,80	60,3	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 2º Ciclo 2015

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 18/06/2015

ANEXO IV
Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA 2012-2015

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado(b)	(b/a) (%)
1	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.312.925.388,15	67%
3	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.376.481,00	R\$ 0,00	0%
5	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
7	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 57.321.606,84	89%
12	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
13	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
14	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%
16	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%

17	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 197.811.049,39	65%
20	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
21	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 13.862.197,00	58%
22	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
27	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 70.152.822,60	17%
28	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	
P 2029 - Ação 0355								9.274.269.585,54	5.596.768.179,68	60%
29	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semárido Paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
30	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 221.000,00	29%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	427.151,42	38%
31	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
32	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
P 2029 - Ação 4640								2.252.988,40	1.509.738,40	67%

33	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
34	17	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 835.823,47	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 8689								1.366.305,97	265.241,25	19%
35	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
36	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
37	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
38	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 1.352.840,00	14%
39	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 255.723,17	53%
40	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
41	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal do Município de Piranhas/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
42	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
P 2029 - Ação 8902								13.827.098,71	4.914.291,81	36%
43	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
44	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estratégico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 410.203,62	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 8917								617.746,24	107.354,71	17%
45	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
46	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.277.000,00	64%
P 2029 - Ação 8340								2.857.015,99	2.134.015,99	75%
47	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Atrasado	R\$ 694.459,19	R\$ 694.459,19	100%
P 2029 - Ação 8918								694.459,19	694.459,19	100%
48	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
P 2029 - Ação 7K66								250.000,00	250.000,00	100%
Total do Programa 2029								9.297.249.785,74	5.607.070.432,45	60%
49	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
50	20	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 350.978,27	R\$ 350.978,27	100%
P 2040 - Ação 8172								579.775,48	518.977,88	90%
Total do Programa 2040								579.775,48	518.977,88	90%

51	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
52	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
53	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 26.600,00	R\$ 1.600,00	6%	
54	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%	
55	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	50%	
56	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 2.630.114,65	35%	
57	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 9.673.041,23	R\$ 5.981.382,54	62%	
58	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 4.663.522,50	R\$ 100.000,00	2%	
59	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%	
60	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%	
61	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 1.901.595,61	R\$ 0,00	0%	
62	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 307.952,28	0%	
P 2111 - Ação 2000									25.517.615,11	10.076.399,47	39%
Total do Programa 2111									25.517.615,11	10.076.399,47	39%
63	22	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
64	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4 Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
65	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4 Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Diagnóstico do NE, elaboração de cenários e proposição de objetivos para o PPA	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
66	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Crítérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
67	27	3. Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
68	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	-	-		
Total das Ações Internas da CGEP/DPLAN								0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL								9.323.347.176,33	5.617.665.809,80	60,3	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 2º Ciclo 2015

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 18/06/2015
