



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Indicadores do Monitoramento e Controle  
da Programação  
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

**3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação  
2016**

**Recife  
28 de setembro de 2016**

## Sumário

	Pág.
Introdução .....	3
1 – Resultados do monitoramento .....	5
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) .....	9
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais .....	23
4 – Indicadores de Gestão de Convênios .....	31
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos .....	43
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos .....	47
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) - Resultado out/15 - ago/16	50
8 – Observações e Deliberações em plenária de 28/09/2016 .....	52
9 – Conclusão .....	55
Anexo I – Quadros do monitoramento .....	56
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira 2016 (posição até agosto) .....	208
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE .....	210
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA .....	217

## Introdução

No dia 28 de setembro foi realizada a reunião do 3º ciclo de monitoramento, oportunidade na qual as unidades internas puderam apresentar a evolução dos seus projetos. Esta foi também a primeira reunião do atual Superintendente, Marcelo José Almeida das Neves, que assumiu a Autarquia em julho deste ano.

Da reunião também participaram os Diretores de Administração, Eugênio Pacelli e de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, Ricardo Barros. Além da alta administração outros 26 servidores também estiveram presentes, entre gestores e técnicos.

Na reunião, além de uma rápida introdução sobre a metodologia aplicada ao processo, incluindo os objetivos da reunião, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional, gestora do trabalho, ressaltou a importância do momento para que a alta administração possa compartilhar os resultados dos últimos encaminhamentos. Aproveitando o contexto, o Superintendente fez um relato de sua visita a Brasília, da repercussão extremamente positiva da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE realizada no dia 22/09 no Instituto Ricardo Brennand, aqui em Recife, registrando ainda, o interesse do Ministro da Defesa, Raul Jungmann de participar da próxima reunião, do Ministro Moreira Franco, da Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, além dos elogios proferidos pelo Ministro da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho sobre a organização e objetividade da reunião do CONDEL.

Foram, neste ciclo, trabalhados 78 projetos, dos quais 19 concluídos, 42 em andamento, 4 cancelados, 3 paralisados e 10 em atraso por diversas razões, a maioria provocada pelas restrições orçamentárias que limitaram as vistorias dos convênios e que estão repercutindo na conclusão, além de casos nos quais o convenente, por motivos diversos, não conseguiu cumprir os prazos estipulados no seu plano de trabalho.

Semelhantemente aos ciclos anteriores, os referenciais adotados são os do Ministério da Integração Nacional, do planejamento estratégico interno e o do Plano Plurianual do Governo Federal (PPA).

A foto adiante ilustra as palavras iniciais do Superintendente Marcelo José Almeida das Neves, na abertura dos trabalhos.



Foto 1: Abertura do 3º ciclo de monitoramento

A foto adiante mostra uma panorâmica do encontro.



Foto 2: Gestores e técnicos que participaram do evento

Momento em que o Superintendente destacava a importância da reunião para o compartilhamento, inclusive, dos assuntos de sua agenda.



Foto 3: Momento em que o Superintendente destacava os resultados da atual administração e o reconhecimento sobre o esforço do quadro interno no sentido de recuperar o prestígio da Autarquia.

Outrossim, o monitoramento oferece cinco vertentes à alta administração do órgão: a) possibilitar ao Diretor da unidade, e ao gestor direto daquele projeto monitorado, a adoção de medidas preventivas sobre projetos que venham apresentando sistemáticos problemas de execução e assim minimizar ou eliminar os riscos para a sua efetividade; b) antecipar, a unidades como a de execução orçamentária, a adoção de medidas relacionadas com a rotina da execução orçamentária e financeira; c) a adoção, pela Diretoria Colegiada, de medidas corretivas, administrativas ou operacionais; d) o acompanhamento da execução da pauta estratégica da SUDENE; e e) o acompanhamento da execução à luz dos chamados eixos estratégicos do Ministério da Integração Nacional, cujo planejamento interno já se encontra compatibilizado ao do MI.

Quanto ao conteúdo, neste relatório constam, além de gráficos e tabelas sobre o status dos 78 projetos e recursos desembolsados até 31 de agosto, 31 indicadores que abrangem a gestão dos convênios, das carteiras do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e dos incentivos fiscais, além da gestão de pessoas, da melhoria da infraestrutura predial, da execução orçamentária e os resultados parciais da avaliação de desempenho institucional. Ao final constam os planos operativos pormenorizados dos 78 projetos monitorados, além de anexos que resumem a condição desses projetos segundo as diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE e a programação do PPA em curso.

## 1- Resultados do monitoramento

### 1.1- Resultados Gerenciais do 3º Ciclo de Monitoramento 2016

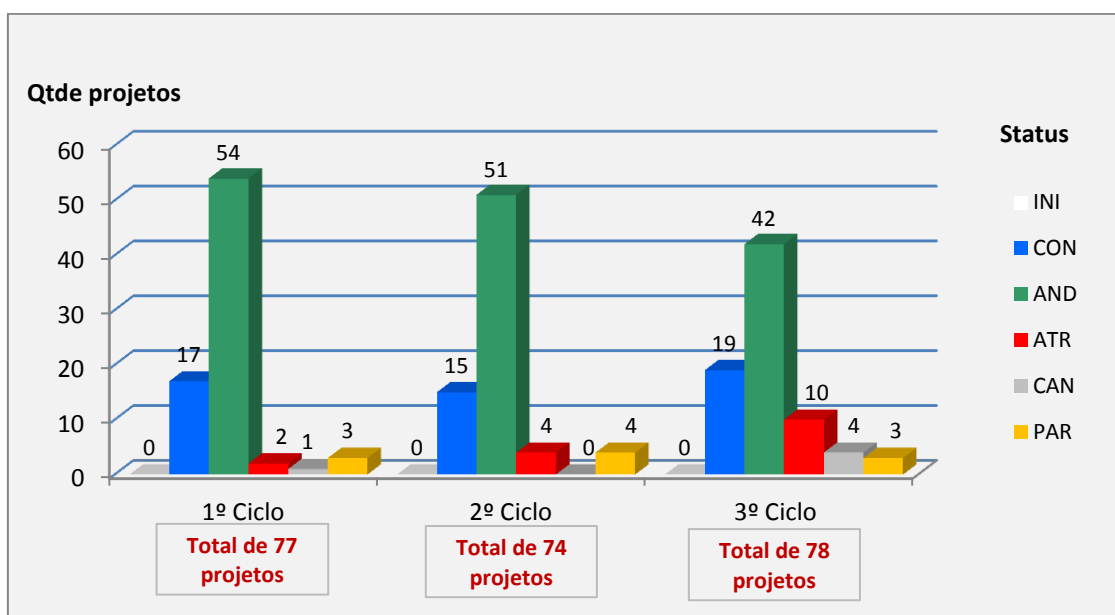


Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2016

O Gráfico acima espelha os resultados entre o 1º, o 2º e o 3º ciclos de monitoramento, com destaque para um discreto aumento na quantidade de projetos em atraso e o aumento de projetos que foram concluídos.

A Tabela 1 adiante, detalha a distribuição dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, os recursos previstos e liberados e o status desses projetos segundo a programação estratégica vigente.

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico <sup>1</sup>	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status <sup>2</sup>						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	58	9.972.601,23	6.515.626,57		17	30	7	4		58
	1.4	1	0,00	0,00		1					1
	1.5	1	234,11	139,87				1			1
<b>Sub-Total</b>		<b>60</b>	<b>9.972.835,34</b>	<b>6.515.766,43</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
2	2.2	1	43.290,00	17.238,00			1				1
	2.3	3	1.825,31	1.182,39			2			1	3
	2.4	1	228,80	168,00						1	1
<b>Sub-Total</b>		<b>5</b>	<b>45.344,10</b>	<b>18.588,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
3	3.1	7	60,41	46,05		1	5	1			7
	3.2	2	1.179,56	1.027,54			1	1			2
	3.3	3	21.453,29	9.895,98			2			1	3
<b>Sub-Total</b>		<b>12</b>	<b>22.693,27</b>	<b>10.969,58</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
4	4.1	1	0,00	0,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>10.040.872,71</b>	<b>6.545.324,40</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

**Convenções:**

1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e MIN – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Referência:** 31/08/2016 (3º Ciclo de monitoramento-2016)

A alta quantia de recursos envolvida no Objetivo Estratégico 1.1 “Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores”, decorre do portfólio de projetos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Sobre os marcos estratégicos, eles são os mesmos do ciclo anterior.



**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Programa do PPA <sup>1</sup> (Código)	Ação do PPA <sup>1</sup> (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	36	9.951.843,83	6.505.933,39		13	16	4	3		36
	20N7	3	1.649,00	417,15			2		1		3
	20WQ	3	1.814,70	1.814,70			2	1			3
	4640	1	1.069,87	326,62			1				1
	8689	3	1.825,31	1.182,39			2			1	3
	8902	9	12.684,07	3.600,90		1	6	2			9
	8917	1	207,54	107,35			1				1
	8340	3	3.882,02	3.882,02		1	1	1			3
	7K66	1	250,00	250,00				1			1
<b>Sub-Total</b>		<b>60</b>	<b>9.975.226,34</b>	<b>6.517.514,52</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>60</b>
2040	8172	1	228,80	168,00						1	1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>228,80</b>	<b>168,00</b>						<b>1</b>	<b>1</b>
2111	2000	10	22.127,15	10.373,60		1	8			1	10
<b>Sub-Total</b>		<b>10</b>	<b>22.127,15</b>	<b>10.373,60</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
2069	-	1	43.290,00	17.238,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>43.290,00</b>	<b>17.238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ações Internas		6	0,00	0,00		3	2	1			6
<b>Sub-Total</b>		<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>10.040.872,71</b>	<b>6.545.324,40</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Convenções:**

1- Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ – Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.


2- INI - A iniciar; CON- Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


**Referência:** 31/08/2016 (3º Ciclo de monitoramento-2016)

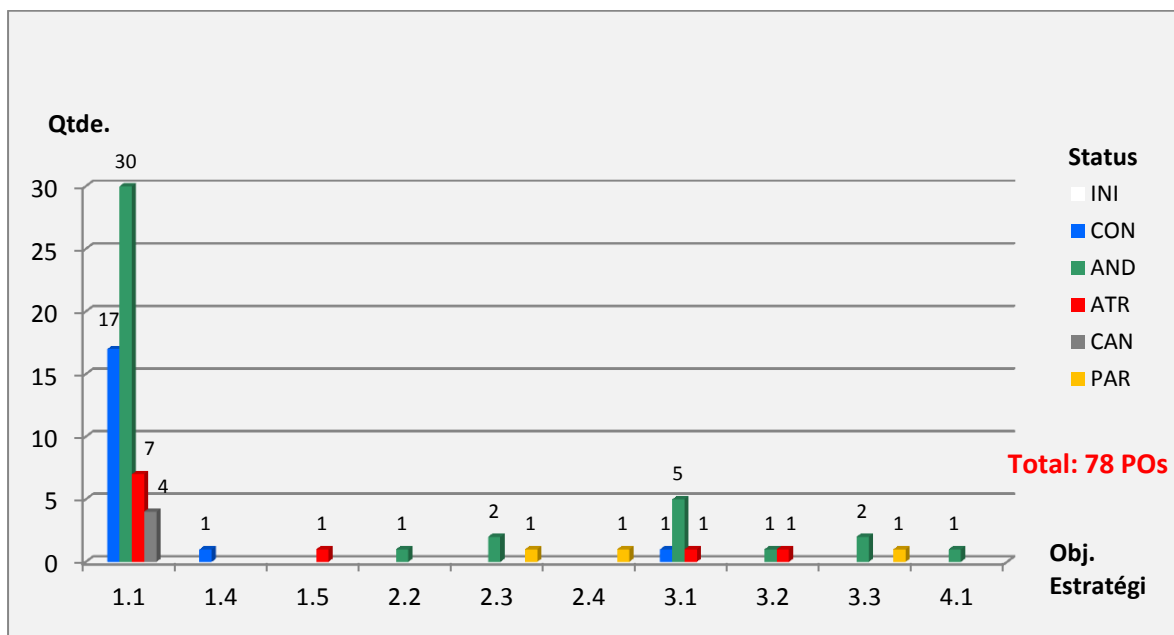

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

**Convenções: Obj. Estratégicos: 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.


**Gráfico 2** – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2016)

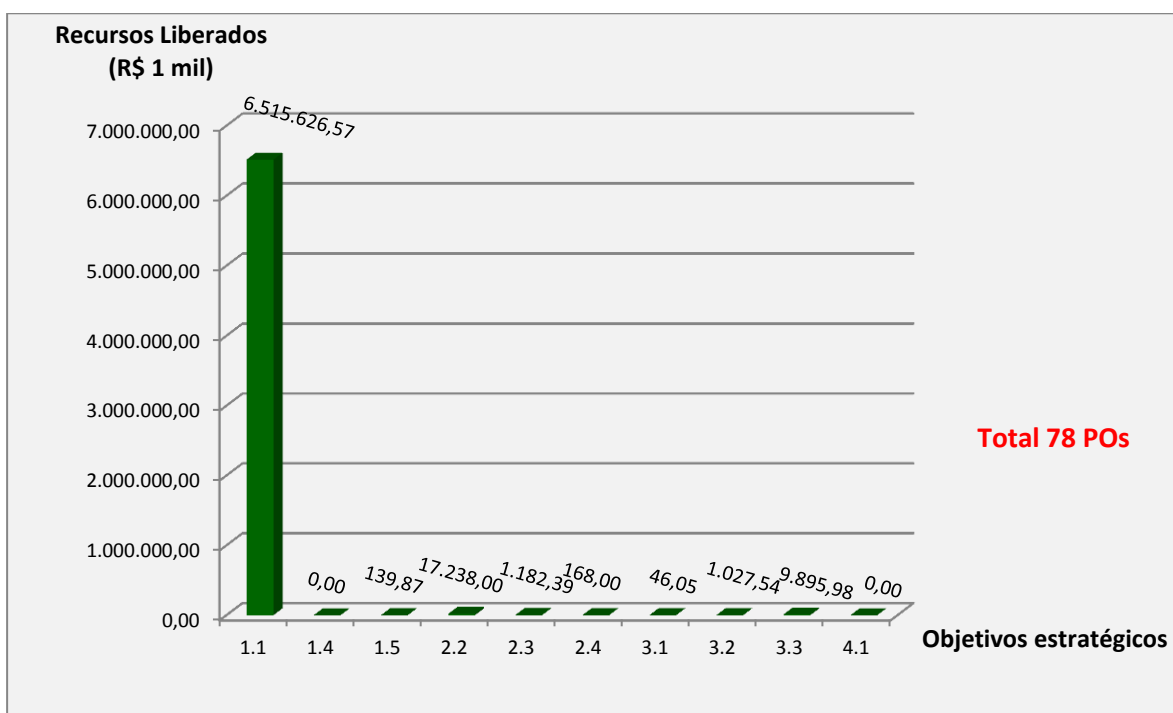

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Gráfico 3** – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º ciclo 2016)



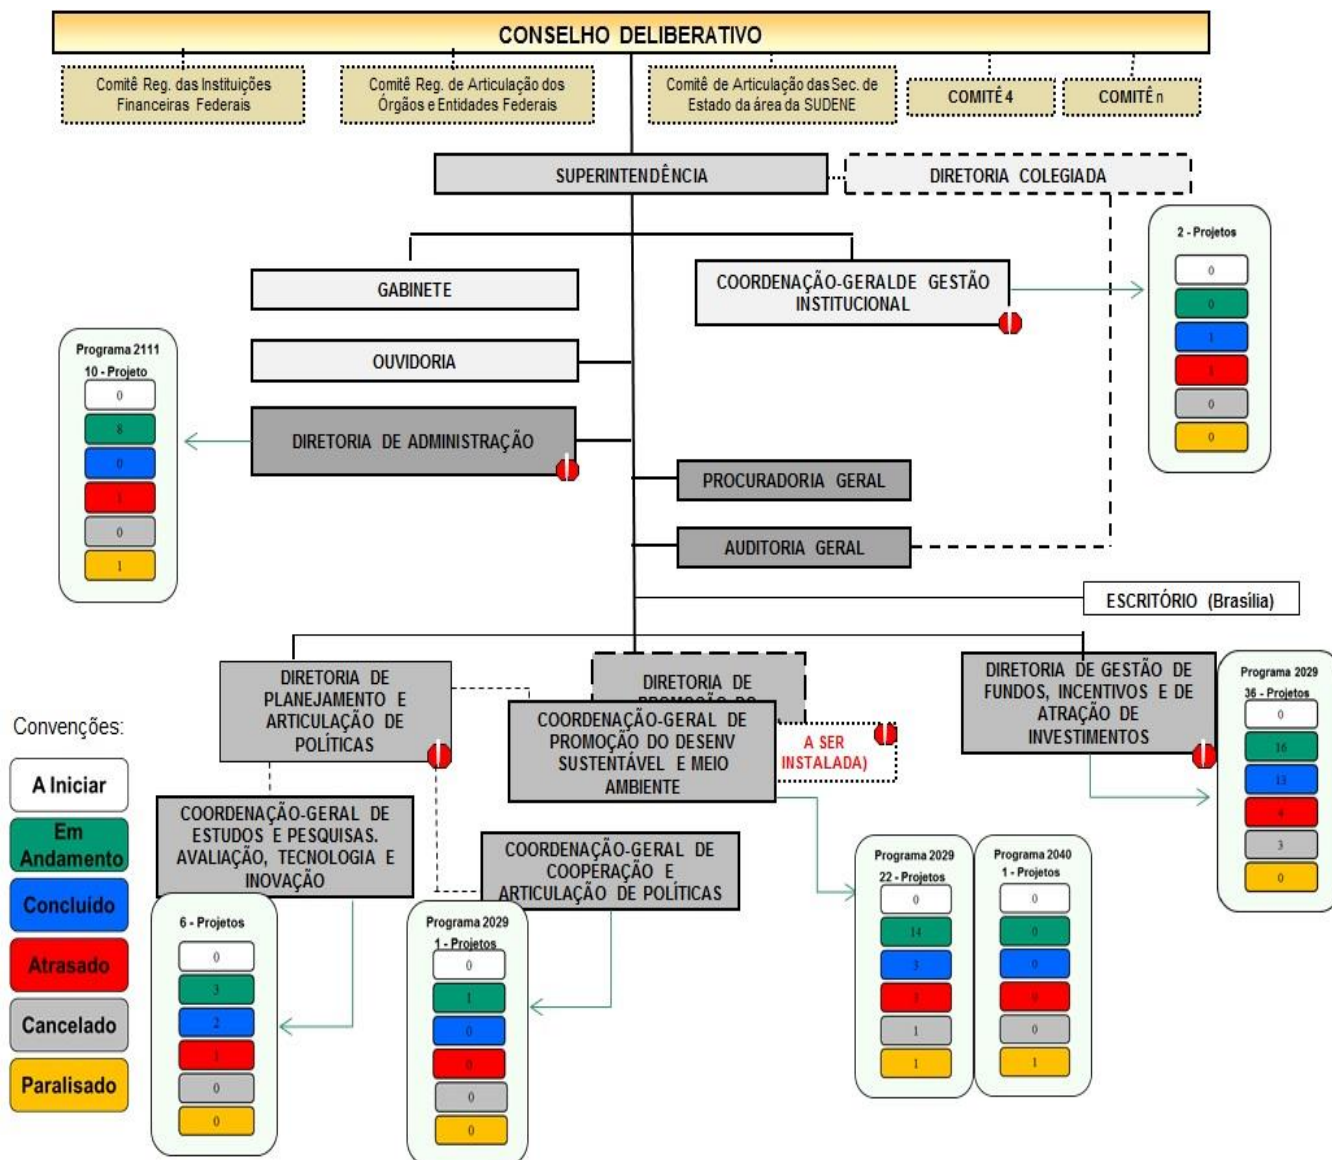

**Diagrama 1 - Distribuição dos 78 Planos Operativos Conforme a Estrutura da SUDENE**

**2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)**

**2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)**

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{9 \times 100}{9} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: Não foi informado

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica

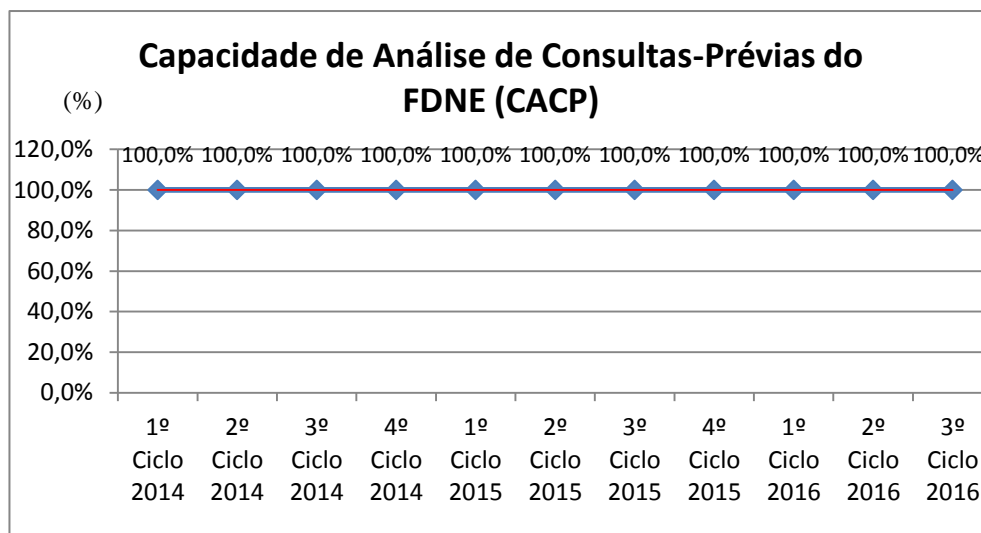

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**Nota:**

<sup>1</sup> até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

## 2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{9}{6} = 1,5 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: -

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análises/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,4 análises/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	3,57 análises/técnico	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,43 análises/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	1,67 análises/técnico	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	4,5 análises/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	5,7 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,33 análises/técnico	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

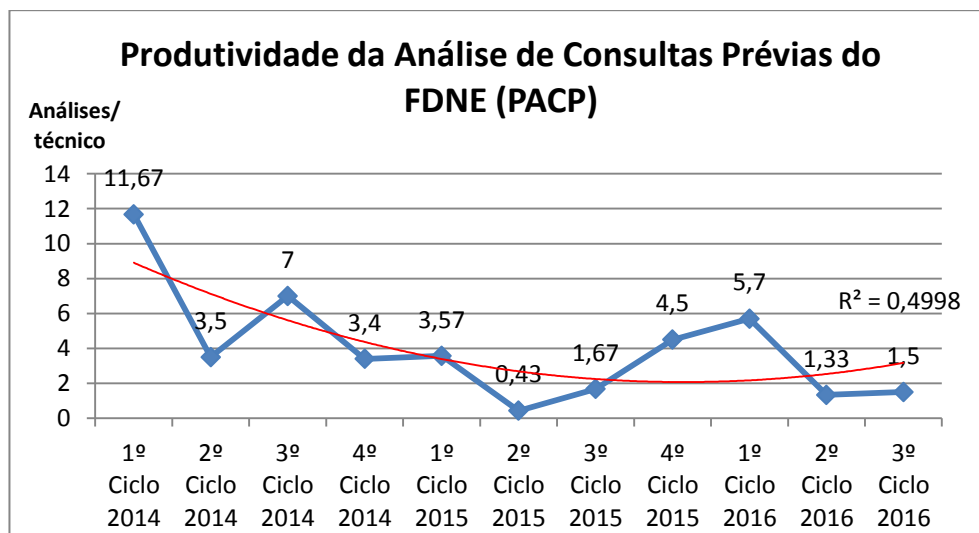

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


A tendência de melhoria da produtividade na análise de consultas-prévias, representada pela linha vermelha do gráfico, é consequência não apenas do aumento do número de técnicos no setor, em que pese o papel exercido pelo agente bancário operador nesse processo, mas também da redução da demanda em determinados períodos, consequência, em parte, do recuo da classe empresarial diante da retração da economia que ainda se manteve em 2016, da perda de poder aquisitivo da população que freou o consumo e consequentemente a produção, e do encarecimento do custo do crédito. Portanto, nesse momento, é um resultado que precisa ser considerado com cuidado.

### 2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{5 \times 100}{9} = 55,5\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	63%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	62,5%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

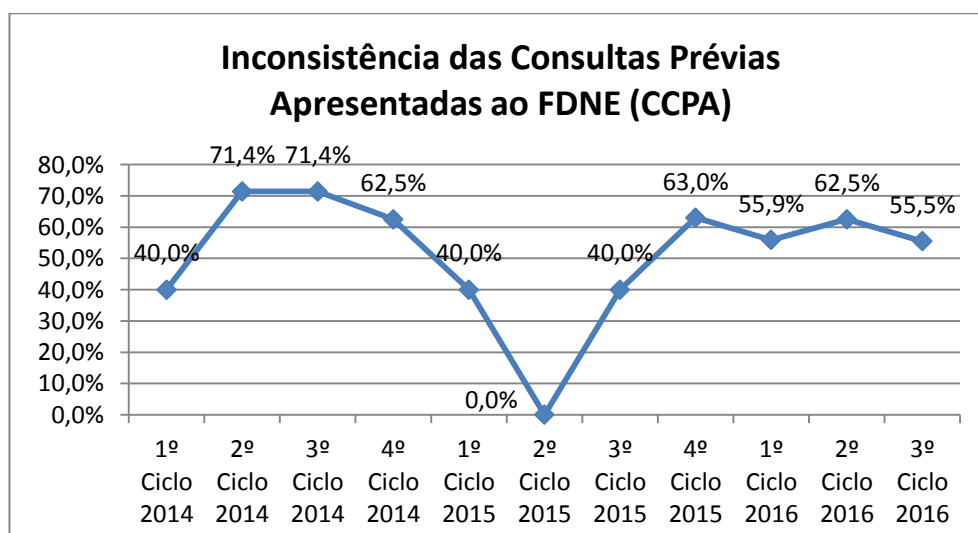

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

<sup>1</sup> Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

Atenção: A partir deste 4º ciclo o título do indicador passou a se chamar “Inconsistência das Consultas Prévias apresentadas ao FDNE (CCPA)” por adequar-se mais apropriadamente ao resultado apresentado.

## 2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

### a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{133,6 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,48$

### a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ..... (igual ou menor que 1 (um))

e) Periodicidade: Jan-agosto/2016


f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015


Jan a Maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0,00; BB 1,22; CEF 0,00	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

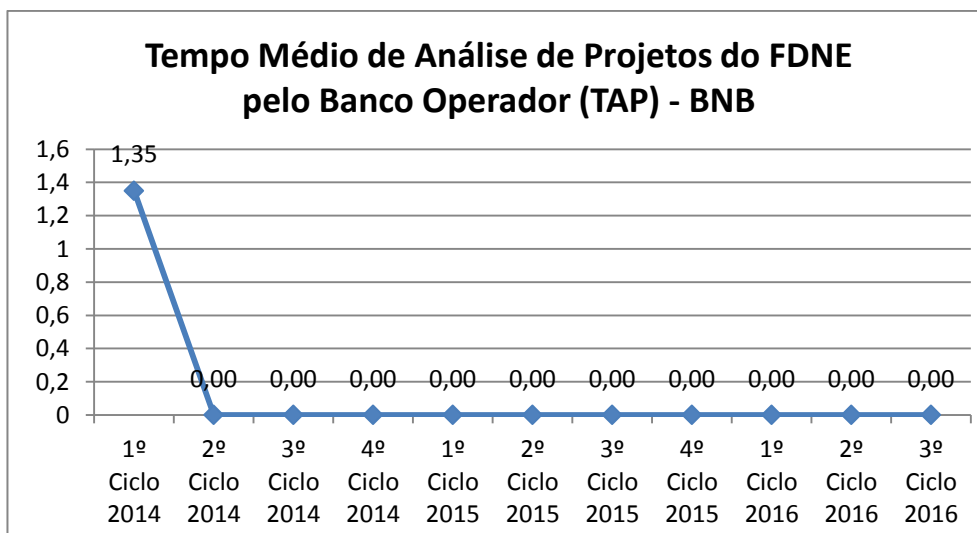

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

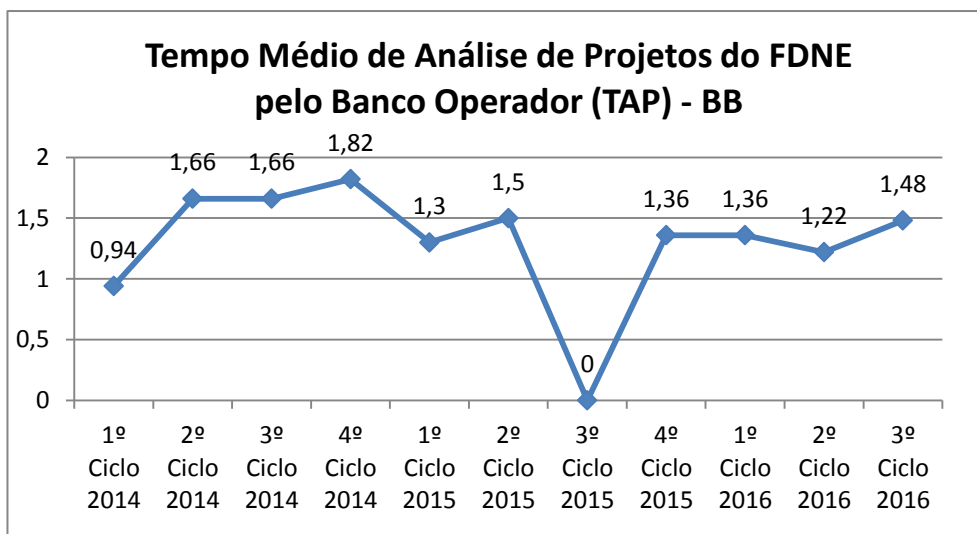

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado



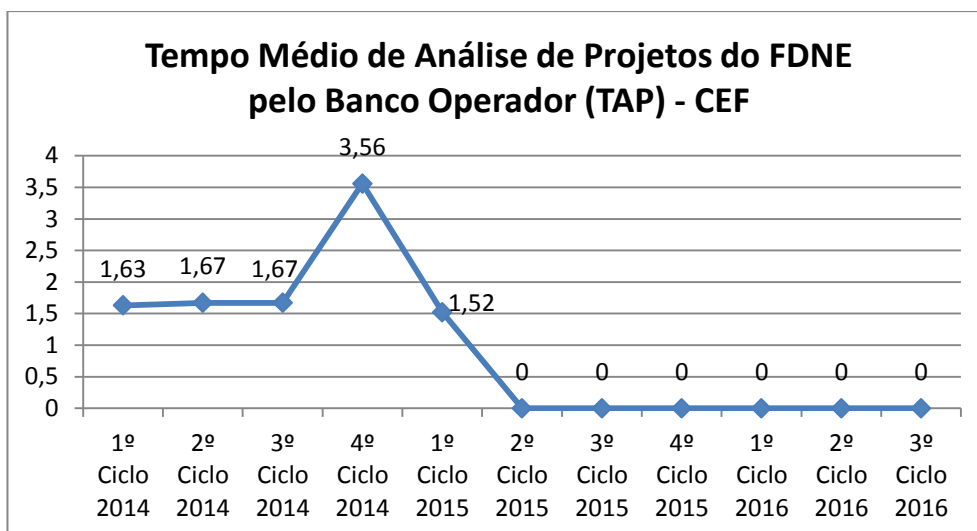

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### Notas

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

## 2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

### a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{2 \times 100}{5} = 40\%$$

**Observação:** um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.

### a.3) Caixa Econômica Federal – CEF


$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016


- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 % ; BB 0,00 % ; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 % ; BB 0,00 % ; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	2º ciclo 2016


- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

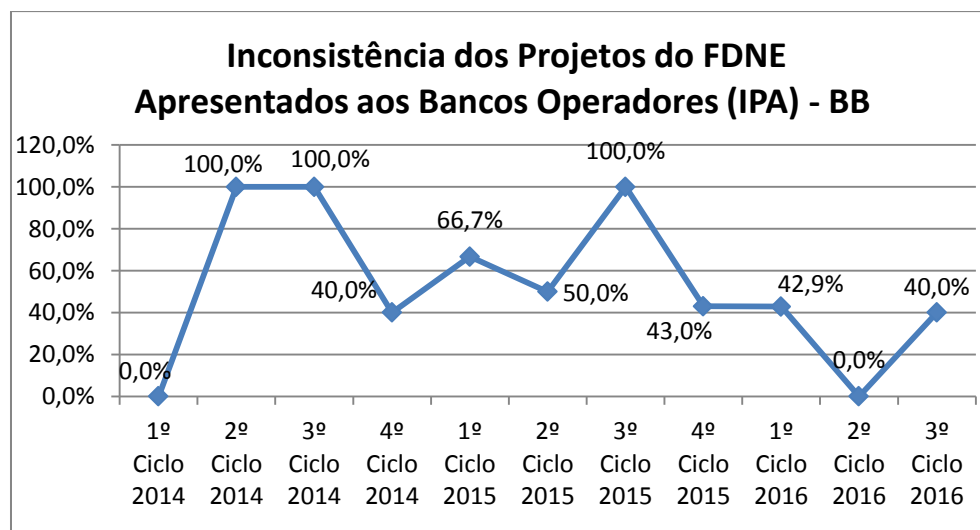

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

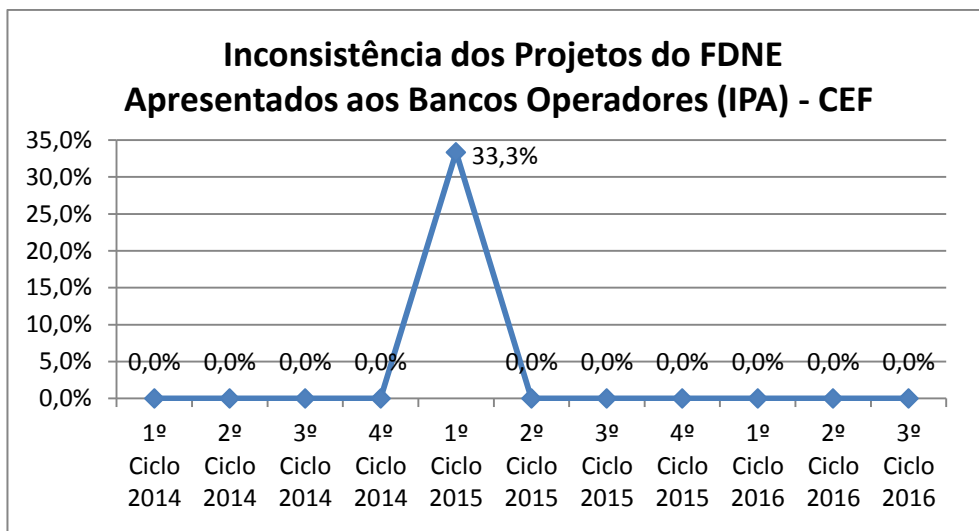

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

## 2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Valor empenhado LOA 2016} \times 100}{\text{Dotação LOA 2016}} = \frac{0,00}{1.895.911.874,00} \times 100 = 0,00\%$$

b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	19,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

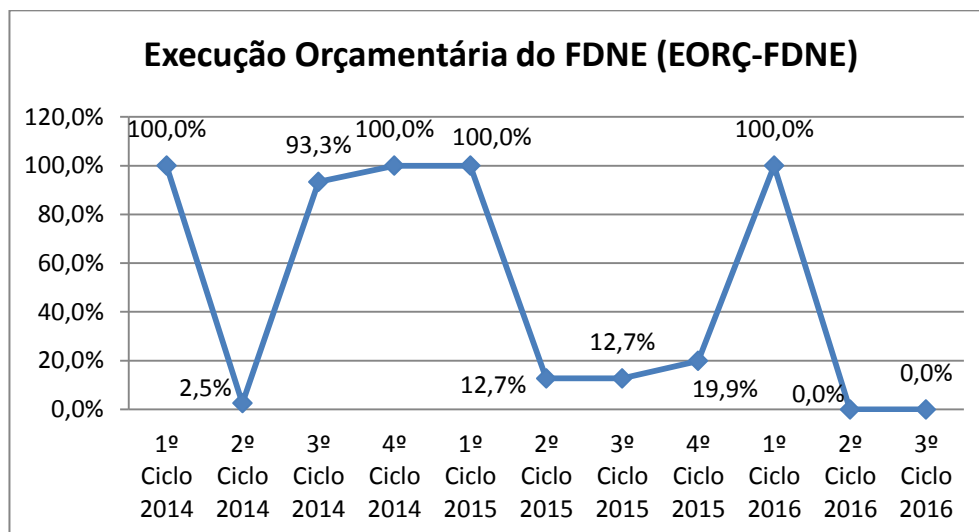

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado


## 2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{325.537.177,06 \times 100}{2.974.359.901,00} = 10,9\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan-agosto/2016
- f) Comentários Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão. Houve cancelamento de empenhos no valor de R\$ 2.009.480.263,88.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	17,74%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	5,70%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

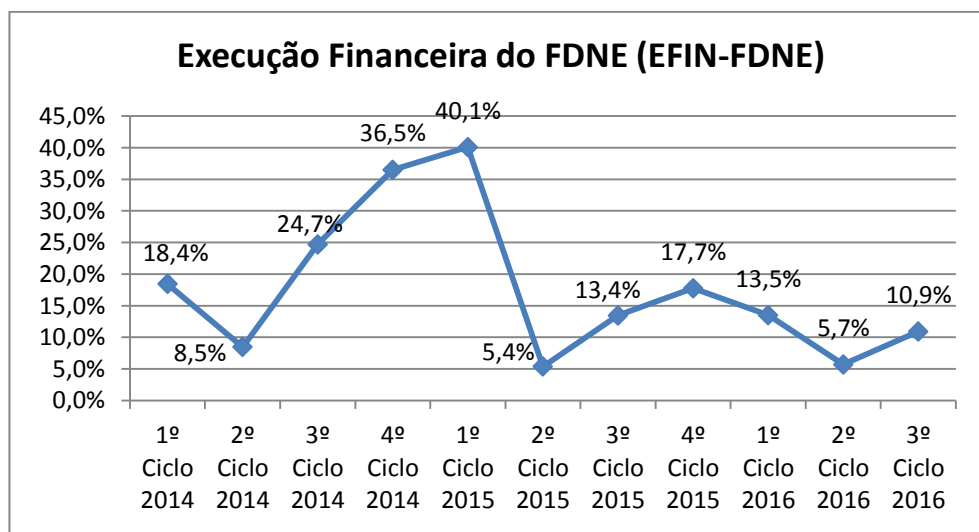

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

## 2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula:  $\frac{M_1}{30 \text{ dias}} = \frac{27}{30} = 0,9$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0,58	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

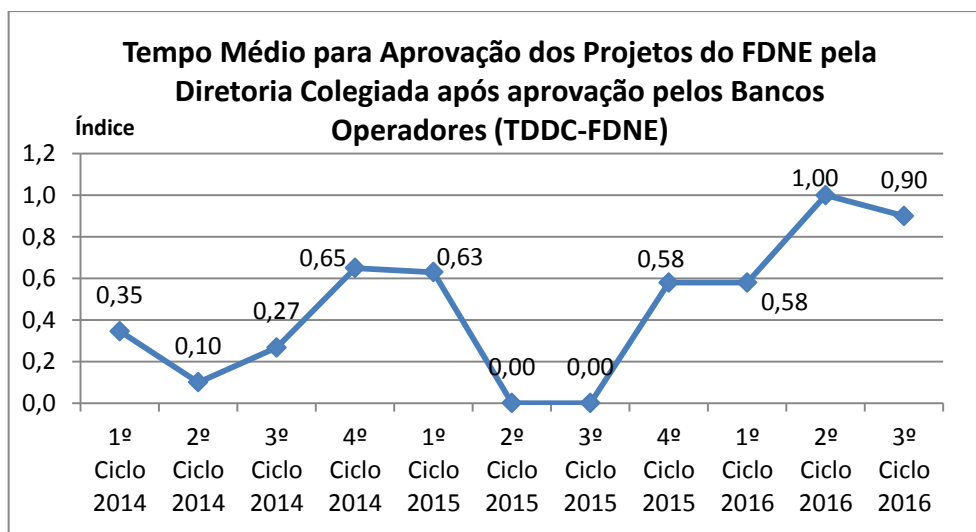

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### Convenção:

**M<sub>1</sub>** – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

### Nota:

<sup>1</sup> 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.



## 2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula:  $T_m = \frac{T}{N} = \frac{1609}{5} = 321,8$  dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	295,34 dias	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	373 dias	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

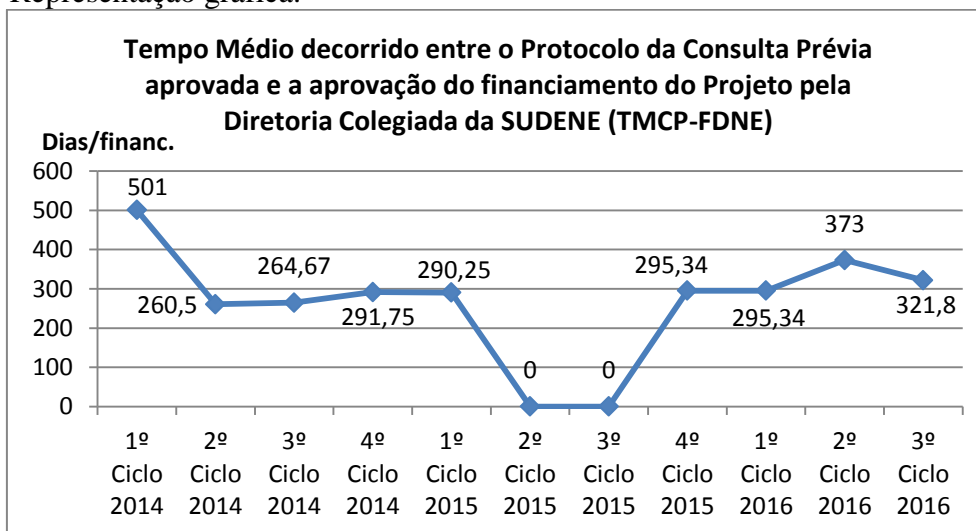

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

**Notas:**


- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

**2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)**

- a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{5}{5} = 1,00$$
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	1,0	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

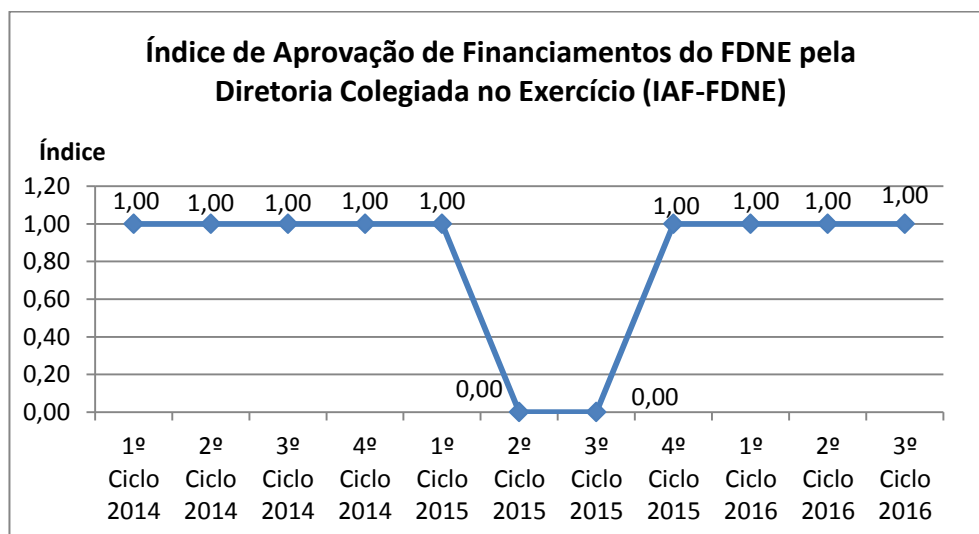

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

**Nota:** resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

### 3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

#### 3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: 
$$T_1 = \frac{7.263 \text{ dias}}{95 \text{ pleitos}} = 76,4 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2016 e encerrado em 31 de agosto de 2016, foram **vistoriados 95 estabelecimentos dos 101 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 76,4 dias**.

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 293 dias (DASA – Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés). O prazo mínimo, de 17 dias, foi observado no processo de interesse da empresa Fipel Frigorífico Industrial Pernambucano Ltda.

O maior número de vistorias (30) situou-se entre 31 e 60 dias de espera. Também foi significativo o número de vistorias realizadas entre 61 e 90 dias (26 vistorias) da data da protocolização.

Prazo em dias	Número de vistorias 1/1/15 a 31/8/15	Número de vistorias 1/1/16 a 31/8/16
Até 30 dias	10	10
De 31 a 60 dias	16	30
De 61 a 90 dias	23	26
De 91 a 120 dias	22	12
De 121 a 150 dias	4	11
De 151 dias a 180 dias	0	4
De 181 a 210 dias	0	1
Acima de 210 dias	0	1
	75	95

Por conta disso é que dos 29 pleitos ingressados em 2015, apenas 3 foram vistoriados naquele ano. Os demais 26 somente foram vistoriados em 2016 e a partir do mês de março, quando normalmente são reiniciadas as viagens.

Convenções:


$T_1 = \Sigma$  do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	72,9 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	73,7 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	92,30 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	78,5 dias/pleito	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

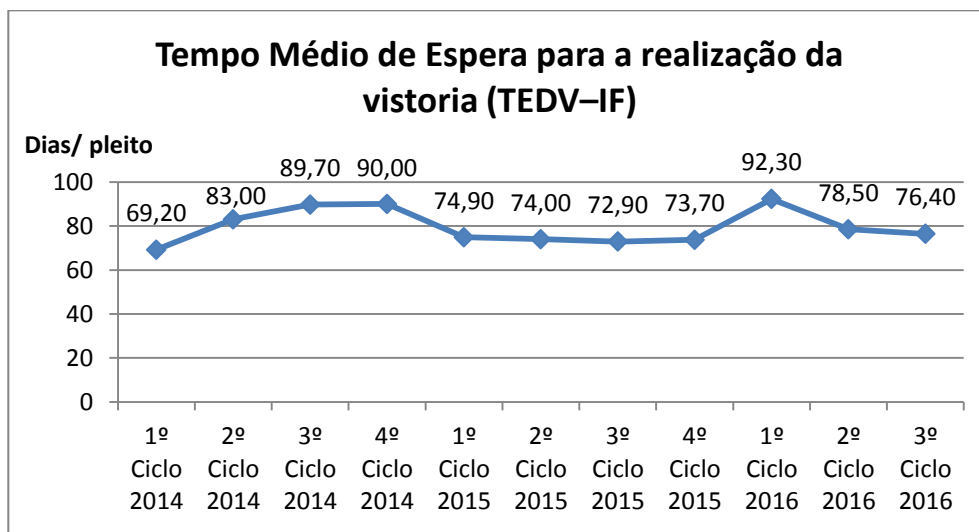

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

$T_1 = \Sigma$  do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

### 3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF\_UF-IF)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = 0,00\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-agosto/2016


f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014

Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0,00%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

### 3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$\frac{133 \times 100}{188} = 70,7 \%$$


- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vitorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais



- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: no período, foram concluídas 133 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 70,7% dos pleitos ingressados.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	60,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	55,9%	2º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

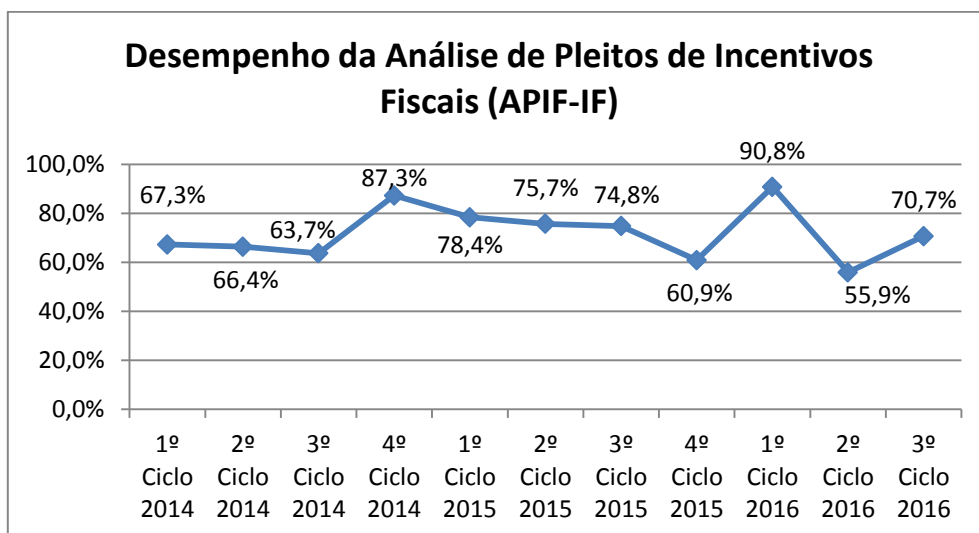

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### 3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:  $T1 = \frac{12.415}{133} = 93,3$  dias/pleito
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.

e) Periodicidade: Jan-agosto/2016


f) Comentários: o prazo médio observado, de **93,3 dias** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros oito meses de 2016 (133). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 100,44 dias e de 70,9 dias para os processos de reinvestimento.

Não foi considerado no cálculo do prazo o tempo médio gasto com os processos de transferência de titularidade uma vez que esses processos já foram examinados e aprovados anteriormente, quando do pedido inicial.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	94,05 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	99,5 dias/pleito	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

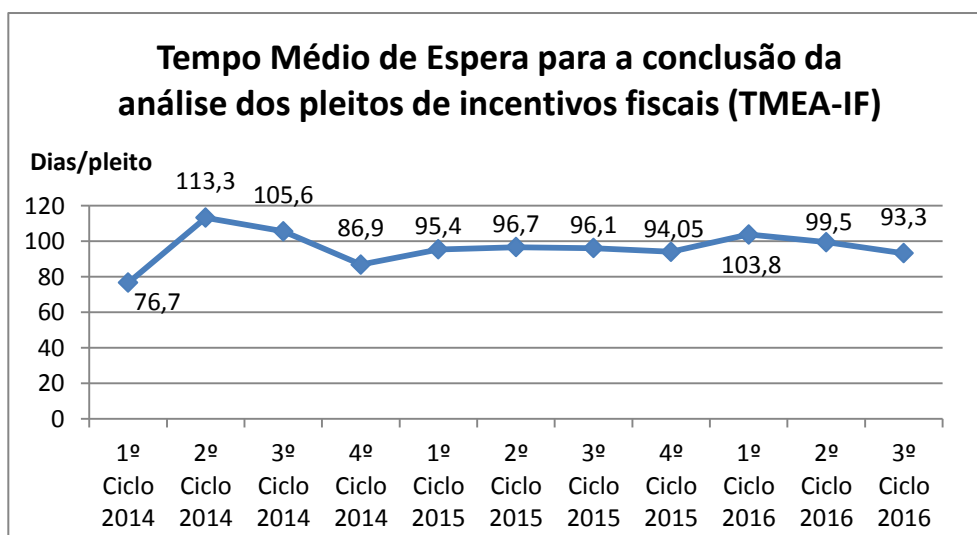

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 =  $\Sigma$  do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.


N = número de processos protocolados no período examinado.

### 3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de análises realizadas no período}}{\text{n}^\circ \text{ de técnicos}} = \frac{133}{21} = 6,3$  análises por técnico
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: o número observado, de 6,33 análises por técnico, é a nosso ver mais que satisfatório.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	14,4 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	9,6 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	15 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	21,6 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	29,8 análise/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,5 análise/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	15,1 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	8,3 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	9,9 análise/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	16,5 análise/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	3,4 análises/técnico	2º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

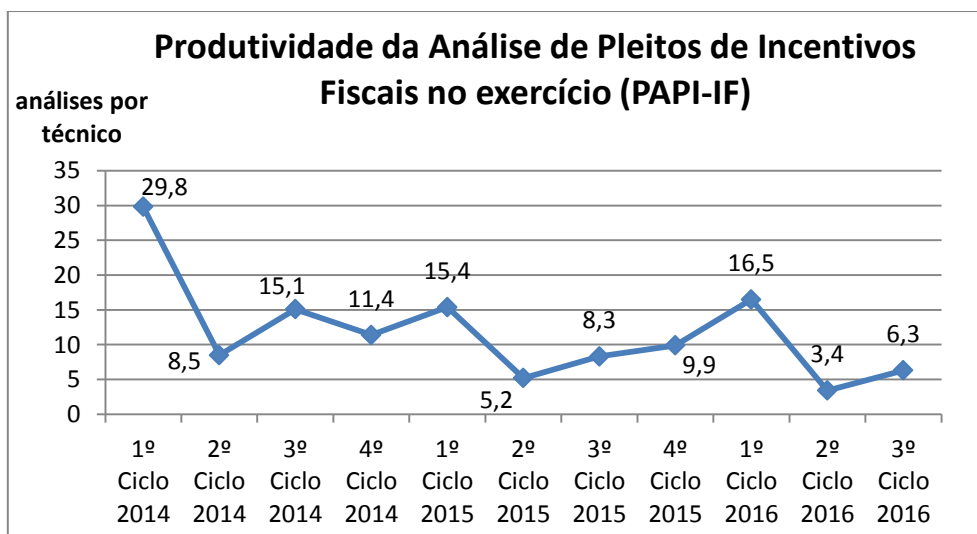

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### 3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{n}^\circ \text{ de vistorias realizadas no período}}{\text{n}^\circ \text{ de equipes}} = \frac{95}{10} = 9,5 \text{ vistorias/equipe}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): .....(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 95 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vistorias/equipe	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	7,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	8,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	20,1 vistorias/equipe	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	4 vistorias/equipe	2º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

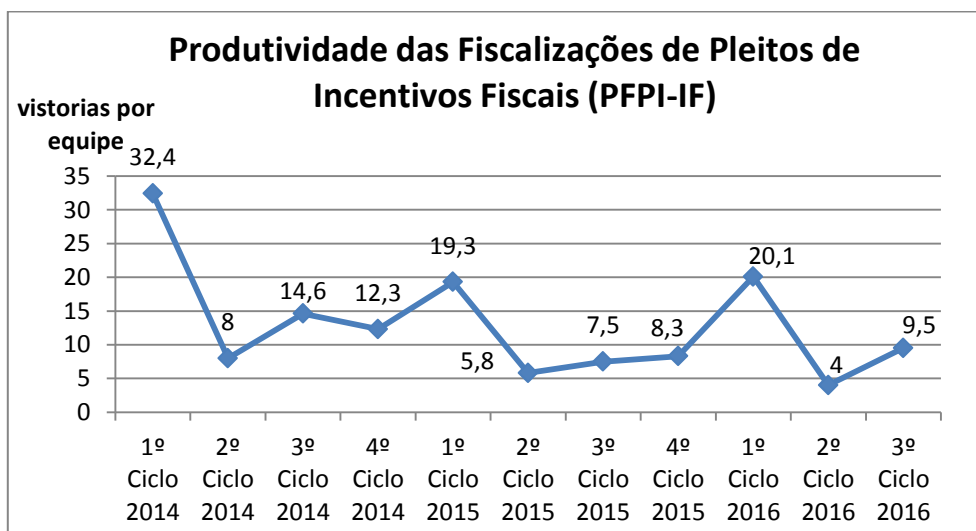

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

## 4 - Indicadores de Gestão de Convênios


### 4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{31 \times 100}{34} = 91,2 \%$$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período de aferição: Jan-agosto/2016.
- f) Comentários: Houve o recebimento de 34 propostas, das quais 31 foram concluídas as análises até a data do presente relatório e 03 estão em análise. Das propostas recebidas, 24 são convênios, 9 são TEDs e uma é uma proposta de Acordo de Cooperação Técnica.

h) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	93,75%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016

g) Representação gráfica:

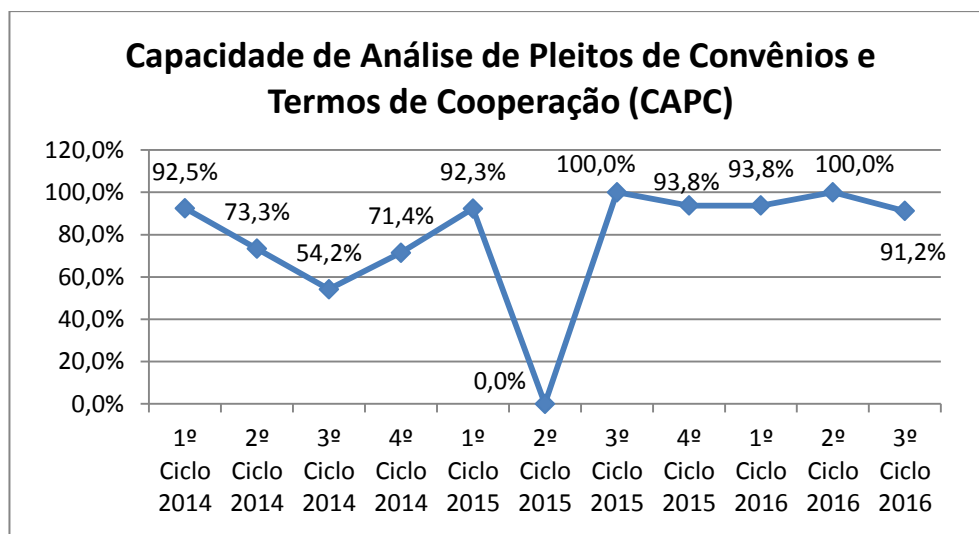

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

#### 4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{21 \times 100}{31} = 67,7 \%$$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-agosto/2016

f) Comentários: Foram analisadas 31 propostas, das quais 21 foram aprovadas, 7 rejeitadas, 3 em complementação.

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	40%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	54%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

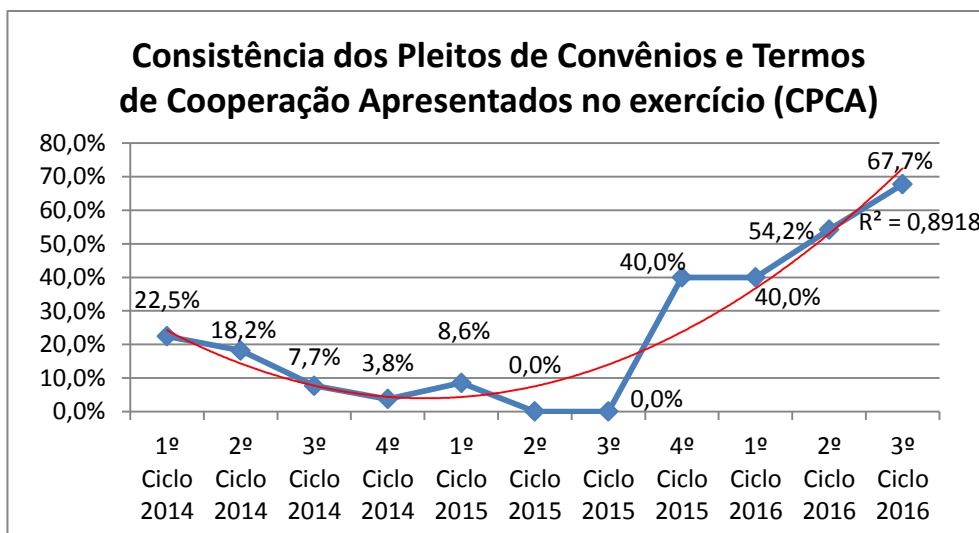

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável  
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)**

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$$

$$= \frac{7 \times 100}{34} = 20,6 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-agosto/2016

f) Comentários: Foram recebidos 34 propostas, das quais 7 foram rejeitadas.

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	56,25%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	25%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

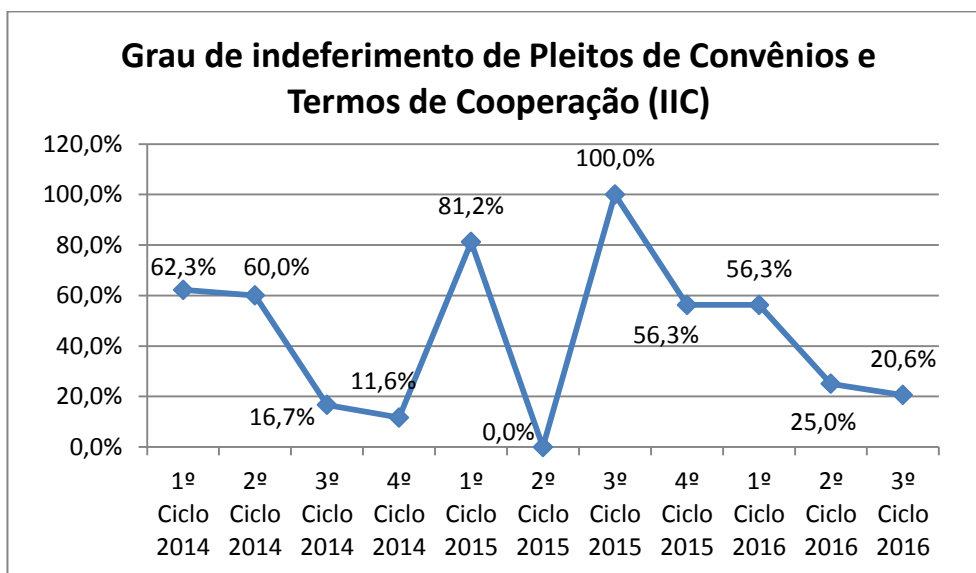

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

**Notas:**

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.



#### 4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{13 \times 100}{13} = 100 \%$$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-agosto/2016

f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 13 viagens de acompanhamento dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral.

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	47,22%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

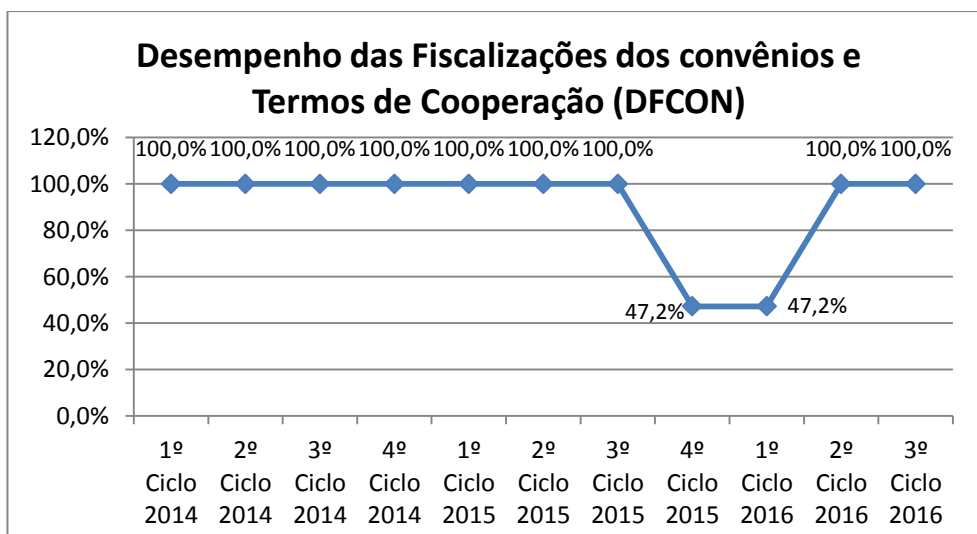

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada, entre janeiro e maio de 2016.

**ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE**  
**JANEIRO A AGOSTO 2016**

<b>EVENTO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>LOCAL</b>	<b>PARTICIPANTES</b>
Reunião de acompanhamento dos TEDs (eólica) com o Centro de Energias Renováveis // SUDENE	08 março	Recife PE	Maria Helena e Isis
Acompanhamento do TED “Mulheres na Construção Civil” – SUDENE/IFPB	06 de abril	Paraíba – João Pessoa	Macira e Givanildo
Acompanhamento do Convênio SUDENE/CONDEPE-FIDEM nº 794329/2013 - Fortalecimento Institucional – PE: Seminário Norte Metropolitano e Mata Norte – Desafios e Oportunidades (Meta 1)	28 de abril	Centro Mariápolis – Igarassu/PE	Vera Lúcia, Maria Helena, Victor, Teresa, Marcelo Viana
Acompanhamento do TED “Construindo com Mulheres” – SUDENE/Município de Maceió/AL	14 a 15.05.2016	Alagoas - Maceió	Macira e Givanildo
Apresentação do Diagnóstico Preliminar do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Salgueiro e seu entorno, Convênio SUDENE/CONDEPE-FIDEM 792551/2013	01 a 03.06.2016	Salgueiro PE	Maria Helena, Vera Lúcia, Isis
Oficina de Apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência do Município de Bom Conselho e Entrega dos Livretos	06 a 07.06.2016	Bom Conselho PE	M <sup>a</sup> Helena, Vera Lúcia, Teresa, Renato, Givanildo e Macira
Reunião SEMAS/Prefeitura de Goiana – APL/Rota do Marisco (ref. CV 822604/15)	30.05.2016	Recife	Reunião SEMAS/Prefeitura de Goiana – APL/Rota do Marisco (ref. CV 822604/15)
Reunião SUDENE/SEMAS-PE ref. CV 822604/2015 – Monitoramento das providências (Condições suspensivas)	28.06.2016	Recife PE	Almiro, Vera Lúcia, Marcelo Viana, Marcelo Saiki

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião com a Secretaria do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária/Maceió-AL, sobre liberação de 2ª e prorrogação vig. convênio e outros	12.07.2016	Recife PE	Carlos Almiro, Macira, Raul
Reunião SUDENE/EMEPA-PB, sobre alteração de metas e troca de equipamento.	22.07.2016	Recife PE	Carlos Almiro, Marcelo Viana, Vera Assunção, Marcelo Saiki.
Acompanhamento do Convênio 794329/2013 – Condepe/Fidem, Meta 2 - que se refere às capacitações dos servidores municipais dos municípios da Mata Norte e Metropolitana Norte de PE	28.07.2016	Paulista PE	Teresa Maria
Oficina de Boas Práticas no Cultivo de Plantas Medicinais, Hortaliças e Frutíferas, objeto TED nº 006/16 - SUDENE/UFPE, “CVT Fitoterápicos”	28.07.2016	Brejo da Madre de Deus PE	Renato
Acompanhamento do Convênio 794329/2013 – SUDENE/Condepe-Fidem – Fortalecimento Institucional	01.08.2016	Iguarassu	Teresa e Victor
Reunião de Monitoramento SUDENE e Agencia CONDEPE/FIDEM – convênios ref. aos projetos: Fortalecimento Institucional RMR e MN – PE; Plano de Desenvolvimento de Bom Conselho; e Plano de Desenvolvimento de Salgueiro e entorno.	02.08..16	Recife PE	Carlos Almiro, Maria Helena, Vera Lúcia, Victor Uchôa, Teresa Maria.
Reunião ref. Convênio SUDENE/SEIRHACT-PB – Projeto ZEE Borborema	04.08.2016	João Pessoa PB	Carlos Almiro, Maria Helena, Vera Assunção.
Acompanhamento da Meta 2 do Convênio 794329/2013 - Condepe/Fidem, que se refere às capacitações dos servidores municipais dos municípios da Mata Norte e Metropolitana Norte de PE	09.08.2016	Paulista PE	Victor Uchôa

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Acompanhamento das ações do Projeto de Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano, Convênio nº 813986/2014 – SUDENE/EMEPA-PB.	10 a 12.08.16	Soledade PB	Marcelo de Castro Viana
Acompanhamento da Meta 2 do Convênio 794329/2013 – SUDENE/Condepe-Fidem, que se refere às capacitações/servidores dos municípios da Mata Norte e Metropolitana Norte de PE	11.08.16	Igarassu PE	Victor Uchôa
Acompanhamento do Convênio nº 792551/2013 – SUDENE/CONDEPE/FIDEM. Evento: 2ª Oficina de Validação das Diretrizes Gerais e Propostas do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.	17 a 19.08.2016	Salgueiro PE	Vera Lúcia, Victor Uchôa
Reunião com Profª. Márcia Vanusa e Prof. Ari sobre TED SUDENE/UFPE – Projeto “Inventário da Caatinga” e sobre proposta de vídeo documentário Plantas da Caatinga	19.08.2016	Recife PE	Teresa, Renato

### **PROPOSTAS RECEBIDAS - JANEIRO A MAIO / 2016**

Entre janeiro e maio de 2016, a coordenação recebeu via SICONV 24 propostas, todas relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”, na ação 7K66, referentes à emendas parlamentares do Rio Grande do Norte. Além disso, foram recebidas 9 propostas para Termos de Execução Descentralizada e uma proposta de Acordo de Cooperação Técnica, esta não envolvendo transferência de recursos.

#### **4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)<sub>Conv</sub>**

a) Fórmula: 
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: **Não Informado pela Coordenação de Gestão de Convênios.**

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

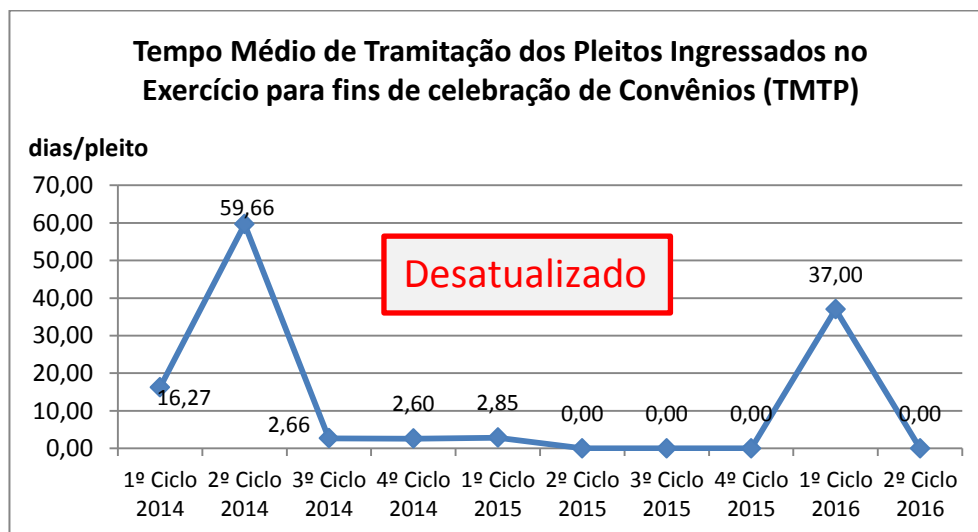

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (**em condições de conformidade**) até sua celebração (assinatura pelas partes).

**Notas:**


- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

**4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)**

- a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: **Não Informado pela Coordenação de Gestão de Convênios.**
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	39,25 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

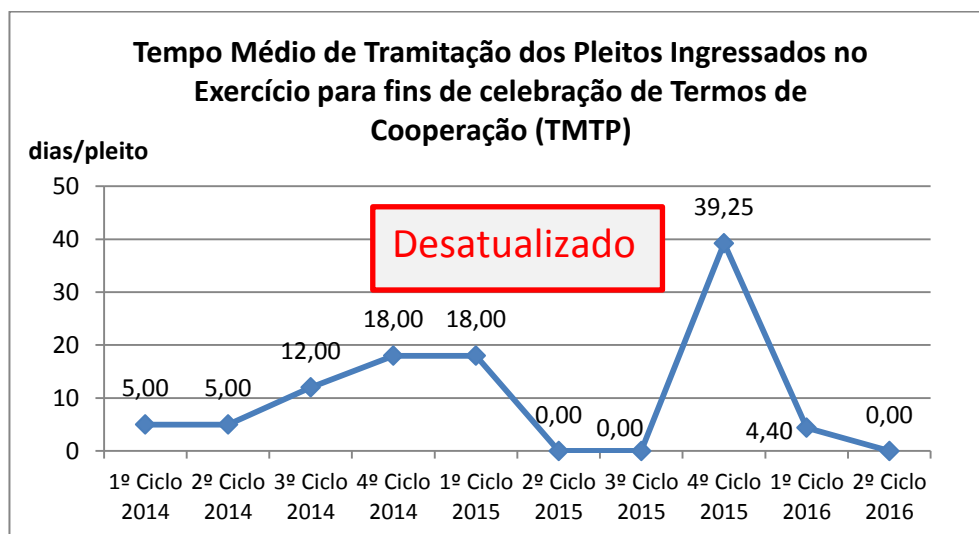

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

#### 4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios}_{a\_Aprovar_{FINAL}}}{\text{Convênios}_{a\_Aprovar_{INICIAL}}}$$

Valor do índice no ciclo:  $IPCA (\%) = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%): .....% (Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: **Não Informado pela Coordenação de Gestão de Convênios.**

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

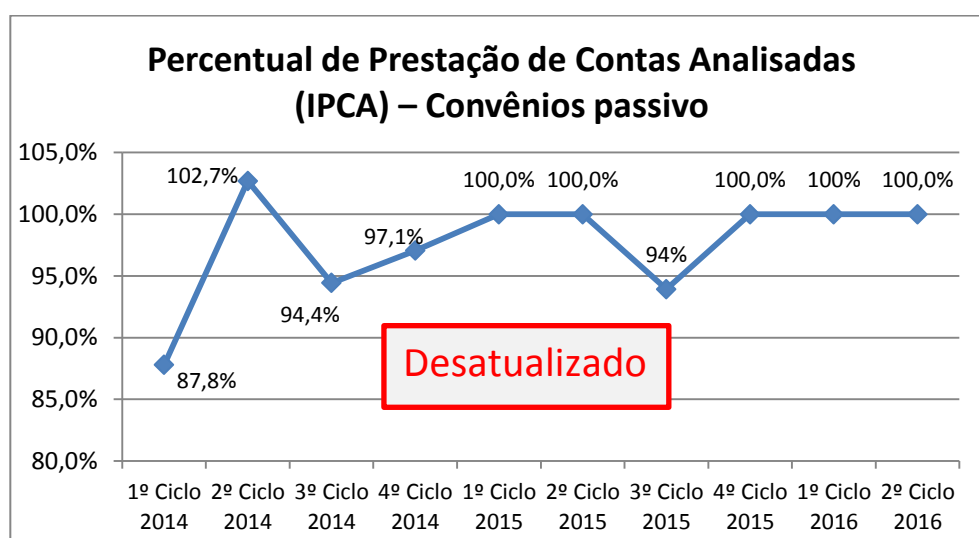

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE e SIAFI.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

#### 4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula: 
$$IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{\text{Convênios}_a \text{ Apro var}_{FINAL}}{\text{Convênios}_a \text{ Apro var}_{INICIAL}}$$

Valor do índice no ciclo:  $IPCA (\%)_{SICONV} = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado Ideal (%): ..... %(Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-agosto/2016




f) Comentários: **Não Informado pela Coordenação de Gestão de Convênios.**

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	130%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	87,5%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

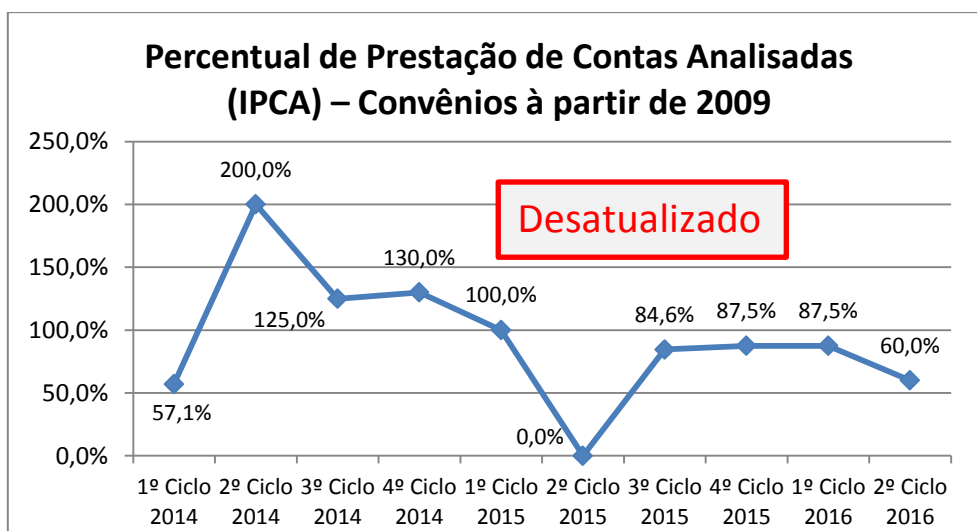

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

## 5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

### 5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)


- Fórmula: 
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{130 \times 100}{200} = 65\%$$
- Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- Resultado Ideal (%): 100 %
- Período da aferição: Jan-agosto/2016

f) Comentários: A meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores foi parcialmente atingida, alcançando 130 (cento e trinta) servidores, representando 65% da meta. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 329 (trezentos e vinte e nove) inscrições efetivamente realizadas. Um maior número de servidores foi capacitado no período devido aos cursos promovidos *in company*.

g) Resultados Anteriores (CSE):

Jan a Dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	60%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	48%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	69%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	43,5%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

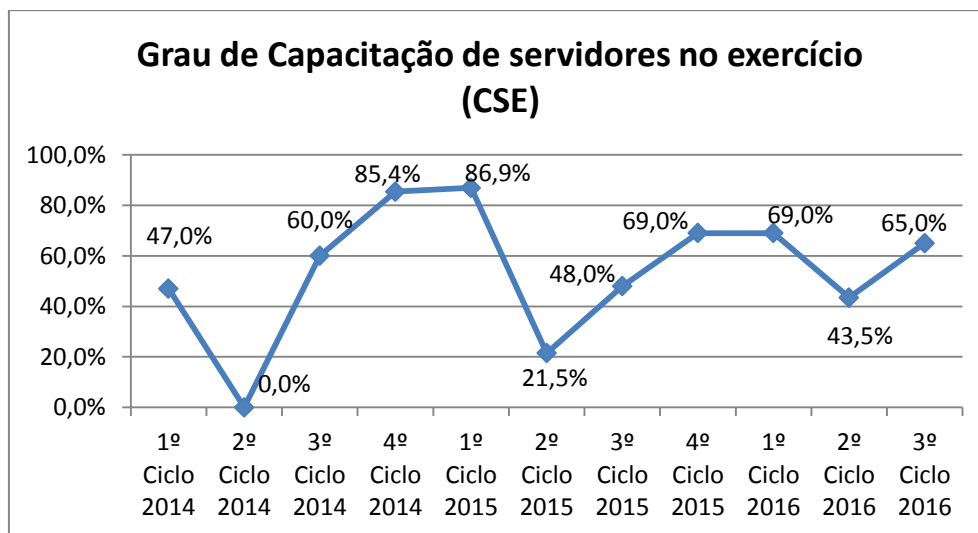

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado


## 5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{42 \times 100}{50} = 84\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 %

- e) Período da aferição: Jan-agosto/2016
- f) Comentários: Foram realizados 42 (quarenta e dois) eventos de capacitação, priorizando os cursos *in company* e na cidade do Recife.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	90%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	102%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	180%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	44%	2º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

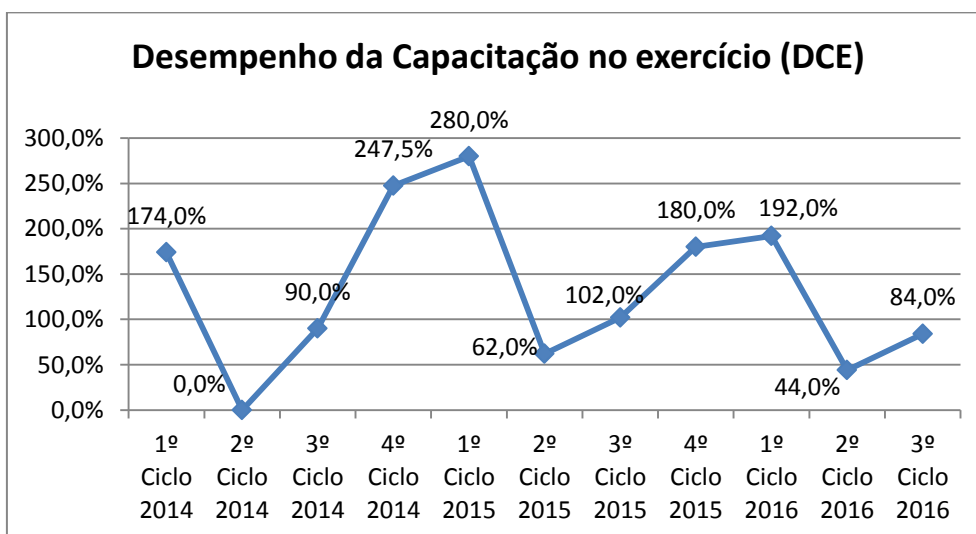

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### 5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.}}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} \times 100 = \frac{72.521,80}{398.404,00} \times 100 = 18,20\%$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100%


e) Periodicidade: Jan-agosto/2016

f) Comentários: A Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 70.688,69 (setenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) e R\$1.833,11 (Hum mil oitocentos e trinta e três reais e onze centavos) com diárias e passagens, representando 18,20 % do valor previsto para o investimento em capacitação. Conforme o Plano Anual de Capacitação 2016 e as normas legais, estão sendo priorizados os cursos realizados na cidade do Recife, *in company* e promovidos por Escolas de Governo.

g) Resultados Anteriores (NIC):

Jan a Dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	40,85%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,97%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

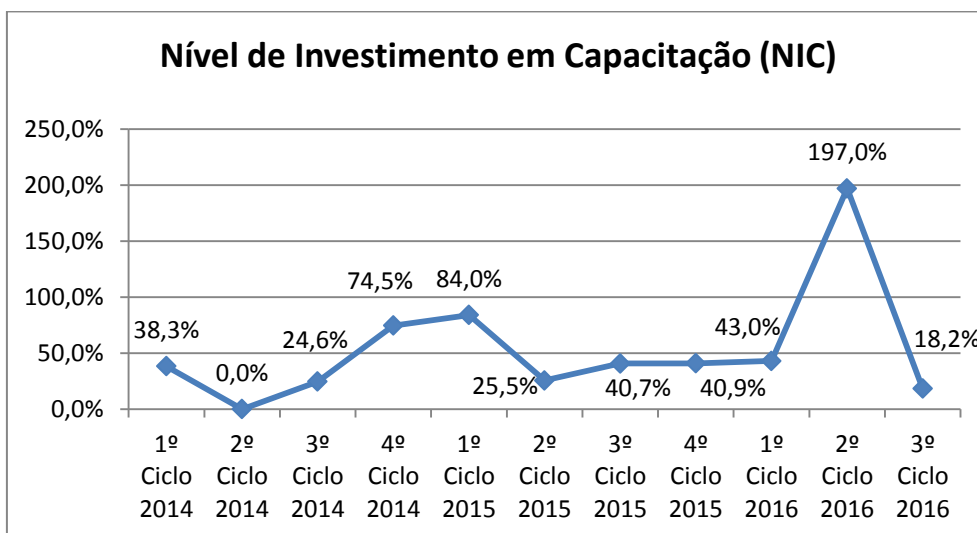

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

## 6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

### 6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos<sup>1</sup> =

$$\frac{67\% + 90\% + 38\%}{3} = 65\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)


e) Data da aferição: 15/09/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (67%); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (90%); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (38%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Jan a Dez/2012	33,9 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	43,67 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	38,55%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	41,63%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	43,99%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	45,64%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	46,8%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	47,6 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	47,6%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	58,70%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	61,33%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	64,7%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	65,7%	2º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

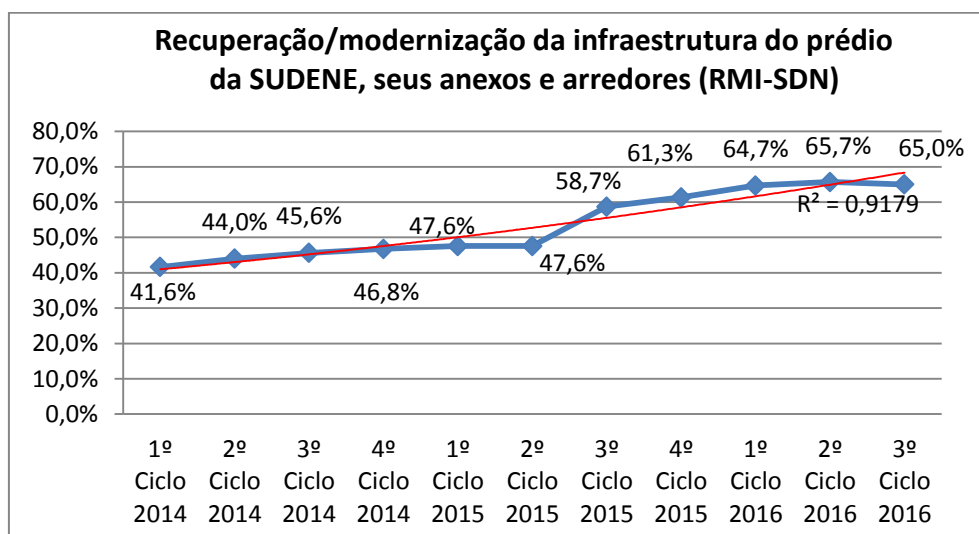

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

**Notas:**

<sup>1</sup> O percentual de execução de cada projeto é obtido da média aritmética geral lida no respectivo Plano Operativo. Neste caso, os POs 74, 75 e 76.

**6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)**

a) Fórmula:  $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}}$

$$\frac{(3.337.367,25+6.458.613,62 +100.000,00) \times 100}{3.459.991,25+8.670.544,86+148.000,00} = 80,6 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, recuperação das fundações do prédio sede e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 15/09/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 3.337.367,25 e limite autorizado acumulado=R\$ 3.459.991,25); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 6.458.613,62 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.670.544,86); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).


g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2012	48,5 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	60,4 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	42,6 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	73,92 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	53,56%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	67,37%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	67,37%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	68,2%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	71,9 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	71,2 %	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	78,9%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	79,1%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	79,1%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	80,6%	2º ciclo 2016

**Nota:**

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

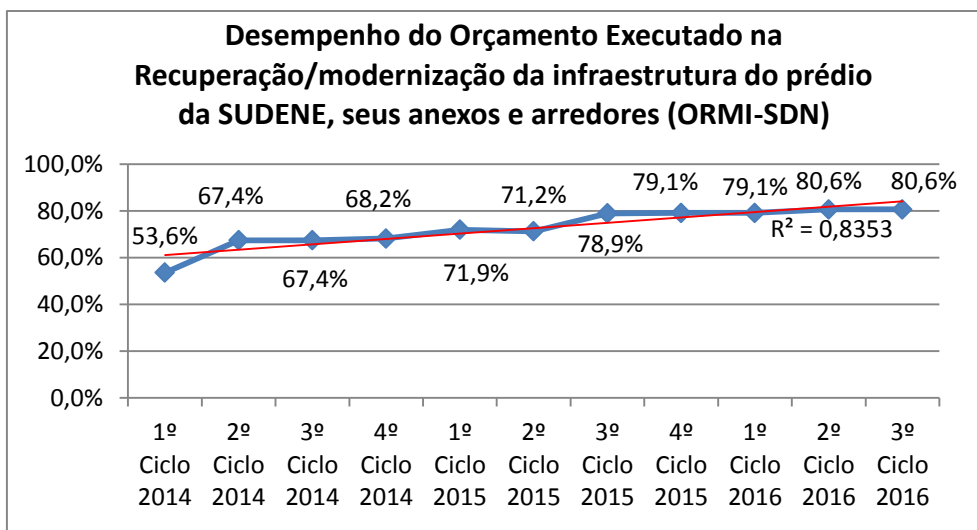

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI)

Os resultados da Avaliação de Desempenho Institucional são periodicamente calculados na época dos ciclos de monitoramento, tendo por referência o estabelecido pela Portaria SUDENE nº 166, de 21 de dezembro de 2015, e em seu anexo constam as metas transcritas abaixo, que estão disponíveis no site da SUDENE, no endereço <http://www.sudene.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/gestao-institucional>, item “Legislação” da página “Gestão Institucional”

**Quadro de Metas de Desempenho Institucional**  
**Resultados do período out/2015-ago/2016 com base na Portaria SUDENE nº 166/2015**

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
D4-Fortalecer a Imagem da SUDENE	D4.1- Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Eventos temáticos realizados	100 %	8 %	6,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>1ª Oficina Rotas da Integração Macrorregional Nordeste (<a href="#">sem informação</a>)</li> <li>Fórum Sudene de Energia e Meio Ambiente (<a href="#">16% realizado</a>) - PO 23</li> </ul> (CGDS/DPLAN)
D4-Fortalecer a imagem da SUDENE	D4.1-Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Encontros realizados	100 %	99,67%	79,7	Realização de encontros abordando temas ambientais (Café com Sustentabilidade) Possíveis temas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Energias Renováveis e Zoneamento Ecológico-Econômico - Reunião de Kick Off dos TEDs formalizados em 2015; (<a href="#">100% realizado</a>)</li> <li>Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Sudene; (<a href="#">99% realizado</a>)</li> <li>ODS nº 7 – Energia. (<a href="#">100% realizado</a>)</li> </ol> (CDGS/DPLAN) - POs 20, 21 e 22
D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1-Moderinizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Planejamento realinhado/ implementado	35%	48%	80,0	Execução do realinhamento/atualização do Planejamento Estratégico. <sup>1</sup> (CGGI) – PO 68 ( <a href="#">48%</a> )
Programa 2029 - Desenvolvimento Regional, Sustentável e Economia Solidária (PPA 2011-2015)	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Projeto realizado	50%	100%	80,0	Execução de projeto com o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco para implantação do padrão de qualidade no “Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Pernambuco - Qualidade Botânica Tradicional e Molecular, Química e Microbiológica” –(CGEP/DPLAN) PO CVT Fitoterápicos II – PO 26 ( <a href="#">86%</a> )
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação aos semiárido	Relatório	100%	100%	80,0	Relatório para Implementação da infraestrutura necessária para instalação de área de geoprocessamento na SUDENE. (CGEP/DPLAN) – PO GT GEO – PO 25 ( <a href="#">100% realizado</a> ) do 2º ciclo 2016
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas.	100%	100%	80,0	Análise das consultas prévias protocoladas junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 3º, art. 18 do Decreto nº 7.838/2012). (CGDF/DFIN) - Indicador ( <a href="#">100%</a> )

Continua



Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamentos analisados.	100%	100%	80,0	Análise da participação do FDNE nos projetos aprovados pelos agentes operadores protocolados junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 2º, art. 22 do Decreto nº 7.838/2012). (CGDF/DFIN) - <b>Indicador (100%)</b>
D1-Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e Portarias aprovadas	300	95,3%	76,2	Aprovação de incentivos fiscais. (CGIF/DFIN) – <b>Indicador (286 aprovados até 31/08/2016)</b>
2111 - Gestão e Manutenção do MI	4575 - Capacitação de Servidores Públicos Federais - Plano Orçamentário 0001	Projetos implementados	100%	74,0%	59,2	Realização de 1 (hum) projetos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas no período 2016-2019: 1. Projeto de desenvolvimento de competências, mediante mapeamento, análise de gaps e validação; <b>(74%)</b> 2. Projeto avaliação de desempenho por competências, mediante estudos, elaboração de instrumentos e aplicação; <b>(0,0%) (a ser implementado)</b> 3. Projeto de planejamento da força de trabalho, mediante estudos, pesquisas e dimensionamento da força de trabalho. <b>(0,0%) (a ser implementado)</b> (CGGP/DAD) – PO 72 - <b>em implementação o item 1- Gestão por Competências (74%)</b>
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do M.I	2000 - Administração da Unidade, plano orçamentário 0002.	Obra executada	85%	89%	80,0	Obra de recuperação do Anexo Nilo Coelho: <b>(67%)</b> 1. Elaboração dos projetos básico e executivo; 2. Licitação para contratação da execução da obra; 3. Execução da obra de ambientação; 4. Fiscalização e acompanhamento da obra . (CGAF/ENG/DAD) – <b>PO 74 (89%)</b>
<b>MÉDIA ARITMÉTICA</b>				86,6%	70,0	

Fontes: : Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

<sup>1</sup> Prazo alterado de 12 para 24 meses em razão da paralisação dos trabalhos e de mudanças na Superintendência, ocorrida entre abril e julho/16, além dos cortes orçamentários, com ajuste do percentual de execução referente ao período de apuração deste ciclo, conforme aprovação na 237ª reunião de 27/07/2016, da Diretoria Colegiada.

Notas:


- Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada
- Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional
- Os resultados aplicam-se ao 7º Ciclo de avaliação GDPGPE e 4º Ciclo de avaliação GDACE- 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.
- Os resultados são calculados a cada ciclo e o limite de observação, pra fins de cálculo é a data de 30/09/2016.
- Cada ponto percentual equivale a 0,8 (8 décimos) de ponto para fins de conversão.

Referência da apuração: 31/08/2016

f) Atesta a Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), equívoco de lançamento das informações relacionadas ao projeto do Plano de Desenvolvimento de Pessoas., agora corrigido, em função de discrepâncias entre as informações apresentadas pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) em e-mail de 30/11/2015, e as lançadas pela CGGI. Com isso, foi corrigido o campo de execução percentual, cuja alteração foi informada à Diretoria Colegiada.

g) projetos contidos da avaliação de desempenho institucional concluídos em ciclos anteriores não constam deste relatório.

a) Representação gráfica:

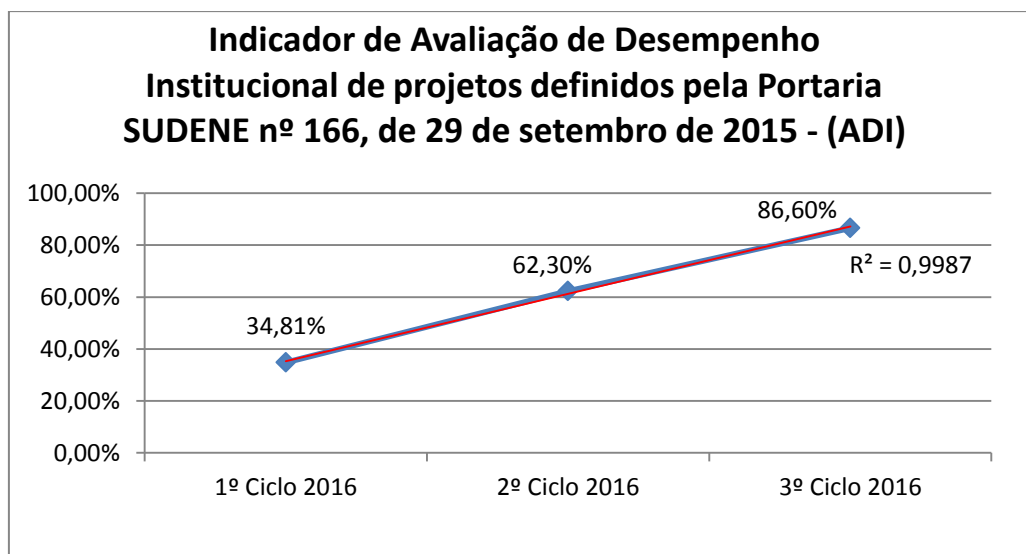

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 8 – Observações e Deliberações em plenária de 28/09/2016

- O Coordenador-Geral da CGGI informou que a partir do próximo ciclo sairão do portfólio os projetos que se mostraram concluídos e os cancelados neste 3º ciclo;

- O Superintendente Marcelo José Almeida das Neves registrou a importância deste momento oportuno para a Superintendência fazer a apresentação dos encaminhamentos por ela conduzidos entre um e outro ciclo. Uma forma de deixar a casa inteirada dos fatos deste Superintendente, inclusive sobre os resultados da visita à exposição do Exército, em Brasília, quando o então Ministro da Defesa, Raul Jungmann externou o seu interesse de participar da próxima reunião do Conselho Deliberativo, da mesma forma como o fez o Ministro Moreira Franco, Chefe da Secretaria-Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal;

- A Coordenadora Maria Helena de Castro, da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente sugeriu gestões da Superintendência junto ao Ministro do MI no sentido de assegurar os recursos financeiros para convênios em vias de finalização, que já contam com o orçamento autorizado, mas falta o recurso efetivo para a conclusão e com as limitações do momento, o risco de novos atrasos se torna real. Isso surgiu em razão da observação do Coordenação-Geral de Administração e Finanças de que o orçamento aprovado não se constitui segurança do financeiro;

- O Superintendente afirmou que tomará providências sobre as questões financeiras junto ao ministério, e solicitou às unidades que enviassem uma relação de todos os projetos que se encontram na mesma situação, para que sejam tomadas as medidas necessárias para resolução de tais problemas.

- A Coordenadora Vera Lúcia, da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, indagada pelo Superintendente sobre as razões do atraso do PO 09- Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba, informou que se deveu a ajuste da licitação, condição para que o projeto seguisse sua execução na normalidade;

- A mesma coordenadora, em relação ao projeto do “Café com sustentabilidade - Restauração e manejo Florestal, informou que se trata de um projeto que objetiva apontar soluções para o semiárido. O técnico Victor acrescentou que a proposta é internalizar esse tema na SUDENE e que o momento é de discussão de uma metodologia para tratar o assunto em outros recortes da preservação do meio-ambiente, inclusive a produção de sementes para recuperação das matas destruídas por alguns projetos como reconhece a empresa Transnordestina Logística S/A-TLSA. A própria empresa vem desenvolvendo a produção de sementes adaptadas. Os projetos de recuperação ambiental, como destacou Maria Helena, estão hoje muito presentes nessas empresas;
- Sobre o PO referente ao “I Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética” informou que, como o travamento dos dados foi 31/ago/16, e o evento foi realizado ontem, 27/set, o PO se mostra com apenas 16%, mas encontra-se concluído e faz parte de uma das metas de desempenho institucional;
- O Superintendente Marcelo José Almeida das Neves recomendou a Maria Helena articulação com instituições internacionais para buscar cooperação e inclusive recursos no campo de energia, e completou: “a busca de organismos não governamentais é um bom caminho” para superarmos as limitações vividas por Brasília, que tanto têm afetado os trabalhos da Sudene”;
- O Coordenador-Geral da CGGI informou que o PO 19 - Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do Sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba, encontra-se paralisado a vários ciclos e pediu a sua retirada para o próximo. A Coordenadora Vera concordou;
- O Superintendente, em relação ao PO 20- Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE, pediu cuidado no apoio a projetos de natureza comunitária pois a história tem mostrado que muitas das vezes, e até involuntariamente, pedidos surgem para apoio, mas no local não encontra-se a estrutura ou infraestrutura necessária para hospedar tal pleito. Exemplo: o apoio para a implantação de uma casa de farinha, quando no local não há plantação de mandioca;
- Foi solicitada articulação com o governo de Sergipe para que o empreendimento funcionasse efetivamente.
- Em relação ao PO 22 - Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino, o Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Frederico Cavalcanti (CGEP/DPLAN) sinalizou que haverá prorrogação de prazo devido à dificuldade da UFPE em trabalhar o relatório das potencialidades por que o conhecimento no uso de fitoterápicos não tem sido passado de pai para filho e há o risco desse conhecimento se perder, e esse é o esforço da Universidade, no sentido de recuperar esse conhecimento via depoimentos que estão sendo gravados, no tempo originalmente previsto. O projeto encontra dificuldades em relação a recurso para diária e passagens para os servidores acompanharem a execução.
- O Superintendente explanou que já havia solicitado uma ampliação de diárias e passagens ao ministério.
- O diretor de administração Eugênio Pacelli sugeriu que as unidades mandem um ofício para a diretoria informando a prioridade de acordo com a urgência e importância dos projetos que necessitam de diárias e passagens, com a finalidade de quando a solicitação do Superintendente for atendida, o novo recurso seja melhor aplicado.
- Em relação ao PO 25 - Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas) - PED/CG-2035,

esclareceu o técnico Lautemyr da CGEP/DPLAN, com tantas etapas em atraso, apesar da situação geral de “Em Andamento”, a razão tem sido a demora da apresentação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, de um novo cronograma e execução do projeto, já pedido;

- Em relação aos POs 52- Companhia Siderúrgica Suape S/A, PO 58 - Braskem S/A - Modernização do Centro de Petroquímicos Básicos. , PO 59- Braskem S/A- Modernização das unidades industriais de vinílicos, a Coordenadora-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento, Sabrina Lyra, esclareceu que foram cancelamentos unilateralmente realizados pelo agente operador Banco do Brasil. Em razão disso, os cancelamentos dos empenhos já foram providenciados e as empresas estão buscando outros agentes. Salientou o Diretor de Gestão de Fundos, Ricardo Barros, que o Banco do Brasil cancelou os POs 58 e 59 ainda na fase de contratação por pura falta de interesse e entende que uma decisão da Diretoria Colegiada deve ser discutida para que obrigue os agentes a apresentar as motivações de cancelamentos desse tipo, pois entende que uma decisão desse porte, depois de todo um trabalho tão complexo da SUDENE em apoiar o projeto, não pode ser perdido por uma simples decisão de uma agente operador, sem qualquer explicação plausível. A Coordenadora da CGDF, Sra. Sabrina acrescentou que alguns operadores temem a assunção de 100% do risco, e já ouviu comentários de que um percentual menor poderia gerar maior interesse;

- O diretor de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos, Ricardo Barros, questionou sobre o andamento da contratação do planejamento estratégico. O coordenador-geral da CGGI, Manoel Barreiros, informou que houve uma reunião com um consultor com a presença do superintendente onde foi recomendado que planejamento estratégico deve ser feito posteriormente a definição das diretrizes do plano regional do desenvolvimento do Nordeste, PRDNE, para que assim em conjunto se definam as estratégias para a instituição.

- A coordenadoras-geral de gestão de pessoas, Ângela Lima, solicitou à diretoria que seja colocada em pauta para a próxima reunião de D.C. a implantação de um comitê de gestão de pessoas. E também solicitou aos gestores, colaboração incentivando e mostrando a importância aos servidores da participação no projeto Investindo em Sonhos, que prepara para uma futura aposentadoria.

- Encerrando, o Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, informou que no início de outubro pedirá que as unidades atualizem os resultados das metas alcançadas entre out/15 e set/16, para fins de avaliação de desempenho institucional, ao mesmo tempo que sinalizará para que apresentem a suas metas para o próximo período. Informou também, a agenda para o próximo ciclo;

- A Coordenadora Maria Helena informou que dias 14 e 15/dez haverá evento que mobilizará a SUDENE e sugeriu ajuste de data para a reunião do 4º ciclo;

- O técnico Lautemyr, da CGEP/DPLAN, informou sobre prêmio que a sua unidade vem estudando, a exemplo do Prêmio Celso Furtado, sobre as melhores práticas de inovação para o semiárido, com o apoio de empresas, articulação essa que contará com o Ministério da Integração Nacional no sentido de buscar adesões a esse apoio;

- O Superintendente informou o acatamento de sugestão do Diretor de Planejamento Sérgio Alencar, para que todos os Coordenadores-Gerais participem das próximas reuniões de Diretoria Colegiada, tendo assuntos pautados ou não;

- Encerrando, o Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, informou que no início de outubro pedirá que as unidades atualizem os resultados das metas alcançadas entre out/15 e set/16, para fins de avaliação de desempenho institucional, ao mesmo tempo que sinalizará para que apresentem a suas metas para o próximo período. Informou também, a agenda para o próximo ciclo;

## 9 – Conclusão

O período transcorrido entre 30 de junho e 28 de setembro de 2016, que marcou o interstício entre o 2º e o 3º ciclo, foi marcado por mudanças significativas por que o então Superintendente substituto, Ricardo Barros, que interinamente conduzia a Autarquia com a exoneração de João Paulo, passou o comando ao novo Superintendente, Marcelo José Almeida das Neves, que assumiu a Autarquia em 11 de julho de 2016, data da publicação do DOU de nomeação. Além disso, o início deste segundo semestre tem exigido mais atenção e cuidado das unidades administrativas em razão das restrições da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, que trouxe significativas mudanças nas regras eleitorais deste ano, nas eleições para prefeitos e vereadores do país.

Paralelamente, nesse período a SUDENE continuou enfrentando as restrições orçamentárias, particularmente as limitações nos gastos para diárias e passagens, com impacto na finalização de alguns convênios da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, com forte tendência à adoção das prorrogações de ofício, aquela em que a causa do atraso é imputada ao concedente, no caso a SUDENE.

Chamam a atenção as restrições orçamentárias para as atividades finalísticas e particularmente a dotação prevista para o FDNE em 2017. Enquanto este ano o orçamento do fundo foi de R\$ 2.022.481.635,00, para 2017 estão sendo cogitados apenas R\$ 482.903.225,00. Gestões estão sendo encetadas pela administração da casa junto à Comissão Mista de Orçamento para reverter este quadro.

Destaca-se também, o pedido do Ministério da Integração Nacional e do novo Superintendente para que a Diretoria de Planejamento acelere a contratação da elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento, base para a atualização do planejamento estratégico da SUDENE e de outros encaminhamentos que integram as agendas dos fundos de desenvolvimento e de financiamento regionais, FDNE e FNE.

A agenda para o próximo ciclo segue adiante:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
4º	28/11/2016	02/12/2016	15/12/2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Durante a reunião foram sinalizados pela CGDS e pela Superintendência, alguns eventos que poderão recomendar a necessidade de mudança da data, inclusive uma próxima reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, contudo esses ajustes, se necessários, serão realizados mais adiante.

A agenda para os ciclos de 2017 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	31/12/2016	10/02/2017	23/02/2017
2º	31/05/2017	9/06/2017	21/06/2017
3º	31/08/2017	8/09/2017	22/09/2017
4º	30/11/2017	6/12/2017	15/12/2017

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

# **ANEXO I**

## **Quadros do Monitoramento**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 01</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.5. Fortalecer as administrações públicas.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
<b>Projeto:</b>	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
mai/12	139.865,15	7.361,32	147.226,47	A realizar no exercício	R\$ 94.240,34
jun/12	94.240,34	4.960,01	99.200,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	<b>234.105,49</b>	<b>12.321,33</b>	<b>246.426,82</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 94.240,34
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 139.865,15

<b>Previsão de Conclusão:</b>	07/08/2016	<b>CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
--	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012	100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012	100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012	100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012	100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012	100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012	100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2012	02/01/2013	100,0%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>56,3%</b>	<b>Atrasado</b>		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013	100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	<b>Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.</b>	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	28/6/2016		1/12/2013		81,3%	<b>Atrasado</b>		
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/7/2014		1/12/2013	14/3/2014	100,0%	Concluído	O convênio atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014	100,0%	Concluído		



9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	28/9/2015		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao convenente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	20/3/2016	20/3/2016	R\$ 94.240,34				0,0%	Paralisado	A liberação da parcela recebeu parecer positivo da equipe técnica e foi autorizada pelo gestor, no entanto, conforme comunicado pela COC, não há disponibilidade de recursos no Ministério da Integração para realizar a liberação. Não há previsão para efetuar a liberação.	Solicitou-se prorrogação de ofício por igual período de atraso na liberação da segunda parcela.
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	26/2/2016		28/5/2015	21/01/2016		100,0%	Concluído	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária. Produto entregue no dia 21/01/2016. Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015.
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/2/2016	28/6/2016		22/1/2016			50,0%	Atrasado	Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final.	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	6/6/2016	7/6/2016		6/6/2016	7/6/2016		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho.	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	29/06/2016	07/08/2016					0,0%	Atrasado	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 234.105,49	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 139.865,15	<b>76%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**

**2º Ciclo - 2016.** Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausência de recursos no Ministério da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEPE/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorrogou vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Conveniente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas. Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho no dia 07/06/2016. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final. Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausência de recursos no Ministério da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício.

**3º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 02</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almira Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, conseqüentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
<b>Projeto:</b>	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	ONVENENT	TOTAL		
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
<b>TOTAL</b>	<b>530.482,50</b>	<b>58.942,50</b>	<b>589.425,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/03/2018	<b>CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONS 013341/2012)</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>39,8%</b>	<b>Atrasado</b>		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	<b>Concluído</b>		

6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	01/09/2013	30/03/2016	R\$ 325.222,88	15/11/2014	--	--	80,0%	Atrasado	Contratada a empresa para a conclusão das atividades da Etapa 1/Meta 1, em substituição a que realizou destrato. Além disso, o processo licitatório para contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1, foi realizado e homologado no dia 07/10/2015, aguardando o repasse da segunda parcela para execução. Resta a contratação dos serviços para a realização do Seminário final.	Solicitada pela Convenente e acatada pela Concedente novo Termo Aditivo, ampliando o prazo de vigência para 30/12/2016. Apesar de algumas Metas/ Etapas apresentarem-se como atrasadas isto é decorrente da Convenente ainda não ter procedido no SICONV os ajustes no Plano de Trabalho no que se refere aos seus cronogramas físico e desembolso adequados ao novo prazo pactuado. Como medida corretiva, enviou-se solicitação de esclarecimento via SICONV em 15/07/2016, sem haver resposta até a data presente.
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/07/2014	30/04/2016	R\$ 356.560,00	08/12/2014	--	--	40,0%	Atrasado		
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015	R\$ 146.400,00	08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	Concluído	Etapa concluída após a retomada da realização dos Encontros em 21/09/2015 com a contratação de uma nova empresa.	
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	Atrasado	A liberação da segunda parcela está condicionada à aprovação dos relatórios de execução pela equipe técnica do Concedente. No momento, encontra-se em análise pela Concedente justificativas apresentadas pela Convenente a respeito de aspectos relativos a relatórios de execução. <b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>	
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	04/01/2016	30/03/2016	R\$ 176.960,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	O processo licitatório para a execução da Etapa 2 já foi realizado e homologado. No momento, aguardam o repasse da segunda parcela de recursos para realizar os 14 workshops previstos. <b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>	
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	04/04/2016	30/04/2016	R\$ 33.200,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	<b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>	
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2014	30/04/2016	R\$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	45,0%	Atrasado	<b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>	
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2014	30/04/2016	R\$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	90,0%	Atrasado	A convenente informou a realização de diversas atividades, indicando o estado avançado desta Etapa, entretanto, sem concluí-la. <b>Novo período de execução repactuado, mas não ajustado.</b>	

8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/03/2016	30/04/2016	R\$ 50.000,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	Novo período de execução repactuação, mas não ajustado.	
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/03/2017	01/02/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 530.482,50	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 265.241,25	<b>60%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

**Observações:**

\* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016.

**3º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 03 (ex PO 04)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.			
<b>Projeto:</b>	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>485.874,65</b>	<b>25.572,35</b>	-	<b>511.447,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 485.874,65

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/08/2016	<b>CONVÊNIO Nº 794997/2013</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	<b>Vigência: 31/12/13 a 14/05/16</b>

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE (Telefone: (31) 3915-5153/5258/5255)
--	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>	CGDS/SUDENE				<b>26/09/2013</b>	<b>17/01/2014</b>		<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	<b>Concluído</b>		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	<b>Concluído</b>		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	<b>Concluído</b>		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	<b>Concluído</b>		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>	IDENE/SUDENE	<b>31/12/2013</b>	<b>31/07/2014</b>			<b>30/12/2014</b>		<b>60,0%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	<b>Concluído</b>	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	<b>Concluído</b>		
8	<b>Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais</b>	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			100%	<b>Concluído</b>	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	<b>Concluído</b>	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	

8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído	Produto 2 entregue a SUDENE.	
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%	Concluído		
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído	Produto 3 entregue a SUDENE.	
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	Produto 4 entregue a SUDENE.	
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Com o Recurso de Aplicação foi autorizada a ampliação do nº de exemplares.	
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Evento de divulgação realizado dia 11 de setembro de 2015 em Montes Claros/MG	
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Visita realizada na data de divulgação do evento pela Técnica: Maria Helena de Castro Lima	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20 %)</b>									<b>0,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/07/2016	22/08/2016					0%	Atrasado	Aguardando relatórios de execução para emissão de LT.	
<b>Valor Previsto:</b>					<b>R\$ 485.874,65</b>	<b>Valor realizado:</b>			<b>R\$ 485.874,65</b>	<b>80,0%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Etapas 8.6 repactuada

3º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 04 (ex PO 05)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
<b>Ação:</b>	<b>8917 - Fortalecimento das Administrações Locais</b>	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
<b>Finalidade da ação:</b>	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almira Moreira Pinto
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
<b>Problema (causa):</b>	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
<b>Projeto:</b>	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
OUT/2014	107.354,71	5.650,24	113.004,95	Pago até o ano anterior	R\$ 107.354,71
OUT/2015	100.187,91	5.273,04	105.460,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 100.187,91
<b>TOTAL</b>	<b>207.542,62</b>	<b>10.923,28</b>	<b>218.465,90</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2015)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/07/2017	<b>CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>50,6%</b>	<b>Atrasado</b>		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	--	--		11/09/2015	24/09/2015		100,0%	Concluído		
10	<b>Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.</b>	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	18/03/2016	--	--	--		<b>90,0%</b>	<b>Atrasado</b>	Foi solicitada pela Conveniente aditamento de prazo (90 dias), diante de dificuldades na execução do convênio - 4º TA, de 24/08/16, que prorrogou a vigência para 28/11/2016. A justificativa apresentada pela conveniente refere-se ao atual contingenciamentos por que vem passando o Estado de Pernambuco, resultado em reflexos negativos na logística do projeto a atraso na programação, com destaque para o adiamento na contratação de técnicos que dariam melhor suporte ao	Participação em reuniões: Ag. CONDEPE/FIDEM 14/06/2016 com equipe Condepe, Genesis (contratada) e secretários municipais para sensibilização dos gestores, para construção de proposta das oficinas. No mesmo dia, após essa, com a equipe do CONDEPE, Genesis e representante da SUDENE, por solicitação do CONDEPE, para tratar das dificuldades enfrentadas na execução física, a ex. da substituição de municípios e beneficiários; em 02/08/2016, entre a SUDENE e a Agência Condepe/Fidem para solução das pendências relativas aos produtos das atividades realizadas, necessidade de observância das
10.1	<b>Etapa 1.1:</b> Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	20/12/2015	--	--	--		<b>100,0%</b>	Concluído		
10.2	<b>Etapa 1.2:</b> Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	--	--		<b>70,0%</b>	Atrasado		
10.3	<b>Etapa 1.3:</b> Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	15/02/2016	18/03/2016	--	--	--		<b>100,0%</b>	Concluído		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	-	-		28/04/2016	28/04/2016		100,0%	Concluído		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	29/02/2016	29/02/2016	R\$ 100.187,91	--	--		0,0%	Atrasado		

13	<b>Meta 2:</b> Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	21/03/2016	31/05/2016		04/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído	cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico. Há também a pendência de liberação da segunda parcela dos recursos. O Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso estão em ajuste. <b>Datas não estavam atualizadas no siconv até a data de travamento.</b>			
13.1	<b>Etapa 2.1:</b> Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	15/04/2016	29/04/2016	--	04/07/2016	15/07/2016	--	100,0%	Concluído				
13.2	<b>Etapa 2.2:</b> Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	02/05/2016	13/05/2016	--	25/07/2016	05/08/2016	--	100,0%	Concluído				
13.3	<b>Etapa 2.3:</b> Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	16/05/2016	31/05/2016	--	09/08/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído				
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	25/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído				
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									0,0%	A Iniciar				
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/2016	31/07/2017	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar				
<b>Valor Previsto:</b>									R\$ 207.542,62	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 107.354,71	71%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado ( 1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, conseqüentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a conseqüente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

**3º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 05 (ex PO 06)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.			
<b>Projeto:</b>	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30

Cronograma de Desemolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56
jun/14	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08
dez/14	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>359.682,64</b>	<b>18.930,66</b>	<b>378.613,30</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 138.415,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56

<b>Previsão de Conclusão:</b>	24/04/2017	<b>CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

Vigência: 23/02/2017

<b>Responsáveis técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Moriera - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013	100,0%	<b>Concluído</b>		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013	100,0%	<b>Concluído</b>		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100,0%	<b>Concluído</b>		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013	100,0%	<b>Concluído</b>		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013	100,0%	<b>Concluído</b>		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013	100,0%	<b>Concluído</b>		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014	100,0%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>51,1%</b>	<b>Em Andamento</b>		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	<b>Concluído</b>	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015	100,0%	<b>Concluído</b>		
9	<b>Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno</b>	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	27/08/2016		28/08/2015		55,7%	<b>Atrasado</b>		
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014	100,0%	<b>Concluído</b>	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015	100,0%	<b>Concluído</b>	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.	



9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015	05/08/2016		100,0%	Concluído	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 05/08/2016, ao siconv na ABA - PLANO DE TRABALHO - ANEXOS - LISTAR ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da etapa 2 - Diagnóstico Situacional
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2016	30/04/2016	R\$ 138.415,08				0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. O projeto se encontra em seu 3º Termo Aditivo. Aguardando a repactuação das datas.
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	27/03/2016	26/05/2016			17/08/2016		1,0%	Atrasado	Os técnicos Vera Lúcia Assunção e Victor Uchôa realizaram visita técnica de acompanhamento da Oficina para validação das diretrizes gerais e propostas em Salgueiro-PE ocorrida entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	27/05/2016	27/08/2016					0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. O projeto se encontra em seu 3º Termo Aditivo. Aguardando a repactuação das datas.
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 359.682,64	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 221.267,56	<b>71%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**

a) Repactuada a atividade 9.1 e 9.2

b) O conveniente solicitou prorrogação da vigência, que acatamos, para que possamos repactuar as datas.

**3º ciclo 2016.**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 06 (ex PO 09)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
<b>Projeto:</b>	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Cronograma de Desemolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	<b>R\$ 343.585,70</b>	<b>R\$ 18.140,00</b>	<b>R\$ 361.725,70</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2018	Convênio Nº 813986/2014
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsáv(e)l(e)is técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva/ Marcelo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
---	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>34,6%</b>	<b>Em Andamento</b>		
8	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convete solicitou ajustes no cronograma de desembolso	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1ª parcela
9	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	21/04/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	O processo licitatório que contempla essa atividade foi iniciado em 2015, mas devido a problemas jurídicos, não foi finalizada. Outra licitação foi iniciada e finalizada em 2016, com a contratação dos técnicos. Os mesmos já se encontram em atividades, executando as ações previstas. Portanto, Meta/Etapa concluída.	
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	05/07/2016	-	04/11/2015	Não informado	-	100%	Concluído		

11	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	05/12/2016	-	24/10/2015	-	75%	Em Andamento	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.		
12	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/11/2016	-	02/12/2015	-	40%	Em Andamento	Foram inseminadas 232 cabras, o que equivale à 464 doses de sêmen.		
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	02/12/2016	-	14/09/2015	-	40%	Em Andamento			
14	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	14/12/2016	-	27/11/2015	-	22%	Em Andamento	Foram realizados 08 cursos entre os meses de junho e julho.		
15	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	11/07/2016	13/07/2016	100%	Concluído			
16	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28			0%	Atrasado	Foi realizada visita técnica de acompanhamento do convênio em julho e solicitado ao convenente a elaboração da prestação de contas referente à 1ª parcela.	Aguardar envio da prestação de contas parcial pelo convenente, para liberação da 2ª parcela.	
17	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	13/02/2017	17/02/2016	-			0%	Atrasado			
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>0,0%</b>	<b>Atrasado</b>			
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/06/2016	29/07/2016	-			0%	Atrasado			
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 343.585,70	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 206.151,42	<b>55%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

**Observações:**

3º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 07 (ex PO 08)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais		<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.			
<b>Projeto:</b>	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	Pago até o ano anterior	R\$ 211.000,00
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	A realizar no exercício	R\$ 560.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>771.000,00</b>	<b>218.777,00</b>	<b>989.777,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 560.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 211.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>									<b>20,0%</b>		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado			100,0%	<b>Concluído</b>	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a formalização do convênio, a qual foi cumprida em toda a sua totalidade (100%)
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015			100,0%	<b>Concluído</b>	
	<b>Execução (Peso 60%)</b>									<b>22,2%</b>	<b>Em Andamento</b>	Assinado o 1º Termo Aditivo em 31.03.2016, prorrogando a vigência do convênio para 22.12.2016.
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/ SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	100,0%	<b>Concluído</b>	
9	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016			100,0%	<b>Concluído</b>	
10	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016			100,0%	<b>Concluído</b>	

11	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		23/08/2016			33,0%	Em Andamento	Realizado nesse período (23/08/2016 até 31/08/2016) um curso em Piquet Carneiro e outro em Banabuiú.
12	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016					0,0%	A iniciar	Terá início após conclusão dos cursos (item 11)
13	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016					0,0%	A iniciar	Terá início após conclusão dos cursos (item 11)
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/08/2016	19/08/2016					0,0%	Atrasado	Com a nova data de vigência do convênio, houve a necessidade repactuar nova data.
15	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00				0,0%	A iniciar	Com a nova data de vigência do convênio, houve a necessidade repactuar nova data.
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016					0,0%	A iniciar	Pregão eletrônico concluído. Aguardando a liberação da 2ª parcela de recursos financeiros para a aquisição dos animais.
<b>Encerramento - 20%</b>									<b>0,0%</b>		
17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	A iniciar	
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	A iniciar	
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 771.000,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 211.000,00	42%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

**Observações:**

3º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 08 (ex PO 10)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
<b>Projeto:</b>	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL (R\$)		
326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	Pago até o ano anterior	R\$ 326.618,00
371.625,00		jun/15	371.625,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 743.250,00
371.625,00		set/15	371.625,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>1.090.800,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 326.618,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Ricardo José Lessa Júnior (coordenador)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>			
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014	-	100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015	-	100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014	-	100%	Concluído		
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014	-	100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-			-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>34,9%</b>	<b>Em Andamento</b>		
8	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00	
9	<b>Liberação da 1ª parcela</b>	COFC /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	24/03/2015	24/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	100%	Concluído		
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015	-	100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao conveniente sobre o processo de convênio.	
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016	-	100%	Concluído		
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015	-	100%	Concluído		
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 41.750,00	Não informado	Não informado	-	100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL	

14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/03/2016	30/03/2016	-		Não informado		100%	Concluído	
15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			20%	Atrasado	Só foram adquiridos os 'tablets' dos materiais e equipamentos previstos no Plano de Trabalho (R\$ 42.155,00).
16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-				0%	Atrasado	A entidade a ser contratada para fornecer a capacitação é quem ficará responsável pela elaboração do material didático e como se encontra em processo licitatório esta etapa se encontra em atraso.
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.
18	<b>Liberação da 2ª parcela</b>	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/07/2016	R\$ 371.625,00				0%	Atrasado	
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2016	R\$ 371.625,00	15/04/2016	15/06/2016		70%	Atrasado	Foram capacitadas 200 mulheres nos cursos de auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso.
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	30/05/2016	-	15/05/2016	15/05/2016		100%	Concluído	
21	<b>Liberação da 3ª parcela</b>	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2016	<b>R\$ 371.625,00</b>				0%	A Iniciar	
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2016	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar	
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2016	-				0%	A Iniciar	
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2016	-				0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/02/2016	01/02/2017	-				0%	A Iniciar	
					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 1.069.868,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 326.618,00</b>	<b>55%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

**Observações:**

Termo Aditivo de prorrogação do convênio para encerramento em 30/12/2016.

**Na visita técnica foi discutido sobre o pagamento das bolsas estudantis às mulheres capacitandas, se por OBTV ou qual outra modalidade factível prevista em legislação**

**3º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 09 (ex PO 11)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>		<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.			
<b>Projeto:</b>	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	3330.41 e 4430.42	30	R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 458.149,49
AGO/2015	R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	R\$ 499.949,49	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 377.673,98
OUT/2015	R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	R\$ 428.743,26	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
-	R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	R\$ 928.692,75	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 377.673,98
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 458.149,49

<b>Previsão de Conclusão:</b>	10/10/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Conveniente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>7,5%</b>	<b>Em Andamento</b>		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/08/2015	31/08/2015	R\$ 458.149,49	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 458.149,49	100%	<b>Concluído</b>		
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	50%	<b>Paralisado</b>	A Conveniente informou que o processo licitatório foi cancelado e ainda não têm data prevista para ser realizado.	



8	Consolidação do Projeto	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	11/05/2016	R\$ 41.304,00	--	--	--	0%	Atrasado	
9	Elaboração de Diagnóstico	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 458.645,49	--	--	--	0%	Atrasado	
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%	Atrasado	
9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	02/09/2015	11/07/2016	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%	Atrasado	
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	03/09/2015	11/07/2016	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%	Atrasado	
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	04/09/2015	11/07/2016	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%	Atrasado	
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	05/09/2015	11/07/2016	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%	Atrasado	
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/10/2015	31/10/2015	R\$ 377.673,98	--	--	--	0%	Atrasado	
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 294.170,50	--	--	--	0%	Atrasado	
12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	02/10/2015	10/08/2016	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	Atrasado	
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	Atrasado	
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	03/10/2015	10/08/2016	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	Atrasado	
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	04/10/2015	10/08/2016	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	Atrasado	
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	10/08/2016	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	Atrasado	
15	Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	09/09/2016	R\$ 89.649,88	--	--	--	0%	A Iniciar	
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	09/09/2016	R\$ 44.922,88	--	--	--	0%	A Iniciar	
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	

O convênio foi prorrogado de ofício, tendo como nova vigência 09/09/2016. Foi inserida, em 18/02/2016, no SICONV uma "Solicitação de Esclarecimento", na qual foi pedido que a Convenente apresentasse relatório descritivo do andamento deste Convênio 813695/2014. Foi concedido o prazo até o dia 26/02/2016 para que este relatório fosse apresentado, mas, até a data limite deste PO, a "Solicitação" ainda não havia sido respondida, nem o solicitado relatório constatado no SICONV. Em 17/03/2016, a Convenente inseriu no SICONV o Ofício/GS/ nº 0173/2016, no qual apresenta duas alternativas de orçamentos para o projeto para a análise deste SUDENE. A equipe técnica posicionou-se contra as duas proposições apresentadas pela Convenente. Foi encaminhado um ofício à SEIRHMACT indicando o posicionamento da equipe técnica, bem como solicitando o agendamento de uma reunião presencial com os representantes da SEIRHMACT/PB, para tomada de decisão quanto aos encaminhamentos a serem adotados.

Foi realizada uma reunião entre os gestores da SUDENE e da SEIRHMACT/PB, em João Pessoa/PB, em 04/08/2016, quando ficou acordado que seria concedida uma ampliação do prazo de vigência deste convênio por mais 180 dias para que a Convenente tentasse solucionar as pendências encontradas. O processo foi encaminhado para providências do termo aditivo, entretanto até a data desta atualização deste 3º ciclo não havia sido concluído este processo.

<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	10/11/2016	10/10/2017					0%	<b>A Iniciar</b>	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 835.823,47	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 458.149,49	<b>28%</b>	<b>Paralisado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

**Observações:**

O 1º Termo de Prorrogação de Ofício foi assinado em 05/11/2015, prorrogando a vigência do Convênio para 09/09/2016.

**3º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 10 (ex PO 12)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2009
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
<b>Objetivo da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.			
<b>Projeto:</b>	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Articular e coordenar o planejamento energético regional.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	9.452.840,00	9.452.840,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 952.322,32
A realizar no exercício	R\$ 3.100.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 3.100.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 952.322,32

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Moreira - SUDENE
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CIM	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100,0%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas -	DPLAN/CGDS/CIM	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100,0%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CIM	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100,0%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100,0%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013	Sem ônus	100,0%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.

6	Articulações com a (EPE) UFCG para a elaboração do Balanço Energético Regional 2015/2016 (digital) e apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais	DPLAN/CGDS/CIM	01/12/2012	30/12/2016	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013				<b>Cancelado</b>	Esse plano operativo foi estruturado como um programa com o objetivo de realizar a estruturação de um sistema de informações energéticas formalizando parcerias e projetos com as diversas instituições especializadas nesse tema. Suas ações se iniciaram em 2009 com a formalização de um acordo de cooperação técnica com a EPE, responsável por realizar anualmente o Balanço Energético Nacional. A partir desse acordo foram realizadas diversas atividades com a CER/UFPE, com ATECEL/UFCG, com o GT Regional de Planejamento Energético entre outros. A última ação a ser finalizada nesse PO foi etapa nº 6 "Articulações com a (EPE) UFCG para a elaboração do Balanço Energético Regional 2015/2016 (digital) e apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais". Com as mudanças de gestão, e de perspectivas políticas, e pela sinalização do interesse dos estados em se priorizar o balanço energético regional, não foi possível apoiar a execução dos balanços energéticos estaduais. Entretanto, a CGDS articulou com a UFCG para apoio ao projeto do balanço energético regional, a ser formalizado ainda este ano. Diante desses fatos, a coordenação entende que este PO está finalizado.	
7	Formalização de Cooperação Técnica com a UFPE, para realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CIM	01/03/2013	30/04/2015	R\$ 600.000,00	19/06/2013	27/11/2015	R\$ 599.482,32	100,0%	<b>Concluído</b>	Identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região. Formalizados 2 (dois) TED's com o CER/UFPE	Termos de Execução Descentralizada com o Centro de Energias Renováveis/UFPE - 1)Solar:" Estudo das características de geração de células orgânicas e módulos fabricados no Brasil"; 2) Eólica:" Anteprojeto da área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída".
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_ Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnicas para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014	25/09/2015	Sem ônus	100,0%	<b>Concluído</b>	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.
					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 5.052.840,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 952.322,32</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**Obs.** 4º Ciclo 2015 - Repactuada a atividade 6, 7 e 8

Os recursos previstos na etapa 6 são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

**3º Ciclo 2016 - PO finalizado**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 11 (ex PO 13)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar	
<b>Finalidade da ação:</b>	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos			
<b>Projeto:</b>	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adquirir frota de equipamentos agrícolas(plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 250.000,00	R\$ 266.400,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 250.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	03/08/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Agrimon Marcos Brasileiro Lima/SUDENE - Marcelo Viana/Município de Currais Novos/RN.
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		11/06/2013	16/01/2014	-	13/06/2013	31/12/2014	-	20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013	-	100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013	-	31/12/2014	31/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014	-	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		31/12/2013	05/06/2015	R\$ 266.400,00	31/01/2014	22/08/2014	R\$ 266.400,00	60%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	31/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
10	<b>Meta 1</b>		31/12/2013	05/06/2015	R\$ 266.400,00	16/07/2014	22/08/2014	R\$ 266.400,00	100%	Concluído		
10.1	Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 196.000,00	16/07/2014	16/07/2014	R\$ 196.000,00	100%	Concluído		
10.2	Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 34.400,00	21/08/2014	21/08/2014	R\$ 34.400,00	100%	Concluído		
10.3	Grade aradora(02 Unid.)	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 36.000,00	22/08/2014	22/08/2014	R\$ 36.000,00	100%	Concluído		

ENCERRAMENTO (Peso 20%)			04/08/2015	03/08/2016	-			-	0%	Atrasado		
11	Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	31/03/2016	09/06/2016	-			-	0%	Atrasado	A visita técnica foi prejudicada por falta de recursos financeiros e humanos.	Está sendo feito um planejamento para dar prioridade a curto prazo à visita técnica.
12	Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/08/2015	03/08/2016	-			-	0%	Atrasado	Laudo Técnico depende da visita "in loco".	Está sendo feito um planejamento para dar prioridade, a curto prazo, à visita
					R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 250.000,00	80%	Atrasado	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:**

Município de Currais Novos/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013;  
(2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.  
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.

3º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 12 (ex PO 14)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.	
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos			
<b>Projeto:</b>	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 852.088,92	R\$ 905.088,92
				852.089	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 700.000,00
R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 152.088,92	R\$ 15.000,00		R\$ 167.088,92	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
<b>R\$ 852.088,92</b>	<b>R\$ 53.000,00</b>		<b>R\$ 905.088,92</b>	Valor liberado no Exercício	R\$ 152.088,92
				Saldo a liberar	R\$ 147.911,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 852.088,92

<b>Previsão de Conclusão:</b>	15/11/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.
---	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>30/09/2013</b>	<b>14/01/2014</b>	<b>-</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>09/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/2013	02/10/2013	-	03/04/2014	03/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/2013	12/12/2013	-	30/09/2013	12/12/2013		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/2013	26/12/2013	-	23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/2014	14/01/2014	-	09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>30/12/2013</b>	<b>30/10/2016</b>	<b>R\$ 1.053.000,00</b>	<b>05/02/2014</b>		<b>R\$ 905.088,92</b>	<b>52%</b>	<b>Concluído</b>		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 23.000,00	05/02/2014	05/02/2014	R\$ 23.000,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 400.000,00	13/02/2014	13/02/2014	R\$ 400.000,00	100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/03/2015	30/03/2015	R\$ 15.000,00	07/04/2015	07/04/2015	R\$ 15.000,00	100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/11/2015	30/11/2015	R\$ 300.000,00	18/11/2015	18/11/2015	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		
12	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/12/2015	30/12/2015	R\$ 15.000,00	27/05/2016	27/05/2016	R\$ 15.000,00	100%	Concluído		
13	Liberação da 3ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/08/2016	30/08/2016	R\$ 152.088,92	05/08/2016	15/08/2016	R\$ 152.088,92	100%	Concluído	Ver Observação (2)	
14	<b>Meta 1 - Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.</b>	Município de Saboeiro	<b>30/12/2013</b>	<b>16/09/2016</b>	<b>R\$ 1.053.000,00</b>	<b>28/02/2014</b>		<b>R\$ 905.088,92</b>	<b>95%</b>	<b>Em Andamento</b>	Ver Observação (1)	
15	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/2016	30/10/2016	-			-	0%	A Iniciar		

	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>		<b>15/11/2016</b>	<b>15/11/2017</b>	-				<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/11/2016	15/11/2017					0%	<b>A Iniciar</b>	Ver Observações (3) e (4)
					<b>R\$ 852.088,92</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 852.088,92</b>	<b>72%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Município de Saboeiro/CE

**Observações:**

- (1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R\$ 905.088,92.
- (2) Há um saldo de R\$ 147.911,08 a desembolsar, que só será liberado, caso alguma implementação no projeto seja aprovada pela equipe da CGDS. Caso contrário, o valor não será utilizado e devolvido.
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.

**3º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

<b>Legenda</b>	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 13 (ex PO 16)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
<b>Projeto:</b>	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>R\$ 20.540,15</b>		<b>R\$ 420.540,15</b>	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 200.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>03/11/2017</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>31/08/2016</b>

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>24/02/2014</b>	<b>15/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>24/02/2014</b>	<b>09/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>01/12/2014</b>	<b>30/10/2016</b>	<b>R\$ 420.540,15</b>	<b>02/02/2015</b>		<b>R\$ 123.500,00</b>	<b>31%</b>	<b>Em Andamento</b>		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 10.000,00	02/02/2015	02/02/2015	R\$ 10.000,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
10	<b>Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1</b>	Município de Jardim de Piranhas	<b>23/12/2014</b>	<b>15/07/2016</b>	<b>R\$ 210.000,00</b>	<b>15/02/2016</b>		<b>R\$ 123.500,00</b>	<b>59%</b>	<b>Atrasado</b>	Até a data desta apuração só haviam sido gastos aproximadamente R\$ 123.500,00	O município está sendo cobrado para que agilize a execução das obras / Foi aprovado Aditamento de Vigência por mais 150 dias
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016	R\$ 10.540,15	13/07/2016	13/07/2016	R\$ 10.540,00	100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00				0%	Atrasado	A liberação da 2ª parcela está condicionada à conclusão da meta 1, pelo município, o que não ocorreu até a presente data.	O município está sendo cobrado para que agilize a execução das obras / Foi aprovado Aditamento de Vigência por mais 150 dias
13	<b>Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2</b>	Município de Jardim de Piranhas	<b>20/07/2016</b>	<b>04/09/2016</b>	<b>R\$ 210.540,15</b>				<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	A liberação da 2ª parcela está condicionada à conclusão da meta 1, pelo município, o que não ocorreu até a presente data.	O município está sendo cobrado para que agilize a execução das obras / Foi aprovado Aditamento de Vigência por mais 150 dias

14	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/2016	30/10/2016	-			-	0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>			<b>29/12/2016</b>	<b>03/11/2017</b>	-				<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/12/2016	03/11/2017	-				0%	A Iniciar		
					<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>51%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Município de Jardim de Piranhas/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014
- (2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.
- (6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.
- (7) Foi solicitado Aditamento da Vigência do convênio por mais 150 dias, a contar da vigência anterior

**3º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 14 (ex PO 17)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
<b>Projeto:</b>	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>		<b>R\$ 310.000,00</b>	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 150.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>18/11/2017</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>31/08/2016</b>

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
--	---

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>06/03/2014</b>	<b>15/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>06/03/2014</b>	<b>08/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1 Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído		
2 Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
3 Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4 Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
5 Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído		
6 Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído		
7 Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>01/12/2014</b>	<b>19/09/2016</b>	<b>R\$ 310.000,00</b>	<b>04/02/2015</b>		<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>42%</b>	<b>Concluído</b>		
8 Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 5.000,00	04/02/2015	04/02/2015	R\$ 5.000,00	100%	Concluído		
9 Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10 <b>Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1</b>	Município de Messias Targino/RN	<b>05/12/2014</b>	<b>17/08/2016</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>28/07/2015</b>	<b>25/05/2016</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
11 Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015	R\$ 5.000,00	15/04/2016	15/04/2016	R\$ 5.000,00	100%	Concluído		
12 Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	05/06/2016			90%	Em Andamento		
13 <b>Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2</b>	Município de Messias Targino/RN	<b>01/07/2016</b>	<b>19/09/2016</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>				<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	Ver Observação (8)	
14 Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/2016	30/10/2016	-			-	0%	A Iniciar		

ENCERRAMENTO (Peso 20%)		18/11/2016	18/11/2017					0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	18/11/2016	18/11/2017					0%	A Iniciar	Ver Observação (7)
Valor Previsto:				R\$ 300.000,00	Valor realizado:			R\$ 150.000,00	62%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Município de Messias Targino/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014
- (2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
- (4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.
- (6) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho
- (7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (8) Foi efetuada Prorrogação de Ofício por 33 dias, alterando a data de vigência do convênio para o dia 19/09/2016; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV
- (9) Foi solicitado Aditamento de Vigência por mais 120 dias, a contar do 19/09/2016

**3º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 15 (ex PO 18)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Contexto de fragilidade socioeconômica em que vivem as populações de pescadores e pescadoras artesanais no município de Goiana-PE. Organização coletiva precária e dependência de atravessadores.		
<b>Projeto:</b>	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover maior inclusão produtiva dos pescadores e pescadoras, permitindo que tenham maior autonomia sobre o seu trabalho e oferecer um produto com maior valor agregado.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 4	30	534.417,84	539.816,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/03/2018	Convênio Nº 822608/15
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
fev/16	377.417,84	5.398,16	382.816,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
jun/16	157.000,00		157.000,00	A realizar no exercício	R\$ 534.417,84
<b>TOTAL</b>	<b>534.417,84</b>	<b>5.398,16</b>	<b>539.816,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 534.417,84
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / Vera Lúcia Assunção/ SEMAS - Rafael Siqueira
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	01/07/2015	06/09/2015		01/07/2015	06/09/2015		100,0%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	01/07/2015	06/09/2015		27/08/2015	27/08/2015		100,0%	Concluído	
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		27/08/2015	01/10/2015		100,0%	Concluído	
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		01/10/2015	10/11/2015		100,0%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		11/11/2015	24/11/2015		100,0%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	30/12/2015		100,0%	Concluído	
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		30/12/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído	
<b>Execução (Peso 60%)</b>											
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COFC/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 377.417,84				0,0%	Cancelado	
9	Realizar 03 mapeamentos da cadeia produtiva das comunidades.	SEMAS/PE	01/02/2016	30/04/2016					0,0%	Cancelado	
10	Realizar 09 oficinas de capacitação, 03 por comunidade, com cessão de uso às associações dos bens e materiais adquiridos	SEMAS/PE	01/05/2016	31/06/2016					0,0%	Cancelado	
11	Elaborar 03 planos de gestão dos bens adquiridos, 01 por comunidade	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	Cancelado	
11.1	Aquisição dos bens e planejamento de sua gestão com	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	Cancelado	
11.2	Construção ou reforma de estrutura física para abrigar os bens adquiridos	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	Cancelado	
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado					0,0%	Cancelado	

15	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 157.000,00				0,0%	Cancelado	
16	Realização de 21 visitas técnicas de acompanhamento dos três primeiros meses de	SEMAS/PE	01/09/2016	30/11/2016					0,0%	Cancelado	
<b>Encerramento - 20%</b>									<b>0,0%</b>	Cancelado	
17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado					0,0%	Cancelado	
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	30/03/2017	30/03/2018					0,0%	Cancelado	
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 534.417,84	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 0,00	20%	Cancelado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

SEMAS - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 16 (ex PO 19)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
<b>Projeto:</b>	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58

Cronograma de Desemboço (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/2016	<b>TED 05/2015</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	<b>Vigência: 27/11/2016</b>

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Prof. Alexandre Costa (Telefone: 2126-7326/ 99706-9585)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado	100%	<b>Concluído</b>	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015	100%	<b>Concluído</b>		
3	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015	100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado	100%	<b>Concluído</b>	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015	100%	<b>Concluído</b>	Parecer N° 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015	100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado	100%	<b>Concluído</b>		
8	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado	100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>8,0%</b>	<b>Em Andamento</b>		
9	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	<b>Concluído</b>	
10	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016				0%	<b>Atrasado</b>	Aguardando relatórios parciais de execução da UFPE.	
11	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016		3/12/2015		20%	<b>Em Andamento</b>		
12	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	01/05/2016				0%	<b>Atrasado</b>		
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir				0%	<b>A iniciar</b>		
14	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	31/7/2016				0%	<b>Atrasado</b>		

15	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2019	1/11/2016					0%	A iniciar	
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir					0%	A iniciar	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	27/12/2016					0%	A iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A iniciar</b>	
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17					0%	A iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 277.371,58	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 277.371,58	<b>28%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

UFPE - Centro de energias renováveis

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 17 (ex PO 20)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
<b>Projeto:</b>	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	Pago até o ano anterior	R\$ 322.110,74
			R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 322.110,74

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/2016	<b>TED</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	<b>Vigência: 27/11/2016</b>

<b>Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>									<b>20,0%</b>		
1	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015			29/06/2015				100%	<b>Concluído</b>	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;
2	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015			100%	<b>Concluído</b>	
3	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015			100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN
4	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015			12/11/2015				100%	<b>Concluído</b>	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED
5	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015			100%	<b>Concluído</b>	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU
6	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015			100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN
7	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015			27/11/2015				100%	<b>Concluído</b>	
8	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015			02/12/2015				100%	<b>Concluído</b>	
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>									<b>19,3%</b>		
9	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74		100%	<b>Concluído</b>	
10	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016						0%	<b>Atrasado</b>	
11	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016		3/12/2015				20%	<b>Em Andamento</b>	

12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2016		3/12/2015			50%	Atrasado	A UFPE e o CSEM ainda não formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica, com isso, algumas etapas foram atrasadas. Todavia foram disponibilizados as células e os módulos fotovoltaicos para os ensaios.
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia 14 de junho foi realizada uma visita técnica de acompanhamento no Centro de Energias Renováveis. Foi constatado que, embora enfrentando dificuldades iniciais para a realização da parceria com o CSEM, o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	31/09/2016		1/1/2016			20%	Em Andamento	
15	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2019	1/11/2016					0%	A Iniciar	
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado					0%	A Iniciar	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	27/12/2016					0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17					0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 322.110,74	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 322.110,74			<b>39%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

Parceiros institucionais:

Observações:

3º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 18</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
<b>Projeto:</b>	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL		
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
			R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2016	<b>Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	
<b>Vigência: 31/12/2016</b>		

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	CGDS / SUDENE	Carlos Almiro Moreira Pinto / Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015	100%	<b>Concluído</b>		
2	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015	100%	<b>Concluído</b>		
3	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015	100%	<b>Concluído</b>		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015	100%	<b>Concluído</b>		
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015	100%	<b>Concluído</b>		
	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
6	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>32,4%</b>	<b>Em Andamento</b>		
9	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	<b>Concluído</b>	
10	<b>Mobilização e Planejamento</b>	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado	100%	<b>Concluído</b>	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da	

10.1	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016	12/02/2016	Não informado	100%	Concluído	iniciando a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.HSF
11	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	100%	Concluído	A SUDENE participou do <b>Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos</b> indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.
12	<b>Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF</b>	<b>MMA</b>	<b>12/05/2016</b>	<b>13/09/2016</b>	<b>08/03/2016</b>		78%	Em Andamento	
12.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016	08/03/2016		80%	Atrasado	Foi apresentada pelo consórcio de empresas uma versão deste diagnóstico, que analisada pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA), instituída por portaria interna do MMA, tendo sido devolvido à empresa contratada para ajustes/complementações.
12.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016	22/04/2016	18/07/2016	100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
12.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	04/08/2016	16/07/2016		80%	Atrasado	Foi apresentada pelo consórcio de empresas uma versão deste diagnóstico, que analisada pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA), instituída por portaria interna do MMA, tendo sido devolvido à empresa contratada para ajustes/complementações.
12.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	13/09/2016	05/08/2016		50%	Em Andamento	Esta Etapa esta diretamente relacionada à conclusão das três Etapas anteriores.
13	<b>Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF</b>	<b>MMA</b>	<b>14/09/2016</b>	<b>13/10/2016</b>			0%	A Iniciar	
13.1	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	13/10/2016			0%	A Iniciar	
14	<b>Sistematização e divulgação dos resultados</b>	<b>MMA</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>12/11/2016</b>			0%	A Iniciar	
14.1	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	02/11/2016			0%	A Iniciar	
14.2	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	12/11/2016			0%	A Iniciar	
15	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	A definir	A definir			0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>							<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

A vigência do contratado realizado entre o MMA com o consórcio de empresas responsável pela atualização do Diagnóstico do MacroZEE da BHSF foi ampliada para **12/11/2016**, daí implicando na repactuação das datas de execução das Metas/ Etapas.

16	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	08/11/2016	09/01/2017					0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 459.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 459.000,00	52%	Em Andamento	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		<b>Número do Projeto:</b>	PO 19 (ex PO 21)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	<b>Eixo temático (MI):</b>	Assegurar proteção civil	
<b>Ação:</b>	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres	
<b>Finalidade da ação:</b>	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrópicos, causando danos e prejuízos às populações.			
<b>Projeto:</b>	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para Paraíba.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL
dez/12	167.999,61	25.421,91	193.421,52
fev/13	60.797,60	--	60.797,60
-	<b>228.797,21</b>	<b>25.421,91</b>	<b>254.219,12</b>

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 167.999,61
A realizar no exercício	R\$ 60.797,60
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 60.797,60
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 167.999,61

<b>Previsão de Conclusão:</b>	09/09/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE/ Juliana Borges e Marcélio de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>												
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		100,0%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100,0%	Concluído		
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>												
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	100,0%	Concluído		
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50,0%	Paralisado		
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100,0%	Concluído		
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0,0%	Paralisado		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	Paralisado		
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R\$ 60.797,60				0,0%	Paralisado		
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14					0,0%	Paralisado	Processo em tramitação na Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas, para devolução dos recursos financeiros não aplicados.	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>												
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	09/09/15					0,0%	Paralisado		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 228.797,21	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 167.999,61	41%	Paralisado	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros Institucionais:</b>	Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
<b>Observações:</b>	Obs.: De acordo com o técnico Marcelo Viana, o projeto será cancelado por dificuldades de execução
<b>3º ciclo 2016</b>	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE**  
**METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2015 - 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 20 Meta Inst.
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias e arranjos produtivos e Promover a sustentabilidade ambiental		<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	Ação interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar desigualdades regionais	
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais	
<b>Finalidade da ação:</b>	"META INSTITUCIONAL - 2015/2016"			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Café com Sustentabilidade Restauração e Manejo Florestal: Perspectivas para o Semiárido			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Discutir sobre ações envolvendo os recursos florestais na região semiárida, com atividades produtivas capazes de contribuir para a conservação, preservação e a recuperação ambiental, assim como o uso sustentável de seus recursos naturais como fonte de renda para os atores locais e contribuição para a matriz energética da região, objetivando a busca do desenvolvimento sustentável.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016
<b>Atualização do PO:</b>	Teresa e Renato

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto (SUDENE)</b>	Vera Lúcia Assunção, Maria Helena, Maria do Socorro Vilar, José Aildo, Teresa Oliveira, Renato Vaz,Victor Uchoa
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Planejamento da Oficina								20%	Concluído	
1.1	Articulação com Insituições para discutir proposta do Café com Sustentabilidade	Vera Lúcia Assunção, Teresa Oliveira, Renato Vaz, Isis Guimarães, José Aildo, Maria Helena, Carlos Almiro, Maria do Socorro e Victor Uchôa	28/06/2016	22/07/2016		28/06/2016	22/07/2016		100%	Concluído	Reunião no dia 28/06 com a ONG CEPLAN para compartilhamento de experiência com APL da Restauração Florestal no NE. Reunião no dia 22/07 interna para definição do objetivo, levantamento de possíveis convidados e elaboração da programação.
1.2	Elaboração da Proposta/Nota Técnica	Teresa Oliveira, Renato Vaz, Victor Uchôa, José Aildo, Socorro Vilar	22/07/2016	29/07/2016		22/07/2016	06/08/2016		100%	Concluído	Reuniões internas para elaboração da Nota Técnica e Programação. Revisão da Nota Técnica a partir da discussão entre os Coordenadores e técnicos da CGDS. Reunião no dia 03/08/2016 com o CEPAN para ajuste da proposta de apresentação no Café. Inserção na Nota Técnica de instituições a serem convidados para o evento.
2	Preparação								20%	Concluído	
2.1	Alinhar conteúdos	Aildo, Renato, Victor, Teresa, Socorro, Vera Lúcia, Maria Helena, Carlos Almiro	28/06/2016	12/08/2016		28/06/2016	12/08/2016		100%	Concluído	Reuniões internas de discussão da proposta entre técnicos e coordenadores da CGDS. Reuniões e e-mail entre a CGDS e os parceiros para discutir a proposta. Elaboração de Nota Técnica com discUssão sobre o conteúdo do Café para subsidiar as discussões internas sobre o tema proposto.

2.2	Revisar/ajustar proposta/Apresentação do Evento	Vera, Maria Helena, Almiro, Aildo, Renato, Teresa e Victor	25/07/2016	15/08/2016	25/07/2016	19/08/2016	100%	Concluído	Revisão de Nota Técnica sobre a Restauração Florestal após discussão entre técnicos e coordenadores da CGDS. Elaboração de Apresentação para abertura do Evento.
2.3	Serviços (logística e infraestrutura)	Teresa, Vera, Aildo, Renato, Socorro e ASCOM/SUDENE	25/07/2016	29/07/2016	05/08/2016	12/08/2016	100%	Concluído	Reunião com a ASCOM para apresentação a Nota Técnica que contém a proposta do evento e solicitar a confecção de convite, cartaz e matéria de divulgação para intranet/SUDENE. Reuniões e e-mails para ajuste do material elaborado. Reserva do auditório para realização do evento. Elaboração de Convite para os palestrantes e demais convidados externos. Elaboração de Certificados para os palestrantes
2.4	Divulgar evento / Realização dos convites	Victor, Teresa, Renato, Maria Helena, Socorro e Aildo	27/07/2016	17/08/2016	01/08/2016	18/08/2016	100%	Concluído	Elaboração de lista de convidados (email e telefone), elaboração (minuta de convite) e realização de convites para instituições que têm missão relacionada ao tema da Restauração e Manejo Florestal no Semiárido. Realizar convite para o Gabinete, as Diretorias e Coordenações-gerais da SUDENE. Divulgação do evento na Intranet para todos os servidores da SUDENE.
3	Execução						50%	Concluído	
3.1	Realizar o evento	CGDS	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	100%	Concluído	Evento realização conforme programação prevista.
3.2	Participar/acompanhar as atividades	CGDS	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	100%	Concluído	Apoio na organização da logística e relatoria das discussões das atividades previstas na programação.
4	Encerramento						10%	Concluído	
4.1	Consolidar registros	José Aildo	11/08/2016	29/08/2016	11/08/2016	29/08/2016	100%	Concluído	Elaboração de relatório com a sistematização do material produzido pelo evento (lista de presença, conteúdo discutido, imagens, anexos).
			Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:		100,0%	Concluído	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

PARCEIROS DO PROJETO: CEPAN e APNE

**Observações:**

3º ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE  
METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2015 - 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 21 Meta Inst.
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	Ação interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar desigualdades regionais		
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais		
<b>Finalidade da ação:</b>	"META INSTITUCIONAL - 2015/2016"				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto		
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Café com Sustentabilidade "Rotas da Integração Prioritárias no Nordeste"				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Apresentar e discutir com a equipe Técnica da SUDENE o estudo realizado pelo Consultor Paulo Cavalcanti sobre os APLs no NE e as estratégias de Rotas da Integração para o MI, bem como a atuação da SUDENE na promoção da inclusão produtiva na sua área de atuação				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016
<b>Atualização do PO:</b>	Teresa Oliveira e Isis Guimarães

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto (SUDENE)</b>	Vera Lúcia Assunção, Socorro Vilar e Isis Guimarães
---	---

	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento da Oficina	Vera Lúcia Assunção	09/12/2015	28/04/2016	Diária da Servidora Vera Lúcia Assunção	09/12/2015	28/04/2016		20%	Concluído	A motivação inicial decorre da videoconferência de apresentação dos resultados parciais do estudo " rotas prioritárias para a macrorregional Nordeste" no dia 06/08/2015, pelo professor Paulo Cavalcanti, consultor da Rede Sist contratado pelo MI .Após esse início, foram feitas várias articulações com o Professor, incluindo a participação da Coordenadora de Desenvolvimento Territorial, Vera Lúcia Assunção na 7ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais em Brasília nos dias 09 e 10 de dezembro 2015..	
1.1	Articulação e elaboração da Proposta	Vera Lúcia Assunção e Isis Guimarães	22/03/2016	11/05/2016		22/03/2016	11/05/2016		100%	Concluído	Para a proposta do encontro foram mandados e-mails, no período de março/2016 a maio/2016, bem como encontros durante a Oficina de trabalho Nordeste "Agenda para o Desenvolvimento" realizada pela Sudene nos dias 14 e 15 de abril de 2016. Foi também realizada articulação dos servidores Socorro Vilar, Renato Vaz e Isis Moreira, em evento sobre APLs na UFRPE em abril.	
0	Formalização da proposta para Diretoria	Carlos Almiro e Sérgio Alencar	11/05/2016	12/05/2016		11/05/2016	12/05/2016		100%	Concluído	Preparação de nota técnica para a realização do encontro de apresentação e debate das rotas mapeadas e prioritárias para o Nordeste.	
2	Preparação								20%	Concluído		
2.1	Convite para o palestrante	Isis Guimarães e Carlos Almiro	11/05/2016	12/05/2016		11/05/2016	12/05/2016		100%	Concluído		
2.2	Serviços (logística e infraestrutura)	Diretoria de Adm (CGGP) e CGDS	10/05/2016	16/05/2016	Diárias (1,5) para o prof. Paulo Cavalcanti	10/05/2016	16/05/2016		100%	Concluído	Foi feita articulação com a Diretoria de Administração e Coordenação de Gestão de Pessoas e elaborado Memorando para as diárias do Prof. convidado.	

2.3	Divulgar evento	Ascom e CGDS	13/05/2016	20/05/2016				100%	Concluído	Em articulação com a ASCOM, foi realizada a arte e o convite do evento em tela.	
3	Execução							50%	Concluído		
3.1	Realizar o evento	CGDS	20/05/2016	20/05/2016		20/05/2016	20/05/2016	100%	Concluído		
3.2	Participar/acompanhar as atividades	CGDS	20/05/2016	25/05/2016		20/05/2016	25/05/2016	100%	Concluído	Após o evento, foram enviados o material produzido para o Prof. Convidado, matéria na Intranet e fotos.	
4	Encerramento							10%	Concluído		
4.1	Relatório Final	Isis Moreira e Maria do Socorro Vilar	30/05/2016	15/09/2016		30/05/2016	03/08/2016	100%	Concluído	Elaboração de relatório com a sistematização do material produzido pelo evento (lista de presença, conteúdo discutido, imagens, anexos).	
			Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

UFPB/ REDESIST

**Observações:**

3º ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2015 - 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	4. Fortalecer a imagem da Sudene			<b>Número do Projeto:</b>	PO 22 Meta Inst.
<b>Objetivo estratégico:</b>	4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	Ação Interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	Não se aplica		
<b>Ação do PPA:</b>	Ação Interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Não se aplica		
<b>Objetivo da ação:</b>	Realizar um encontro "Café com sustentabilidade" com servidores da SUDENE e parceiros estratégicos para discutir ações programas e projetos de cunho ambiental				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN/CGDS	<b>Subunidade responsável:</b>	CGDS		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto		
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	"Café com Sustentabilidade" - Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Tema 7 - Acesso à Energia				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar um encontro "Café com sustentabilidade" com o tema os objetivos do desenvolvimento sustentável - 7 : Acesso a energia				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016
<b>Atualização do PO:</b>	Isis Moreira

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muller
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Reunião interna - definição de temas e especialistas convidados	Equipe cgds	09/06/2016	19/06/2016		09/06/2016	19/06/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	A definição do assunto do café com sustentabilidade teve motivação na recente definição da ONU para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.		
2	Articulação com os especialistas convidados e definição de data	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	19/06/2016	30/06/2016		19/06/2016	30/06/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	Foram feitos contatos telefônicos e enviados e-mails para os Professores convidados		
3	Elaboração e envio dos convites para os especialistas	Sérgio / Carlos Almiro	27/06/2016	07/07/2016		27/06/2016	27/06/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído			
4	Elaboração da programação	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	01/07/2016	14/07/2016		01/07/2016	14/07/16	R\$ 0,00	100%	Concluído			
5	Reuniões e articulação com ASCOM para organização do evento	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	04/07/2016	06/07/2016		04/07/16	06/07/16	R\$ 0,00	100%	Concluído			
6	Elaboração de material gráfico	Ascom	06/07/2016	12/07/2016		13/07/2016	25/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído			
7	Divulgação interna e parceiros externos	Ascom e Equipe CGDS	06/07/2016	29/07/2016		06/07/2016	29/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	Outras instituições foram convidadas: IBGE, CODEVASF, IBAMA		
8	Elaboração da apresentação CGDS	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	18/07/2016	21/07/2016		25/07/2016	27/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído			
9	Realização do café com sustentabilidade	Equipe cgds	29/07/2016	29/07/2016		29/07/2016	29/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído			
10	Registro do evento	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	29/07/2016	15/09/2016		01/08/2016		R\$ 0,00	90%	Em Andamento			
			<b>Valor Previsto:</b>			R\$ -	<b>Valor realizado:</b>			R\$ -	99,0%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

UFPE, UFPB

**Observações:**

3º ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE  
METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2015 - 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 23 Meta Inst.
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias e arranjos produtivos	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	Ação interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	Não se aplica
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Não se aplica
<b>Finalidade da ação:</b>	"META INSTITUCIONAL - 2015/2016"		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	A biomassa tem um papel de extrema relevância no Nordeste, especialmente no semiárido, gerando renda e energia na Região. Contudo, a extração desse recurso é feita de maneira informal e desordenada, aumentando a pressão sobre o bioma. Além disso, a população que sobrevive e se utiliza dessa atividade produtiva é tratada muitas vezes de forma marginalizada e criminalizada. Crescem os estudos e as discussões sobre a inserção sustentável da biomassa na matriz energética. A Sudene como promotora do desenvolvimento sustentável e incluída em sua área de atuação tem o papel de articular os principais atores desse tema para definição de uma estratégia regional.		
<b>Projeto:</b>	I Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Apresentar estudos de demanda e oferta e a inserção da biomassa na socioeconomia regional, promover o debate e estabelecer parcerias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
-	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016
<b>Atualização do PO:</b>	Maria Helena, Victor e Isis

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto (SUDENE)</b>	Maria Helena, Victor Uchôa Silva, Isis Guimarães e Aildo Sabino
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>	<b>Planejamento da Oficina</b>								<b>16%</b>	<b>Em Andamento</b>		
1.1	Definição de temas e possíveis parceiros	CGDS/CIM	05/08/2016	31/08/2016		05/08/2016	30/08/2016		100%	<b>Concluído</b>		
1.2	Articulação com instituições parceiras e especialistas convidados	Maria Helena, Victor, Isis, Aildo	11/08/2016	16/09/2016		11/08/2016			60%	<b>Em Andamento</b>	1) Foi realizada uma reunião de trabalho, no dia 11/08/2016 com Chico Barreto Campello, que atualmente é Superintendente do Ibama/PE para discutir os desdobramentos do encontro ocorrido na Sudene no dia 01/06/2016 : "Estudos para inserção da biomassa florestal nativa na sócio economia do Nordeste: Matriz Energética" . 2) No dia 13/09/2016 foi realizada um reunião de planejamento com o PNUD/IBAMA para a formulação do Encontro de Energia e Meio Ambiente sobre a Inserção da Biomassa Florestal no Nordeste	
1.3	Planejamento de programação	Maria Helena, Victor Uchôa, Isis Guimarães, Renato Vaz e Aildo Sabino	15/08/2016	14/09/2016		05/09/2016			80%	<b>Em Andamento</b>		
<b>2</b>	<b>Preparação</b>								<b>0%</b>			
2.1	Elaboração e envio de convites institucionais	CGDS	14/09/2016	19/09/2016					0%	<b>A Iniciar</b>	Instituições convidadas: PNUD/IBAMA, Órgãos Estaduais, CEPIS, APNE, IABS, UFCG, EPE, IICA, MMA, Universidade Politécnica de Madri etc	
2.2	Organização logística - Coffe-break (PNUD/IBAMA), áudio e som, reserva de sala.	CGDS e ASCOM	14/09/2016	19/09/2016					0%	<b>A Iniciar</b>		
2.3	Elaboração de material de divulgação	ASCOM	14/09/2016	19/09/2016					0%	<b>A Iniciar</b>		
2.4	Mobilização e Divulgação do evento	CGDS/CIM	14/09/2016	28/09/2016					0%	<b>A Iniciar</b>		

3	Execução								0%				
3.1	Realizar o evento	CGDS/CIM	27/09/2016	27/09/2016					0%				
3.2	Participar/acompanhar as atividades	CGDS/CIM	27/09/2016	27/09/2016					0%	A Iniciar			
4	Encerramento								0%				
4.1	Elaboração de registro final	Maria Helena, Victor Uchôa, Isis Guimarães, Renato Vaz e Aildo Sabino	28/09/2016	30/09/2016					0%	A Iniciar			
					Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	16,0%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

PNUD/IBAMA

**Observações:**

3º ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 24 (ex PO 21)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
<b>Projeto:</b>	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação, para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Convênio	857.015,99	965.632,35

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
274.405,33	108.616,36	Mai/2013	383.021,69	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>857.015,99</b>	<b>108.616,36</b>	-	<b>965.632,35</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 857.015,99

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/06/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santana Alves

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012	Não se aplica	100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013	Não se aplica	100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	Providenciado
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Licitações realizadas (100%)
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Vistoria realizada	
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada	Liberado em 16/12/2014

8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada	Prorrogado para 31/07/2015
9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2015					0%	Cancelado	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	A SEDETEC/SE enviou o Relatório atualizado em 29/05/2015, sendo constatado neste relatório, bem como no SINCONV, que o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2o Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015		27/07/2015	27/07/2015	Não se aplica	100%	Concluído	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações financeiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	31/10/2015	30/12/2015		31/10/2015			0%	Cancelado	Atividade cancelada para este período devido ao erro que ocorreu no SICONV, a SEDETEC não conseguiu incluir a prestação de contas no sistema (reprogramada no item 14).	A SEDETEC está entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente do SICONV para solucionar o problema.
12	Envio de Relatório de Execução por e-mail	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/03/2016	11/04/2016		22/03/2016	29/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Devido ao erro que ocorreu no SICONV, foi acordado com a SEDETEC que seria elaborado e enviado por e-mail o relatório técnico final, sem incluir as questões financeiras. Prazos repactuados.	
13	Emissão de Relatório Técnico sobre a prestação de contas (sem incluir o SICONV)	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	18/03/2016	04/04/2016		29/03/2016	04/04/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Este Relatório técnico será para acompanhamento interno e não terá validade perante o SICONV.	Foi alterada a previsão do término do Laudo Técnico sem a prestação de contas.
14	Apresentação da prestação de contas (após solução dos problemas)	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/04/2016	04/04/2016		04/04/2016	18/07/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Foi resolvido o problema da inclusão dos dados da prestação de contas, que se tratava do cálculo dos valores de devolução por meio do SICONV que não estão de acordo com os respectivos valores de devolução previstos.	A solução se deu com o apoio da SUDENE que encaminhou ofício para o Ministério do Planejamento solicitando que fosse alterado de OBTV para o modo não OBTV de forma que possibilitasse o cálculo manual dos valores que serão devolvidos para a Conveniente e Concedente, entretanto o MPOG para solucionar o problema preferiu corrigir a funcionalidade do sistema.
15	Realização de visita técnica para subsidiar o laudo técnico.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão e Marcus Paz)	23/05/2016	25/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	Concluído	Foi alterada a previsão da viagem tendo em vista que os problemas operacionais na prestação de contas ainda persistem. A elaboração do Laudo técnico será concluída após a solução das pendências no SICONV.	Foi realizada a visita técnica às instalações do CVT de Confecções de Tobias Barreto para levantar informações que serão utilizadas para embasar a análise da prestação de contas do convenente. (de acordo com o status do item 14)
16	Elaboração de Relatório sobre a visita técnica	DPLAN (Robson e Marcus)	27/05/2016	08/06/2016		27/05/2016	08/06/2016		100%	Concluído	Esta atividade foi incluída para registro da visita técnica.	



17	Emissão de Laudo Técnico (final)	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz)	14/04/2016	22/04/2016		29/08/2016				75%	Atrasado	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista que os problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	Minuta elaborada e enviada para apreciação/modificação do técnico Marcus
18	Emissão de Laudo Técnico Financeiro	Coordenação de Gestão de Convênios	22/04/16	02/05/16						0%	Atrasado	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista que os problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	Etapa só irá ser iniciada após enviar o Laudo Técnico acerca do cumprimento do objeto para Convênios
19	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	02/05/2016	30/06/2016						0%	Atrasado	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista que os problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	
			<b>Valor Previsto:</b>	857.015,99	<b>Valor realizado:</b>	857.015,99	82%	Atrasado	<b>Status do Projeto</b>				

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

Houve necessidade de reprogramar este PO, acrescentando novas etapas, tendo em vista os problemas operacionais do SICONV.

3º ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 25 (ex PO 22)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.			
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento da Cadeia Bioessencial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em apoio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 2.000.000,00
1.277.000,00	0,00	Novembro/2014	1.277.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
723.000,00	0,00	Março/2015	723.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 2.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/06/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Unidade	Albertina de Souza Leão Pereira
	Unidade Descentralizadora	
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014	-	13/08/2014	13/08/2014	-	100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014	-	12/11/2014	12/11/2014	-	100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014	-	17/11/2014	17/11/2014	-	100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	R\$ 1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	R\$ 1.277.000,00	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015	-	27/02/2015	27/02/2015	-	100%	Concluído		
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	R\$ 723.000,00	10/03/2015	23/03/2015	R\$ 723.000,00	100%	Concluído	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2ª parcela. Liberação autorizada em 23/03/2015, mas aguardando limite financeiro. (Foi liberado com atraso)	
7	Solicitação de Termo aditivo financeiro	UFPE (Cláudia Sampaio)	27/05/2015	27/05/2015	-	cancelado	cancelado	-	0%	Cancelado	Foi solicitada um aditivo no valor de R\$	

8	Paracer técnico referente ao termo aditivo financeiro	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	27/05/2015	29/05/2015	-	cancelado	cancelado	-	0%	Cancelado	Foi solicitado um aditivo no valor de R\$ 252.045,00, mas a executora decidiu não pedir mais o termo aditivo financeiro, uma vez que conseguiu adequar o andamento do plano de trabalho ao valor inicial.
9	Trâmites burocráticos	Convênios e Procuradoria	01/06/2015	30/06/2015	-	cancelado	cancelado	-	0%	Cancelado	
10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	16/03/2016	30/03/2016	-	30/03/2016	30/03/2016	-	100%	Concluído	Os prazos foram reprogramados tendo em vista que o projeto foi analisado pela Auditoria Interna e esta atividade não foi prevista.
11	Realização de encontro para apresentação dos resultados.	UFPE (Cláudia Sampaio); DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel, )	03/05/2016	03/05/2016	-	03/05/2016	03/05/2016	-	100%	Concluído	Foi incluída uma nova atividade (encontro para apresentação dos resultados) a ser realizada no auditório panorâmico da SUDENE, por solicitação da UFPE.
12	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel, Robson Brandão, Técnico em Química)	03/05/2016	03/05/2016	-	13/05/2016	13/05/2016	-	100%	Concluído	A visita técnica foi realizada após o encontro para apresentação dos resultados, que se realizou no auditório panorâmico da SUDENE, em 03/05/2016.
13	Relatório da visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz e Técnico em Química)	16/05/2016	20/05/2016	-	16/05/2016	04/07/2016	-	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica, dada constatação da necessidade de criar condições adequadas para a elaboração a emissão do laudo/parecer final.
14	Elaboração e emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz e Técnico em Química)	16/05/2016	30/06/2016	-	16/05/2016	05/07/2016	-	100%	Concluído	Datas da coluna "previsto" foram reprogramadas tendo em vista que o Laudo Técnico só poderá ser concluído após os ajustes acordados no decorrer da visita técnica, ocorrida em 13/05/2016.
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 2.000.000,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 2.000.000,00	100%	Concluído	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
3º ciclo 2016
Tendo em vista que a servidora Jéssica Rivas pediu exoneração, foram designados para acompanhar a execução deste projeto os servidores Gabriela Isabel e Robson Brandão. Para as atividades pertinentes aos itens de números 13 e 14, foi designado o servidor Marcus Paz
As linhas 12 e 13 foram retiradas pois não há obrigatoriedade de prestação de contas junto à SUDENE no caso de Termo de Execução Descentralizada

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 26 (ex PO 23)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação 8902 - Promoção de Investimento em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em apoio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	286 e 280	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	1.025.000,00	1.025.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL		
800.000,00	0,00	Fevereiro/2016	800.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
225.000,00	0,00	Julho/2016	225.000,00	A realizar no exercício	R\$ 1.025.000,00
	0,00	-	1.025.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 1.025.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.025.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	02/05/2017
<b>Data Atualização:</b>	05/09/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Unidade Descentralizadora	Albertina de Souza Leão Pereira
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	17/11/2015	17/11/2015	-	17/11/2015	17/11/2015	-	100%	Concluído	A visita técnica foi substituída por reuniões realizadas nas instalações da CGEP nas quais estiveram presentes técnicos da UFPE e da SUDENE.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	01/12/2015	01/12/2015	-	01/12/2015	01/12/2015	-	100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	03/12/2015	03/12/2015	-	03/12/2015	03/12/2015	-	100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	100%	Concluído		
5	Reunião para programar visitas técnicas e de campo	SUDENE E UFPE	11/03/2016	11/03/2016	-	11/03/2016	11/03/2016	-	100%	Concluído	Verificou-se a importância e necessidade de que a equipe UFPE forneça relatórios parcial (regime trimestral) das atividades desenvolvidas no projeto. Em virtude disto, foram acrescentadas novas etapas no PO (Apresentação do relatório parcial).	

6	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/03/2016	11/04/2016	-	17/03/2016	21/03/2016	-	100%	Concluído	Relatório entregue pelo técnico SUDENE em 21/03/2016	
7	Apresentação do 1º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/03/2016	18/03/2016	-	18/03/2016	23/03/2016	-	100%	Concluído	Relatório entregue pela UFPE em 23/03/2016. Ressalta-se que este relatório apresenta informações relativas ao cronograma das atividades iniciais de abertura do projeto, não sendo necessário parecer técnico sobre o assunto.	
8	Vistoria de campo aos seis municípios do projeto	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/04/2016	11/10/2016	-	14/06/2016		-	50%	Em Andamento	As atividades de mobilização e sensibilização (visitas de campo iniciais) foram prejudicadas pela ausência de recursos financeiros (carro, motorista, combustível) que seriam disponibilizados pela UFPE. Foi realizado acompanhamento de visita técnica a Caruaru em 14/06/2016 pela servidora Ludmilla Calado.	A UFPE agendou visita a Picos no período de 09 a 11 de maio. Data alterada em virtude de inviabilidade de agenda, a ser definida. Conforme ofício LBQ64/2016, a nova data agendada para a reunião será 01/06, realizada através de docentes da UFPI/LAFIPI.
8.1	Acompanhamento de visita de campo - Reunião de Abertura - Caruaru	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	14/06/2016	12/08/2016	-	14/06/2016	14/06/2016	-	100%	Concluído	Foi realizada reunião de abertura em 14/06, ficando pendente a coleta de materiais. Relatório técnico da Reunião de Abertura concluído em 07/07/2016	
8.2	Acompanhamento de visita de campo - Coleta de Material - Caruaru	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	10/06/2016	10/06/2016	-	21/07/2016	21/07/2016		100%	Concluído		
8.3	Acompanhamento de visita de campo - Implementação de Ações Tecno Gerencial - Brejo da Madre de Deus	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	26/08/2016	26/08/2016	-	28/07/2016	28/07/2016	-	100%	Concluído		
8.4	Acompanhamento de visita de campo - Reunião de Abertura - Esperança/Campina Grande	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	26/08/2016	26/08/2016	-	25/08/2016	25/08/2016	-	100%	Concluído	Visita realizada pelo técnico Miguel Araujo.	
9	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	14/05/2016	-	14/05/2016	14/05/2016	-	100%	Concluído	Visita realizada pela Coordenadora Albertina em 14/05/16.	
10	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	23/05/2016	-	16/05/2016	06/06/2016	-	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica..	
11	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/05/2016	11/06/2016	R\$ 225.000,00	20/05/2016	05/07/2016	R\$ 225.000,00	100%	Concluído	Os documentos comprobatórios estão em análise.	Repasse financeiro (PF Nº 2016PF000044)

12	Apresentação do 2º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/06/2016	18/06/2016	-	27/05/2016	27/05/2016	-	100%	Concluído	
13	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	11/06/2016	08/09/2016	-	05/09/2016		-	50%	Em Andamento	
13.1	Realização da visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	11/06/2016	11/07/2016	-	05/09/2016	05/09/2016	-	100%	Concluído	A visita foi realizada pela Coordenadora Albertina em 05/09/16.
13.2	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	08/09/2016	08/09/2016	-				0%	A Iniciar	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica..
14	Apresentação do 3º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/09/2016	18/09/2016	-				0%	A Iniciar	
15	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	01/12/2016	01/02/2017	-				0%	A Iniciar	
16	Emissão de laudo/parecer final	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	01/02/2017	02/05/2017	-				0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 1.025.000,00		<b>Valor realizado:</b>	R\$ 1.025.000,00	75%		Em Andamento	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
<b>3º ciclo 2016</b>

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 27 (ex PO 24)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico	
<b>Finalidade da ação:</b>	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidades responsáveis:</b>	CGEP e CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestores das subunidades:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.			
<b>Projeto:</b>	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Marcus Vinicius e Miguel Vieira - CGEP/DPLAN ; Caio de Assis e Renato Vaz (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							20,0%	Concluído			
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015	-	13/07/2015	12/08/2015	-	100%	Concluído		
2	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015	-	22/09/2015	22/09/2015	-	100%	Concluído		
3	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015	-	13/10/2015	13/10/2015	-	100%	Concluído		
4	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015	-	21/10/2015	21/10/2015	-	100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015	-	12/11/2015	19/11/2015	-	100%	Concluído		
6	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015	-	25/11/2015	27/11/2015	-	100%	Concluído		
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015	-	01/12/2015	01/12/2015	-	100%	Concluído		
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	-	02/12/2015	02/12/2015	-	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							14,6%	Em Andamento			
9	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído		
10	<b>Meta 1: Levantamento etnobotânico</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 76.800,00	18/01/2016			66%	Em Andamento		
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016	-	10/03/2016	10/03/2016	-	100%	Concluído		

10.2	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016	-	23/05/2016	25/05/2016	-	100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio. O técnico Renato (CGDS) está elaborando relatório da visita (ainda sem data definida).	Relatório enviado em 23/08/2016.
10.3	Relatório de conclusão da Meta 1	UFPE	23/05/2016	10/11/2016	-			-	0%	A Iniciar		
11	<b>Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 138.000,00				0%	A Iniciar		
11.1	2ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016	-			-	0%	Atrasado		2ª reunião reagendada para o dia 05 e 06 de setembro de 2016 em virtude de agendas.
11.2	Relatório de conclusão da Meta 2	UFPE	13/06/2016	10/11/2016	-			-	0%	A Iniciar		
12	<b>Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 373.400,00				0%	A Iniciar		
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016	-			-	0%	A Iniciar	Também será reagendada, porém ainda está sem data definida.	
12.2	Relatório de conclusão da Meta 3	UFPE	12/09/2016	10/11/2016	-			-	0%	A Iniciar		
13	<b>Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 160.800,00				0%	A Iniciar		
13.1	Visita técnica (oficinas devolutivas)		01/11/2016	03/11/2016	-			-	0%	A Iniciar		
13.2	Relatório de conclusão da Meta 4	UFPE	04/11/2016	10/11/2016	-			-	0%	A Iniciar		
14	Apresentação de relatório final	UFPE	01/12/2016	31/12/2016	-			-	0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									0,0%	A Iniciar		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	01/01/2017	28/02/2017	-			-	0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 749.000,00	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 749.000,00	35%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 28 (ex PO 26)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	Ação interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
<b>Finalidade da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Prover os agentes públicos e privados de informações regionais, objetivando subsidiar planos e programas para o Nordeste.				
<b>Projeto:</b>	Nordeste em Números 2015				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Sistematizar um conjunto de informações sócio-econômicas referente à região Nordeste e estados que a compõem, atualizando a versão anterior do Nordeste em Números 2011.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2016
<b>Data Atualização:</b>	05/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Gabriela Isabel Limoeiro Alves Nascimento / José Luis Alonso
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Coleta de dados	José Luis	10/09/2015	10/11/2015	-	10/09/2015	10/11/2015	-	100%	<b>Concluído</b>	Algumas informações apresentadas no Nordeste em Números 2011, não estavam mais disponíveis.	
2	Tabulação e crítica dos dados coletados	Gabriela Isabel / José Luis	10/11/2015	24/11/2015	-	10/11/2015	24/11/2015	-	100%	<b>Concluído</b>		
3	Elaboração de Gráficos e Mapas	Gabriela Isabel / José Luis	24/11/2015	08/12/2015	-	24/11/2015	08/12/2015	-	100%	<b>Concluído</b>		
4	Confeção da publicação (Parte I - capítulo 1 a 9)	Gabriela Isabel / José Luis	08/12/2015	22/12/2015	-	08/12/2015	18/12/2015	-	100%	<b>Concluído</b>		
5	Confeção da publicação (Parte II - capítulo 10 a 18)	Gabriela Isabel / José Luis	22/12/2015	15/01/2016	-	18/12/2015	15/01/2016	-	100%	<b>Concluído</b>		
6	Revisão do documento	Gabriela Isabel / José Luis	15/01/2016	19/02/2016	-	15/01/2016	19/02/2016	-	100%	<b>Concluído</b>	Durante a revisão do documento, observou-se a necessidade de acrescentar mais informações relativas ao Semiárido e a características hidrológicas.	
7	Ajustes após revisão	Gabriela Isabel / José Luis	19/02/2016	18/03/2016	-	19/02/2016	18/05/2016	-	100%	<b>Concluído</b>	Acrescentada uma etapa para adequação dos ajustes do documento, que não tinha sido previstos.	
8	Revisão da formatação final/Layout e publicação no site do primeiro capítulo	Gabriela Isabel / José Luis / ASCOM	01/04/2016	08/04/2016	-	cancelado	cancelado	-	-	<b>Cancelado</b>	A conclusão do documento foi postergada tendo em vista que o coordenador geral sugeriu acréscimos de tabelas ao 1º cap.	Realizar ajustes e elaborar memo para ASCOM enviando o documento.

9	Revisão da formatação final/Layout	ASCOM	18/03/2016	18/04/2016	-	18/05/2016	06/07/2016	-	100%	Concluído	O cronograma das atividades foi alterado em virtude da inclusão de novas etapas. Em 09/05, a publicação por capítulos foi suspensa retornando ao formato original de "documento completo", sendo enviado a ASCOM em 18/05/16.	O documento está sendo formatado. A ASCOM enviou várias propostas de capa que estão em análise.
10	Catálogo	Biblioteca	18/04/2016	22/04/2016	-	06/07/2016	01/08/2016	-	100%	Concluído	Esta atividade será realizada após a conclusão da atividade anterior (item 10)	
11	Publicação no site	ASCOM	22/04/2016	29/04/2016	-	15/07/2016	03/08/2016	-	100%	Concluído	Esta atividade será realizada após a conclusão da atividade anterior (item 11)	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 0,00	100,0%	Concluído	<b>Status do Projeto</b>		

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 29 (ex PO 28)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
<b>Projeto:</b>	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico-social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	Descentralização	500.000,00	

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL		
SUDENE	IFPB			Pago até o ano anterior	R\$ -
500.000,00	0,00		500.000,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
500.000,00	0,00	-	500.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 500.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 500.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/11/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(e) técnico(s) pelo Projeto</b>	Unidade Descentralizadora	Anita Rozenblit
	Unidade Descentralizada	Maiara Souza Melo - IFPB

Nº	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Articulação para elaboração do Termo de Execução Descentralizada - TED	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	15/05/2015	10/12/2015	-	15/05/2015	10/12/2015	-	100%	Concluído	Articulação para elaboração dos Plano Estratégico de Campina Grande/PB	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E IFPB	10/12/2015	18/12/2015	-	10/12/2015	18/12/2015	-	100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/12/2015	21/12/2015	-	21/12/2015	21/12/2015	-	100%	Concluído		
4	Descentralização do crédito e a Transferência do limite orçamentário	CGAF/COCF	24/12/2015	24/12/2015	-	24/12/2015	24/12/2015	-	100%	Concluído	R\$ 500.000,00	
5	Reunião com IFPB e a empresa contratada para elaboração do Plano a partir do diagnóstico. Solicitar ajustes no cronograma de execução do Plano de Trabalho.	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	26/02/2015	26/02/2015	-	26/02/2015	26/02/2015	-	100%	Concluído	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisará ser repactuado	
6	<b>Reunião (em João Pessoa):</b> Apresentação do projeto técnico da Macroplan e o ajuste do cronograma do Plano de trabalho.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	21/03/2016	21/03/2016	-	21/03/2016	21/03/2016	-	100%	Concluído	Aguardando o ofício pelo IFPB constando: solicitação dos recursos financeiros do TED e o novo Cronograma de Execução (já ajustado), observados os produtos inseridos no Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada	
7	Recebimento por e-mail do Ofício nº 175/2016/GR/IFPB, encaminhado pelo IFPB e assinado pela Pró-Reitora Mary Roberta Meira Marinho, onde solicita formalmente a alteração do Cronograma de Execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande e Municípios do Entorno - PED/CG-2035.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	18/04/2016	18/04/2016	-	18/04/2016	03/05/2016	-	100%	Concluído	Aguardando o ofício pelos correios para dar andamento ao processo de liberação da 1ª e única parcela dos recursos financeiros do TED nº 10/2015 SUDENE/IFPB.	Em 03/05/2016 foi entregue pelos Correios à SUDENE o Ofício nº175/2016/GR/IFPB de 18/04/2016, protocolo SUDENE nº 59334.000823/2016-81, no qual encaminhou novo Cronograma de Execução do Plano "PED/CG-2035" junto com o diagnóstico situacional, tabela de indicadores de Campina Grande e Municípios do Entorno e solicitação de repasse da parcela única de R\$ 500.000,00, referente ao TED nº 10/2015/SUDENE/IFPB.

8	Elaboração do parecer técnico	DPLAN (Anita Rozenblit)	03/05/2016	10/05/2016	-	03/05/2016	10/05/2016	-	100%	Concluído	No dia 03/05/16 o parecer técnico foi enviado à Coordenação Geral, passando por ajustes e correções, e no dia 11/05/16 foi enviado à DPLAN para providências pertinentes.	
9	Análise da DPLAN em relação ao Parecer Técnico da CGEP e providências pertinentes	DPLAN (Sérgio Alencar)	11/05/2016	11/05/2016	-	11/05/2016	12/05/2016	-	100%	Concluído	No dia 12/05/2016 foi enviado, pelo diretor, o processo do TED nº 10/2015 à DAD, para liberação da parcela única.	
10	Liberação da parcela única	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	12/05/2016	15/05/2016	R\$ 500.000,00	18/04/2016	13/05/2016	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Previsão de liberação da 1ª parcela no mês de maio de 2016.	Autorizado pela SUDENE a liberação da parcela única em 13/05/2016. Diretora do PROEXT - IFPB.
11	Produto 1: Aprofundamento da Visão de Futuro da Cidade de Campina Grande 2015 ( construída na fase de diagnóstico) - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 1</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	30/06/2016	-	17/05/2016		-	0%	atrasado		Foi feita uma ligação para Mayara.
12	Produto 2: Construção da Visão de futuro Complexo Aluísio Campos - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 2</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	30/06/2016	-			-	0%	atrasado		
13	Produto 3: Desenho urbano conceitual da cidade de Campina Grande e conexões com os municípios do entorno - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 3</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/06/2016	29/07/2016	-			-	0%	atrasado	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisou ser repactuado de maio a agosto de 2016. Obs1. conforme Ofício n175/2016/GR/IFPB de 18 de abril de 2016, a data da entrega do primeiro produto (englobando Visão de futuro, Const. visão Aloísio Nunes, Desenho urbano, e detalhamento da Visão Futura de determinadas áreas) está atrasado pois finaliza em 31/07/2017. Diante disso, foi realizado contato com IFPB para a solução do problema. Após contato com a Diretora de Inovação na pessoa de Mayara Melo no dia 29/07/16 ficou acordado que será enviado um ofício com a exposição de motivos do respectivo atraso. Só após elucidação dos problemas internos no IFPB será enviada um novo cronograma. Obs1: haverá nova reunião no Comitê Gestor do TED/CG2035, com previsão de entrega do produto 1.	Em 19/08 foi feita uma ligação para Mayara confirmando o envio da cópia do ofício. Em 22/08 recebemos por email uma cópia do ofício nº 346/2016/GR/IFPB que solicita a alteração do cronograma de execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Campina Grande 2035.
14	Produto 4: Visão de Futuro: desafios, estratégias e metas - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 4</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/06/2016	29/07/2016	-			-	0%	atrasado		
15	Produto 5: Realização de seis oficinas de reflexão estratégica, uma em cada município envolvido - <b>Parecer sobre os resultados das oficinas</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	29/07/2016	-			-	0%	atrasado		
16	Produto 6: Pesquisa de opinião pública via internet - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 6</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	29/07/2016	-			-	0%	atrasado		
17	Produto 7: Realização de Concurso sobre o tema "Campina do Futuro", junto à estudantes do 1 e 2 graus - <b>Parecer sobre resultados do concurso</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/05/2016	29/07/2016	-			-	0%	Atrasado		Recebimento do Ofício em 05/09/2016.
18	Produto 8: Transferência Institucional do Portal 2035 e canais de acompanhamento do projeto pela sociedade e incorporação de propostas de outras fontes (blogs, redes sociais, debates e mídias sociais) - <b>Parecer sobre resultados</b>	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/08/2016	31/08/2016	-			-	0%	A Iniciar		
19	Parecer final de acompanhamento SUDENE envolvendo todas as etapas do processo.	DPLAN (Anita Rozenblit)	01/10/2016	31/10/2016	-			-	0%	A Iniciar		
20	Revisão	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/11/2016	30/11/2016	-			-	0%	A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 500.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 500.000,00	43%	Em Andamento	Status do Projeto	

**Parceiros Institucionais:**

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 30 (ex PO 29)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido</b>	<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa do PPA:</b>	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO	<b>Eixo temático (MI):</b>	Garantir Segurança Hídrica
<b>Ação do PPA:</b>		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
<b>Objetivo da ação:</b>	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade equitativa e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	-
<b>Problema (causa):</b>	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social		
<b>Projeto:</b>	Programa Água para Todos		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	44	40.42	R\$ -	R\$ 43.290.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.878.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 9.360.000,00
Saldo a liberar	R\$ 3.432.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 17.238.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito n° 35	MI - Sudene	01/09/2013	26/09/2013		01/09/2013	02/09/2013		100%	Concluído		
2	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/2013	02/10/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
3	Abertura e Instrução dos Processos	GTAPT	01/09/2013	09/09/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
4	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/2013	23/12/2013		01/10/2013	01/10/2013		100%	Concluído		
5	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/2014	30/01/2014		01/11/2013	01/12/2013		100%	Concluído		
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/2014	30/05/2014		01/04/2014	01/05/2014		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.	
7	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014		02/04/2014	02/05/2014		100%	Concluído	Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram sucesso para empenho.	Nove municípios não foram habilitados para efetivar o Termo de Compromisso.
8	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014	R\$ 8.658.000,00	01/04/2014	01/05/2014	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte forma: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba.	Um município do estado do Piauí foi empenhado, mas não se habilitou para o recebimento da primeira parcela.
9	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/2015	31/07/2015		01/03/2015	31/07/2015		100%	Concluído	A Comissão de Força Tarefa obteve 93 respostas as solicitações de Ofícios.	Os municípios que não responderam ao comunicado oficial foram encaminhados para rescisão unilateral.
10	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015			90%	Atrasado	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.	Memorandos enviados ao Gabinete solicitando engenheiros e contador. Memorando DPLAN/FT-PAPT n° 001/2015. Relatório Propositivo de Agosto de 2015. Memorando CGCP n° 01/2016.

11	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	27/05/2016		100%	Concluído	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.	Os engenheiros estão acumulando a análise do trabalho social. Porém não estão sendo respassados a SDR/MI os dados para alimentar o SPS. Devido a falta de recursos humanos.
12	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	01/02/2016		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/2015	03/12/2015		01/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/2015	04/12/2015		03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito. A SUDENE rescindiu 61 TC's.
15	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/2015	01/05/2016	R\$ 34.632.000,00	01/12/2015		R\$ 9.360.000,00	60%	Atrasado	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N° 35/2013 é atender 50 municípios, até a data de hoje os recursos financeiros descentralizados para a SUDENE contemplam 41 municípios. A Comissão de Força Tarefa efetuou a liberação de 30 municípios até o momento. O PAPT possui saldo financeiro de R\$3.448.000,00.	Com o valor descentralizado até momento a SUDENE continuará com 09 municípios em Restos a Pagar.
16	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/2016	31/03/2017		01/02/2016			20%	Em Andamento	Os municípios que receberam recursos de forma integral, me média possuem 20% das obras executadas. Estes municípios terão seus TC's prorrogados.	
17	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/2015	30/05/2017		10/12/2015			20%	Em Andamento		
18	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	31/03/2017	30/05/2017					0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	30/05/2017	30/07/2017					0%	A Iniciar		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	30/05/2017	30/07/2017					0%	A Iniciar		
21	Encerramento do PAPT	FTAPT	30/07/2017	30/09/2017					0%	A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 43.290.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 17.238.000,00	71,0%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretária de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Progrmas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Progrmas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	31 (ex PO 30)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2008
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Transnordestina Logística S/A - TLSA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/12/2015
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	<b>Concluído</b>	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	<b>Concluído</b>	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	<b>Concluído</b>	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	<b>Concluído</b>	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>08/08/08</b>	<b>28/11/08</b>	<b>0,00</b>	<b>08/08/08</b>	<b>24/11/08</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	<b>Concluído</b>	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/01/10</b>	<b>31/05/15</b>	<b>3.876.491.700,00</b>	<b>12/01/10</b>	<b>-</b>	<b>3.065.105.668,00</b>	<b>83%</b>	<b>Atrasado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>92%</b>	<b>Atrasado</b>		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>					<b>Valor Previsto:</b>	<b>3.876.491.700,00</b>		<b>3.065.105.668,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------	-----------------	--------------------------

**Parceiros Institucionais:**

<b>Observações:</b>
<b>3º Ciclo 2016</b>
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II, Módulo III sem liberação.
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

<b>Legenda</b>	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 32 (ex PO 31)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.593.233.020,25
A realizar no exercício	R\$ 365.766.979,75
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 245.019.314,75
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 120.747.665,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.838.252.335,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>18/12/12</b>	<b>31/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>18/12/12</b>	<b>24/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	140.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	

13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
15	Liberação 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	125.747.665,00				0,00%	A Iniciar	Aguardando pedido de liberação
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/09/13</b>	<b>31/12/16</b>	<b>1.959.000.000,00</b>	<b>24/10/13</b>	<b>00/01/00</b>	<b>1.838.252.335,00</b>	<b>90%</b>	<b>Em Andamento</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>95%</b>	<b>Em Andamento</b>	
16	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 1.959.000.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 1.838.252.335,00</b>	<b>82,35%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- 3º Ciclo 2016
- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
- Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
- Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
- Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.
- Obs.6

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 33 (ex PO 32)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2008
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/03/2010
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto ( O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/07/08</b>	<b>31/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>24/07/08</b>	<b>15/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGGP-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/03/12</b>	<b>20/04/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>21/03/12</b>	<b>01/06/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	A Iniciar	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibilização da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 34 (ex PO 33)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	<b>2008</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 11.099.063,37
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 11.099.063,37
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsável(e) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	<b>Concluído</b>	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	<b>Concluído</b>	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	<b>Concluído</b>	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	<b>Concluído</b>	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>21/01/08</b>	<b>05/01/09</b>	<b>0,00</b>	<b>21/01/08</b>	<b>15/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	<b>Concluído</b>	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/12/2016	31/12/2016	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	<b>A Iniciar</b>	O BNB indica que há possibilidade de não liberação do restante dos recursos, sendo esta condicionada à readequação do projeto. Ainda não houve formalização.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/12/16</b>	<b>31/12/16</b>	<b>53.576.481,00</b>	<b>13/10/15</b>	<b>-</b>	<b>42.477.417,63</b>	<b>50%</b>	<b>Em Andamento</b>		

Competência da SUDENE /Banco								75%	Em Andamento
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar

Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar
----------------------	--	--	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
- Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
- Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
- Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
- Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
- Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB está pro
- Obs9: Aguardando a confirmação de concursão do Agente Operador.
- Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 35 (ex PO 34)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2015
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>59.700.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>02/02/15</b>	<b>59.700.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	0,00	0%	A Iniciar
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 36 (ex PO 35)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.635.943,87
A realizar no exercício	R\$ 1.264.056,13
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 1.264.056,13
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	13/08/2016	Data prevista para implantação do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>31/05/14</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>15/02/16</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**3º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 37 (ex PO 36)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/10/16	31/10/16	496.137,41	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/10/16</b>	<b>64.439.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>-</b>	<b>63.942.862,59</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		

Competência da SUDENE /Banco								83%	Em Andamento
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar

Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar
----------------------	--	--	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		64.439.000,00	Valor realizado:		63.942.862,59	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 38 (ex PO 37)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsáv(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/10/16	31/10/16	428.678,72	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/10/16</b>	<b>59.864.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>-</b>	<b>59.435.321,28</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>59.864.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>59.435.321,28</b>	<b>70,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

**Observações:**

**3º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 39 (ex PO 38)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faísca III Geração e Comercialização de Energia LTDA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$ 429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.848.909,88

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/10/16	31/10/16	429.090,12	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/10/16	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	67%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:	55.278.000,00	Valor realizado:	54.848.909,88	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 40 (ex PO 39)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/10/16	31/10/16	1.056.552,40	-	-		0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/10/16	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		54.216.447,60	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

**Observações:**

**3º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 41 (ex PO 40)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 27.3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	64.455.000,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	64.455.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	09/03/2016	Data prevista para conclusão do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>11/09/15</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Atrasado</b>
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**3º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 42 (ex PO 41)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2011</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2015	<b>Data prevista para conclusão do empreendimento.</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>26/12/13</b>	<b>02/02/15</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Atrasado</b>
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

Parceiros institucionais:

**Observações:**  
**3º Ciclo 2016**  
 Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
 Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.  
 Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.  
 Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.  
 Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.  
 Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 43 (ex PO 42)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 46.786.085,39
A realizar no exercício	R\$ 3.213.914,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 3.213.914,61
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	13/08/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>07/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>15/02/16</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	50.000.000,00	Valor realizado:	50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 44 (ex PO 43)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

<b>Previsão de Conclusão:</b>	08/02/2015
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J. Emerson/ A.F. Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído	
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>										
<b>Observações:</b>										
<b>3º Ciclo 2016</b>										
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.										
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 45 (ex PO 44)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Gestamp Eólica Moxotó S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 40.845.410,40

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/05/2016	Data prevista para conclusão do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>14/06/13</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>15/05/13</b>	<b>01/12/15</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A Iniciar</b>

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

**Parceiros Institucionais:**

**Observações:**

**3º Ciclo 2016**

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
 Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.  
 Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.  
 Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.  
 Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 46 (ex PO 45)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	19/05/2015	<b>Data prevista para conclusão do empreendimento.</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>20/11/14</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Atrasado</b>
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
<b>Parceiros institucionais:</b>									
<b>Observações:</b>									
<b>3º Ciclo 2016</b>									
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.									
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.									
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.									
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.									

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 47 (ex PO 46)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Eólica Pedra do Reino S/A				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	53.959.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	19/05/2015
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>53.959.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>20/11/14</b>	<b>53.959.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
<b>Encerramento (Banco)</b>			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>		53.959.000,00	<b>Valor realizado:</b>		53.959.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
<b>Parceiros institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
<b>3º Ciclo 2016</b>											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 48 (ex PO 47)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ 3.562.805,04
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	0,00
Saldo a liberar	R\$ 3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/05/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Claudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>23/08/10</b>	<b>07/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>23/08/10</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/11/16	01/12/16	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>01/12/16</b>	<b>99.970.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>-</b>	<b>96.407.194,96</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>99.970.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>96.407.194,96</b>	<b>70,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 49 (ex PO 48)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de fábrica de Cimento			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	269.869.740,06
A realizar no exercício	R\$	33.130.259,94
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	33.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	269.869.740,06

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>21/12/12</b>	<b>21/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>21/12/12</b>	<b>19/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	-	-	-	75,00%	Atrasado	Pedido de liberação iniciado em Agosto mas não finalizado no mês	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	3.130.259,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>19/04/13</b>	<b>31/10/16</b>	<b>303.000.000,00</b>	<b>19/04/13</b>	<b>-</b>	<b>269.869.740,06</b>	<b>79%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>90%</b>	<b>Em Andamento</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>303.000.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>269.869.740,06</b>	<b>70,45%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

<b>Parceiros institucionais:</b>	
----------------------------------	--

**Observações:**  
**3º Ciclo 2016**  
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 50 (ex PO 49)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de Condomínio Logístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 108.616.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/03/2019
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>14/12/12</b>	<b>11/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>14/12/12</b>	<b>19/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>19/04/13</b>	<b>30/09/18</b>	<b>270.582.240,00</b>	<b>19/04/13</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>Em Andamento</b>		

Competência da SUDENE /Banco										56%	Em Andamento
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>270.582.240,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22,73%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		
<b>Parceiros institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
<b>3º Ciclo 2016</b>											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 51 (ex PO 50)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Natulab Laboratório S.A.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Laboratório de Farmacos para Humanos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2016	<b>Data prevista para conclusão do empreendimento.</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>06/09/12</b>	<b>16/08/13</b>	<b>0,00</b>	<b>06/09/12</b>	<b>20/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>20/06/13</b>	<b>-</b>	<b>23.855.042,00</b>	<b>20/06/13</b>	<b>-</b>	<b>19.539.983,88</b>	<b>60%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>80%</b>	<b>Em Andamento</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>23.855.042,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>19.539.983,88</b>	<b>60,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

<b>Observações:</b>
<b>3º Ciclo 2016</b>
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 52 (ex PO 51)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Deten Química S.A.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação da Produção de Produtos Químicos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/01/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>05/02/13</b>	<b>26/10/13</b>	<b>0,00</b>	<b>05/02/13</b>	<b>10/09/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>10/09/13</b>	<b>30/12/15</b>	<b>31.256.000,00</b>	<b>10/09/13</b>	<b>-</b>	<b>15.447.600,00</b>	<b>29%</b>	<b>Atrasado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>64%</b>	<b>Atrasado</b>		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	15.447.600,00	41,67%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: **A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.**

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 53 (ex PO 52)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Shineray do Brasil S.A.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Produção de Motocicletas			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/12/2014
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>26/04/13</b>	<b>19/12/13</b>	<b>0,00</b>	<b>26/04/13</b>	<b>27/11/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>27/11/13</b>	<b>01/10/14</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>27/11/13</b>	<b>-</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 54 (ex PO 53)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Cone Multicenter Ltda			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de Complexo Turístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/08/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 177.367.554,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>14/12/12</b>	<b>27/08/13</b>	<b>0,00</b>	<b>14/12/12</b>	<b>28/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14	-	02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Ver Observação 3.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>28/06/13</b>	<b>03/03/17</b>	<b>191.238.424,00</b>	<b>02/06/13</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>11%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>56%</b>	<b>Em Andamento</b>		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>191.238.424,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
<b>3º Ciclo 2016</b>
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: O projeto está sendo totalmente reanalisado pelo agente operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 55 (ex PO 54)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Braskem S.A.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	18/02/2015	<b>Data prevista para conclusão do empreendimento.</b>
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016	

<b>Responsáv(e)l(e)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/09/13</b>	<b>08/06/14</b>	<b>0,00</b>	<b>03/09/13</b>	<b>12/05/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/05/14</b>	<b>31/08/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>16/05/14</b>	<b>22/08/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>			

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**  
**3º Ciclo 2016**  
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 56 (ex PO 55)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Companhia Siderúrgica Suape S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de Laminadora de Aço			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>19/12/13</b>	<b>06/07/14</b>	<b>0,00</b>	<b>19/12/12</b>	<b>27/06/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Cancelado	O Agente Operador solicitou a rescisão do contrato de financiamento para operacionalização de recursos do FDNE em 13/07/2016.	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-	-	0,00%	Cancelado	Contrato CEF/Empresa em fase de formalização. Cronograma de desembolso será repactuado.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>27/06/14</b>	<b>31/07/17</b>	<b>1.075.935.159,00</b>	<b>16/05/14</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6%</b>	<b>Cancelado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>53%</b>	<b>Cancelado</b>		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Cancelado		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Cancelado		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Cancelado	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	1.075.935.159,00	Valor realizado:	0,00	26,92%	Cancelado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------	--------	-----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs 2: O Agente Operador solicitou a rescisão do contrato de financiamento para operacionalização de recursos do FDNE em 13/07/2016.

Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 57 (ex PO 56)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. ( antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 178.622.724,54
A realizar no exercício	R\$ 177.924.928,79
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 67.883.618,19
Saldo a liberar	R\$ 169.076.219,79
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 246.506.342,73

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/05/13</b>	<b>20/03/14</b>	<b>0,00</b>	<b>03/05/13</b>	<b>21/02/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14	-	21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/08/16	31/08/16	85.128.647,73	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	83.947.572,06	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/02/14</b>	<b>31/12/16</b>	<b>415.582.562,52</b>	<b>21/02/14</b>	<b>-</b>	<b>246.506.342,73</b>	<b>71,43%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>86%</b>	<b>Em Andamento</b>		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 246.506.342,73	67%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	--------------------	------------------	--------------------	-----	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Obs1:  O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2:  O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs3:  A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 58 (ex PO 57)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Cone S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de plataforma de serviços de logística			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/08/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 123.186.471,03
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 123.186.471,03
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>12/12/13</b>	<b>02/05/14</b>	<b>0,00</b>	<b>12/12/13</b>	<b>12/11/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-			-	0,00%	Atrasado	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Cronograma de desembolso será repactuado.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>18/11/14</b>	<b>02/03/16</b>	<b>123.186.471,03</b>	<b>00/01/00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>50,00%</b>	<b>Atrasado</b>		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>		<b>R\$ 123.186.471,03</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>R\$ -</b>	<b>21,43%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	3º Ciclo 2016
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste							<b>Número do Projeto:</b> PO 59 (ex PO 58)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores							<b>Ano:</b> 2015			
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE				<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).				<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas					
<b>Objetivo da ação:</b>											
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF					
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros				<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
<b>Problema (causa):</b>											
<b>Projeto:</b>	Iraeta Brasil S/A										
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de uma unidade de fabricação de flanges eólicas										
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto</b>	<b>Valor Total do Projeto</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>					
	100	5	90	34.102.182,00	89.861.866,00	Pago até o ano anterior	R\$	-			
						A realizar no exercício	R\$	34.102.182,00			
						Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	34.102.182,00			
						Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
						Valor liberado no Exercício	R\$	-			
						Saldo a liberar	R\$	34.102.182,00			
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$	34.102.182,00			
						Total Liberado até o exercício	R\$	-			
<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/04/2016										
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016										
<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
			<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Físico %</b>		
1	Consulta prévia	Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)	07/10/14	06/11/14	-	07/10/14	24/10/15	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	02/04/15	30/08/15	-	02/04/15	28/08/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/08/15	27/09/15	-	28/08/15	23/09/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>07/10/14</b>	<b>27/09/15</b>	<b>0,00</b>	<b>07/10/14</b>	<b>23/09/15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/09/15	22/09/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização (houve prorrogação)
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>28/09/15</b>	<b>31/10/15</b>	<b>34.102.182,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>Atrasado</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>63%</b>	<b>Atrasado</b>	
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Emprend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>				<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 34.102.182,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>50%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	
<b>Parceiros Institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
3º Ciclo 2016											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 60 (ex PO 59)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Sauípe S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	68.299.987,00	193.893.821,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 68.299.987,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 68.299.987,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2018
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(é)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir Vilaça/Claudia da Silva (SUDENE/DFIN)	09/10/14	08/11/14	-	09/10/14	30/10/14	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/05/15	22/10/15	-	25/05/15	26/10/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	26/10/15	25/11/15	-	26/10/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 231/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>09/10/14</b>	<b>25/11/15</b>	<b>0,00</b>	<b>09/10/14</b>	<b>12/11/15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/16	01/05/16	10.133.063,55	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	16.330.175,83	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	6.085.184,11	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	12.766.884,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/04/17	01/05/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/10/17	31/10/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	5.731.169,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>16/11/15</b>	<b>31/01/18</b>	<b>68.299.987,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5,56%</b>	<b>Em Andamento</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>53%</b>	<b>Em Andamento</b>		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>				<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 68.299.987,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>25%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 61 (ex PO 60)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação e modernização de um complexo turístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 39.800.940,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>29/06/15</b>	<b>03/12/15</b>	<b>0,00</b>	<b>29/06/15</b>	<b>12/11/15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>16/11/15</b>	<b>31/12/15</b>	<b>39.800.940,00</b>	<b>-</b>	<b>13/06/16</b>	<b>39.800.940,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 39.800.940,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 39.800.940,00	71%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----	---------------------	--------------------------

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
3º Ciclo 2016	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 62 (Ex PO 61)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor
<b>Objetivo da ação:</b>		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Braskem S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Modernização do Centro de Petroquímicos Básicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	188.283.235,00	418.407.190,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/01/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Austricínio (SUDENE/DFIN)	03/02/15	05/03/15	-	03/02/15	26/02/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	04/08/15	01/01/16	-	04/08/15	28/12/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/01/16	31/01/16	-	12/01/16	11/02/16	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 241/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/02/15</b>	<b>31/01/16</b>	<b>0,00</b>	<b>03/02/15</b>	<b>11/02/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/02/16	16/06/16	-	17/02/16	-	-	50,00%	Cancelado		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	188.283.235,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>17/02/16</b>	<b>31/07/16</b>	<b>188.283.235,00</b>	<b>17/02/16</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>Cancelado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>63%</b>	<b>Cancelado</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Cancelado		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Cancelado</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 188.283.235,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>50%</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------	------------	------------------	--------------------------

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>3º Ciclo 2016</b>	
Obs1:	Cancelado pelo Agente Operador

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 63 (ex PO 62)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
<b>Objetivo da ação:</b>		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Braskem S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Modernização das unidades industriais de vinílicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	62.999.857,00	139.999.682,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/01/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	03/02/15	05/03/15	-	03/02/15	26/02/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	04/08/15	01/01/16	-	04/08/15	28/12/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/01/16	31/01/16	-	12/01/16	11/02/16	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 242/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/02/15</b>	<b>31/01/16</b>	<b>0,00</b>	<b>03/02/15</b>	<b>11/02/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/02/16	16/06/16	-	17/02/16	-	-	50,00%	Cancelado	O Agente Operador solicitou a rescisão do contrato de financiamento para operacionalização de recursos do FDNE em 13/07/2016.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	62.999.857,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>17/02/16</b>	<b>31/07/16</b>	<b>62.999.857,00</b>	<b>17/02/16</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>Cancelado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>63%</b>	<b>Cancelado</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Cancelado		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Cancelado</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 62.999.857,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>50%</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parcelas institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>3º Ciclo 2016</b>	
<b>Obs1:</b>	O Agente Operador solicitou a rescisão do contrato de financiamento para operacionalização de recursos do FDNE em 13/07/2016.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 64
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Caetex Florestal S.A.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Cultivo de eucalipto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	R\$ 25.459.126,00	R\$ 95.852.598,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 8.954.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 25.459.126,00
Valor Empenhado no Exercício	-
Valor liberado no Exercício	-
Saldo a liberar	R\$ 25.459.126,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.459.126,00
Total Liberado até o exercício	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/16
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	24/11/15	04/12/16	-	24/11/15	04/12/16	-	100%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	05/02/16	05/06/16	-	05/02/16	30/05/16	-	100%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/06/16	21/07/16	-	21/06/16	20/06/16	-	100%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/11/15</b>	<b>21/07/16</b>	<b>0,00</b>	<b>24/11/15</b>	<b>20/06/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/07/16	18/09/16	-	-	-	-	50%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/07/16	30/09/16	R\$ 5.312.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/10/16	31/12/16	R\$ 3.642.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/01/17	31/03/17	R\$ 867.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	01/04/17	30/06/16	R\$ 1.742.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	01/07/17	30/09/17	R\$ 1.742.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
10	Liberção 6	SUDENE/BB	01/10/17	31/12/17	R\$ 867.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
11	Liberção 7	SUDENE/BB	01/01/18	31/03/18	R\$ 860.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
12	Liberção 8	SUDENE/BB	01/04/18	30/06/18	R\$ 1.753.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
13	Liberção 9	SUDENE/BB	01/07/18	30/09/18	R\$ 1.753.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
14	Liberção 10	SUDENE/BB	01/10/18	31/12/18	R\$ 860.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
15	Liberção 11	SUDENE/BB	01/01/19	30/03/19	R\$ 773.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
16	Liberção 12	SUDENE/BB	01/04/19	30/06/19	R\$ 1.111.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
17	Liberção 13	SUDENE/BB	01/07/19	30/09/19	R\$ 1.111.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
18	Liberção 14	SUDENE/BB	01/10/19	31/12/19	R\$ 773.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		

19	Liberação 15	SUDENE/BB	01/01/20	31/03/20	R\$	252.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	01/04/20	30/06/20	R\$	703.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
21	Liberação 17	SUDENE/BB	01/07/20	30/09/20	R\$	703.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
22	Liberação 18	SUDENE/BB	01/10/20	31/12/20	R\$	252.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
23	Liberação 19	SUDENE/BB	01/01/21	31/03/21	R\$	3.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
24	Liberação 20	SUDENE/BB	01/04/21	30/06/21	R\$	189.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
25	Liberação 21	SUDENE/BB	01/07/21	30/09/21	R\$	189.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		
26	Liberação 22	SUDENE/BB	01/10/21	31/12/21	R\$	3.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar		

<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/07/21</b>	<b>31/12/21</b>	<b>R\$</b>	<b>25.460.000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>2,17%</b>	<b>Em Andamento</b>		
--	--	--	-----------------	-----------------	------------	----------------------	---	---	-------------	--------------	---------------------	--	--

<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>51%</b>	<b>Em Andamento</b>		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	--	--

27	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado			-	-	-	0,00%	A Iniciar		
28	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado			-	-	-	0,00%	A Iniciar		

<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
-----------------------------	--	--	----------------------	----------------------	------------	-------------	---	---	-------------	--------------	------------------	--	--

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>26%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		
-----------------------------------	--	------------------------	------------	----------------------	-------------------------	------------	----------	------------	---------------------	--------------------------	--	--

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 65
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
<b>Objetivo da ação:</b>		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros		
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Suzano Papel e Celulose S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/2024
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 223.997.049,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 260.189.953,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 260.189.953,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 260.189.953,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	-	100,00%	Concluído	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>21/10/15</b>	<b>27/07/16</b>	<b>0,00</b>	<b>21/10/15</b>	<b>20/07/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	31/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/12/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/12/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>20/07/16</b>	<b>31/12/16</b>	<b>260.189.953,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>56%</b>	<b>Em Andamento</b>		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 260.189.953,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	<b>28%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------	------------	---------------------	--------------------------

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>3º Ciclo 2016</b>	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 66
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Brametal S.A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/12/2018
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto: Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 4.095.556,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.095.556,81
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>27/08/15</b>	<b>20/08/16</b>	<b>0,00</b>	<b>27/08/15</b>	<b>01/08/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/08/16</b>	<b>30/09/16</b>	<b>4.095.556,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>63%</b>	<b>Em Andamento</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 4.095.556,81	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	31%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	------------------	-------------------------	-------	-----	---------------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**  
3º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b> 3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		<b>Número do Projeto:</b> PO 67 (ex PO 66)	
<b>Objetivo estratégico:</b> 3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências		<b>Ano:</b> 2016	
<b>Sub-objetivo:</b> 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.			
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
<b>Unidade Responsável:</b>	Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI)	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte aos Colegiados (CGP/CGGI)
<b>Responsável:</b>	Manoel Francisco Barreiros (Coordenador-Geral)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carmen Lúcia Couto Fonseca
<b>Problema (causa):</b>	Mudanças no Decreto nº 8.276, de 27/06/14, feitas pelo Decreto nº 8.679, de 22/02/2016, reduziu 9 cargos comissionados, afetando o funcionamento de algumas unidades da estrutura organizacional da SUDENE.		
<b>Projeto:</b>	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adequar, até 13/06/2016, o atual RI da SUDENE aos cortes estabelecidos pelo Decreto nº 8.679/2016, sancionado em 22/02/2016 e publicado no DOU em 23/02/2016.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				0,00	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	16/06/2016
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião com as unidades internas para a apresentação da metodologia e dos encaminhamentos necessários (prazos e produtos esperados) para a adequação do Regimento interno vigente aos cortes. Espaço Cultural Celso Furtado - 8º andar, sala 01-Ala Norte, 9h30	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/03/16	01/03/16		01/03/16	01/03/16		100,00%	<b>Concluído</b>	Os novos ajustes do RI da SUDENE terão como base a Resolução da DC nº 230 que aprovou o RI em 2015, bem como, o Decreto nº 8.276/14, o Decreto nº 8.679/2016 que estabeleceu cortes na estrutura de cargos daquele Decreto, ademais das contribuições das unidades. Além disso os efeitos do Decreto nº 8.679/2016 começam vinte e um dias após a sua publicação. Ou seja, 15/03/16.	
2	Análise das unidades e encaminhamento das propostas de ajuste	Gestores das unidades internas	01/03/16	18/03/16		01/03/16	23/05/16		100,00%	<b>Concluído</b>	Devido ao pouco tempo e escassez do quadro da CGGI não haverá prorrogação. A unidade que não se manifestar até a data será interpretada como aderente à proposta vigente no Regimento Interno aprovado pela RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA nº 230/2015.	
3	Retorno das unidades internas	Gestores das unidades internas	12/04/16	12/04/16		16/05/16	23/05/16		100,00%	<b>Concluído</b>	Apenas as unidades afetadas pelo Decreto nº 8.679/16 (Coordenação-Geral de Adm. e Finanças e Coordenação-Geral de TI) encaminharam propostas.	
4	Reunião presencial com as unidades e últimos ajustes, conforme o caso.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	13/04/16	19/04/16		24/05/16	24/05/16		100,00%	<b>Concluído</b>		
5	Montagem da primeira minuta e envio às unidades para apreciação	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	06/04/16	08/04/16		25/05/16	25/05/16		100,00%	<b>Concluído</b>		



6	Envio da proposta do RI ajustado à Procuradoria da SUDENE para análise da proposta.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	25/04/16	25/04/16		30/05/16	30/05/16		100,00%	Concluído	
7	Análise das observações feitas pela Procuradoria da SUDENE e ajuste da minuta	Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)	30/05/16	13/06/16		30/05/16	04/07/16		100,00%	Concluído	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.
8	Reunião prévia de esclarecimento e alinhamento de posições com os Diretores de Administração, de Fundos e Incentivos, e de Planejamento	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/06/16	14/06/16		05/07/16	05/07/16		100,00%	Concluído	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.
9	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada e aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/06/16	15/06/16		06/07/16	06/07/16		100,00%	Concluído	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades.
10	Encaminhamento para publicação no DOU e Boletim interno.	Gabinete da Superintendência	16/06/16	16/06/16		08/07/16	08/07/16		100,00%	Concluído	Datas previstas ajustadas em razão do atraso na entrega das contribuições das unidades. O prazo limite é 13/06/16 (90 dias contados do início dos efeitos do Decreto nº 8.679/2016) contudo as unidades atrasaram a entrega de suas propostas.
			<b>Valor Previsto:</b>	0,00	<b>Valor realizado:</b>				100%	Concluído	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Unidades Administrativas internas.

**Observações:**

3º Ciclo 2016

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 68</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;</b>	<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Sub Objetivo:</b>	<b>3.1.1-Reestruturar as unidades gestoras</b>		
<b>Programa do PPA:</b>		<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
<b>Objetivo da ação:</b>	Ação prevista no rol das atribuições da Coordenação-Geral de Gestão Institucional		
<b>Unidade responsável:</b>	Superintendência	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
<b>Gestor:</b>	Ricardo Barros (Superintendente interino).	<b>Gestor da subunidade:</b>	Manoel Francisco Barreiros
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de realinhamento da programação do planejamento estratégico vigente objetivando mais clareza e foco, paralelamente com o trabalho de melhoria da vinculação das metas e ações às atribuições e processos gerenciais.		
<b>Projeto:</b>	Realinhamento do planejamento estratégico institucional com a definição de metas e ações, integradamente com a atualização das atribuições regimentais e dos processos mapeados em 2012		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realinhamento do planejamento estratégico da SUDENE, das atribuições regimentais e dos processos mapeados em 2012, sua atualização/complementação objetivando adequação desses referenciais à realidade da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				0,00	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	19/07/17
<b>Data Atualização:</b>	31/08/16

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Leonardo Galindo Cavalcanti (Analista Técnico Administrativo-CGDF/DFIN) e Manoel Barreiros (Coordenador-Geral da CGGI)
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reunião com a Chefia de Gabinete para início dos trabalhos incluindo a definição da condução do novo realinhamento, responsabilidades, envolvidos inicialmente, metodologia, referenciais, testes de validação, organização de apresentações, agenda	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	06/04/16	06/04/16		06/04/16	06/04/16	100%	<b>Concluído</b>			
2	Escolha da unidade administrativa para aplicação da metodologia (teste de validação metodológica da análise integrada entre o estratégico, o regimental e o processo mapeado)	Uyran Costa (Gabinete), Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	07/04/15	07/04/16		07/04/16	07/04/16	100%	<b>Concluído</b>	Foi escolhida a Diretoria de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento e suas duas Coordenações Gerais: Fundos de Desenvolvimento e Financiamento, e Benefícios e Incentivos Fiscais		
3	Reestudo das competências regimentais vigentes da SUDENE, aprovadas pela Diretoria Colegiada por meio da Resolução nº 230, de 21 de outubro de 2015, integrando-a aos objetivos do planejamento estratégico vigente para o período 2013-2016, e ao mapeamento de processos atualizando o que foi realizado em 2012.	Uyran Costa (Gabinete) e Manoel Barreiros (CGGI)	06/04/16	23/08/16		06/04/16		70%	<b>Paralisado</b>	O trabalho foi assumido pelas Diretorias de Gestão de Fundos e de Administração, avançou, mas a decisão de sua continuidade foi, em 25/04/16, repassada pelo então Superintendente João Paulo para o Diretor de Planejamento, Sérgio Alencar, e não teve continuidade. Saída da equipe de João Paulo e do chefe de gabinete Uyran Costa, resultando na paralisação da etapa.	<b>O trabalho será conduzido por empresa a ser contratada.</b>	
4	Mapeamento piloto e apresentação dos resultados do projeto "piloto" à Diretoria Colegiada para deliberação.	Manoel Barreiros (CGGI)	24/08/16	24/08/16		16/05/16		20%	<b>Atrasado</b>	A Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento vem trabalhando o mapeamento de seus processos, alcançando 40% até a data deste preenchimento.		

5	Apresentação da proposta para os Coordenadores Gerais da SUDENE	Manoel Barreiros (CGGI)	30/08/16	30/08/16					0%	A Iniciar		
6	Apresentação da proposta para os Coordenadores Gerais	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	31/08/16	07/12/16					0%	A Iniciar		
7	1ª Apresentação do andamento dos trabalhos para a Diretoria Colegiada	Manoel Barreiros (CGGI)	14/12/16	14/12/16					0%	A Iniciar		
8	Continuidade dos trabalhos	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	07/02/17	31/05/17					0%	A Iniciar		
9	2ª Apresentação do andamento dos trabalhos para a Diretoria Colegiada	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	07/06/17	07/06/17					0%	A Iniciar		
10	Ajustes da proposta	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	08/06/17	14/07/17					0%	A Iniciar		
11	Apresentação final para aprovação da Diretoria Colegiada	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI)	19/07/17	19/07/17					0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	26%	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>			

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
3º Ciclo 2016


Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 69 (ex PO 67)</b>
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	<b>3.1.2. Modernizar a gestão</b>	<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
<b>Diretor:</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Heber Leandro Nunes
<b>Problema (causa):</b>	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
<b>Projeto:</b>	Monitoramento das últimas etapas de finalização de convênios.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Corrigir competências institucionais para garantir a conclusão de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Valor de Despesa	Validade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				-	-



<b>Previsão de Conclusão:</b>	ñ se aplica
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Heber Leandro Nunes
--	---------------------

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1 Processo nº 59335.000175/2012-20 (SIAFI n.º 769473), Aprovação de Relatório de Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/01/2016	19/01/2016	ñ se aplica	04/01/2016	04/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
2 Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/01/2016	03/02/2016	ñ se aplica	19/01/2016	20/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
3 Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/01/2016	05/02/2016	ñ se aplica	21/01/2016	26/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
4 Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783), Análise Financeira complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/03/2016	05/04/2016	ñ se aplica	21/03/2016	22/03/216	ñ se aplica	100%	Concluído			
5 Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Reanálise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/03/2016	05/04/2016	ñ se aplica	21/03/2016	31/03/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
6 Processo nº 59335.000116/2012-51 (SIAFI n.º 769782), Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/04/2016	19/04/2016	ñ se aplica	04/04/2016	29/04/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
7 Processo nº 59333.000262/2005-78 (SIAFI n.º 542944), Análise Financeira complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/04/2016	04/05/2016	ñ se aplica	19/04/2016	04/05/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
8 Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365), Reanálise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/05/2016	04/06/2016	ñ se aplica	20/05/2016	24/05/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
9 Processo nº 03054.000003/99-74 (SIAFI n.º 374633), Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	27/05/2016	11/06/2016	ñ se aplica	27/05/2016		ñ se aplica	50%	Em Andamento			
		<b>Valor Previsto:</b>			<b>Valor realizado:</b>				94%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
<b>Observações:</b>	2º ciclo 2016 - Jan/2016 a Mai/2016 3º Ciclo 2016 - Dados não recebidos da unidade.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado




**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 70 (ex PO 68)
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	3.1.2. Modernizar a gestão			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial		
<b>Diretor:</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Heber Leandro Nunes		
<b>Problema (causa):</b>	Localização inadequada das etapas administrativas em convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
<b>Projeto:</b>	Monitoramento das últimas etapas administrativas de finalização de convênios.				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Corrigir competências institucionais e acompanhar a execução de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	ñ se aplica
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016



<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	30/06/2016	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tendo em vista a remessa de documentação pelo potencial responsável, foi solicitada a emissão de laudo técnico complementar	
2	Processo TCE n.º , Ref. Conv. SIAFI n.º 317557 (Processo n.º 03057.000002/96-93) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	26/10/2015	30/06/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações	
3	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03, Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	03/10/2016	N/A	06/04/2016		N/A	66%	Em Andamento		
4	Processo TCE n.º 59335.000538/09-21, Ref. Conv. SIAFI n.º 406596 (Processo n.º 59313.000105/00-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	26/10/2015	30/06/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações	
			<b>Valor Previsto:</b>			<b>Valor realizado:</b>			77%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
<b>Observações:</b>	2º ciclo 2016 - Jan/2015 a Mai/2016 3º Ciclo 2016 - Dados não recebidos da unidade.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 71 (ex PO 69)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
<b>Programa:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
<b>Diretor :</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Ângela Maria Lima Gouveia		
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe				
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento de Lideranças				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.414,51	25.414,51
				25.415	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	9.580,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)		
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	6.254,51
Saldo a liberar		
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	15.834,51

<b>Previsão de Conclusão:</b>	17/11/2019
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14		17/11/14	28/11/14		100%	Concluído		
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído		
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14		11/12/14	11/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15		03/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15		01/04/15	30/04/15		100%	Concluído		
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/06/16	15.834,51	04/05/15		6.254,51	50%	Atrasado	Contratações adicionais para efetivação do projeto serão realizadas.	
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/12/15	30/06/16	7.980,00	04/12/15	30/06/16	7.980,00	100%	Concluído	Curso realizado, aguardando certificação	
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/07/16	30/11/16		01/07/16			5%	Em Andamento		
9	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e equipe	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	01/08/16	16/12/16					0%	A Iniciar		
10	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/16	30/12/16					0%	A Iniciar		

	<b>Valor Previsto:</b>	25.414,51	<b>Valor realizado:</b>	15.834,51	66%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	
--	------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-----	---------------------	--------------------------	--

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

Ciclo janeiro a agosto de 2016. O projeto é uma ação interligada ao Projeto Gestão por Competências e ambos ocorrerão nos próximos 04 anos conforme previsto no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2016/2019.

3º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 72 (ex PO 70)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
<b>Programa:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
<b>Diretor :</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Ângela Maria Lima Gouveia		
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.				
<b>Projeto:</b>	Gestão por Competências				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.000,00	25.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 25.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 24.020,40
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 24.020,40

<b>Previsão de Conclusão:</b>	10/11/2019
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14		24/11/14	12/12/14		100%	Concluído		
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15		19/01/15	30/01/15		100%	Concluído		
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15		02/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/06/16	25.000,00	01/04/15	10/06/16	24.020,40	100%	Concluído		
5	Reunião de orientação para descrição de competências por unidade organizacional	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	16/02/16	16/02/16		16/02/16	16/02/16		100%	Concluído		
6	Levantamento das competências das unidades organizacionais	Gestores das unidades organizacionais	16/02/16	29/02/16		16/02/16	29/02/16		100%	Concluído		
7	Mapeamento das competências	Marlene Franklin e Marina Braga	29/02/16	23/03/16		29/02/16	23/03/16		100%	Concluído		
8	Elaboração do projeto de gestão por competências	Marlene Franklin e Marina Braga	23/03/16	30/03/16		23/03/16	30/03/16		100%	Concluído		
9	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	27/06/16	18/10/16		18/07/16			30%	Em Andamento		
10	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	27/06/16	18/10/16		18/07/16			30%	Em Andamento		
11	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	06/07/16	15/09/16		18/07/16			30%	Em Andamento		



12	Elaboração de Plano para o desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	21/09/16	05/10/16					0%	A Iniciar		
13	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
14	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					25.000,00	<b>Valor realizado:</b>			24.020,40	64%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

CENTRESAF/PE - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

**Observações:**

Ciclo de janeiro a agosto de 2016. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento. de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.

**3º Ciclo 2016**

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 73 (ex PO 71)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
<b>Programa:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
<b>Diretor :</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Ângela Maria Lima Gouveia		
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral				
<b>Projeto:</b>	Investindo nos Sonhos				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laborativa.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		10.000,00	10.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/11/2019.
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	6.200,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	6.200,00

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14		06/10/14	10/10/14		100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14		17/10/14	17/10/14		100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14		19/11/14	05/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicossociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15		20/01/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15		01/04/15	10/04/15		100%	Concluído		
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15		13/04/15	21/05/15		100%	Concluído		

7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído		
8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15		08/06/15	26/06/15		100%	Concluído		
9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00	16/06/15	18/05/15		100%	Concluído	Os recursos não foram utilizados. Prevê-se utilizar na segunda turma.	
10	Encontros de formação de facilitadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	21/05/15	03/07/15		21/05/15	03/07/15		100%	Concluído		
11	Realização dos Encontros com os participantes da primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	15/09/15		01/06/15	15/09/15		100%	Concluído		
12	Planejamento e Homenagem aos servidores aposentados	Participantes do Projeto e facilitadores	15/09/15	22/09/15		15/09/15	22/09/15		100%	Concluído		
13	Planejamento para realização dos encontros da segunda turma	CGGP e facilitadores	15/09/15	02/10/15		15/09/15	02/10/15		100%	Concluído		
14	Realização dos Encontros - segunda turma	CGGP e facilitadores	16/10/15	18/12/15	2.500,00	16/10/15	18/12/15	1.200,00	100%	Concluído		
15	Encerramento do Projeto de 2015	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	18/12/15	18/12/15		18/12/15	18/12/15		100%	Concluído		
16	Planejamento do Projeto para 2016	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	01/09/16	09/09/16					0%	A Iniciar		
17	Realização dos Encontros - terceira turma	CGGP e facilitadores	12/09/16	18/11/16					0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					10.000,00	<b>Valor realizado:</b>			6.200,00	88%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Banco Central; Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, Igreja Batista do Cordeiro

**Observações:**

Ciclo de janeiro a agosto de 2016. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.

**3º Ciclo 2016**

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 74 (ex PO 67)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	3.271.552,15
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$	155.878,20
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)		
Valor Empenhado no Exercício	R\$	32.560,90
Valor liberado no Exercício	R\$	65.815,10
Saldo a liberar no Exercício	R\$	122.624,00
Saldo a Empenhar no exercício		
Total liberado até o exercício	R\$	3.337.367,25

<b>Previsão de Conclusão:</b>	06/09/2017
<b>Data Atualização:</b>	15/09/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Wilson Galdino / Paula Aragão de Souza
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	R\$ 1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	R\$ 908.911,38	100%	<b>Concluído</b>	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	R\$ 0,00	100%	<b>Concluído</b>	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	R\$ 1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	R\$ 1.581.203,27	100%	<b>Concluído</b>	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	

5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	R\$ 140.000,00	11/03/13	11/02/14	R\$ 140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	R\$ 0,00	20/01/14	13/04/15	R\$ 0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compor Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R\$ 241.454,70.	
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	R\$ 960.000,00	06/02/14	05/12/14	R\$ 555.861,00	100%	Concluído		As poltronas foram entregues nesta Autarquia e pagas em 28/12/2015, aguardando a reforma dos auditórios para serem instaladas.
8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	15/06/16	R\$ 273.000,00	11/06/15			99,7%	Atrasado	Foi celebrado em 05/02/2015 o 1º Termo Aditivo ao Contrato, acrescentando o valor de R\$ 32.560,90 e prazo de 45 dias.	
8.1	Levantamentos e estudos preliminares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/05/15		11/06/15	28/10/15	R\$ 25.356,00	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 25.356,00.	Os serviços foram concluídos em 28/10/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.2	Projeto Básico da reforma geral	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/05/15	31/12/15		27/07/15	14/12/15	R\$ 60.220,50	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 60.220,50.	Os serviços foram concluídos em 14/12/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.3	Projeto Executivo	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/06/15	15/06/16		17/08/15		R\$ 65.815,10	99%	Atrasado	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 87.478,20.	A Área de Engenharia da Sudene analisou os projetos e está aguardando a Contratada realizar as correções sugeridas nessa análise.
9	Licitação da obra de ambientação final	SUDENE/CPL	01/07/16	01/11/16	R\$ 0,00				0%	A Iniciar		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	07/11/16	06/09/17	R\$ 3.300.000,00				0%	A Iniciar		
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compor Eng. e Automação Ltda.	07/11/16	06/09/17	R\$ 72.000,00				0%	A Iniciar	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 68.400,00.	
12	Entrega da obra			06/09/17					0%	A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 7.553.642,89	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 3.337.367,25	67%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

3º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 75 (ex PO 68)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			<b>Ano:</b>	2009
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
<b>Diretor:</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares		
<b>Problema (causa):</b>	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.				
<b>Projeto:</b>	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	6.458.613,62
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$	2.211.931,24
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)		
Valor Empenhado no Exercício		
Valor liberado no Exercício		
Saldo a liberar no Exercício		
Saldo a Empenhar no exercício		
Total liberado até o exercício	R\$	6.458.613,62

<b>Previsão de Conclusão:</b>	20/08/2015
<b>Data Atualização:</b>	15/09/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	20/08/15	5.745.805,68	22/10/12		3.533.874,44	88%	Paralisado	A Diretoria Colegiada da Sudene autorizou a realização da vistoria final dos serviços, a qual foi realizada em 25/05/16.	

9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	20/08/15	0,00	22/10/12	0,00	88%	Paralisado	A Comissão de Fiscalização realizou a vistoria final dos serviços, tendo emitido o <b>Termo de Recebimento Provisório dos Serviços</b> em 02/06/2016, dando um prazo de 15 dias para a Contratada corrigir as pendências encontradas nessa vistoria.	A Comissão de Fiscalização realizou a vistoria sem a participação dos fiscais José Villeneuve e Rebeca Ramalho.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		20/08/15	0,00			0%	Paralisado		
			<b>Valor Previsto:</b>		9.673.041,23	<b>Valor realizado:</b>		6.458.613,62	90%	Paralisado	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**3º ciclo 2016**

Este Plano Operativo não sofreu qualquer atualização desde o Ciclo anterior.

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 76 (ex PO 69)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho</b>	<b>Ano:</b>	<b>2009</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
<b>Problema (causa):</b>	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
<b>Projeto:</b>	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	4.226.603,89	4.226.603,89

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	15/09/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Wilson Galdino / Diego Vêras Emerenciano / Thiago Teles da Silva
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 48.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar no Exercício	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	<b>Concluído</b>	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	<b>Concluído</b>	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	<b>Concluído</b>	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	<b>Concluído</b>	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	<b>Concluído</b>	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.



6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.	A Área de Engenharia encaminhou Memorando à CGAF, em 20/03/2015, solicitando a contratação dos serviços de modernização das subestações elétricas.
7	Relançamento da Licitação da Obra	SUDENE/CPL	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15	15/04/15	0,00	100%	Concluído	A CPL devolveu o processo para a Área de Engenharia, em 15/04/2015, informando que aguardasse a decisão final sobre que órgão condominial iria realizar esta licitação.	Ficou decidido que a contratação será realizada pela Sudene, tendo sido solicitada a autorização do MI, através do Ofício GAB/SUDENE nº 371/2015, em 17/07/15, e reiterado através do Ofício GAB/SUDENE nº 492/2015, em 1º/12/2015.
8	Autorização para a contratação dos serviços	Ministério da Integração Nacional	17/07/15	17/08/15	0,00	17/07/15	17/12/15	0,00	100%	Concluído	A autorização do Ministério da Integração Nacional foi proferida em 17/12/2015, em despacho do Secretário-Executivo Substituto, Sr. Laércio Roberto Lemos de Souza.	Face à necessidade de atender à Decisão judicial que anulou a interdição do Edifício SUDENE, a autorização ministerial caracterizou a contratação como emergencial.
9	Novo processo de contratação da obra	SUDENE/DAD	18/12/15	30/08/16	0,00	18/12/15			45%	Atrasado	Em 11/04/2016, a Área de Engenharia encaminhou o Projeto Básico para a contratação da obra, que recebeu a aprovação do Diretor de Administração, reduzindo o orçamento básico da obra para 4.066.603,89.	Em 31/05/2016, o Coordenador-Geral da CGAF encaminhou o processo para a DAD, após a emissão de Parecer pela Procuradoria sobre a minuta de Edital para a contratação na modalidade Concorrência.
10	Execução da Obra	A definir	01/09/16	28/02/17	4.066.603,89					A Iniciar		
11	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Vêras e empresa de consultoria	01/09/16	28/02/17	60.000,00					A Iniciar		
12	Entrega da obra			28/02/17						A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	4.226.603,89	<b>Valor realizado:</b>	100.000,00	<b>38,41%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

3º ciclo 2016

Este Plano Operativo não sofreu qualquer atualização desde o Ciclo anterior.

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 77 (ex PO 76)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	-
<b>Problema (causa):</b>	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)		
<b>Projeto:</b>	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	33	90	565.700,00	565.700,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	565.700,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	565.700,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>31/07/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>24/09/2016</b>

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Nascimento (UFPE).
---	---------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májury Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído		
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído		
6	Coordenação Científica (R\$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	31/07/2016		30/04/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R\$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májury Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassete e 200 fitas de vídeo (R\$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015		01/07/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
9	Pesquisa em jornais (R\$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philipe Pedro, Sergio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
10	Produção de Artigos e pesquisas para o site e para o Ciclo de Debates. (R\$ 24.000,00)	Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/07/2016		15/05/2015	31/07/2016		100%	Concluído		

11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R\$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/05/2016		100%	Concluído	
12	Coleta de depoimento na elaboração de documentário (R\$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/10/2015	20/07/2016		01/10/2015	19/08/2016		100%	Concluído	Apesar da vigência do TED ter sido 31/07/2016, a entrevista com o senador Armando Monteiro Neto estava agendada e adiada por conveniência do entrevistado.
13	Alimentação e monitoramento do site (R\$ 7.800,00)	Fabício Silva	15/05/2015	31/07/2016		15/05/2015	31/08/2016		100%	Concluído	
14	Produção de Artigos para o livro (R\$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	31/05/2016		01/06/2015	31/05/2016		100%	Concluído	
15	Revisão, normatização e diagramação (R\$ 6.000,00)	Contratado	01/10/2015	31/07/2016		01/10/2015	31/07/2016		100%	Concluído	
16	Transcrição de depoimentos (R\$ 10.000,00)	Contratado	01/08/2015	20/07/2016		30/09/2015	22/08/2016		100%	Concluído	Foi prevista a transcrição do último depoimento.
17	Publicação do livro (R\$ 20.000,00)	Contratado	20/06/2016	31/07/2016		20/06/2016			99%	Atrasado	A gráfica atrasou a produção dos exemplares. Nova data de fim previsto para dia 10/10/2016.
18	Preservação analógica do acervo textual (R\$ 20.000,00)	Contratado	01/04/2016	31/07/2016		01/04/2016			99%	Atrasado	As especificidades dos documentos, tornou o processo mais lento. Nova data de fim previsto para dia 10/10/2016.
19	Realização de Ciclos de Debates (R\$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	31/07/2016		01/06/2015	31/07/2016		90%	Concluído	A realização do último Ciclo de Debates desta fase, será realizado em parceria com o Centro D[Celso Furtado e o BNB, que custeará as despesas, previsto para o mês de novembro.
20	Assistência administrativa (R\$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016						Cancelado	Por necessidade de outras atividades do projeto esta ação foi cancelada.
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R\$ 16.000,00)	M2S	01/09/2015	31/07/2016		01/09/2015	31/07/2016		100%	Concluído	
22	Assessoria de comunicação (R\$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016		01/05/2015	31/08/2016		100%	Concluído	O bolsista participou mais um mês devido a agenda externa.
			<b>Valor Previsto:</b>	<b>565.700,00</b>		<b>Valor realizado:</b>	<b>565.700,00</b>		<b>99%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia para o Conhecimento

**Observações:**

3º ciclo 2016

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 78 (ex PO 73)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
<b>Diretor:</b>	Eugenio Pacelli Remigio Araujo	<b>Gestor da subunidade:</b>	Josué Ribeiro
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
<b>Projeto:</b>	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>30/12/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>31/08/2016</b>

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 383.999,07
A realizar no exercício	R\$ 229.863,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 77.842,04
Saldo a liberar	R\$ 152.021,77
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 461.841,11

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %					
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído				
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído				
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM			
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído				
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - especificação de requisitos, arquitetura, processos, modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/04/15	30/09/15	340.953,88	06/04/15	08/09/15	35.043,28	100%	Concluído	Recursos da SUDENE			
6	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - codificação e testes	Empresa Contratada.	01/10/15	30/10/15	-	19/10/15	-	76.046,79	95%	Atrasado				
7	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - especificação de requisitos, arquitetura, processos, modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/11/15	30/12/15	-	10/11/15	-	77.842,04	100%	Concluído				
8	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - codificação e testes	Empresa Contratada.	04/01/16	29/07/16	-	26/02/16	-	-	25%	Atrasado				
9	Implantação do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador e da SUDENE	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/16	30/12/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar				
<b>Valor Previsto:</b>					613.862,88	<b>Valor realizado:</b>					461.841,11	91%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Ministério da Integração Nacional e SUDAM

**Observações:**

**3º Ciclo 2016**

Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

**ANEXO II**  
**Gestão Orçamentária e Financeira**  
**Exercício 2016**

**SUDENE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 2016**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/0001	A	1	15.557.318,00	10.501.620,00	5.667.774,92	67,50	53,97	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	398.404,00	303.185,00	46.758,75	76,10	15,42	Servidor capacitado	199		0,00		
4	122	2111	216H/0020	A	1	102.594,00	102.594,00	64.157,41	100,00	62,54						
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	267.676,82	100,00	46,47	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	53.867,00	53.867,00	35.968,05	100,00	66,77	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	95.869,96	100,00	39,95	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.237.592,00	1.237.592,00	836.383,83	100,00	67,58	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	22.044,00	22.044,00	591,32	100,00	2,68	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.900.000,00	3.900.000,00	2.324.827,02	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	27.034.586,00	27.034.586,00	17.126.563,35	100,00	-	-	-	-	-	-	
<b>2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI</b>						<b>Total</b>	<b>49.122.405,00</b>	<b>43.971.488,00</b>	<b>89,51</b>	<b>60,19</b>	-	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.305.121,00	2.305.121,00	1.607.460,85	100,00	69,73	-	-	-	-	-	
<b>0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>						<b>Total</b>	<b>2.305.121,00</b>	<b>2.305.121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,73</b>	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	707.427,00	707.427,00	0,00	100,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	459.000,00	459.000,00	0,00	100,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	319.486,00	319.486,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	608	2029	214S/0001	A	1	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	1.238.577,00	1.238.577,00	0,00	100,00	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO006	A	1	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7192	A	1	8.837.183,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0024	A	1	10.487.436,00	7.763.226,00	5.422.497,00	74,02	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
<b>2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária</b>						<b>Total</b>	<b>24.509.109,00</b>	<b>12.947.716,00</b>	<b>52,83</b>	<b>41,88</b>						
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
<b>2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres</b>						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>					
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: 31/08/2016 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

**ANEXO III**  
**Projetos tabulados segundo Diretrizes**  
**e Objetivos Estratégicos da SUDENE**



Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provisão de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provisão de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
7	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 9.452.840,00	R\$ 952.322,32	10%
8	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
9	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
10	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
11	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
12	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provisão de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Cancelado	R\$ 534.417,84	R\$ 0,00	0%
13	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
14	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
15	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Café com Sustentabilidade Restauração e Manejo Florestal: Perspectivas para o Semiárido	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
16	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Café com Sustentabilidade "Rotas da Integração Prioritárias no Nordeste	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
17	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	I Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
18	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
19	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Bioessencial de Plantas Medicinais, Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	-
20	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Bioessencial de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	100%
21	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
22	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%
23	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
24	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.838.252.335,00	94%
25	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
26	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
27	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
28	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
29	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
30	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
31	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
32	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
33	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
34	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
35	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
36	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
37	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
38	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
39	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
40	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
41	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
42	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
43	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
44	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
45	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
46	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
47	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
48	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suaepe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
49	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
50	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
51	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
52	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
53	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
54	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 188.283.235,00	R\$ 0,00	0%
55	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 62.999.857,00	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
56	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Caetex Florestal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 25.459.126,00	R\$ 0,00	0%
57	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
58	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
<b>Total do Objetivo 1.1</b>								<b>9.972.601.231,47</b>	<b>6.515.626.569,07</b>	<b>65%</b>
59	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Nordeste em Números 2015	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total do Objetivo 1.4</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
60	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
<b>Total do Objetivo 1.5</b>								<b>234.105,49</b>	<b>139.865,15</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 1</b>								<b>9.972.835.336,96</b>	<b>6.515.766.434,22</b>	<b>65%</b>
61	30	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
<b>Total do Objetivo 2.2</b>								<b>43.290.000,00</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>40%</b>
62	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
63	9	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
64	18	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
<b>Total do Objetivo 2.3</b>								<b>1.825.305,97</b>	<b>1.182.390,74</b>	<b>65%</b>
65	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
<b>Total do Objetivo 2.4</b>								<b>228.797,21</b>	<b>167.999,61</b>	<b>73%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 2</b>								<b>45.344.103,18</b>	<b>18.588.390,35</b>	<b>41%</b>
66	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
67	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Realinhamento do planejamento estratégico institucional com a definição de metas e ações, integradamente com a atualização das atribuições regimentais e dos processos mapeados em 2012	Ação interna	Ação interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
68	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
69	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
70	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.414,51	R\$ 15.834,51	62%
71	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 24.020,40	96%
72	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
<b>Total do Objetivo 3.1</b>								<b>60.414,51</b>	<b>46.054,91</b>	<b>76%</b>
73	77	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
74	78	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 461.841,11	75%
<b>Total do Objetivo 3.2</b>								<b>1.179.562,88</b>	<b>1.027.541,11</b>	<b>87%</b>
75	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.337.367,25	44%
76	75	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
77	76	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 4.226.603,89	R\$ 100.000,00	2%
<b>Total do Objetivo 3.3</b>								<b>21.453.288,01</b>	<b>9.895.980,87</b>	<b>46%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 3</b>								<b>22.693.265,40</b>	<b>10.969.576,89</b>	<b>48%</b>
78	22	4. Fortalecer a imagem da Sudene	4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	"Café com Sustentabilidade" - Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Tema 7 - Acesso à Energia	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total do Objetivo 4.1</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.040.872.705,54</b>	<b>6.545.324.401,46</b>	<b>65,2</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 3º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/08/2016

**ANEXO IV**  
**Projetos tabulados segundo a**  
**Programação do PPA**



Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.838.252.335,00	94%
3	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
13	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%



Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
15	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxoto S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
20	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
27	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
28	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
29	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
30	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Saupe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
31	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
32	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 188.283.235,00	R\$ 0,00	0%
33	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 62.999.857,00	R\$ 0,00	0%
34	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Caetex Florestal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 25.459.126,00	R\$ 0,00	0%
35	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
36	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 0355</b>								<b>9.951.843.832,79</b>	<b>6.505.933.393,18</b>	<b>65%</b>
37	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Sertão do Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
38	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
39	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Moluscos nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Cancelado	R\$ 534.417,84	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 20N7</b>								<b>1.649.003,54</b>	<b>417.151,42</b>	<b>25%</b>
40	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
<b>P 2029 - Ação 4640</b>								<b>1.069.868,00</b>	<b>326.618,00</b>	<b>31%</b>
41	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
42	9	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
43	18	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 8689</b>								<b>1.825.305,97</b>	<b>1.182.390,74</b>	<b>65%</b>
44	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
45	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
46	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
47	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia, Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R\$ 9.452.840,00	R\$ 952.322,32	10%
48	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
49	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
50	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
51	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aero geradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
52	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
<b>P 2029 - Ação 8902</b>								<b>12.684.074,02</b>	<b>3.600.900,92</b>	<b>28%</b>
53	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
<b>P 2029 - Ação 8917</b>								<b>207.542,62</b>	<b>107.354,71</b>	<b>52%</b>
54	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
55	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%
56	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 8340</b>								<b>3.882.015,99</b>	<b>3.882.015,99</b>	<b>100%</b>
57	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 7K66</b>								<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100%</b>
58	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Caiçabu e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
59	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%
60	77	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
<b>P 2029 - Ação 20WQ</b>								<b>1.814.700,00</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>100%</b>
<b>Total do Programa 2029</b>								<b>9.975.226.342,93</b>	<b>6.517.514.524,96</b>	<b>65%</b>
61	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
<b>P 2040 - Ação 8172</b>								<b>228.797,21</b>	<b>167.999,61</b>	<b>73%</b>
<b>Total do Programa 2040</b>								<b>228.797,21</b>	<b>167.999,61</b>	<b>73%</b>
62	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
64	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
65	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.414,51	R\$ 15.834,51	62%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
66	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 24.020,40	96%
67	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
68	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.337.367,25	44%
69	75	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
70	76	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 4.226.603,89	R\$ 100.000,00	2%
71	78	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 461.841,11	75%
<b>P 2111 - Ação 2000</b>								<b>22.127.565,40</b>	<b>10.403.876,89</b>	<b>47%</b>
<b>Total do Programa 2111</b>								<b>22.127.565,40</b>	<b>10.403.876,89</b>	<b>47%</b>
72	30	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
<b>Total do Programa 2069</b>								<b>43.290.000,00</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>40%</b>
73	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias e arranjos produtivos e Promover a sustentabilidade ambiental	Café com Sustentabilidade Restauração e Manejo Florestal: Perspectivas para o Semiárido	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
74	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias	Café com Sustentabilidade "Rotas da Integração Prioritárias no Nordeste	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
75	22	4. Fortalecer a imagem da Sudene	4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	"Café com Sustentabilidade" - Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Tema 7 - Acesso à Energia	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
76	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias e arranjos produtivos	I Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
77	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Nordeste em Números 2015	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
78	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Realinhamento do planejamento estratégico institucional com a definição de metas e ações, integradamente com a atualização das atribuições regimentais e dos processos mapeados em 2012	Ação interna	Ação interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total das Ações Internas/ Não se aplicam</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.040.872.705,54</b>	<b>6.545.324.401,46</b>	<b>65,2</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional  
Referência dos dados: 3º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/08/2016
